



★ ★ ★ ★ ★  
SECRETARÍA DE FINANZAS

**Secretaría de Finanzas**

**Dirección General de Inversiones Públicas**

# Informe de Avance Físico y Financiero

**SECRETARÍA DE DESARROLLO  
COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO  
(SEDECOAS/FHIS)**

Tercer Trimestre, 2020

Octubre, 2020

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A.

## IV. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

### 4.1 EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

La Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS)-Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) cuya finalidad es la de promover el mejoramiento de las condiciones de vida de los grupos sociales marginados en el área rural y urbana, mediante el otorgamiento de financiamientos para programas y proyectos de desarrollo social o económico, con el propósito de aumentar su productividad, sus niveles de empleo y de ingresos y de contribuir a la satisfacción de sus necesidades básicas.

Cuadro No. 05  
Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2020  
Cifras en Lempiras


Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	504,159,571
Presupuesto Vigente	491,434,870
Devengado III Trimestre-2020	30,871,519
<b>% Ejecución (Devengado III Trim-2020 / Vigente)</b>	<b>6%</b>
Devengado Anual	126,858,806
<b>% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)</b>	<b>26%</b>
Comprometido (Devengado + Compromiso)	161,758,196
<b>% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)</b>	<b>33%</b>

Fuente: SIAFI, 30/09/2020

Al tercer trimestre del 2020 la institución cuenta con un presupuesto vigente de inversión pública de **L 491,434,870** y la ejecución presupuestaria del trimestre asciende a un monto de **L 30,871,519** lo que representa el 6% con relación al presupuesto vigente, de igual forma presenta una ejecución acumulada anual de **L 126,858,806** tal como se detalla en el Cuadro No. 5.

Dicha ejecución se llevó a cabo a través de (6) seis proyectos enfocados en Agua y Saneamiento, Electrificación Rural y Caminos Rurales, Infraestructura Social, Infraestructura Escolar, Fortalecimiento de Capacidades para Jóvenes, Recuperación de Espacios Públicos y Mejora de la Infraestructura Básica. Ver Detalle de Ejecución Física en Anexo No. 5

**Gráfica No.6**  
Presupuesto Vigente  
Financiamiento por Organismo Financiero  
Cifras en millones de Lempiras

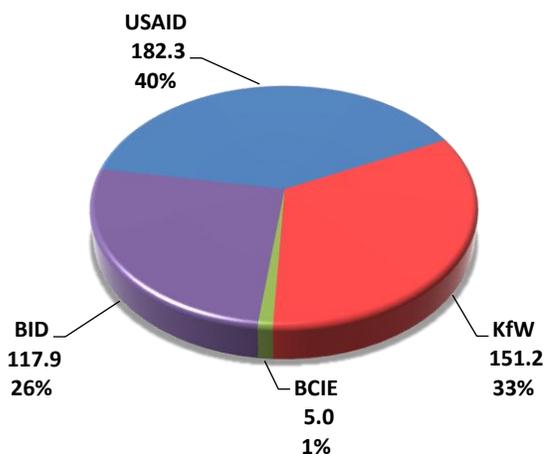

### 4.2 PRINCIPALES PROYECTOS

Con relación al presupuesto vigente con recursos externos para la ejecución de los proyectos está se distribuye por; KfW Banco Alemán con 33%, BID con el 26%, USAID con el 40% y BCIE con el 1%.

Del total del financiamiento, el 65% corresponde a fondos de donaciones externas expresado en términos monetarios por un monto de L.318,928,991 y el 28% a recursos de crédito externo por un monto de L.137,463,790 la contraparte nacional corresponde a gastos operativos con un

presupuesto vigente de L.35,042,089 equivalente a 7%.

La inversión en el tercer trimestre del año 2020 se concentró en los siguientes proyectos:

1. Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y su Gestión Local (PROMINE).
2. Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB).
3. Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (ICS).
4. Proyecto de Infraestructura Rural (PIR-BCIE).
5. Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras (PIOH).
6. Proyecto Convivencia y Espacios Seguros para los Jóvenes en Honduras (CONVIVIR).

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros de los principales proyectos de acuerdo a su presupuesto vigente:

#### **Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y de su Gestión Local (PROMINE) FASE IV**

PROMINE tiene por objetivo general fortalecer la rectoría Sectorial en Infraestructura Educativa de la Secretaría de Educación y la gestión local participativa, así como mejorar el acceso de los alumnos y alumnas de las comunidades pobres al Centro Educativo de calidad que operan de manera sostenible. De esa manera se pretende contribuir al aumento de la eficiencia y de la calidad del sistema educativo (pre-básico y básico).

Con relación a la Fase IV, actualmente se han considerado 41 proyectos de los cuales, 21 ya cuentan con la factibilidad institucional y con sus respectivas no objeciones por parte del organismo financiador, de los cuales 11 proyectos están en ejecución con un avance físico del 50% en promedio. Debido a la emergencia COVID-19 (Coronavirus) muchos procesos se paralizaron, sin embargo, a la fecha se ha avanzado en los procesos de contratación de 7 proyectos y por comprometer 3 proyectos cuyo monto contratado asciende a L 152,548,236.43 más esto con la finalidad de avanzar en la ejecución.

A continuación, véase la ejecución histórica del Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y de su Gestión Local (PROMINE), tercer trimestre 2020:

## SECRETARÍA DE FINANZAS

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto*/	Inicio-Fin	
Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y de su Gestión Local (PROMINE)	SE/FHIS VIII No.2008-66-178 2014 67 414 (KFW) / FHIS - SE	1,345,320,646	2012-2020	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
III Trimestre 2020	135,907,777	135,907,777	1,537,000	1
Acumulado 2020	135,907,777	135,907,777	24,768,633	18
Acumulado Vida del Proyecto*/	1,345,320,646	1,345,320,646	939,574,882	70

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Ver Detalle de Ejecución Física en Anexo No. 5

### Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB)

Consisten en contribuir a mejorar la convivencia ciudadana en Honduras a través de la mejora en la calidad de vida en barrios vulnerables y la reducción de la incidencia de delitos violentos. Los objetivos específicos son: (I) mejorar el hábitat de barrios urbanos vulnerables, aumentando el acceso a infraestructura de servicios básicos y de prevención para disminuir delitos de robos y violaciones sexuales; (II) reducir los niveles de incidencia de homicidios y violencia intrafamiliar (VIF) en los municipios intervenidos mejorando los servicios de prevención y atención a víctimas de la violencia; y (III) mejorar la efectividad policial en investigación criminal, a través del incremento de la proporción de casos de homicidio con agresor identificado e informe de investigación aceptado por el Ministerio Público.

A continuación, véase los avances por productos al 30 de septiembre de 2020:

#### Proyectos Integrales de Mejoramiento de Barrios.

- Los Proyectos de integración urbana el cual incluye: Ampliación, Mejoramiento y/o Construcción de sistemas de alcantarillado sanitario, agua potable, drenaje pluvial, mejoramiento vial y obras de mitigación de riesgos, colonias 25 de enero, Australia, Nueva España, Nueva Galilea, inicio la ejecución de obras el día 20 de diciembre de 2019. La duración prevista de finalización del contrato para dichas obras es al mes de junio del año 2021 (período ampliado debido a la pandemia por el COVID-19). Al mes de septiembre de 2020 se tiene la instalación de servicios básicos de agua potable, alcantarillado sanitario, drenaje pluvial y pavimentación de calles en sectores de los barrios beneficiados; el porcentaje de avance físico de este producto es de un 20% y tiene un avance financiero de 50% en relación al monto contratado que es de L 128,592,322.09.

Debido a la pandemia del COVID-19 en este proyecto se han implementado los protocolos de bio-seguridad establecidos por: la Secretaría del Trabajo, SEDECOAS FHIS y el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras; en este sentido se ha tenido muy poco avance en comparación al trimestre anterior debido a que el personal se ha ido incorporando hasta en un 30% y previo a la contratación de personal se realizan pruebas para la detección de COVID-19 encontrándose resultados positivos de hasta un 20% lo cual ha disminuido el

trabajo de construcción.

El proyecto de equipamiento social el cual incluye, Reparación de Cancha Polideportiva, Colonia Nueva Galilea, Construcción de Centro Comunal, Colonia Nueva Galilea, Ampliación de Jardín de Niños; Colonia Nueva España, Ampliación Escuela David Corea Sánchez, Colonia Australia, Construcción Centro Comunal, Colonia Australia y Construcción Centro Comunal, Colonia 25 de enero, inició el día 23 de noviembre de 2019. Al mes de septiembre de 2020 se tiene un avance físico promedio del 65% y un avance financiero del 42.5% en relación al monto contratado que es de L 10, 967,584.51. En comparación al avance físico del trimestre anterior el proyecto no ha tenido un avance notorio, debido al paro de labores establecidas por la emergencia nacional ante el COVID-19.

- El Programa de Deportes y Valores. En el programa participan 1,337 niños y jóvenes en 16 secciones deportivas, sin embargo, debido a la pandemia del COVID-19 se ha comenzado a realizar clases virtuales para el entrenamiento en deportes y a estas sólo tienen acceso quienes en sus viviendas cuentan con un servicio de internet; en este sentido se ha creado un canal en YouTube, para el aprovechamiento de clases.

En el Componente de Capacitaciones en valores y emprendimiento, En este producto se provee la capacitación en valores y emprendimiento, que iniciarán en el mes de octubre del año 2020 (estimando la apertura económica ante la pandemia del covid-19); la meta a alcanzar inicialmente programada era 2,000 asistencias a capacitación, sin embargo, ante la emergencia se ha reprogramado este producto a una asistencia de 750 personas; ya que hasta el día 14 de septiembre de 2020 de acuerdo a la reapertura inteligente para la reactivación económica; en este sentido, hasta esta fecha se iniciaron los procesos de compra de insumos para brindar capacitaciones los cuales se restringieron mediante la Circular No. DGIP-003-2020.

Cabe mencionar que como respuesta para detener la propagación de la Pandemia del COVID-19 en el país se determinó la redistribución o reasignación de recursos de crédito externo disminuido fondos por un monto de US\$ 5.0 millones del monto total asignado al Programa de acuerdo al convenio de crédito firmado entre el Gobierno de Honduras y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de acuerdo al PCM-046-2020.

A continuación, véase la ejecución histórica del Programa al tercer trimestre 2020:

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto*/	Inicio-Fin	
			Devengado	% Ejec.
<b>Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB)</b>	BID/4518/BL-HO	458,703,700	2018-2023	
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Devengado</b>	<b>% Ejec.</b>
III Trimestre 2020	134,871,251	129,871,251	16,599,724	13
Acumulado 2020	134,871,251	129,871,251	35,824,526	28
Acumulado Vida del Proyecto*/	458,703,700	458,703,700	118,512,749	26

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Ver Detalle de Ejecución Física en Anexo No. 5

Entre otros proyectos ejecutados por la SEDECOAS/FHIS están:

### **Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (USAID/ICS)**

El propósito del Programa es incrementar la resiliencia de las comunidades y los individuos a la violencia y al crimen a través de mejoras en la infraestructura pública de pequeña escala. Esto incluye el mejoramiento en las estructuras comunitarias que mitiguen el crimen eliminando o disminuyendo el riesgo de oportunidad, creando espacios comunitarios más seguros, aumento en los servicios de calidad que protejan contra la violencia, mejoramiento en la participación de los sistemas de seguridad y rendimiento de justicia nacional y municipal, mejoramiento en la participación ciudadana con los sectores de justicia y seguridad.

Monto del Convenio es de \$14,637,541.74, de los cuales, fondos de donación de USAID: \$11,710,033.39; fondos de contraparte de Gobierno de Honduras: \$2,927,508.35 (efectivo: \$2,127,508.35 y especies: \$800,000.00), al 30 de septiembre cuenta con un presupuesto vigente de L 145,322,291 y una ejecución del L 46,273,981 que representa el 32%, para la rehabilitación de 6 centros escolares y 2 Unidades Departamentales de Prevención y Seguridad Comunitaria de la Policía Nacional, entre otros proyectos.

Por el estado de emergencia emitido mediante decreto, se suspendió la ejecución de proyectos, a la fecha se han priorizado proyectos de Infraestructura y Equipamiento de establecimientos de salud con el objetivo de hacer frente a los desafíos en esta etapa de emergencia que atraviesa el país, según PCM-077-2020.

### **Proyecto de Infraestructura Rural (PIR-BCIE)**

Proyecto que consiste en Mejorar el acceso cualitativo y sustancialmente de los servicios de infraestructura (carreteras, agua, saneamiento y energía eléctrica) para la población pobre de zonas rurales en el territorio nacional, desarrollando las capacidades y condiciones adecuadas de prestación de servicios de infraestructura rural y planificación a nivel local. Los fondos destinados para la ejecución de este Programa son de US\$ 15,000,000.

Se solicitó a lo interno del SEDECOAS/FHIS una modificación de aprovechamiento de espacio presupuestario, disminuyendo así el espacio del Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB) y creando espacio para PIR, con el fin de mantener el equilibrio presupuestario a nivel institucional, por la cantidad de L 5,000,000 correspondiente al presupuesto vigente y una ejecución de L 4,184,495 lo que representa el 84%.

Proyecto en proceso de cierre financiero y administrativo, en el marco del cierre definitivo del Proyecto de Infraestructura Rural (PIR) y con la previa autorización del BCIE, se efectuó traslado de fondos de las cuentas PIR a cuenta del FHIS No.11-401-014437-0 según memorándum PIR 256/2020 (F01 424 y F01 468) y memorándum 247/2020, por un total de L 3,149,714.48, como reserva para el último pago de estimaciones de obras cuya finalización va más allá de la fecha de cierre del Proyecto del 30 de septiembre de 2020.

Para el presente año se finalizaron las siguientes obras:

1. Construcción de Sistema Integral de Microcaptación Pluvial y Saneamiento Básico Comunidad El Coyolar
2. Construcción de Sistema de Micro captación Pluvial y Saneamiento, Comunidades de Guasquin, La Puebla, El Triunfo y San Matías
3. Construcción de Sistema de Micro captación Pluvial y Saneamiento, Comunidad de El Derrumbado

### **Programa de Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes (CONVIVIR)**

El programa abarca la construcción, el mejoramiento y el equipamiento de infraestructura social para jóvenes y espacios públicos, financiamiento y/o cofinanciamiento del trabajo con jóvenes y la capacitación de jóvenes, la capacitación de personal de las instituciones involucradas, las municipalidades seleccionadas, las comunidades de barrio y servicios de consultoría.

La ejecución de los proyectos es a través de Municipios Mancomunidades y Comunidades que interactúan en función a la ejecución de los proyectos, bajo la modalidad de Proyectos Ejecutados por la Comunidad (PEC) para lo cual son debidamente asesorados y capacitados.

Los fondos destinados para la ejecución de este Programa en su Fase I son €10,000,000.00. El tipo de financiamiento es un contrato de Préstamo.

El Programa cuenta con un presupuesto vigente para el 2020 de L 22,475,156 y el ejecutado de L 6,660,962 al cierre del tercer trimestre alcanza a un 31% de ejecución. Entre las razones más importantes para este porcentaje (%) de ejecución, se debe a que todo lo programado para el tercer trimestre no se ejecutó, debido a la situación actual de la Pandemia del COVID-19, por lo que los procesos y proyectos se suspendieron por emergencia sanitaria del COVID-19 y se reanudaron las actividades hasta el mes de julio, por lo tanto, se tuvo atraso por más de cuatro meses.

Actualmente se tiene una cartera de 37 proyectos de infraestructura aprobados para ejecutar con el monto del convenio. De dichos proyectos ya se terminaron 27 obras, 9 proyectos en ejecución, 1 proyecto adjudicado listos para dar inicio y 2 proyectos en proceso de resolución de contrato debido a la falta de voluntad política del municipio y factibilidad social de las obras. Dichos proyectos se encuentran ubicados en La Lima, Cortes.

### **4.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN**

- La SEFIN aprueba modificación de disminución de asignaciones correspondientes a los Proyectos denominados Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios en el marco del Convenio de Préstamo BID 4518/BL-HO y Programa de Convivencia y Espacios Seguros para los Jóvenes en Honduras Convenio de Préstamo BMZ Nr.2016 65348 KFW-CONVIVIR por un monto de L 12,724,701.00, según lo estipulado mediante Nota Técnica No.19 en la cual se solicita traslado de espacio presupuestario entre Instituciones de la Administración Central Fuente 21; dicho espacio es necesario para iniciar la Ejecución del Programa para la

Respuesta Inmediata de Salud Pública para contener y controlar el coronavirus (COVID-19) y mitigar su efecto en la prestación de servicios en Honduras.

- En atención al Oficio No.SE-SEDECOAS-151-FHIS/2020 de fecha 02 de Julio de 2020 la SEDECOAS/FHIS solicita a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas autorizar por un monto de L 1,104,407.00 mediante modificación presupuestaria, la cual se realiza con el propósito de readecuar asignaciones presupuestarias de la contraparte nacional correspondientes al Proyecto de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (FHIS-ICS) en el marco de la Carta de Ejecución No.522-0501-4, a fin de priorizar los renglones que van a ser ejecutados en lo que resta del Ejercicio Fiscal, debido que la ejecución del proyecto ha sufrido retrasos por el estado de Emergencia Sanitaria y Humanitaria COVID-19, la misma es autorizada el 20 de septiembre de 2020.
- En atención al Oficio No.SE-SEDECOAS-FHIS-224/2020 de fecha 07 de septiembre del presente año, mediante el cual la SEDECOAS/FHIS solicita a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas autorizar por un monto de L 8,704,331.00 modificación presupuestaria la cual se efectúa con el propósito de reprogramar actividades para la implementación del Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y su Gestión Local (PROMINE) debido a la suspensión de las actividades de campo producto de la crisis provocada por la Pandemia del Covid-19, la misma es autorizada el 22 de septiembre de 2020.

### **Conclusiones**

- La ejecución presupuestaria del tercer trimestre de 2020 experimentó una ejecución acumulada del 26%, relativo a L 126,858,806 con respecto al presupuesto vigente, pese a la reactivación económica la ejecución de las obras correspondiente al tercer trimestre fue inferior en 11 puntos porcentuales con relación a la ejecución del segundo trimestre de 2020.
- Para este trimestre se ha realizado modificaciones presupuestarias entre proyectos de la misma institución con el fin de ir cubriendo las metas establecidas por el ajuste de la programación de acuerdo a los planes operativos ajustados de cada uno de los proyectos, así como la reapertura inteligente y reactivación económica propuesto por el Gobierno de la República.

### **Recomendaciones**

- Coordinar gestiones para acelerar la ejecución física y financiera de los proyectos, tomar acciones correctivas, ceder espacio presupuestario a otros proyectos en vista de lo reprogramado con el objetivo de alcanzar las metas establecidas en los Planes Operativos Anuales institucionales.
- Se recomienda acelerar la ejecución de los proyectos con el fin de fomentar la reactivación económica, generar empleo y sentar las bases para un mayor

crecimiento que puede beneficiar a más personas, de acuerdo a lo dispuesto en la Circular No. 004-2020 de la Secretaría de Finanzas.

# SECRETARÍA DE FINANZAS

ANEXO No. 04  
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS  
Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública  
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE 2020  
Cifras en Lempiras

No.	Gabinete / Institución / Proyecto	Nro Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Devengado Anual				Devengado III Trimestre				
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./ Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./ Vig.)	
6	0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social			35,042,089	469,117,482	504,159,571	35,042,089	456,392,781	491,434,870	6,481,674	120,377,132	126,858,806	26%	562,268	30,309,250	30,871,519	6%	
1	008 - PROGRAMA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SU GESTION LOCAL	2014 67 414 (KFW) / FHIS - SE	10/07/2012 - 31/07/2023	2,824,000	9,995,100	12,819,100	4,420,299	30,772,754	35,193,053	-	-	-	0%	-	-	-	0%	
		BMZ 2016 68 763	10/07/2012 - 31/07/2023	-	-	-	-	1,082,000	6,790,100	7,872,100	-	-	-	0%	-	-	-	0%
		SE/FHIS VIII No.2008-66-178	10/07/2012 - 31/07/2023	1,298,432	121,790,245	123,088,677	784,133	107,802,691	108,586,824	457,785	24,310,848	24,768,633	23%	-	1,537,000	1,537,000	1%	
<b>Total - 008 - PROGRAMA MODERNIZACION DE LA IN</b>				<b>4,122,432</b>	<b>131,785,345</b>	<b>135,907,777</b>	<b>4,122,432</b>	<b>131,785,345</b>	<b>135,907,777</b>	<b>457,785</b>	<b>24,310,848</b>	<b>24,768,633</b>	<b>18%</b>	<b>-</b>	<b>1,537,000</b>	<b>1,537,000</b>	<b>1%</b>	
2	011 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA	522-0501-4	19/10/2017 - 19/10/2021	28,651,501	116,670,790	145,322,291	28,651,501	116,670,790	145,322,291	6,023,889	40,250,093	46,273,981	32%	562,268	4,348,857	4,911,125	3%	
<b>Total - 011 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PA</b>				<b>28,651,501</b>	<b>116,670,790</b>	<b>145,322,291</b>	<b>28,651,501</b>	<b>116,670,790</b>	<b>145,322,291</b>	<b>6,023,889</b>	<b>40,250,093</b>	<b>46,273,981</b>	<b>32%</b>	<b>562,268</b>	<b>4,348,857</b>	<b>4,911,125</b>	<b>3%</b>	
3	012 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS	ATN/OC-17135-HO	01/10/2018 - 01/10/2023		4,889,760	4,889,760		4,889,760	4,889,760		123,800	123,800	3%		123,800	123,800	3%	
		BID/4518/BL-HO	01/10/2018 - 01/10/2023		129,981,491	129,981,491		113,058,790	113,058,790		35,700,726	35,700,726	32%		16,475,924	16,475,924	15%	
<b>Total - 012 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJOF</b>				<b>134,871,251</b>	<b>134,871,251</b>	<b>134,871,251</b>	<b>117,948,550</b>	<b>117,948,550</b>	<b>117,948,550</b>	<b>35,824,526</b>	<b>35,824,526</b>	<b>30%</b>	<b>16,599,724</b>	<b>16,599,724</b>	<b>16,599,724</b>	<b>14%</b>		
4	014 - PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS	BMZ Nr. 2016 65348	06/12/2013 - 31/12/2023		-	-		4,000,000	4,000,000		-	-	0%				0%	
		KFW-CONVIVIR	06/12/2013 - 31/12/2023	2,268,156	20,207,000	22,475,156	2,268,156	15,405,000	17,673,156	-	6,660,962	6,660,962	38%	-	3,079,652	3,079,652	17%	
<b>Total - 014 - PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS</b>				<b>2,268,156</b>	<b>20,207,000</b>	<b>22,475,156</b>	<b>2,268,156</b>	<b>19,405,000</b>	<b>21,673,156</b>	<b>-</b>	<b>6,660,962</b>	<b>6,660,962</b>	<b>31%</b>	<b>-</b>	<b>3,079,652</b>	<b>3,079,652</b>	<b>14%</b>	
5	047 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)	BCIE-1736	24/10/2012 - 30/09/2020		-	-		5,000,000	5,000,000		4,184,495	4,184,495	84%		2,658,603	2,658,603	53%	
<b>Total - 047 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>4,184,495</b>	<b>4,184,495</b>	<b>4,184,495</b>	<b>84%</b>	<b>2,658,603</b>	<b>2,658,603</b>	<b>2,658,603</b>	<b>53%</b>	
6	060 - ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS	522-0502 Cd E No.9	31/10/2018 - 30/04/2021		65,583,096	65,583,096		65,583,096	65,583,096		9,146,208	9,146,208	14%		2,085,414	2,085,414	3%	
		<b>Total - 060 - ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL C</b>				<b>65,583,096</b>	<b>65,583,096</b>	<b>65,583,096</b>	<b>65,583,096</b>	<b>65,583,096</b>	<b>9,146,208</b>	<b>9,146,208</b>	<b>9,146,208</b>	<b>14%</b>	<b>2,085,414</b>	<b>2,085,414</b>	<b>2,085,414</b>	<b>3%</b>

Fuente: SIAFI al 30/09/2020

# SECRETARÍA DE FINANZAS

## ANEXO No. 05

**SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS**  
 Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública  
**Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al III Trimestre, 2020**

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2020		
			Prog.	Ejecución	% Ejecución	Prog.	Ejecución	% Ejecución
<b>Fondo Hondureño de Inversión Social</b>								
<b>008 - PROGRAMA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SU GESTION LOCAL</b>	01 - Capacitación a los miembros de comité ejecutores de proyectos (CEP'S) FASE IV PROMINE	1009 - CAPACITACIÓN	4	-	0%	1	-	0%
	02 - Capacitación a los miembros de comité ejecutores de proyectos (CEP'S) FASE V PROMINE	1009 - CAPACITACIÓN	1	-	0%	-	-	0%
	05 - Capacitación a los miembros de comité ejecutores de proyectos (CEP'S) FASE IV PROMINE.	1009 - CAPACITACIÓN	1	-	0%	-	-	0%
	06 - Asistencia técnica para la ejecución del proyecto FASE IV. PROMINE	992 - ASISTENCIA TÉCNICA	1	-	0%	-	-	0%
	07 - Acciones para el fortalecimiento institucional del Fondo Hondureño de Inversión Social FASE IV. PROMINE	131 - ACTIVIDAD	1	-	0%	-	-	0%
	09 - Asistencia técnica para la ejecución del proyecto FASE V PROMINE	992 - ASISTENCIA TÉCNICA	1	-	0%	-	-	0%
	10 - Acciones para el fortalecimiento institucional del Fondo Hondureño de Inversión Social FASE V. PROMINE	131 - ACTIVIDAD	1	-	0%	-	-	0%
	12 - Informe con enfoque de genero PROMINE	149 - INFORME	4	-	0%	1	-	0%
	15 - Asistencia técnica para la ejecución del proyecto FASE IV PROMINE.	992 - ASISTENCIA TÉCNICA	1	-	0%	-	-	0%
	16 - Acciones para el fortalecimiento institucional del Fondo Hondureño de Inversión Social. FASE IV PROMINE.	131 - ACTIVIDAD	1	-	0%	-	-	0%
<b>011 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA</b>	04 - Conformación y capacitación de los miembros de Comités Ejecutores de Proyectos CEP y líderes comunitarios. ICS	1009 - CAPACITACIÓN	25	-	0%	8	-	0%
	04 - Supervisión de Proyectos. ICS	129 - SUPERVISION	25	-	0%	9	-	0%
	06 - Implementación, diseño y formulación de proyectos. ICS	291 - DISEÑO	25	-	0%	8	-	0%
	07 - Informe con enfoque de genero ICS	149 - INFORME	4	-	0%	1	-	0%
<b>012 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS</b>	02 - Diseños de Obras de Infraestructura de servicios basicos Formulados. PCCMB	291 - DISEÑO	1	-	0%	-	-	0%
	03 - Supervisión de Proyectos integrales de servicios básicos en barrios. PCCMB	129 - SUPERVISION	1	-	0%	-	-	0%
	05 - Asistencia Técnica Equipo de Promoción Social ETEC. PCCMB	992 - ASISTENCIA TÉCNICA	10	-	0%	-	-	0%
	05 - Informe con enfoque de genero PCCMB	149 - INFORME	4	-	0%	1	-	0%
	06 - Eventos de Integración y Recreativos. PCCMB	39 - EVENTO	1	-	0%	-	-	0%
	07 - Convenio para Fortalecimientos a Microemprendimientos. PCCMB	26 - CONVENIO	1	-	0%	1	-	0%
	08 - Actividades Deportivas del Programa Deportivo y Formacion de Valores. PCCMB	131 - ACTIVIDAD	16	-	0%	-	-	0%
	09 - Talleres de Emprendedurismo y Valores. PCCMB	156 - TALLER	27	-	0%	9	-	0%
	10 - Plan de capacitación de emprendimiento laboral. ATN-PCCMB	264 - PLAN	1	-	0%	-	-	0%
	11 - Taller para el fortalecimiento de Comité de Emergencia Local CODEL en barrios ATN-PCCMB	156 - TALLER	1	-	0%	-	-	0%
	12 - Taller de reforestación de la cuenca del río Guacerique ATN-PCCMB	156 - TALLER	1	-	0%	-	-	0%
	13 - Talleres de Emprendedurismo y Empleabilidad ATN-PCCMB	156 - TALLER	1	-	0%	-	-	0%
	14 - Plan estratégico de sostenibilidad y apoyo para la inserción laboral ATN-PCCMB	1083 - PLAN ESTRATÉGICO	1	-	0%	-	-	0%
	<b>014 - PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS</b>	02 - Actividades para la formación al fortalecimiento institucional y equipamiento a funcionarios coejectores del programa (INJ, Alcaldías, FHIS). CONVIVIR	131 - ACTIVIDAD	5	-	0%	-	-
04 - Talleres para la formación de habilidades sociales y laborales para jóvenes en los lugares de incidencia del programa. CONVIVIR		156 - TALLER	9	-	0%	-	-	0%
05 - Supervisión de Infraestructura de recuperación de espacios públicos. CONVIVIR		129 - SUPERVISION	10	-	0%	4	-	0%
08 - Asistencia técnica de la Consultoría Internacional para la ejecución de proyectos de infraestructura y social. CONVIVIR		992 - ASISTENCIA TÉCNICA	1	-	0%	-	-	0%

Ejecución al III Trimestre 2020  
 Secretaría de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento

## SECRETARÍA DE FINANZAS

## ANEXO No. 05

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS  
 Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública  
 Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al III Trimestre, 2020

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2020		
			Prog.	Ejecución	% Ejecución	Prog.	Ejecución	% Ejecución
<b>Fondo Hondureño de Inversión Social</b>								
014 - PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS	09 - Compra de Equipamiento para las obras de infraestructura del programa. CONVIVIR	392 - EQUIPO	11	-	0%	6	-	0%
	10 - Informe con enfoque de genero CONVIVIR	149 - INFORME	4	-	0%	1	-	0%
	13 - Asistencia técnica de la Consultoría Internacional para la ejecución de proyectos de infraestructura y social. CONVIVIR fase II	992 - ASISTENCIA TÉCNICA	1	-	0%	-	-	0%
047 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)	03 - Diseño de Proyectos de Saneamiento (Alcantarillado Sanitario y Plantas de Tratamiento). PIR	291 - DISEÑO	3	-	0%	-	-	0%
	04 - Prefactibilidad de Proyectos de Saneamiento (Alcantarillado Sanitario y Plantas de Tratamiento). PIR	149 - INFORME	2	-	0%	-	-	0%
	07 - Diseños de Proyectos de Agua Potable. PIR	291 - DISEÑO	11	-	0%	-	-	0%
	08 - Pre factibilidad de Proyectos de Agua Potable. PIR	149 - INFORME	4	-	0%	-	-	0%
	09 - Informe con enfoque de género. PIR	149 - INFORME	1	-	0%	-	-	0%
	10 - Taller de Cierre del Proyecto. PIR	156 - TALLER	1	-	0%	-	-	0%
060 - ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS	03 - Conformación y capacitación de los miembros de Comités Ejecutores de Proyectos CEP y líderes comunitarios. PIOH	1009 - CAPACITACIÓN	10	-	0%	-	-	0%
	08 - Acta de recepción de proyectos entregados PIOH	991 - ACTA	12	-	0%	-	-	0%
	11 - Supervisión de Proyectos. PIOH	129 - SUPERVISION	8	-	0%	-	-	0%
	13 - Informe con enfoque de genero PIOH	149 - INFORME	4	-	0%	1	-	0%

Fuente: SIAFI, al 30/09/2020
