



SECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

Informe de Avance Físico y Financiero

Secretaría de Educación (SEDUC)

Al III trimestre, 2020

Tegucigalpa M. D. C.

Honduras, C.A.

Octubre, 2020

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Secretaría de Educación (SEDUC) encargada de la formulación, coordinación, ejecución y evaluación de las políticas relacionadas con todos los niveles del Sistema Educativo Formal; para el III Trimestre del año 2020 cuenta con la ejecución de dos proyectos y que representa el 7% del Presupuesto Vigente en el Gabinete Social. En el cuadro No. 1 se presenta el Presupuesto de Inversión y ejecución financiera de la Secretaría de Educación para el Tercer Trimestre.

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

El Programa de Inversión vigente de la SEDUC, es financiado por recursos de Crédito Externo (95%) proveniente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Donaciones Externas (4%) por parte del Gobierno Alemán (KFW) y el restante 1% con Recursos Nacionales como contraparte nacional de la donación.

Para el Tercer trimestre del 2020, se contó con un Presupuesto Vigente de L199.2 millones ejecutando en el período L26.6 millones (13%) a nivel de devengado de los recursos asignados en relación a dicho Presupuesto. El financiamiento de la inversión para la Secretaría de Educación se refleja en el gráfico No. 1.

En forma comparativa al tercer trimestre del año 2019, donde la SEDUC contó con un Presupuesto Vigente de L187.1 millones de los cuales registró ejecución en 44% (L82.3 millones); para el año 2020, la asignación incrementó en 6.4% (L11.9 millones), sin embargo, los registros de ejecución reportados únicamente alcanzan ejecución en 13% (L26.5 millones) que corresponden a los compromisos honrados por el Proyecto Joven.


Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del
2020

Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	452,905,060
Presupuesto Vigente	199,116,282
Devengado III Trimestre	29,125
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	0.01%
Devengado Anual	26,581,347
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	13%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	26,581,347
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	13%

Fuente: SIAFI, 30/09/2020

Gráfico No. 01
Financiamiento de la Inversión por Fuente
(Cifras en Lempiras)

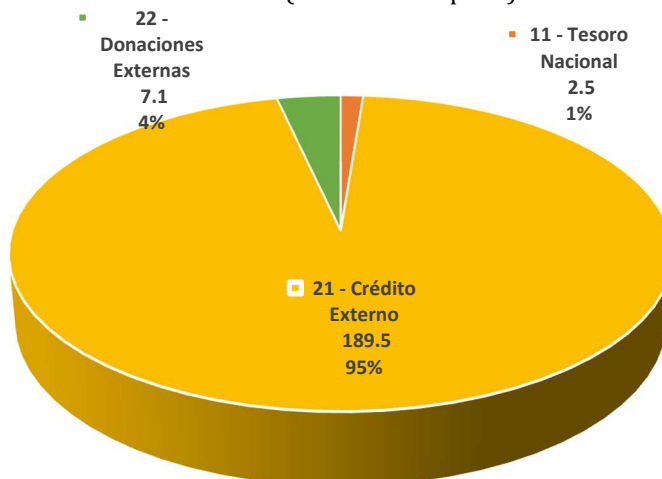

Ver Detalle de Proyectos, Ejecución Financiera en Anexo No. 4.

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

A continuación se detalla la ejecución financiera trimestral y acumulada de la vida de los proyectos adscritos a la Secretaría de Educación:

Proyecto: “Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo”, Proyecto Joven:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven	BID 4449/BL-HO	US\$	45,000,000	02/02/2018 03/10/2023
		Lempiras	1,100,169,000	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
III Trimestre 2020	443,317,192	189,528,414	-	0%
Acumulado 2020	443,317,192	189,528,414	26,541,243	14%
Acumulado Vida del Proyecto *	1,492,170,000	1,100,169,000	151,859,623	14%

Nota: Mediante Contratos Modificatorios suscritos el 30/06/2020; El Convenio BID 4449/BL-HO que financia el "Proyecto Joven", modifica su Organismo Ejecutor a la Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales (AEPAS-H), así mismo, se reorientan US\$15.0 millones para financiar Proyecto "Respuesta Inmediata de Salud para Contener y Controlar el Coronavirus (COVID-19) y mitigar su efecto en la prestación del Servicio en Honduras", a ser ejecutado por la Secretaría de Salud.

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 30/09/2020 (BCH): L24.4482 por US\$1.00

El objetivo del proyecto es contribuir al desarrollo de las habilidades para el trabajo y la vida de los jóvenes hondureños por medio de la mejora del acceso y calidad de los aprendizajes en el tercer ciclo de Educación Básica en los municipios priorizados por el proyecto; a fin de contribuir a la reducción de los factores de riesgo a la migración en adolescentes y la reinserción de los jóvenes emigrantes retornados. Su localización geográfica está en los Departamentos de: Copán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Santa Bárbara, Cortés y Francisco Morazán.

Con la Publicación del **Decreto Ejecutivo número PCM-004-2020**, se crea la Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H), encargada del diseño, ejecución, supervisión y administración de proyectos productivos, ambientales y sociales, que le sean asignados, como resultado de la formalización de contratos, convenios y acuerdos de financiamiento internacionales, convenios interinstitucionales o designación directa de los órganos de decisión por el Gobierno de la República de Honduras.

En ese sentido y por mandato en el Artículo 24 del Decreto Ejecutivo; la AEPAS-H asume en definitiva la ejecución de todos los recursos previstos en los contratos, convenios y acuerdos de financiamiento internacionales, así como los recursos de contraparte; por lo que en cumplimiento a dicho mandato, a partir del mes de Agosto los saldos disponibles para ejecución del Mejora de

Ejecución al III Trimestre 2020; Secretaría de Educación

SECRETARIA DE FINANZAS

la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven, son trasladados a la Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales (AEPAS-H).

En fecha 30 de junio de 2020; se suscriben los Convenios modificatorios con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por el cambio de Organismo Ejecutor y por la reorientación de US\$15.0 millones en apoyo a las acciones del Gobierno de Honduras para atender la Emergencia Sanitaria por el Coronavirus (COVID-19).

Este proceso de traslado ya ha hecho efectivo el cambio del Organismo ejecutor mediante la Enmienda a Nota de Prioridad No 2, así mismo se enmendó el Alineamiento Estratégico (CeA-048-2020) y se realizó la Enmienda No 3 por disminución del monto del Proyecto en US\$15.0 millones; se cuenta con la migración de las estructuras presupuestarias y asignación de disponibilidades en los Sistemas Nacionales (SNIPH – SIAFI).

**Programa: “Mejora de la Infraestructura Escolar (PROMINE/KFW, FASE IV y V)”
(Componente SEDUC):**

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
Programa: “Mejora de la Infraestructura Escolar (PROMINE/KFW, FASE IV)” (Componente SEDUC)	2014 67 414 (KFW) / FHIS - SE	Lempiras	59,554,506	03/12/2015 30/11/2020
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
III Trimestre 2020	9,587,868	9,587,868	29,125	0.3%
Acumulado 2020	9,587,868	9,587,868	40,104	0.4%
Acumulado Vida del Proyecto *	59,554,506	59,554,506	29,565,298	50%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 30/09/2020 (BCH): L24.4482 por US\$1.00

El Programa se enfoca en dotar de una infraestructura educativa adecuada, que permita una educación en condiciones pedagógicas modernas, considerando también el uso de los espacios exteriores, promoviendo una educación por valores. Además, está la incorporación del rol de las escuelas en la prevención de la violencia y los espacios escolares seguros, con locales adecuados a las diversas condiciones climáticas y culturales de Honduras.

La modalidad de ejecución de proyectos es "Proyectos Ejecutados por la Comunidad" (PEC), que se desarrolla en el marco de la descentralización y bajo una Gerencia Comunitaria. Para esto, los fondos son transferidos a las municipalidades y de su parte a las comunidades, las cuales son debidamente organizadas, capacitadas y asesoradas, para que realicen las actividades administrativas, organizativas logísticas y técnicas, asumiendo la responsabilidad en la ejecución eficiente y transparente de los recursos financieros. En general la ejecución PEC genera el empoderamiento y apropiamiento de los proyectos y los actores comunitarios y municipales (padres, docentes, autoridades educativas y municipales) que son previamente capacitados para cumplir de forma adecuada su gestión.

Ejecución al III Trimestre 2020; Secretaría de Educación

Para el año 2020, se programó en el Plan Operativo Anual (POA-Presupuesto SIAFI) las siguientes actividades:

- Diseño y formulación de 15 proyectos de Obra de Infraestructura Escolar (Fase IV).
- Supervisión de 30 Centros Educativos con proyectos de Obra de Infraestructura Educativa en los niveles Pre básica y Básica en los Departamentos: Ocotepeque, Lempira, Copán, Francisco Morazán, Valle, Choluteca, Comayagua y Gracias a Dios. (Fase IV)
- Diseño y formulación de 15 proyectos de Obra de Infraestructura Escolar (Fase V).
- Fortalecer con material didáctico, 200 Centros Educativos a nivel de Bachilleratos Técnicos Profesional (BTP). (Fase V)
- Supervisión de 528 Centros Educativos con proyectos Obra de Infraestructura Educativa en los niveles Pre básica y Básica en los Departamentos: Copán, Lempira, Intibucá, La Paz, Santa Bárbara, Ocotepeque y Gracias a Dios. (Fase V)

Al III trimestre no presenta ejecución física en ninguna de las actividades programadas en el SIAFI.

De acuerdo a lo reportado por la Unidad Ejecutora, el Programa no contó desde el inicio del año 2020 con personal técnico contratado, debido a que la Dirección de Adquisiciones de SEDUC, estuvo resolviendo temas con la ONCAE, en relación al Plan de Adquisiciones y Contrataciones Consolidado (PACC).

Durante el año 2020, a raíz de la Pandemia COVID-19 por lo que no se logró realizar las actividades planificadas en el PACC y POA 2020, que conllevan al logro y ejecución física y financiera del Programa PROMINE, debido a las restricciones por contención del gasto mediante las Circulares DGP-003-2020 con fecha 23 de marzo de 2020, y DGIP-003-2020 con fecha 31 de marzo de 2020. Lo anterior considerando que el Programa realiza su ejecución mediante las visitas a centros educativos y realizar la Formulación, Supervisión y Recepción de Proyectos de Infraestructura Educativa ejecutados por SEDECOAS, así mismo confirmar la implementación de la normativa de Planificación de la Infraestructura de Centros Educativos.

Al Tercer Trimestre, no se logró la ejecución física y financiera del Programa, ya que se espera la autorización interna en SEDUC de modificación presupuestaria con la cual se llevarán a cabo los procesos para la contratación del personal técnico, administrativo y de legal.

Proyecto: “Mejoramiento de la Calidad de la Educación Prebásica en Honduras” (IDA 6560-HN):

En fecha 16 de junio de 2020, el Gobierno de Honduras suscribe con la Asociación Internacional del Fomento (Banco Mundial) y la Alianza Mundial para la Educación (AME), Acuerdo de Financiamiento (No. 6560-HN) y Acuerdo de Subvención (No. TF0B2218-HN) respectivamente para el financiamiento por un monto total de US\$39.5 millones (alrededor de L.973.8 millones), el cual se encuentra en proceso de homologación sistemática para definir la ejecución del Proyecto, considerando los diferentes financiamientos y las regulaciones en la ejecución de los mismos.

El proyecto consistirá en la mejora de la capacidad institucional de Secretaría de Educación (SE) para la gestión de este nivel educativo; las prácticas de enseñanza de docentes y educadoras a nivel nacional; y los entornos de aprendizaje físico en centros de Prebásica que atienden educandos vulnerables de regiones seleccionadas.

Con este Proyecto, se busca mejorar la calidad de las prácticas pedagógicas de enseñanza en las aulas de Educación Prebásica aumentando la relevancia en el Diseño y Herramientas Curriculares, proporcionando materiales de aprendizaje y apoyando en la mejora de las prácticas pedagógicas en los docentes y/o educadoras. Se estarán beneficiando un total de 7,900 docentes y educadoras de Educación Prebásica con la dotación de herramientas curriculares y 178,400 educandos con materiales de aprendizaje. En cuanto al mejoramiento de los entornos de aprendizaje físico (infraestructura) en centros de Educación Prebásica que atienden a educandos, el Proyecto prevé la construcción y/o mejora de 224 aulas en los centros del nivel Prebásica, este mejoramiento incluye: obra de infraestructura, áreas recreativas y mobiliario para docentes y educandos, garantizando así que los educandos de comunidades desfavorecidas puedan acceder a entornos físicos de calidad.

Al III Trimestre, se encuentra en proceso de identificación de espacio presupuestario para su incorporación; así mismo, se iniciaron los procesos para la contratación del personal de la Unidad Ejecutora del Proyecto, procesos de adquisición relacionados al funcionamiento de la misma.

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Durante el Tercer Trimestre se realizaron las siguientes actividades y/o acciones en apoyo a los proyectos de inversión:

- Revisión y actualización de la Proyección Mensual (Julio- Agosto –Septiembre a Diciembre) de ejecución para el Año 2020.
- Apoyo en seguimiento a las solicitudes de cuotas de compromiso mensuales de Crédito Externo para su gestión ante TGR en función de las proyecciones de ejecución reportadas por las Unidades ejecutoras de Proyectos.
- Reuniones de Seguimiento y monitoreo del traslado en cumplimiento al PCM-004-2020 a la AEPAS-H, en conjunto SEFIN, SEDUC, SCGG/AEPAS-H.
- Apoyo en la gestión para la migración por cambio de ejecutor a la AEPAS-H, para el Proyecto Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven (BID 4449/BL-HO).
- Reuniones de Seguimiento y monitoreo con el equipo técnico del Banco Mundial, SEFIN y SEDUC, para definir la Homologación en Sistemas para el Proyecto Mejoramiento de la Calidad en la Educación Prebásica.
- Se continuó con las actividades de la Formulación del Programa de Inversión Pública Anual y Plurianual 2021 – 2024 para la SEDUC.
- Se actualizó la Matriz de Inversión Departamental del Programa de Inversión Pública, ejecutado al mes de Junio de 2020.
- Se elaboró el Programa de Inversión Pública para el ejercicio fiscal 2021 con un enfoque Territorial.

- Se elaboró informe de Principales Logros de cada Proyecto durante el Año 2020.

Conclusiones

- En el mes de Febrero del año 2020, se Decretó Emergencia Nacional por la Pandemia del Coronavirus (COVID19), situación que afecta la normal ejecución de las actividades y procesos programados por las Unidades Ejecutoras de Proyectos, principalmente aquellos cuyas intervenciones se realizan en campo, como es el caso de los adscritos a la SEDUC; debido a que se prioriza la ejecución de los recursos en aras de atender y salvaguardar la salud de la población hondureña.
- Al término del Tercer Trimestre, la ejecución reportada por la SEDUC registra un 13% (L26.5 millones) a nivel de devengado y compromisos, en relación al Presupuesto Vigente asignado.
- El Proyecto: “Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo” Proyecto Joven”, por mandato del Decreto Ejecutivo número PCM-004-2020, se trasladó a la agencia ejecutora AEPAS-H; adicionalmente, producto de la Emergencia Sanitaria el Gobierno de Honduras tomó la decisión de reorientar recursos de operaciones activas con el BID para poder dar atención inmediata en servicios de salud y contener la propagación del COVID-19.
- El Programa PROMINE actualmente se encuentra ejecutando la fase IV con recursos de Donación Externa (KFW) y Contraparte Nacional; en relación a la fase V se ha considerado el desfase de su inicio para el año 2021, debido a las condiciones actuales en la restricción para el uso de los recursos.

Recomendaciones

- Para la gestión 2020, las unidades ejecutoras deberán realizar una programación financiera que les permita contar con todos los recursos necesarios según las actividades y procesos que estas realicen, priorizar actividades haciendo uso eficiente de los recursos, tomando en consideración las medidas giradas por parte de la Secretaría de Finanzas
- Se recomienda registrar la programación y ejecución física en SIAFI conforme a los planes de ejecución de los Proyectos.

ANEXO No. 04
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE 2020
Cifras en Lempiras

No.	Gabinete / Institución / Proyecto	Nro Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Devengado Anual				Devengado III Trimestre				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./ Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./ Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comp./ Vig.)
2	Gabinete Social			2,497,156	450,407,904	452,905,060	2,497,156	196,619,126	199,116,282	40,104	26,541,243	26,581,347	13%	29,125	-	29,125	0%	40,104	26,541,243	26,581,347	13%
2	0050 - Secretaría de Educación			2,497,156	450,407,904	452,905,060	2,497,156	196,619,126	199,116,282	40,104	26,541,243	26,581,347	13%	29,125	-	29,125	0%	40,104	26,541,243	26,581,347	13%
1	007 - PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE IV)	2014 67 414 (KFW) / FHIS - SE	10/07/2012 - 31/07/2023	2,497,156	7,090,712	9,587,868	2,497,156	7,090,712	9,587,868	40,104	-	40,104	0%	29,125	-	29,125	0%	40,104	-	40,104	0%
	Total - 007 - PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)			2,497,156	7,090,712	9,587,868	2,497,156	7,090,712	9,587,868	40,104	-	40,104	0%	29,125	-	29,125	0%	40,104	-	40,104	0%
2	009 - Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven	4449/BL-HO	05/02/2018 - 05/02/2023		443,317,192	443,317,192		189,528,414	189,528,414		26,541,243	26,541,243	14%		-	-	0%		26,541,243	26,541,243	14%
	Total - 009 - Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven				443,317,192	443,317,192		189,528,414	189,528,414		26,541,243	26,541,243	14%		-	-	0%		26,541,243	26,541,243	14%

Fuente: SIAFI al 30/09/2020.

ANEXO No. 05
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al II Trimestre, 2020

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2020		
			Prog.	Ejecución	% Ejecución	Prog.	Ejecución	% Ejecución
Secretaría de Educación								
007 - PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE IV)	12 - Diseño y formulación de proyectos obra de infraestructura escolar.	Proyecto	13	0	0%	4	0	0%
	13 - Supervisión de proyectos obra de infraestructura educativa en los niveles Prebásica y básica en los departamentos de: Ocotepeque, Lempira y Copán en la zona de occidente. Francisco Morazán, valle, Choluteca, Comayagua y Gracias a Dios.	Centro Educativo	10	0	0%	0	0	0%
	14 - Diseño y formulación de proyectos obra de infraestructura escolar.	Proyecto	10	0	0%	0	0	0%
	15 - Bachilleratos Técnicos Profesional (BTP) fortalecidos con material didáctico.	Centro Educativo	200	0	0%	0	0	0%
	16 - Supervisión de proyectos obra de infraestructura educativa en los niveles Pre básica y básica en los departamentos de: Copán, Lempira, Intibucá, La Paz, Santa Bárbara, Ocotepeque y Gracias a Dios.	Centro Educativo	280	0	0%	15	0	0%
009 - Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven	07 - Jóvenes del Tercer Ciclo de Educación Básica atendidos por la Modalidad Educativa Alternativa (IHER)	Educando	22,742	0	0%	0	0	0%
	08 - Docentes con formación inicial y permanente en el Tercer Ciclo de la educación básica en el area de su desempeño	Docente	400	0	0%	0	0	0%
	09 - Diseño de herramienta tecnológica para fortalecer el sistema integrado de información educativa (SIIE).	Porcentaje	25	0	0%	0	0	0%
	10 - Evaluación anual financiera y de cumplimiento del proyecto joven.	Informe de Auditoría	1	0	0%	0	0	0%

Fuente: SIAFI, al 30/09/2020
