

Informe General de la Inversión Pública

IV Trimestre, Año 2019

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A.

Enero, 2020

INVERSIÓN PÚBLICA AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2019

PRESENTACION

El presente apartado, muestra el análisis del comportamiento de la ejecución física y financiera la de Inversión Pública correspondiente al cuarto Trimestre del ejercicio fiscal 2019. Este documento es elaborado por la Dirección General de Inversiones Públicas (DGIP) en el marco de sus competencias como ente técnico coordinador del Programa de Inversión Pública (PIP).

El monto aprobado por el Congreso Nacional para la Inversión Pública (PIP) para el ejercicio fiscal 2019 ascendió a **L.25,020,045,094**, que incluye la inversión bajo la modalidad de Asociación Público Privada (APP), Programa de Infraestructura Vial, por un monto de **L.6,509,000,000 y L.2,000,000,000** respectivamente, así como el Fondo Social para la Reducción de la Pobreza (Vida Mejor) que asciende a **L.4,500,000,000**. Del monto total de la Inversión Pública aprobado para la gestión 2019 los Proyectos que conforman el Programa de Inversión Pública (PIP) suman un monto de **L12,011,045,094**, y que están registrados en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIPH)

Al cuarto Trimestre la Inversión Pública cuenta con un presupuesto vigente de **L21,329,432,168.5** para la ejecución de 108 (incluidos 6 proyectos financiados a través de la modalidad Asociaciones Público – Privadas (APP) proyectos y dos fideicomisos; el fideicomiso de infraestructura vial y Fondo Social para la Reducción de la Pobreza (Vida Mejor). El presupuesto vigente refleja una disminución de **L3,690,612,925** respecto al presupuesto aprobado, esta situación obedece a la implementación del Decreto PCM 036-2019 y la disminución de los recursos de APP y Fideicomiso Vial

En relación al PIP, muestra un presupuesto vigente de **L 10,127,126,540** , lo que refleja una disminución de L1,883,918,273.8 respecto al aprobado, esto se debe a la Vigencia del Decreto PCM 036-2019 del cual se trasladaron parte de los recursos al Proyecto Hidroeléctrico Patuca III (PIEDRAS AMARILLAS) el resto de los recursos externos se trasladaron a estructuras presupuestaria sin proyectos.

El plan de Inversión Pública en su conjunto para la gestión 2019, muestra una ejecución financiera al 31 de diciembre del 2019 por la cantidad de **L18,015,593,434 (84%)** a nivel de devengado, el mismo incluye proyectos APP, el Fondo Social Reducción de la pobreza (Vida Mejor) y el programa de Infraestructura Vial.

I. ANALISIS GLOBAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA AL IV TRIMESTRE 2019

1.1 Inversión Pública Global 2019

El presupuesto global de la Inversión Pública al Cuarto Trimestre del 2019 reportó un presupuesto vigente de **L 21,329,432,168.47** que representa el **3.2% del PIB** para el 2019, el cual muestra una disminución de **L3,690,612,925** respecto al presupuesto aprobado por el Congreso Nacional.

Los Fondos Nacionales, experimentaron un incremento de **L494,031,198** debido a la incorporación de fondos de contraparte para proyectos de inversión ejecutados por el Fondo Hondureño de Inversión Social FHIS, así como fondos nacionales para proyectos ejecutados por la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP) e INVEST-H. Asimismo, se ha disminuido en fondos externos la cantidad de **L1,415,113,422**, de estos **L219,359,091** corresponden a donaciones externas fuente 22 para incorporación de programas de apoyo presupuestario que no forman parte del PIP. A su vez, se trasladaron recursos por **L1,200,190,419** de crédito externo que fueron disminuidos del Programa de Inversiones Públicas para la implementación del Plan de Rescate de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Por otra parte, se ha incrementado los fondos de donación de la Cuenta del Milenio para INVEST-H por la cantidad de **L4,436,088**. Por otra parte, dentro del presupuesto global se observa una disminución por la cantidad de **L3,920,635,367** para los Proyectos de Asociaciones Públicas Privadas. Sumando un presupuesto vigente total **L21,329,432,168**.

Cuadro N° 1
Inversión Pública: Clasificación del sector Público
Al 31 de Diciembre 2019
Cifras en Millones de Lempiras

Proyectos	Estructura Sector Publico	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado Aprobado	% de ejecución (Ejecutado/Vigente)
84	Administración Central	10,075.17	8,852.54	8,205.92	93%
16	Resto del sector	978.04	1,274.59	959.17	75%
100	Sub total PIP	11,053.21	10,127.13	9,165.09	91%
1	Fondo Social Reducción de la Pobreza (Vida Mejor)	4,500.00	4,949.90	4,949.90	100%
6	Proyectos APP**	6,509.00	4,350.90	2,426.90	56%
1	Programa Vial	2,000.00	1,901.50	1,474.10	78%
108	Total Inversión Pública	25,020.00	21,329.43	18,015.99	84%


Fuente: SIAFI

** Fuente: UCF,SEFIN

Al término del cuarto trimestre, se registra una ejecución financiera de **L18,015,593,434**, a nivel de devengado (incluye APP, Fondo Social Reducción de la pobreza (Vida Mejor) y Fondo Vial con un porcentaje de ejecución del 84% para la ejecución de 108 proyectos detallados así: 88 para la Administración Central, 12 para el Resto del Sector Publico, 6 de Asociaciones Público Privadas, 1 para el Fondo Social para la Reducción de la Pobreza Vida Mejor y 1 del Fondo Vial, y el mayor porcentaje se concentra en los proyectos ejecutados por la Administración Central en los Gabinetes: Infraestructura, Servicios y Empresas Públicas (**67%**); Económico con **13%**, el Social con **11%** alcanzando en su conjunto, el **93.3%** de la inversión Pública para la gestión; en menor proporción se observa el resto de los Gabinetes.

En el transcurso del cuarto trimestre se han incorporado 6 proyectos al PIP; tres (3) proyectos con fondos nacionales en INSEP, uno en la Alcaldía Municipal del Distrito Central, Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria y Empresa Nacional Portuaria.

Cabe resaltar que en el PIP se ejecutan programas y proyectos que contribuyen al incremento de los activos no financieros de las entidades que integran el Sector Público y los bienes y servicios de dominio público, con el fin de iniciar, ampliar, mejorar, modernizar, reponer o reconstruir la capacidad productiva de bienes y la prestación de servicios nacionales.

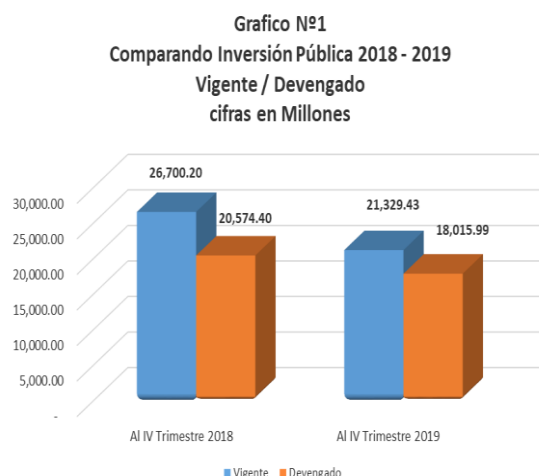

El desempeño de la ejecución de la Inversión Pública al cuarto trimestre del 2019 a nivel de devengado (incluye APP Fondo Social para la Reducción de la Pobreza Vida Mejor y el Programa de Infraestructura Vial; muestra un incremento de 6 puntos porcentuales en comparación con el año 2018 (79%), lo anterior se debe a que con el propósito de mantener la estabilidad en el control del gasto y déficit fiscal, en seguimiento al Decreto Ejecutivo No.PCM-036-2019, publicado en la Gaceta en fecha 11 de julio de 2019 del Programa de Inversión Pública al termino del cuarto trimestre, de igual forma se han efectuado traslados de

estructuras presupuestarias a fin de compensar espacio presupuestario para la incorporación de los recursos de crédito externo, con esto se pretende lograr que la ejecución de la Inversión Pública 2019 sea ejecutado conforme a la disponibilidad presupuestaria.

También se destaca la reducción de los fondos destinados a Proyectos APP en un 33.2% dada la reprogramación de actividades en los proyectos en ejecución.

Cuadro N°2
Dirección General de Inversiones Públicas
Inversión Pública Comparativa 2018 y 2019
Cifras en Millones de Lempiras

SECTOR	2018			2019		
	Vigente	Ejecutado	Porcentaje de Ejecución	Vigente	Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
1 - CARRETERAS	8,993.00	7,323.99	81%	6,558.27	5,786.75	88%
1 - DESARROLLO PRODUCTIVO	829.68	707.60	85%	1,422.28	1,331.65	94%
1 - MODERNIZACION DEL ESTADO	569.55	484.88	85%	792.65	633.51	80%
1 - SALUD	518.94	456.68	88%	589.45	458.56	78%
2 - COMUNICACIONES	141.33	31.93	23%	78.44	1.47	2%
2 - EDUCACION	273.88	239.94	88%	277.12	247.94	89%
2 - RECURSOS FORESTAL Y AMBIENTE	236.73	181.28	77%	269.06	257.62	96%
3 - ENERGIA	3,607.69	2,157.44	60%	1,083.56	914.82	84%
3 - SEGURIDAD Y DEFENSA	140.67	104.70	74%	225.14	210.15	93%
4 - DESCENTRALIZACION	5.68	5.35	94%	0.27	0.27	100%
4 - TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	4,874.94	2,774.15	57%	4,053.08	2,277.97	56%
5 - PROTECCION SOCIAL	6,278.08	6,043.11	96%	5,658.93	5,611.30	99%
5 - RIEGO	147.89	44.24	30%	320.60	283.57	88%
8 - AGUA Y SANEAMIENTO	82.17	19.14	23%	0.59	-	0%
Total General	26,700.23	20,574.44	77%	21,329.4	18,015.6	84%

Fuente SIAFI

1.2 Programas y Proyectos de Inversión Pública a Nivel Sectorial 2019

El monto Total de la Inversión Pública a nivel de presupuesto vigente ascendió a **L21,329,432,168.47** y se concentra en su mayor parte en los proyectos de las instituciones de la Administración Central, con **97%** específicamente en los proyectos ejecutados por INVEST-H, INSEP, ENEE, SAG y SEDIS, proyectos APP, Fondo Social Reducción de la Pobreza (Vida Mejor), Programa Vial y El resto del Sector Público alcanza apenas el **3%** de la Inversión.

La distribución de la Inversión Pública de acuerdo a la Clasificación del Sector Público se aprecia en el Gráfico No.2. Asimismo, refleja una ejecución de **L18,015,593,434** representando un **84%** respecto al presupuesto vigente global.

En términos financieros del Programa de Inversión Pública, se registran mayores niveles de ejecución en INVEST-H **L 3,275,899,109**, La Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), **L 1,779,068,657**, La Secretaría de Agricultura y Ganadería SAG **L910,870,561**, la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social **L630,595,030**, y La Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENEE, **L869,696,473** quienes en su conjunto suman **L7,466,129,830**; es decir que concentran el 91% del total del presupuesto ejecutado correspondiente al PIP registrados en el SNIPH, (L9,165,089,991.44); por otra parte, los proyectos APP, el Fondo Social Reducción de la Pobreza (Vida Mejor), y el Programa Vial suman **L8,850,503,442** de presupuesto ejecutado, haciendo un total de **L 18,015,593,434**.




Para el ejercicio fiscal 2019 en las normas de ejecución presupuestarias, se incluyó lineamientos específicos orientados a ordenar y agilizar la ejecución de proyectos, acorde a las restricciones fiscales, así como en la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, Control de las Exoneraciones y Medidas Anti evasión y la Ley de Responsabilidad Fiscal.

1.3 La Inversión Pública Ejecutada a Nivel de Sector

En cuanto a la ejecución a nivel sectorial, el Sector de Protección Social cuenta con el mayor porcentaje de ejecución **L5,611,3 millones, (99%)**; es el que concentra el mayor monto de ejecución presupuestaria; seguido el Sector Carretero por el orden de **L5,786,8 millones (88%)**; de participación en relación al total del presupuesto ejecutado; incluye APP (Construcción del Corredor Logístico; seguido el Sector de Transporte y Obras Publicas **L2,278, millones (56%)**; de ejecución en comparación al PIP, incluye también proyectos APP como ser la Construcción del Aeropuerto Palmerola, Centro Cívico y la Lima, entre otros, con un monto ejecutado de **L2,426,469,836.4, (12.4%)**; finalmente el sector Productivo con un **(8%) L1,331,7 millones**; y en menor proporción el resto de los sectores como ser: Comunicaciones 2%; y Salud, Educación, Modernización del Estado, Seguridad y Defensa , recursos forestales y Ambiente, con apenas 1% de ejecución en cada uno de estos sectores. Ver gráfico No.3.


Grafico Nº 3
Ejecución de La Inversión Pública por sector al IV Trimestre 2019
 cifras en Millones de Lempiras

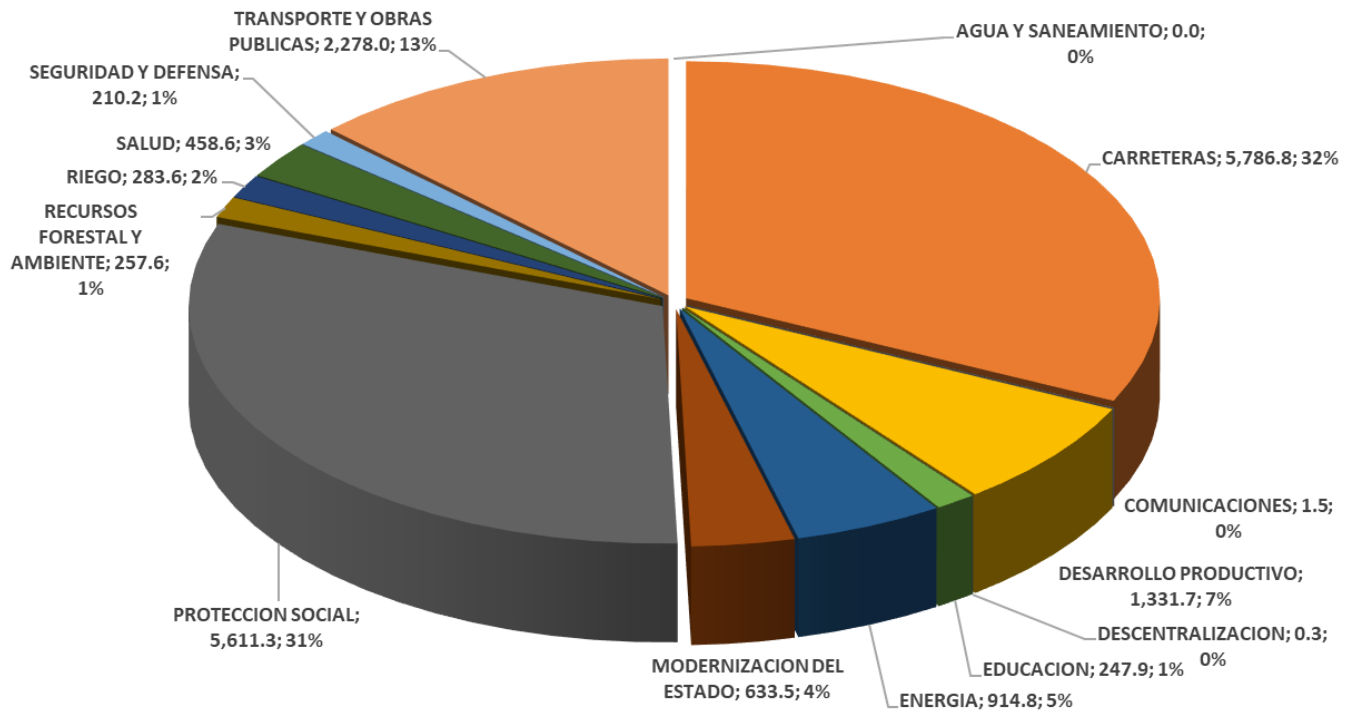

1.4 La Inversión Pública a Nivel de Gabinete Sectorial

En el marco de la reforma a la Ley General de la Administración Pública, Según Decreto Ejecutivo número PCM-009-2018 se conformaron Gabinetes Sectoriales que agrupan las instituciones de acuerdo a la naturaleza de sus atribuciones. En el grafico No.4 se muestra la Inversión Pública distribuida en diferentes Gabinetes, a nivel de presupuesto vigente el Gabinete de Infraestructura, Servicios y Empresas Públicas cuenta con el mayor porcentaje de participación **66%**, el Gabinete Social con el **13%** de participación, seguido el Gabinete Económico con un **14%** y en menor porcentaje el resto de los gabinetes. Ver gráfico No 4.

Grafico Nº 4
Distribución del Presupuesto Vigente de la Inversión Pública por Gabinete Sectorial al IV Trimestre 2019

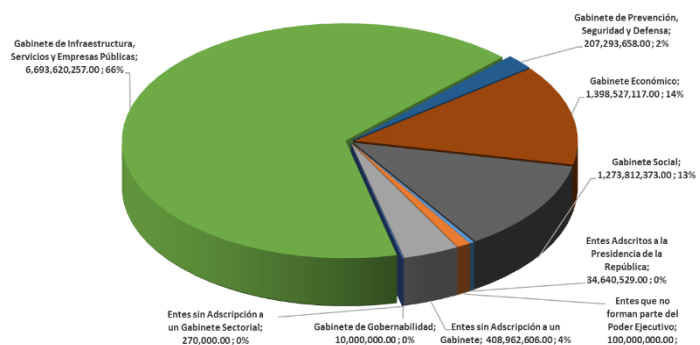

Los avances de la ejecución física respecto al PIP y a Nivel de Gabinete se muestran a continuación.

GABINETE DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y EMPRESAS PÚBLICAS

El Gabinete Sectorial Infraestructura Servicios y Empresas Públicas está conformado por 6 Instituciones Públicas y son: Fondo Hondureño de Inversión Social (**FHIS**), Cuenta del Desafío del Milenio-Honduras(**INVEST-H**), Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (**INSEP**), Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (**PRONADERS**), Empresa Nacional de Energía Eléctrica (**ENEE**) y La Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (**HONDUTEL**). Al cuarto Trimestre el Gabinete de Infraestructura Servicios y Empresas Públicas cuenta con un presupuesto vigente de **L1,827,446,174**, su ejecución presupuestaria al 31 de diciembre de la gestión 2019, asciende a **L1,719,068,657 (94%)** según SIAFI.

Al cuarto Trimestre las distintas Instituciones del Sector registraron diferentes avances de ejecución de sus proyectos entre los cuales están:

Proyectos ejecutados por La Cuenta del Desafío del Milenio-Honduras INVEST-H:

- **Corredor Pacífico-Programa de Integración Vial Regional (BID_2470/BL-HO-1 y BID_2470BL-HO-2):**

Durante el 2019 se concluyeron 41.7 km del tramo III "Choluteca-Guasaule". El lote A "Choluteca - desvío San Bernardo", con una longitud de 20.06 km, fue finalizado en el mes de julio 2019. El lote B "Desvío San Bernardo-Guasalule", con una longitud de 21.65 km, fue finalizado en el mes de noviembre. Para 2019 se reportan 11.65 km terminados, ya que 30.06 km ya habían sido reportados con carpeta terminada en el año 2018. Adicionalmente, durante el año, 13 Microempresas Asociativas de Conservación Vial (MEACV) dieron mantenimiento en una longitud de 713 km en los caminos alimentadores del Corredor Pacífico en los departamentos de Valle y Choluteca.

- **Programa de Integración Vial Regional II, (BID-3815/BL-HO):**

Presenta una longitud de 19 km rehabilitados y ampliados de 2 a 4 carriles. El lote B (Potrerillos-Pimienta) se finalizó en un 100% de su longitud total de 10.5 km; el lote A (La Barca-Potrerillos) presenta un porcentaje de 96.49% de avance físico, con 8.5 km de carpeta terminada y señalización.

- **Construcción del Corredor Logístico Villa de San Antonio-Goascorán Sección II y III, (BCIE 2116 y BCIE-2205):**

La obra física del tramo El Quebrachal – Goascorán fue finalizada durante el III trimestre 2019, misma que consistió en la ampliación de 2 a 4 carriles y pavimentación con carpeta asfáltica de 46.18 Km. Durante los meses de agosto y septiembre el contratista realizó las subsanaciones a las observaciones de la supervisión y de la firma verificadora y el 27 de septiembre la obra fue finalizada y decepcionada.

- **Construcción, Rehabilitación y Ampliación Carretera CA-5 Sur: Tega - Júcaro Galán, (BCIE-2162):**

Durante el primer semestre se realizaron los pagos finales para las firmas supervisoras de los Tramos "Júcaro Galán-La Venta del Sur" y "La Venta del Sur-Cerro de Hula"; así como

el pago final para la firma constructora del Tramo “La Venta del Sur-Cerro de Hula”, correspondiente a la estimación de cierre. Proyecto Finalizado

- **Alianza para el Corredor Seco (Carta de Ejecución No. 7 USAID y TF017904):**

Su objetivo de largo plazo es reducir la pobreza y la desnutrición de los hogares y comunidades beneficiadas en los departamentos de Intibucá, La Paz, Lempira, Copán, Santa Bárbara y Ocotepeque, Choluteca, Francisco Morazán y El Paraíso, a través del incremento de los ingresos, las oportunidades de empleo, la productividad, el acceso a mercados y a servicios financieros, así como la gobernanza en el manejo del agua y el acceso a mejores servicios de salud y nutrición materna e infantil. A diciembre de 2019 hay un total de 21,814 hogares recibiendo asistencia de ACS-USAID, tanto en producción como en salud y nutrición.

A diciembre de 2019 hay un total de 21,814 hogares recibiendo asistencia de ACS-USAID, tanto en producción como en salud y nutrición.

Del total de hogares; 7,626 (35%) tienen a mujeres como cabeza de familia. Durante el trimestre octubre-diciembre 2019 se realizaron 3,820 eventos de asistencia técnica y capacitación, en las siguientes áreas: producción, manejo de recursos naturales, postcosecha, información de mercados, habilidades de negocio, finanzas/créditos, procesamiento, entre otros.

- **Programa de Infraestructura Vial (Fideicomiso)**

En el año 2019 la INVEST-H dio mantenimiento en una longitud total de 5,459.50 km, de los cuales 2,590 km recibieron mantenimiento rutinario con atención de microempresas asociativas de conservación vial (MEACV) y 2,869.50 km mantenimiento periódico y rutinario del Programa de Acceso a Cabeceras Municipales red vial no pavimentada.

Las cifras reportadas en el presente informe, el Fideicomiso de Infraestructura Vial tuvo un presupuesto aprobado por el Congreso Nacional de L2,000.0 millones y en los registros del SIAFI reporta un presupuesto vigente de L741 millones, alcanzando una ejecución de L541.1 millones.

Sin embargo, es importante señalar que de acuerdo al Informe presentado por la INVEST-H recibió recursos para el financiamiento del fideicomiso vial de diferentes fuentes, de las cuales se resalta los fondos nacionales por L. 741.0 millones, así como fondos del Fideicomiso de FINA 2 por L.150.0 millones, totalizando un monto desembolsado en el 2019 de L. 1,474.1 millones, y una ejecución global de L2,090.3 millones que se desglosa de la siguiente manera:

**EJECUCION FINANCIERA POR PROGRAMA
INVEST-HONDURAS (DCPV)
(MILLONES DE LEMPIRAS)**

NOMBRE DEL PROGRAMA	PAGADO A TRAVES FIDEICOMISO-2019
SECTOR TURISMO	601.70
CONTINGENCIAS Y CAMINOS PRODUCTIVOS	318.41
MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE CONSERVACION VIAL	77.75
TORMENTA No.14	143.15
ACCESO A CABECERAS MUNICIPALES	891.89
ESTUDIOS Y DISEÑOS	57.45
GRAN TOTAL	2,090.34

Fuente: INVEST-H

Proyectos ejecutados por Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP):

- **Construcción y pavimentación con concreto hidráulico del tramo carretero Valladolid-la virtud-Mapulaca con una longitud aproximada de 30 km localizado en el departamento de Lempira, (FN-INSEP-23245):**

El proyecto inició su ejecución a partir del 19 de septiembre 2019 donde se le otorgó la orden de inicio al supervisor, al Cuarto trimestre el Contratista ha presentado una ejecución física acumulada del 51.05% y una ejecución financiera acumulada del 45.68% el proyecto tiene un plazo de ejecución de 25 meses.

A la fecha se han pavimentado 17 km con concreto hidráulico. Lo que denota la buena ejecución que ha tenido el contratista desde que inició el proyecto.

Es importante resaltar que el contratista deberá realizar reprogramación de las actividades del contrato, debido a que se legalizó la Modificación de Contrato No. 1, por un monto de L436,757,117.99, el cual representa un aumento de 3.74% con respecto al monto original del contrato.

- **Rehabilitación Vial del Corredor de Occidente: la Entrada - Copán Ruinas - el Florido y la Entrada - Santa Rosa de Copán, (BCIE-2156, BEI-FI No.84859, DCI-ALA/2015/369-566, TA2015034 HN LIF).**

El proyecto finalizó su etapa física. Sin embargo en cuanto a su ejecución financiera para el Lote La Entrada-Santa Rosa de Copán financiero posee un monto ejecutado acumulado de US\$ 42, 720,526.69 que representa el 88.86%. Para el Lote No.2: La Entrada-Los Ranchos un monto ejecutado acumulado de US\$ 39, 863,300.11 que representa el 91.53% y para el Lote No.3: Los Ranchos-El Florido un monto ejecutado acumulado de US\$ 42, 765,126.60 que representa el 85.47%.

La INSEP en noviembre 2019 solicitó Dictamen técnico de Ampliación de tiempo por 5 meses siendo efectivo a partir del 31 de enero del 2020, finalizando el 30 de junio de 2020. Lo anterior para realizar el desembolso del monto disponible de Tres Millones Ochocientos Mil Cuatrocientos, Cincuenta y Un Dólares con 25/100 (USD 3, 814,451.25).

- **Proyecto "Construcción y Pavimentación Carretera Catacamas-Cuevas de Talgua en el Departamento de Olancho, con una longitud aproximada de 8.93 Kilómetros, (Fondos Nacionales 0000003-13):**

Al Cuarto Trimestre el proyecto ha alcanzado un avance físico del 74% logrando la pavimentación de los 9 km los cuales se encontraban dentro del objetivo del proyecto.

Se encuentra pendiente de finalizar la actividad enchape de cunetas. Actualmente se está realizando la construcción del Puente sobre el rio Talgua específicamente ejecutando la actividad de incado de pilotes.

La Unidad Ejecutora de la INSEP realizará una solicitud de ampliación tiempo de 6 meses a SEFIN durante la gestión 2020 para poder finalizar el proyecto.

- **Reconstrucción y Pavimentación Carretera La Libertad - Las Lajas, (Fondos Nacionales 72500):**

El Proyecto fue suspendido en el mes de junio 2019. Lo anterior debido a los largos tiempo para la aprobación por parte de Coordinación General por la modificación al costo del proyecto al 25% misma que será remitida posteriormente al Congreso Nacional para su aprobación.

Es importante mencionar que mientras el proyecto estuvo en ejecución logró un avance físico 20 km pavimentados, la construcción de 2 puentes y la pavimentación 700 mts lineales en el casco urbano obteniendo un porcentaje de avance físico del 99.57%. La obra faltante para finalizar el proyecto es la pavimentación de 5 km de carretera mismos que están contemplados en la última modificación realizada al proyecto.

Proyectos ejecutados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE):

- **Programa de Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional, (BID 3103/BL-HO y GRT/SX-16864-HO):**

Los principales avances alcanzados al termino del 2019 se resaltan: Evaluación final del contrato de préstamo 3103/BL-HO, apoyo técnico y administrativo a la ejecución del contrato del préstamo proyecto apoyo a la Integración de Honduras en el MER, auditoria externa del proyecto y supervisión externa de las obras relacionadas con la Integración de Honduras al Mercado Eléctrico Regional.

- **Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral - Río Lindo, (BID 3435/BL-HO y JICA HO-P6):**

Para el ejercicio fiscal 2019 se definieron estrategias para agilizar la ejecución del proyecto, entre ellas: Mejoras a las subestaciones Eléctricas de Cañaveral y Río Lindo, plan estratégico para el fortalecimiento de la empresa de generación, Supervision de Mejoras a las Subestaciones Eléctricas de Cañaveral y Río Lindo mediante obra de Construcción y Pruebas, asesoría a la ENEE en las etapas de adquisición e implementación del proyecto bajo Normas AOD del Japón, gestión de contratación del equipo auxiliar y obras civiles para la repotenciación del Complejo Hidroeléctrico y obra para (4) sistemas de excitación estática digital y (4) transformadores de excitación para la central hidroeléctrica Francisco Morazán.

Proyecto Ejecutado por El Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (PRONADERS):

- **Proyecto De Energía Renovable Para El Desarrollo Rural Sostenible Pro-Energía Rural, (EDCF No. HND-5) Fondos de Korea Eximbank:**

Al 31 de Diciembre 2019 se han instalado un total acumulado desde su inicio (2017, 2018 y 2019) de 21,486 Sistemas Fotovoltaicos sobre los 21,486 planificados, ejecutando el 100%

de la meta física total programada del proyecto, (Instalación de 21,036 Sistemas Fotovoltaicos en viviendas, 416 Escuelas y 34 Centros de Salud), distribuidos en los departamentos de Ocotepeque, Copán, Lempira, Intibucá, Santa Bárbara y La Paz. Con respecto al componente de las Juntas de Energía se ha logrado ejecutar 580 Juntas de Energía y con respecto a la meta total de 595, (99%).

Proyecto Ejecutado por Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL):

- **El Proyecto Servicios Convergentes de Nueva Generación, (FP-HONDUTEL-22102) Fondos Propios:**

Considerando que el proyecto Servicios Convergentes de Nueva Generación ha sido diseñado como un plan integral de desarrollo de las infraestructuras de telecomunicaciones y a que su presupuesto fue disminuido durante la gestión 2019, se trasladará su ejecución para el presupuesto 2020, siempre limitado y priorizado con lo que permita el monto de inversión disponible, al IV Trimestre se han ejecutado 2 de sus metas planificadas logrando un 100% de ejecución física, en lo que respecta a su ejecución financiera fue L. 1471,733.0 (2%).

Proyecto Ejecutado por el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS):

- **Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB), (BID 4518/BL-HO):**

Proyectos Integrales de Mejoramiento de Barrios.

- Se han diseñado al 100% 4 proyectos integrales de mejoramiento de barrio que incluye: mejora, reparación y/o construcción del sistema de agua potable, alcantarillado sanitario, drenaje pluvial y sistema vial para las colonias: Nueva España, Nueva Australia, Nueva Galilea y 25 de Enero.
- Se tiene la licencia ambiental para 4 proyectos integrales y la aprobación del SANAA y ENEE del diseño de sistemas de agua potable, alcantarillado sanitario y sistema eléctrico de 4 proyectos integrales de mejoramiento de barrio.
- Se contrató la ejecución y supervisión del Proyecto de Integración Urbana, incluye: Ampliación, Mejoramiento y/o Construcción de sistemas de alcantarillado sanitario, agua potable, drenaje pluvial, mejoramiento vial y obras de mitigación de riesgos para 1071 predios en las siguientes colonias: Nueva Australia, Nueva Galilea, Nueva España y 25 de Enero.
- Se ha contratado la ejecución y supervisión de proyecto de 6 obras de equipamiento social Reparación de Cancha Polideportiva, Colonia Nueva Galilea, Construcción de Centro Comunal, Colonia Nueva Galilea, ampliación de Jardín de Niños; Colonia Nueva España, ampliación Escuela David Corea Sánchez, Colonia Australia, construcción Centro Comunal, Colonia Australia, y Construcción Centro Comunal, Colonia 25 de Enero; se iniciaron las obras a finales del mes de octubre de 2019.
- Se está ejecutando la consultoría para el diseño de 5 proyectos integrales de mejoramiento de barrio: Proyecto de Integración Urbana Incluye: Ampliación, Mejoramiento y/o Construcción de Sistemas de Alcantarillado Sanitario, Agua Potable, Drenaje Pluvial, Red de Alumbrado Público, Mejoramiento Vial, Espacios de Recreación y Obras de Mitigación de Riesgos para 3035 predios , en las siguientes colonias: Montes de los Olivos, Nueva Jerusalén No. 2, Brisas del Mogote, Altos de la Quezada, La Huerta, Villas San Miguel, Brisas del Roble y Altos del Mirador; ya se ha realizado el informe de diagnóstico de barrios y se

están realizando los diseños preliminares de los sistemas de agua potable, alcantarillado sanitario, drenaje pluvial, pavimentación, alumbrado público y equipamiento social.

Programa de Deportes y Valores:

- Se ha ejecutado el Programa de entrenamiento deportes olímpicos y Valores en las disciplinas de: Taekwondo, Tenis de Mesa, y Levantamiento de pesas, con una participación de 900 niños y jóvenes de las colonias beneficiarias.
- Se ha obtenido la asistencia de 2015 personas capacitadas en el programa de valores y emprendimiento en los siguientes temas: Organización Comunitaria, Normas Parlamentarias, Derechos humanos, derechos del niño y adolescencia, Derechos humanos, derechos de la mujer y adulto mayor, Prevención en Drogas, Higiene laboral y comunitaria, Elaboración y envasado de encurtidos, Elaboración de arroz chino, Elaboración de piñatas, Elaboración de tres leches, Confección de bisutería, Elaboración de adornos navideños, Elaboración de alimentos para navidad, Elaboración de tortillas de harina, Elaboración de empanadas de jamón y queso.
- Para la ejecución de actividades de capacitación se adjudicó la compra de un bus mediano.

Capacitaciones en empleabilidad.

- 20 mujeres se capacitan a través del programa Empleando Futuros en las siguientes especialidades:
- Operario Textil (3).
- Panadería (4).
- Auxiliar de Bodega (2).
- Diseño Gráfico (5).
- Operario de Restaurante (6).

Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (USAID/ICS 522-0501-4):

El propósito de esta actividad es incrementar la resiliencia de las comunidades y los individuos a la violencia y al crimen a través de mejoras en la infraestructura pública de pequeña escala. Esto incluye el mejoramiento en las estructuras comunitarias que mitiguen el crimen eliminando o disminuyendo el riesgo de oportunidad, creando espacios comunitarios más seguros, aumento en los servicios de calidad que protejan contra la violencia, mejoramiento en la participación de los sistemas de seguridad y rendimiento de justicia nacional y municipal, mejoramiento en la participación ciudadana con los sectores de justicia y seguridad.

Monto del Convenio es de \$14,637,541.74, de los cuales, fondos de donación de USAID: \$11,710,033.39; fondos de contraparte de Gobierno de Honduras: \$2,927,508.35 (efectivo: \$2,127,508.35 y especies: \$800,000.00).

A la fecha la ejecución acumulada al IV trimestre corresponde al 100% con relación al presupuesto vigente de L.60,781,669.00, al cierre del año 2019 se cerraron financieramente 11 proyectos y 13 proyectos continuaran su ejecución para la gestión fiscal 2020.

Programa Infraestructura Rural (BCIE), Agua y Saneamiento, (BCIE-1736):

Actualmente se encuentran en ejecución tres (3) subproyectos de construcción de sistemas de agua potable mediante Microcaptación pluvial y saneamiento, con un avance de (21%) En el sector de Caminos Rurales, se encuentran en ejecución dos (2) subproyectos: rehabilitación del tramo Calle Agua Zarca del municipio de Camasca; así como el tramo Azacualpa - Buena Vista del Municipio de Candelaria.

- **Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar PROMINE/ KFW SE-FHIS FASE III y IV, (2014 67 414 (KFW) / FHIS – SE y SE/FHIS VIII No.2008-66-178):**

A la fecha, se finalizó 4 proyectos con el cual se beneficiaron 1,933 personas (alumnos y personal administrativo) y se generaron 108 empleos, con lo cual se alcanzó ejecutar el 100% con respecto a lo planificado para el cuarto trimestre, de acuerdo a la meta física de PROMINE en su Fase III.

Con relación a la Fase IV, actualmente se encuentran 11 centros educativos en ejecución, se espera que se beneficien 1,758 personas (alumnos y personal administrativo) y se espera generen 294 empleos, se alcanzó a ejecutar el 36% del monto contratado al final del cuarto trimestre.

❖ **EL GABINETE DE DESARROLLO SOCIAL:**

Este Gabinete Sectorial Social lo conforman 17 instituciones de las cuales seis (6) instituciones: Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), Universidad Nacional de Agricultura (UNA) y la Dirección Nacional de Ciudad Mujer, ejecutan 16 programas y proyectos de inversión pública.

El Gabinete tiene un presupuesto vigente asignado de **L1,273,812,373** en el cuarto trimestre logró una ejecución de **L496,806,094**. Equivalente el 39% respecto al presupuesto vigente. La Distribución de la Inversión del Gabinete, está concentrada mayormente en la Secretaría de Desarrollo e Inversión Social (SEDIS) con un 52% seguida de la Secretaría de Salud (**30%**), Secretaría de Educación (**10%**), Universidad Nacional de Agricultura (**3%**), Dirección Nacional de Ciudad Mujer (**1%**) y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (**1%**).

Los principales rubros de inversión que forman parte del Gabinete Social, están destinadas a inversión en desarrollo humano en las poblaciones más vulnerables, mejoramiento y cobertura de los servicios de salud y la red hospitalaria del País y proyectos de infraestructura (productiva, social, básica), fincas y cultivos; electrificación, (instalación de sistemas solares), extensión de red y rehabilitación de caminos rurales, construcción (sistema de agua potable, conexiones domiciliarias, obras civiles de agua y saneamiento; estudio y diseño para proyectos de alcantarillado; educación y salud.

Al cuarto trimestre las distintas Instituciones del Sector, registran los siguientes avances físicos:

Proyectos Ejecutados por Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS):

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, la inversión de la institución se concentra en siete (7) proyectos relevantes que apoyan las Traslaciones a las Familias de Extrema pobreza. Entre estos se encuentran.

- **Programa de Apoyo a la Red de Protección Social II (BID 3371/BL-HO):**

Durante el cuarto trimestre en el **Componente I Transferencias Monetarias Condicionadas:** se utilizaron recursos de contraparte del Convenio (fondos nacionales) para realizar la entrega en los municipios del departamento de Olancho cubriendo así 2,952 hogares de los Municipios Campamento (614 hogares), Concordia (177 hogares), El Rosario (143 hogares), Esquipulas del Norte (180 hogares), Guata(411 hogares), Jano (139 hogares), La Unión (138 hogares), Mangulile (239 hogares), Manto (301 hogares), Salamá (124 hogares), San Francisco de La Paz (262 hogares), Silca (152 hogares) y Yocón (72 hogares), que representan una inversión de L7,249,755.00. En el **Componente II Fortalecimiento de la Oferta de Servicios de Tercer Ciclo de Educación Básica:** se continuó fortaleciendo la Unidad de Corresponsabilidad de la Secretaría de Educación a través de la contratación del personal que apoya y garantiza la operatividad técnica del Programa para la corresponsabilidad.

Dentro del **Componente V Centros Educativos de Educación Básica con Instalaciones,** en el período reportado se concluyó la recepción de la ampliación de obras de infraestructura de 19 CEBs; según detalle por departamento:

- 2 en Copán: (i) CEB Federico Canales, San Nicolás; (ii) CEB Francisco Morazán, San Antonio;
- 6 en La Paz (i) CEB Altagracia Amador, Santa Elena; (ii) CEB José Trinidad Reyes, Santa Elena; (iii) CEB Presentación Centeno, Santa Elena; (iv) CEB José Trinidad Cabañas, Santa Elena; (v) CEB Manuel Bonilla, Opatoro; (vi) CEB José Cecilio del Valle, Guajiquiro;
- 3 en Lempira (i) CEB Alberto Membreño, La Campa; (ii) CEB Herlinda Pineda, La Unión; (iii) CEB La Independencia, Gracias;
- 2 en Ocotepeque: (i) CEB Edgardo Paz Barnica, Sensenti; (ii) CEB Pablo Portillo Figueroa, San Francisco del Valle
- 6 en Santa Bárbara: (i) CEB Miguel Paz Barahona, Atima; (ii) CEB Luis Landa, Atima; (iii) CEB Francisco Morazán, Atima; (iv) CEB Lempira, Atima; (v) CEB República de Ecuador, Atima y (vi) CEB Manuel Bonilla, Concepción del Norte.
- Se realizó el pago contra entrega del informe de supervisión No. 6 a la firma Supervisora de los 19 CEBs.
- Se continuo con los servicios de cinco (5) ingenieros supervisores; a la firma supervisora de las 34 obras, realizado el primer pago contra entrega del informe inicial y el pago número 2 por el 19.12% de avance de obra.
- El avance financiero fue significativo en concepto de cancelación de las estimaciones No.2 de la construcción de las obras de infraestructura en 34 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (3), Copán (10), La Paz (5), Lempira (4), Santa Bárbara (9) y Ocotepeque (3) distribuidos en dieciséis (16) lotes.
- Se canceló en concepto de anticipo del 20% de los contratos de las Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en 24 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (1), Copán (5), La Paz (5), Lempira (6), Santa Bárbara

(6) y Ocotepeque (1) distribuidos en doce (12) lotes.

- **Financiamiento Adicional para el Proyecto de Protección Social (Bono 10,000), (IDA-5603):**

En abril 2019 fueron finalizados los pagos de los procesos de adquisiciones realizados en el año 2018: (i) adquisición Equipo, mobiliario de Oficina y equipo informático para fortalecimiento de la Operatividad de la SSIS, (ii) equipo de acondicionamiento, acceso, detección de fuego y aislamiento de Data Center, (iii) Licencias informáticas para virtualización de equipos año 2018, para el desarrollo de sistemas, mantenimiento de software, y replicación de bases de datos, firewall entre otros.

Asimismo, se efectuó el pago por los Servicios de Auditoria Externa Financiera y Revisión de Cumplimiento sobre Transferencias Monetarias Condicionadas para el Programa Bono Vida Mejor, correspondiente al año 2018.

En el marco del Desarrollo de la Estrategia de Desarrollo de Protección Social CENISS, se efectuó el pago por las adquisiciones realizadas y bienes recepcionados en 2018: Access Point para red inalámbrica del Centro Nacional de Información del Sector Social (CENISS), adquisición e instalación de servidores, discos, procesadores memorias y accesorios para la ampliación del almacenamiento y capacidades de plataforma de información, adquisición de 30 tabletas (gama alta tipo 1, marca Samsung), en el marco del Fortalecimiento del Registro Único de Participantes (RUP), equipo informático móvil personalizados para levantamiento piloto de la Ficha Socioeconómica única (FSU) en el uso de nuevas tecnologías, renovación de licencias de desarrollo Visual Studio Enterprise with MSDN Licencias Dvexpress para el CENISS, mobiliario de oficina para adecuación de las oficinas (60 sillas semi ejecutivas).

- **Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social con Prioridad en Occidente (3723/BL-HO):**

En el cuarto trimestre en el **Componente I Transferencias Monetarias Condicionadas:** En el período reportado, se efectuó el pago de la comisión bancaria correspondiente a la primera entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) a los participantes del PBVM, de acuerdo a liquidación de fecha 19 de septiembre del 2019. Asimismo, el traslado de fondos para el segundo pago de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) del año 2019, por un monto de L104,220,957.00.

A la fecha se cuenta con datos preliminares de la segunda entrega en los municipios de los departamentos; cubriendo con recursos de esta operación 40,636 hogares según detalle por departamento: Choluteca 1,883 hogares; Copán 6,011 hogares; El Paraíso 10,641 hogares; Intibucá 9,744 hogares; La Paz 1,762 hogares; Lempira 9,405 hogares; Ocotepeque 738 hogares y Olancho 452 hogares. Con una inversión financiera de L102,791,910.00, considerando que ya se cuenta con la liquidación correspondiente por parte de BANADESA.

El **Componente Piloto de Superación de Pobreza:** se continuó con la implementación del Piloto denominado "Emprendiendo una Vida Mejor" (EMVIDA), a través del contrato suscrito entre Fundación Capital y la SSIS, dirigido fundamentalmente aquellos hogares que por la edad de sus hijos(as) saldrán del PBVM. A finales del mes de octubre, se realizaron los actos de cierre del Proyecto de Inclusión Productiva de Emprendimiento para una Vida Mejor, graduándose 845 participantes, en los departamentos de Copán, El

Paraíso, La Paz y Lempira, lográndose el empoderamiento y participación activa de los actores involucrados generando en ellos un cambio en su plan de vida. (SSIS/PRAF) y el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), en el marco del Programa Bono Vida Mejor por un monto de L351,928.00.

Levantamiento de Ficha Socioeconómica Única: se realizó el reembolso de viáticos por gira realizadas, con el propósito de :i) trasladar al personal Técnico del CENISS para la capacitación de las Guías de Familias que participaron en el proceso de levantamiento de la FSU-RUP, en San Lorenzo , Valle, Comayagua y La Paz.

- **Fideicomiso Vida Mejor**

Al cierre de la gestión 2019 el fideicomiso Vida Mejor logró alcanzar el 100% de sus recursos (L4,949.9 millones), los principales logros físicos se mencionan a continuación:

- **Bono Vida Mejor:** 11,695 familias beneficiadas con transferencias monetarias condicionadas en dominio rural y 14252 familias del dominio urbano.
- **Merienda Escolar Formal, Apoyo a la Educación y Entrega de uniformes:** Entrega de uniformes y zapatos escolares a 2,236 niños y niñas.
- **Acceso a Vivienda y Mejoramiento en las condiciones de Vivienda:** Entrega de 3,002 letrinas en 16 departamentos; 10,726 beneficiarios con vivienda completa (incluye pisos, letrinas, techos y filtros de agua).
- **Bolsa Solidaria:** 222,057 entregas a personas en situación de pobreza extrema en todo el país.
- **Prevención de embarazos:** 29,325 alumnos capacitados en 6 departamentos de diferentes centros educativos.
- **Metodología Mejores Familias:** 293,178 mujeres capacitadas en el tema de Seguridad Alimentaria y Nutricional; Capacitación a 2,699 Guías de Familia, 18,673 familias integradas a la estrategia Criando con Amor.

Proyecto Ejecutado por la Dirección Nacional Ciudad Mujer:

Centro Ciudad Mujer Kennedy

El Centro Ciudad Mujer Kennedy se encuentra en operación y funcionando en todos sus módulos. Al 31 de diciembre del presente año, se han atendido 167,343 mujeres, de las cuales 40,937 fueron nuevos ingresos (24.4%) del total y 126,406 (75.6%) visitas subsecuentes al Centro, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida en los diferentes módulos, atendiendo en 2019 un promedio diario de 278 visitas y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 313,675 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez.

Durante el trimestre se han atendido a 15,423 mujeres de las cuales 2,241 fueron nuevos ingresos (14.5%) del total y 13,182 (85.5%) visitas subsecuentes y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 26,023; tanto las atenciones como los servicios han disminuido en 18.5% en relación al trimestre anterior, comportamiento que se debe a

que el mes de diciembre las usuarias no llegan al centro por los preparativos de las fiestas navideñas.

Durante este trimestre se realizaron las siguientes actividades con el fin de fortalecer el centro:

- ✓ Se realizaron diferentes reuniones con: consultoras BID que realizan consultorías puntuales para el fortalecimiento de los módulos de Protección a los derechos de la Mujer - MAPRODEM y el Módulo de Atención a las Adolescentes – MAA; CENISS, Comité Técnico Nacional.
- ✓ Se realizaron varios talleres en temas de: Autoestima, Proyecto de vida, empatía, relaciones interpersonales, comunicación asertiva y toma de decisiones sin problemas y conflictos, uso correcto de las redes sociales, pensamiento creativo, pensamiento crítico, manejo de tensiones/estrés, Adolescencia, anticoncepción e ITS, prevención de cáncer de mama.
- ✓ Implementación de la estrategia Cuido, Autocuido y Seguridad – CAS.

Centro Ciudad Mujer Choloma

Es el segundo Centro Ciudad Mujer en Honduras, se encuentra operando y en funcionamiento todos sus módulos. Al 31 de diciembre del presente año, se han atendido 74,083 mujeres, de las cuales 21,114 fueron nuevos ingresos (28.5%) del total y 52,969 (71.5%) visitas subsecuentes al Centro, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida en los diferentes módulos, atendiendo un promedio diario de 163 visitas y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 188,405, entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez.

Durante el trimestre se han atendido a 9,060 mujeres de las cuales 1,520 fueron nuevos ingresos (16.7%) del total y 7,540 (83.3%) visitas subsecuentes y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 19,132; tanto las atenciones como los servicios han disminuido en .9% en relación al trimestre anterior, comportamiento que se debe a que el mes de diciembre las usuarias no llegan al centro por los preparativos de las fiestas navideñas.

Durante este trimestre se realizaron las siguientes actividades con el fin de fortalecer el centro:

- ✓ Se realizaron diferentes reuniones con: consultoras BID que realizan consultorías puntuales para el fortalecimiento de los módulos de Protección a los derechos de la Mujer - MAPRODEM y el Módulo de Atención a las Adolescentes – MAA; Reunión con GLASSWING INTERNATIONAL, Foro SIDA, Inversiones para el Desarrollo de Honduras.
- ✓ Se realizaron talleres en temas de: “Campeones y Campeonas por el Cambio” de PLAN INTERNACIONAL; Curso de Chocolatería gestionado por la Gerencia con la REDMUCH (Red de Mujeres Chocolateras y Cacaoterías) para CCM-Choloma.
- ✓ Acercamientos con: Glasswing International, ACNUR, TRANYCOP, REDMUCH/SOLIDARIDAD, OPC, ALCALDIA DE CHOLOMA, OMM DE PTO. CORTES, OMM DE OMOA, COOPERADORES INDIVIDUALES.

- ✓ Implementación de la estrategia Cuido, Autocuido y Seguridad - CAS
- ✓ Actividades especiales como: Dona un Libro, Jornada de Prevención y Atención al Cáncer de mama, a la diabetes, activismo para prevención de la violencia contra la mujer.

Centro Ciudad Mujer La Ceiba:

En el mes de abril se finalizaron las obras del centro Ciudad Mujer en la ciudad de La Ceiba, un recinto construido de aproximadamente 8 mil metros cuadrados para dar atención integral a la mujer hondureña desde su adolescencia. En el mismo, se cuida su salud sexual y reproductiva, se le protege contra la violencia y se potencia su autonomía económica. Asimismo, en el mes de septiembre se iniciaron las obras para la construcción del centro Ciudad Mujer en la ciudad de Choluteca, presentando al 31 de diciembre un avance físico de 10%, porcentaje inferior al programado debido a que las lluvias del último trimestre afectaron tanto el avance general de la obra como el suministro previsto de bloques.

Proyecto Ejecutado por Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM):

- **Construcción del Edificio Multifuncional de Talleres y Laboratorios en el Centro Regional de San Pedro Sula de la UPNFM, (FN 0000057-11 UPNFM):**

Al cierre del año 2019, el proyecto alcanzó un porcentaje de ejecución de 48% por un monto de L5.8 millones de un presupuesto vigente de L12 millones.

Los avances físicos del Proyecto son: **“Construcción del Edificio Multifuncional de Talleres y Laboratorios en el Centro Regional de San Pedro Sula de la UPNFM”:**

- Apertura de ofertas de Licitación Pública Nacional N° 001-2019 en la cual presentaron ofertas seis empresas de un total de 15 que habían retirado bases de licitación, en el Salón de la UPNFM.
- Publicación del Concurso Privado N° CPR 001-2019 para la supervisión del proyecto.
- Adjudicación a la Empresa Constructora DICONSET por el Consejo Superior Universitario.
- Adjudicación de la Supervisión del proyecto a la Empresa INDES S. de R.L. por el Consejo Superior Universitario.
- Entrega en Diciembre del anticipo a la Compañía Constructora.

Los avances del Proyecto: **“Construcción del Edificio Multifuncional de Deporte y Cultura en el Centro Universitario Regional de Nacaome”:**

- Adjudicación a la Empresa Constructora CELAQUE por el Consejo Superior Universitario.
- Orden de inicio de la obra.
- Entrega de anticipo a la Compañía Constructora.

- Contratación de la Supervisión del proyecto a la Ingeniera Wendy Patricia Reyes Posadas.
- Actividades de excavación y Concreto de limpieza.
- Cimientos: incluye zapatas y 190 metros lineales de viga de cimentación.
- Se avanzó en 4,315 metros cúbicos de relleno con material granular, Castillos-soleras de amarre, cumpliendo con la meta programada al IV Trimestre en un 100%.

Proyectos Ejecutados por La Secretaría de Educación (SEDUC:)

- **Proyecto: “Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo”, Proyecto Joven, (BID 4449/BL-HO):**

Al finalizar el año el proyecto contó con un presupuesto vigente de L123.5 millones, los cuales fueron ejecutados en un 99%, lográndose definir las estrategias para el Fortalecimiento de las direcciones de la Secretaria de Educación a través de lo siguiente:

- Elaboración de Estrategia de Seguimiento al Convenio con el IHER.
- Elaboración de Estrategia de Ejecución de Infraestructura Educativa.
- Contratación de Asesoría puntual en el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED)

Al contar con las estrategias de seguimiento al convenio con el IHER y la estrategia de ejecución de infraestructura educativa, permitió la elaboración de:

- Elaboración y firma de Convenios (UPNFM, IHER).
- Elaboración de carpetas Pre factibilidad.
- Elaboración de documentos de Términos de Referencia.
- Elaboración de documentos de Especificaciones técnicas de procesos de adquisiciones.

El principal logro del Proyecto Joven al cierre de la gestión 2019, ha sido a través del Convenio de prestación de servicios educativos en Modalidades Alternativas para el tercer ciclo firmados de acuerdo con los requerimientos de la SEDUC, el cual fue suscrito con el IHER. El Proyecto está beneficiando a 11,371 educandos en su zona de intervención, 171 más que la matrícula proyectada inicialmente. Para lo anterior se han contratado, según planillas presentadas por el IHER a 652 gestores educativos.

- **Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar” (PROMINE KFW Fase II):**

Durante el cuarto trimestre, el Proyecto PROMINE-SE realizó las siguientes actividades:

- Visitas realizadas por los Supervisores Departamentales para evaluación de la situación Actual mediante la Pre-factibilidad de los Centros Educativos según el siguiente detalle:

No.	Municipio /	Departamento	Centro Educativo
1	Concepción Norte	Santa Bárbara	Esc. Miguel Ángel Bueso
2	San José	La Paz	Esc. Aspiración Infantil (Equipamiento)
	La Encarnación	Ocotepeque	CEB. Eusebio Ventura

3		Quezada (Equipamiento)
---	--	------------------------

- Visita de Supervisión de proyectos en Ejecución. Visitas realizadas por los Supervisores Departamentales para Supervisión de los proyectos en ejecución de Fase IV. La supervisión fue realizada en los siguientes municipios:

Cantidad de Centros Escolares visitados	Municipio	Departamento
1	Trinidad	Copán
1	Concepción	Ocotepeque
1	La Labor	
1	San Jorge	
1	Las Vegas	Santa Bárbara
1	Magdalena	Intibucá
1	Camasca	
1	Santa Cruz	Lempira

La ejecución financiera a cierre del cuarto trimestre de 2019 fue de 91%, el cual representa L. 4.65 millones.

Proyectos Ejecutados por Secretaría de Salud (SESAL).

- **Programa Apoyo a la Red de Inclusión Social con Prioridad en Occidente, (BID 3723/BL-HO):**

Al cuarto trimestre, el proyecto contó con un presupuesto vigente de L154.3 millones, de los cuales se logró ejecutar L137.2, representativos del 89%.

El objetivo del Proyecto es apoyar al desarrollo de capital humano a través de una intervención integral de alivio a la pobreza y mejoramiento del acceso a servicios de salud, priorizando a los municipios más pobres del Occidente de Honduras. El programa ejecuta dos componentes Alivio a la Pobreza e Inversión en Capital Humano, ejecutado a través de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social y el componente Fortalecimiento de la Oferta de Servicios de Salud el cual se ejecuta mediante la Secretaría de Salud.

La unidad ejecutora presenta los siguientes avances en los sub componentes:

✓ **Sub componente Gestores descentralizados de primer nivel**

- Brindadas a través de gestores descentralizados 68,206 atenciones (atención de embarazadas, seguimiento de puérperas y recién nacido, control de anemia, control de diarrea).
- Atenciones médicas de 919 partos institucionales
- Adquisición de 10 vehículos, asignados a 9 departamentos del país.
- Adquisición de 90 motocicletas asignadas a 12 departamentos del país.

✓ **Sub Componente Gestores descentralizados de segundo nivel**

Dentro de los resultados alcanzados por este subcomponente se pueden mencionar los siguientes:

- 51,516 atenciones de Consulta Externa
- 42,666 atenciones de Emergencia
- 2,859 atenciones de Complicaciones Obstétricas
- 1,094 atenciones de Complicaciones Neonatales
- 3,970 atenciones de partos institucionales
- 817 atenciones en métodos de planificación familiar
- Firma de 4 convenios de gestión para el segundo nivel de atención

Dentro los principales servicios brindados se destacan la atención de mujer en estado de gestación, dotación de métodos de planificación familiar, atención de partos, abastecimiento y entrega de medicamentos, micronutrientes y zinc; así como la contratación de recurso humano especializado (médicos, enfermeras y odontólogo), también se garantiza la atención 24/7 en el segundo nivel de atención (hospitales).

✓ **Sub Componente de Fortalecimiento de Hospitales:**

Comprende la adquisición de equipo médico hospitalario, equipo informático y contratación de asistencias técnicas para el fortalecimiento de hospitales.

Al cuarto trimestre, se realizó la medición de indicadores en el marco al programa, realizada por Unidad de Gestión Descentralizada (UGD). Igualmente se realizó modificación presupuestaria para incrementar la compra de micronutrientes.

• **Hospital María de Especialidades Pediátricas, (ITALIA-HOS/MARIA):**

Dentro de las actividades reportadas por la unidad ejecutora tenemos las siguientes:

- Durante el cuarto trimestre se le entrego los contratos de suministros firmados por la Secretaria de Salud a la empresa ALTHEA.
- En Diciembre el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia (MAECI), remitió la imputación a los contratos de suministros vía correo electrónico.
- La empresa ALTHEA realizo los primeros envíos de equipo los cuales serán recibidos en el Hospital Maria en los meses de enero y febrero 2020.

Avances financieros

- Se realizó el pago de anticipo del contrato 20% que representa L.23.3 millones.
- Se procedió a realizar los primeros pagos correspondiente al 20% del valor de los contratos como anticipo y el 60% de avance por los envíos de equipos realizados, dicho monto corresponde a 23,328,119 lempiras.

- **Construcción y Modernización del Hospital Regional del Sur en Choluteca, (EDCF No. HND-4) Fondos de Eximbak Korea:**

En este Proyecto se han realizado reuniones con personal de Salud para conocer la problemática del mismo y encontrándose que no hay acuerdos entre las autoridades de SALUD, sobre el alcance del proyecto, por lo tanto a la fecha no se cuenta con los diseños finales para la construcción del Hospital de Choluteca.

Cabe mencionar que se emitió dictamen Técnico de Ampliación de Plazo en cumplimiento al Decreto Legislativo No.162-2018 mediante el cual el Congreso Nacional instruye a la Secretaría de Finanzas a realizar la ampliación de plazo de ejecución hasta el 26 de enero del 2022.

La SEFIN, envió oficio al organismo para desobligar los recursos del financiamiento, a lo cual se respondió que es necesario el informe de cierre por parte de SALUD, dado que durante 7 años no se pudo ejecutar y así finiquitar el proyecto.

El proyecto no presenta ejecución física y financiera al cuarto trimestre 2019.

Proyecto Ejecutado por la Universidad Nacional de Agricultura (UNA):

- **Proyecto Social de Inclusión a la Educación Superior e Impulso de la Producción Sustentable (UNA/PINPROS)” (BCIE 2069):**

Se finalizó la Construcción del edificio de vivienda para estudiantes mujeres con la contratación de la empresa Cresco S de R.L. y se entregó la responsabilidad del bien a bienes duraderos de la UNA. En cuanto al equipamiento se contrató a la empresa Cummins S de R.L., la cual tiene pendiente por ejecutar US\$27,443.35 de US\$34,279.85, (20%) avance financiero, (0%) avance físico.

❖ **GABINETE ECONÓMICO**

Este Gabinete lo conforman veintinueve (29) instituciones:

De las cuales siete (7) Instituciones están ejecutando proyectos de Inversión Pública: La Secretaría de Agricultura y Ganadería (**SAG**) con 71.6% de participación, Secretaría de Finanzas (**SEFIN**) 12.3%, Instituto Nacional de Conservación Forestal (**ICF**) con 10% y la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (**STSS**) con 4.3%, Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (**SENASA**) con un 1.1%;, y en menor porcentaje el Instituto Hondureño de Ciencia Tecnología e Innovación (**IHCIETI**) y Centro Nacional de Educación para el Trabajo (**CENET**).

Al cuarto Trimestre 2019 el Gabinete Sectorial de Desarrollo Económico cuenta con un presupuesto Vigente de **L1,403,527,117** y un presupuesto devengado que asciende a **L1,214,990,792.04 (86.6%)**. Los principales rubros de inversión que forman parte del Gabinete Sectorial de Desarrollo Económico, están enfocados en la ejecución de Planes de Negocios, implementación de Sistemas de Riego, Modernización y Conservación Forestal y Medio Ambiente y Mejoras en zonas turísticas y culturales. Al cuarto trimestre las distintas Instituciones del Sector, registran los siguientes avances físicos:

Proyecto Ejecutado por Instituto Nacional de Conservación Forestal (ICF):

- **El Proyecto Adaptación Al Cambio Climático en el Sector Forestal (CLIFOR), (DCI-AL-4/2012/023-5 I0) KFW/UE:**

El proyecto reportó al cierre de la gestión 2019 una ejecución presupuestaria de L123.3 millones, de un presupuesto vigente de L123.8; CLIFOR finalizó su ejecución física en el mes de agosto, por lo cual, durante el cuarto trimestre se realizaron las siguientes actividades:

- Cierre Presupuestario y Financiero del Proyecto.
- Regularización de gastos efectuados por GIZ Honduras.
- Auditoría final del Proyecto.

Proyectos Ejecutados por Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG):

- **El Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR), (BCIE-2101):**

El proyecto alcanzó un porcentaje de ejecución de 88% (L283.6 millones) de un presupuesto vigente de L320.6; tiene como objetivo mejorar el nivel de vida de las familias beneficiarias mediante el incremento de los ingresos, generación de empleo y seguridad alimentaria, fomentando el desarrollo agrícola bajo riego, con enfoque de inclusión social y equidad de género.

Comprende la construcción de cinco grandes sistemas de riego en los Departamentos de Yoro y Comayagua, lo que convierte al Proyecto en suma prioridad del Gobierno, ya se firmaron tres contratos de diseño y construcción de las obras a realizarse en las zonas de influencia del Proyecto.

El Proyecto al IV trimestre presenta una ejecución de 88.45%, correspondiente a pagos de estimaciones de los subproyectos en ejecución, además de procesos administrativos financieros vinculados al Proyecto.

Entre las actividades físicas reportadas por la Unidad Ejecutora tenemos las siguientes:

Es de observar que las actividades programadas del proyecto no presentan ejecución física, entre ellas; nuevas Hectáreas de tierra agrícolas con acceso a riego, en parcelas de los productores, nuevas Hectáreas de tierra agrícolas con acceso a riego intrafinca, en parcelas de productores, capacitaciones en diversificación agrícola (administración financiera, organización, canon de agua, desarrollo agroempresarial), contratos suscritos de comercialización y financiamiento, capacitaciones a Productores/as de asociaciones de regantes (organización, administración, producción, asistencia técnica y normas parlamentarias).

- **Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR), (FIDA 816-HN):**

El proyecto presenta un presupuesto vigente de L156.7 del cual se alcanzó una ejecución de L140.8 (90%). Entre las actividades físicas reportadas por la Unidad Ejecutora tenemos las siguientes:

- Durante el año 2019 se generaron 5,175 empleos temporales y autoempleos con la participación de 84 organizaciones de cinco departamentos en el corredor seco de Honduras.
- Durante el 2019 se desembolsó a 84 organizaciones la suma de L119,365,396.4 para la ejecución de planes de inversión, Planes de Desarrollo Organizacional (PDO), Plan de Negocio Sostenible (PNS) y Planes de Desarrollo Financiero (PDF).
- Se logró aprobar y desembolsar a 60 organizaciones de acuerdo al POA-SIAFI del 2019.
- Se culminó el Informe de Terminación del Programa (ITP) la cual se presentó al FIDA y la SAG como uno de los requisitos de cierre del Programa.
- Se beneficiaron a 200 familias con proyectos de micro riegos, los cuales recibieron el equipo de riego y recibieron la asistencia técnica respectiva.
- Se logró culminar 40.5 kilómetros de camino rural terciario que abarcaron los municipios de Guajiquiro, departamento de La Paz (32 KM), Plan de Jocote-Filipinas en Choluteca (3.5 KM).
- Se logró dar asistencia técnica especializada a 31 grupos organizados y que son beneficiarios de EmprendeSur en el manejo de cultivos bajo riego, en cosechas de agua, sistemas de riego, pozos, bombas y el respectivo seguimiento del Técnico de Riego del Programa.
- Con un grupo de 25 organizaciones se ha llegado a cultivar 1000 hectáreas de cultivos bajo riego, abarcando 22 municipios de los departamentos de Choluteca, Valle y Francisco Morazán.
- El Programa concluyó la evaluación de impacto, reflejando la población beneficiaria de la intervención sobre la base de 12,000 productores, insertos en las cadenas de
- Según la encuesta de evaluación de impacto, los datos de los ingresos recibidos en su mayoría se obtienen de las diferentes actividades agrícolas del ciclo productivo y en cuanto al empleo se ha encontrado que las organizaciones beneficiarias han generado un 74.7% en las oportunidades temporales que corresponde a 8,464 empleos, contra un 12.5% que equivale a 1,500 empleos en las organizaciones no beneficiarias. De igual forma la medición de los empleos permanentes para organizaciones beneficiarias es un 12.5% que equivale a 1,500 empleos permanentes y para las familias no beneficiarias en un 5.4% que representa 648 empleos.

- **Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego del Valle de Jamastran Fase 1, IN-(DL98134500295569L) Fondos de Exim Bank India:**

A la fecha se ha llevado a cabo reuniones para activar el proyecto en conjunto con la oficina presidencial OPSPT (Torre de Control) y la SEFIN DGIP y DGCP

El proyecto no presenta ejecución financiera y física al IV trimestre 2019 debido a que el EXIM Bank de la India solicitó a la empresa Ejecutora Apollo International Limited, realizar ciertas actividades puntuales (entre ellas construcción del reservorio, perforación de pozos entre otras) previo a la aprobación de la Adenda No 2 la que extiende el periodo de ejecución del proyecto, mientras el Exim Bank no apruebe la adenda no se puede solicitar desembolso.

Además, está impidiendo avanzar en el proyecto otros puntos como ser tener listo el Plantel de Almacenamiento del contratista, Permiso ambiental, Pago de la comisión de la carta de crédito (contratista) estos últimos puntos actualmente están en proceso, el punto focal es la aprobación de la adenda por el Exim Bank.

En ese sentido, se tendrá reunión en mes de enero con el contratista para solucionar las diferencias para que pueda ejecutar.

- **Proyecto de Transformación en Regadío en la Ribera del Aguán, ING-BANK-(CREDITO-S/N) Fondos de Holanda:**

- El proyecto consiste en dotar de equipo de riego a 311 productores del Municipio de Olanchito, Yoro; con este proyecto se incorporarán 3110 hectáreas bajo riego.
- La ejecución financiera asciende L.399,789,120 representativos del 99% del presupuesto vigente.

Es de observar, que este proyecto se ejecuta bajo la modalidad llave en mano, en el cual los productos serán entregados por el Contratista al final del proyecto (entregará equipos, obras físicas y los resultados esperados), por tanto a la fecha no presenta ejecución física.

- **Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur Occidental “PROLENCA”, (FIDA-I-899-HN, FIDA-II-200000125200 y GEF-FSS-05-HN):**

El proyecto reporta una ejecución presupuestaria de L90.3 millones de L120.8 millones, representativos del 77% de ejecución.

Entre las actividades físicas presentadas por la Unidad Ejecutora se resaltan:

Componente 1. Desarrollo y fortalecimiento de las organizaciones rurales:

- Elaboración e implementación de 100 Planes de Fortalecimiento Organizacional, con enfoque de equidad de género
- Se tiene en ejecución 54 Planes de Inversión en organizaciones beneficiado a 1610 beneficiarios.

Componente 2. Desarrollo Productivo y de Negocios

Principales actividades desarrolladas:

- Asistencia técnica a 59 organizaciones (incluye acompañamiento, capacitación técnica productiva y ambiental en la implementación de los Planes de inversión beneficiarias con Planes de Negocio y Planes de Desarrollo Productivo. Durante el año con el apoyo a 59 OB se generaron 1,259 empleos.

Componente 3. Infraestructura Rural

Las actividades en ejecución son las siguientes:

- Rehabilitación 42 km Caminos Terciarios de Caminos Rurales, tramo: PTRS – Pinal

San José – Pinal San Antonio – El Zarzal – Cedros de Mejicapa – Camalote/Campuca, Municipio de Gracias, Departamento de Lempira, Santa Elena El Carrizal, Quiscamote, Azacualpa, Guasore; tramo: Llano Alegre – Aguanqueterique y Santa Elena, Aguacinga, Municipio de Santa Elena, Departamento de La Paz.

- Se ha realizado 70 Km de sistema de agua y Sistema de Riego.

Proyecto Ejecutado por Secretaría de Finanzas (SEFIN):

- **Manejo Sostenible De Bosques, (BID3878/BL-HO):**

Al termino del año, el proyecto reportó un presupuesto vigente de L158.4 millones, de los cuales se alcanzó el 53% de ejecución. Es decir, L83.2 millones. Las Principales metas físicas alcanzadas son:

Componente 1. Restauración de bosques afectados por la plaga del gorgojo

- Se elaboraron 21 planes de restauración, equivalentes a 23,306.05 hectáreas, que representa una inversión del proyecto en mano de obra de L246.4 millones; de los cuales, se aprobaron 19 planes equivalentes a 22,919.54 hectáreas con una inversión del proyecto de L241.8 millones.
- En ejecución 18 planes de restauración en 13 municipios de la zona de influencia del proyecto, equivalentes a 22,542.95 hectáreas (66%) con una inversión del proyecto de mano de obra L217 millones (72%), de los cuales durante el 2019 L43.8 millones (USD 1.8 millones).

Componente 2. Fortalecimiento del sistema de sanidad forestal y mejora de la resiliencia de los bosques al Cambio Climático

1. En el marco del Convenio Marco Interinstitucional SEFIN, ICF y UNACIFOR, se han suscrito cartas de acuerdo, lográndose a la fecha lo siguiente:
 - a. Elaborado el Diagnóstico de los Bancos de Germoplasma Existentes y el Estudio de Factibilidad Técnico y Financiero para la Implementación y Sostenibilidad del Banco de Germoplasma en diferentes escenarios.
2. Finalizada la entrega del equipo de laboratorios entomológicos del ICF y las universidades (UNAH y UNACIFOR).

Componente 3. Mejora del acceso a financiamiento climático para promover el MFS

- Se ha recibido la no objeción del banco el financiamiento del Certificado de Fundamentos de Cambio Climático para 25 funcionarios públicos, inicio mes de octubre y finalizado en el mes de diciembre de 2019.

❖ GABINETE DE PREVENCIÓN, SEGURIDAD Y DEFENSA:

Para el presente año, el Gabinete de Prevención, Seguridad y Defensa cuenta con un Presupuesto vigente para el Programa de Inversión Pública (PIP) por la cantidad de **L207,293,658** para la ejecución de dos proyectos, los cuales uno (1) es ejecutado por la Secretaría de Seguridad y uno (1) por la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) representando un 97.6% de ejecución (L202,256,336.2) para el cuarto trimestre de 2019. Las principales metas ejecutadas al IV trimestre del 2019 son:

Proyecto Ejecutado por Comisión Permanente de Contingencias (COPECO):

• **Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres (PGRD) (IDA 5190-HN):**

El avance físico obtenido al cuarto trimestre del 2019 ha sido muy importante, lográndose comprometer muchas de las actividades reflejadas en el POA. En resumen, el proyecto al cuarto trimestre ha alcanzó los objetivos en las siguientes áreas:

- Construcción de 6 medidas estructurales (Obras) y su respectiva supervisión en los municipios de: i). San Pedro Sula, Cortes (2), ii) Tela, Atlántida, iii) Pimienta, Cortes iv) San Francisco de Yojoa, Cortes y v) Quimistan, Santa Bárbara. Los proyectos de ejecución de obras se encuentra adjudicados por un monto de L37.2 millones en el cuarto trimestre se oficializó las ordenes de cambio de estas y quedaron con montos modificados por L. 42.7 millones. Se finalizaron el 100% físico y financiero de 4 medidas estructurales, de los municipios de San Pedro Sula, Tela y San Francisco de Yojoa, 2 medidas estructurales quedaron al 75% físico y financiero las de Pimienta y Quimistan.
- Diseño de 5 medidas estructurales en los municipios de: i) Puerto Cortes, Cortes, ii) Choloma, Cortes, iii) San Antonio de Cortes, Cortes, iv) Santa Rita, Yoro, v) El Negrito, Yoro. El proceso se encuentra adjudicado, con un monto base aproximado de L2.5 millones, y cuya ejecución física termino en un 100%, la ejecución financiera en un 60% de esta fue trasladada al 2020 por recortes presupuestarios.
- Fortalecimiento institucional a través del diseño y construcción de parque solar de COPECO Central. El proceso se encuentra adjudicado, con un monto base de L100 mil y cuya ejecución física quedo al 100%, este diseño será la base de la construcción del parque solar valorado en L. 8.7 millones, cuya construcción se realizara en el 2020.
- Fortalecimiento institucional del diseño y construcción del edificio de CENAOS-COPECO. El proceso se encuentra adjudicado con un monto base de L1.2 millones y su avance físico quedo en 100%, La Construcción del edificio de Cenaos está valorada en L.15.0 millones y se realizara en 2020.
- Fortalecimiento institucional compra de equipo y repuestos de CENAOS-COPECO. El proceso se encuentra adjudicado y está en espera de recepción de los bienes con un monto base de L12.25 millones, estos bienes fueron entregados al 100% y están bajo la custodia y uso del CENAOS-COPECO.
- Fortalecimiento a las unidades municipales de influencia del proyecto con compra

de mobiliario y equipo y capacitaciones enfocadas. El proyecto realizó la socialización del levantamiento de necesidades y se firmaron actas de necesidades, se adjudicó median una Licitación Pública Nacional por L.6.12 millones, y en el mes de noviembre los bienes serán entregados y pagados estos bienes fueron entregados al 100% y están bajo la custodia y uso de las unidades técnicas municipales.

Proyecto Ejecutado por Secretaría de Seguridad:

- **Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios, crédito BID 4518/BL-HO:**

El programa tiene como objetivo contribuir a mejorar la convivencia ciudadana en Honduras a través de la mejora en la calidad de vida en barrios vulnerables y la reducción de la incidencia de delitos violentos; los objetivos específicos son: (i) mejorar el hábitat de barrios urbanos vulnerables, aumentando el acceso a infraestructura de servicios básicos y de prevención para disminuir delitos de robos y violaciones sexuales; (ii) reducir los niveles de incidencia de homicidios y violencia intrafamiliar (VIF) en los municipios intervenidos mejorando los servicios de prevención y atención a víctimas de la violencia; y (iii) mejorar la efectividad policial en investigación criminal, a través del incremento de la proporción de casos de homicidio con agresor identificado e informe de investigación aceptado por el Ministerio Público.

A la fecha, se ha realizado un desembolso de US\$8,900,000.00 por parte del organismo financiador, representando el 22.25% del monto total asignado a la Secretaría de Seguridad US\$40,000,000.00 y representa el 14.83% respecto al total del monto de préstamo.

A continuación, véase las actividades realizadas al cierre de la gestión 2019:

Componente: Atención y servicio al ciudadano en materia de convivencia ciudadana en municipios.

- Contrato firmado para la elaboración del Diseño para la Construcción de 2 Unidades Metropolitanas Policiales SPS y Municipal en Copán Ruinas.
- Entregados cuatro (4) Vehículos Institucionales y un (1) Microbús.
- En ejecución, contrato para la Remodelación y Acondicionamiento del Área de recepción de denuncias, Módulo VIF en la UMEP No. 2, Belén, Comayagüela y Oficinas de la Unidad de Modernización de la Policía Nacional de Honduras.
- Equipo Informático entregado para el área de recepción de denuncias, Modulo VIF en la UMEP No. 2, Belén, Comayagüela.
- Equipo Informático entregado para la Subsecretaría de Prevención.
- Materiales de oficina entregados a ocho (8) Centros Educativos para Oficinas Locales y Centrales.
- Impresión de manuales para la formación en Metodologías Miles de Manos/Familias fuertes y en Prevención Social de la Violencia para la Formación Institucional.
- Equipo Informático entregado para la Subsecretaría de Asuntos Interinstitucionales.
- En ejecución, contrato de un (1) Consultor para el Fortalecimiento de la Subsecretaría de Asuntos Interinstitucionales.

- En ejecución, contrato de un (1) Especialista en Investigación y Estudios para el fortalecimiento del Centro de Estudio y Análisis de Convivencia y Seguridad Ciudadana (CEASCI).
- En ejecución, contrato de un (1) Especialista en Convivencia y Seguridad Ciudadana.
- En ejecución, contrato de un (1) experto para la elaboración de estrategia y guiones artísticos para las producciones audiovisuales de la campaña para la Policía Nacional de Honduras.

Componente: Efectividad policial

- Currícula elaborada a cinco (5) cursos de ascensos para la escala de oficiales de Policías y Diseño Curricular de cinco (5) cursos para ascensos de Agente de Policía.
- Equipo Informático entregado al Sistema de Educación Policial (SEP).
- Equipo Informático entregado a la Academia Nacional de Policía.
- En ejecución, contrato de un (1) Especialista para asesorar a la DNEP en implementar reforma integral del Sistema Educación Policial.
- Equipo Informático entregado para la Unidad de Tutoría y Mentoría de la Policía Nacional.
- En ejecución, contrato para la adquisición de Kits de reactivos para pruebas toxicológicas para aspirantes ITP y ANAPO.
- Entrega 175,526 Test psicométricos para aspirantes a ingresar a la Policía Nacional.
- Diseño de Obras de la Academia Nacional de Policía (ANAPO). Producto final entregado, diciembre 2019.
- En ejecución, contrato para la adquisición de Suministro y Colocación de Generador Eléctrico para la ANAPO.
- Lista corta conformada para el proceso de contratación de Firma para la supervisión de obras de la ANAPO.
- Capacitación Especializada para funcionarios de laboratorio de Balística y Documentología de la DPI.
- En ejecución, contrato para la adquisición de Insumos para casos de homicidios y Equipo complementario para Laboratorio Criminalística, entregas previstas diciembre 2019 – enero 2020.
- En ejecución, contrato para el Mantenimiento del Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares (AFIS) de la DPI.
- En ejecución, Contrato para la capacitación y asistencia técnica para la Gestión de la Calidad con Normas ISO: 9001-2015; 17020-2012; 17025-2017, para Laboratorios de la DPI.

Entregados tres (3) Escáner todo en uno de impresiones dactilares y de palma para aplicaciones forenses y policiales para DPI.

1.4 Financiamiento de la Inversión

El 46%% del Gran Total es financiado por fuentes nacionales (incluye Vida Mejor, APP's y Programa de Infraestructura Vial), el 38% por fondos externos; de estos el 34% es financiado por crédito externo (fuente 21) y el 4% por donaciones (fuente 22 y 28). Principalmente con recursos provenientes del BID, BCIE, BM, Unión Europea y OFID. Ver cuadro No.2

Cuadro N° 3
Programa de Inversión Pública: Clasificación Fuente de Financiamiento al 31 de Diciembre del 2019
Cifras en Lempiras

Fuente de Financiamiento	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado Aprobado	% de Ejec. (Ejecutado/ Vigente)
Fondos Nacionales	761,744,370.00	1,255,775,568.00	967,822,999.78	77%
11 - Tesoro Nacional	635,005,194.00	1,013,413,576.00	894,250,106.63	88%
12 - Recursos Propios	126,739,176.00	242,361,992.00	73,572,893.15	30%
Fondos Externos	10,291,464,394.00	8,871,350,972.00	8,197,266,991.66	92%
21 - Crédito Externo	8,871,952,465.00	7,671,762,046.00	7,231,899,548.59	94%
22 - Donaciones Externas	1,385,973,094.00	1,161,614,003.00	927,754,322.48	80%
28 - Cuenta del Milenio	33,538,835.00	37,974,923.00	37,613,120.59	99%
Total general	11,185,327,153.00	10,127,126,540.00	9,165,089,991.44	91%
Fondo Social Reducción de la Pobreza (Vida Mejor)	4,500,000,000.00	4,949,917,174.00	4,949,917,174.00	100%
Proyectos APP**	6,509,000,000.00	4,350,880,000.00	2,426,469,836.37	56%
Programa Vial	2,000,000,000.00	1,901,508,454.47	1,474,116,432.47	78%
Sub Total	13,009,000,000.00	11,202,305,628.47	8,850,503,442.84	79%
Gran Total	25,020,045,094.00	21,329,432,168.47	18,015,593,434.28	84%

Fuente SIAFI

Al 31 de Diciembre 2019

Las instituciones que concentran el mayor porcentaje de recursos, destaca la INVEST-H, INSEP, ENEE, SAG, SEDIS orientado a la construcción de carreteras, proyectos de energía, construcción de sistemas de riego, planes de negocio, Fondo Social Reducción de la Pobreza (Vida Mejor, Microempresas Eco fogones, techos, pisos saludables, CONVIVIENDA, Microempresas Huertos familiares). En seguimiento a las Disposiciones Generales de Presupuesto Año 2019, en su Artículo 25, que literalmente expresa que; “Sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 36 de la Ley Orgánica del Presupuesto, para fines de agilizar la incorporación de los recursos externos provenientes de donaciones o préstamos previamente aprobados por el Poder Legislativo, el Formulario (FMP-05) denominado “Documento de Modificación Presupuestaria” generado por el SIAFI, hará las veces de una Resolución Interna y se adicionarán en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el presente Ejercicio Fiscal, siempre que se cuente con la contraparte nacional, cuando corresponda.

En el caso de los recursos de financiamiento externo, que requieran incorporación presupuestaria deberán contar previamente con el Dictamen Favorable de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, SEFIN.”

1.5 Factores que han incidido en la Ejecución de la Inversión Pública, para el cuarto trimestre del año 2019

Durante la ejecución de programas y proyectos, se presenta una serie de obstáculos que limitan la normal ejecución de los mismos, en términos físicos y financieros, sin cumplir el objetivo esperado, y por ende la ausencia de impacto en la población meta. Entre los problemas relevantes sobresalen:

Área	Problemas	Acciones
Técnica	La inadecuada planificación por parte de las unidades ejecutoras ocasiona reprogramación de metas, lo que implica solicitar al Organismo Financiador su No Objeción (en caso de los préstamos), ocasionando	Brindar por parte de la DGIP, asistencia técnica a las instituciones gubernamentales en la identificación, formulación y evaluación de proyectos.
	Debilidad en el ciclo de pre inversión, lo que se traduce en la modificación o reformulación de los proyectos, incrementando el costo de los mismos, teniendo que ser cubiertos por el Gobierno.	Se debe dar mayor importancia a la elaboración de los diseños y estudios de proyectos, pasando por todos los niveles de pre inversión: idea, perfil, pre factibilidad y factibilidad; y de acuerdo a la Guía metodológica de Formulación de proyectos de
Administrativa-Financiera	Falta de asignación de Cuotas por parte de la Tesorería General de la República	Identificar un mecanismo de respuesta oportuna y eficaz a las solicitudes por parte de las unidades ejecutoras a fin de agilizar los procesos en las mismas.
	Desfase de la ejecución, considerando la tardía presentación de estimaciones de avance por parte de los proveedores.	Identificar mecanismos de control para establecer tiempos de entrega en los informes de estimaciones, tratando de programar los pagos de acuerdo al tiempo que corresponde.
	El proceso de cumplimiento de condiciones previas para que declaren vigente el préstamo los organismos financiadores y el cumplimiento de condiciones previas al Segundo desembolso, es lento.	La Unidad Ejecutora responsable y la SEFIN, deben dar un seguimiento puntual para mejorar dichos procesos.
	Falta de un mecanismo para acelerar las exoneraciones de impuestos que están sujetos los proyectos de inversión	Implementar acciones con la Dirección General de Franquicias Aduaneras, para mejorar la atención a las gestiones de proyectos y otorgar una respuesta oportuna a las unidades ejecutoras.
	Personal de apoyo insuficiente en relación a la carga de trabajo en las UAP, que limita la agilidad en la firma de contratos, así como la ejecución de los proyectos.	Identificar un mecanismo de respuesta oportuna y eficaz a las solicitudes por parte de las unidades ejecutoras a fin de agilizar los procesos en las mismas.
	Falta de asignación de fondos de contraparte para convenios de crédito entre el Gobierno de Honduras y Organismos Financiadores.	Las instituciones deberán programar los recursos de contraparte para hacer frente a dicho compromiso, evitando la reorientación de los mismos.
Legal	Retrasos en la formalización de contratos de construcción y supervisión, derivados del pago de derecho de vía y paso de servidumbre en el caso de líneas de transmisión.	Establecer e implementar una adecuada estrategia legal de negociación para liberar el derecho de vía de los tramos en construcción. Aplicación de la Ley Especial para la

SECRETARÍA DE FINANZAS
INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE 2019
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Gabinete / Institución / Proyecto	Número de Convenio	Aprobado			Vigente			Devengado Aprobado Anual			
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% (Devengado / Vigente)
1	Entes Adscritos a la Presidencia de la República		-	95,297,633	95,297,633	-	34,640,529	34,640,529	-	33,067,426	33,067,426	95%
1	0037 - Servicio de Administración de Rentas		-	95,297,633	95,297,633	-	34,640,529	34,640,529	-	33,067,426	33,067,426	95%
1	001 - Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Tributaria	BID-3541/BL-HO	-	95,297,633	95,297,633	-	34,640,529	34,640,529	-	33,067,426	33,067,426	95%
1	Entes que no forman parte del Poder Ejecutivo		-	163,844,235	163,844,235	-	100,000,000	100,000,000	-	49,180,309	49,180,309	49%
1	0010 - Poder Judicial		-	163,844,235	163,844,235	-	100,000,000	100,000,000	-	49,180,309	49,180,309	49%
1	005 - PROMOVRIENDO UNA JUSTICIA RAPIDA Y ACCESIBLE EN HONDURAS (EUROJUSTICIA)	DCI-ALA/2013/023-720	-	163,844,235	163,844,235	-	100,000,000	100,000,000	-	49,180,309	49,180,309	49%
3	Entes sin Adscripción a un Gabinete		-	-	-	-	408,962,606	408,962,606	-	376,615,907	376,615,907	92%
1	0180 - Registro Nacional de las Personas		-	-	-	-	369,876,361	369,876,361	-	363,114,299	363,114,299	98%
1	001 - PROYECTO DE MODERNIZACION DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACION EN HONDURAS "Identificate"	2235-TRAMO A	-	-	-	-	369,876,361	369,876,361	-	363,114,299	363,114,299	98%
2	1801 - Alcaldía Municipal del Distrito Central		-	132,118,389	132,118,389	-	39,086,245	39,086,245	-	13,501,608	13,501,608	35%
1	001 - PROYECTO DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TEGUCIGALPA COMAYAGUELA)	BID-2465/BL-HO	-	132,118,389	132,118,389	-	35,536,245	35,536,245	-	11,087,438	11,087,438	31%
2	002 - PROGRAMA DE MITIGACION DE DESASTRES NATURALES EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL	BCIE-2062-1	-	-	-	-	3,550,000	3,550,000	-	2,414,170	2,414,170	68%
1	Entes sin Adscripción a un Gabinete Sectorial		-	270,000	270,000	-	270,000	270,000	-	269,969	269,969	100%
1	0280 - Secretaría de Coordinación General del Gobierno		-	270,000	270,000	-	270,000	270,000	-	269,969	269,969	100%
1	001 - APOYO A LA GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS A NIVEL MUNICIPAL	ATN/OC-13908-HO	-	270,000	270,000	-	270,000	270,000	-	269,969	269,969	100%
2	Gabinete de Gobernabilidad		10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	100%
2	0500 - Instituto Nacional Agrario		10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	100%
1	003 - PROGRAMA TITULACION DE TIERRAS	FN 0000021-11	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000	100%
2	004 - PRODUCCION AGROPECUARIA NACIONAL (PAN)	FN 0000028-11	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000	100%
53	Gabinete de Infraestructura, Servicios y Empresas Públicas		563,284,625	7,282,958,775	7,846,243,400	1,043,831,127	5,649,789,130	6,693,620,257	801,623,915	5,415,188,583	6,216,812,497	93%
8	0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social		21,937,070	439,234,343	461,171,413	28,127,720	304,856,976	332,984,696	26,747,458	292,879,098	319,626,555	96%
1	001 - PRODUCTIVIDAD Y OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO A TRAVÉS DE ENERGÍA RENOVABLE (PODER)	522-0470	-	35,409,703	35,409,703	-	30,909,703	30,909,703	-	30,909,703	30,909,703	100%
2	008 - PROGRAMA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SU GESTION LOCAL	2014 67 414 (KFW) / FUIS - SE / FHS VIII No. 2008-66-178	5,405,750	109,456,219	114,861,969	5,405,750	69,504,354	74,910,104	4,234,568	69,392,280	73,626,848	98%
			-	8,295,450	8,295,450	-	6,159,529	6,159,529	-	6,136,028	6,136,028	100%
	Total 008 - PROGRAMA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SU GESTION LOCAL		5,405,750	117,751,669	123,157,419	5,405,750	75,663,883	81,069,633	4,234,568	75,528,308	79,762,876	98%
3	008 - PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS	BM 5192-HN	-	-	-	-	1,533,789	1,533,789	-	1,512,403	1,512,403	99%
4	009 - PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS	KFW-CONVIVIR	-	62,796,573	62,796,573	-	33,661,644	33,661,644	-	30,786,652	30,786,652	91%
5	011 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA	522-0501-4	16,531,320	89,750,349	106,281,669	16,531,320	44,250,349	60,781,669	16,531,320	44,250,349	60,781,669	100%
6	012 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS	ATN/OC-17135-HO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		BID/4518/BL-HO	-	117,716,409	117,716,409	-	84,562,822	84,562,822	-	75,678,078	75,678,078	89%
	Total 012 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS		-	117,716,409	117,716,409	-	84,562,822	84,562,822	-	75,678,078	75,678,078	89%
7	047 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)	BCIE-1736	-	15,809,640	15,809,640	-	34,274,786	34,274,786	-	34,213,605	34,213,605	100%
8	060 - ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS	522-0502 Cd E No.9	-	-	-	6,190,650	-	6,190,650	5,981,570	-	5,981,570	97%
15	0031 - Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)		10,177,814	4,044,105,516	4,054,283,330	23,761,973	3,348,341,690	3,372,103,663	20,866,405	3,255,032,705	3,275,899,110	97%
1	004 - ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO (USAID-GAFSP)	Carta de Ejecución No. 7 USAID	-	174,042,856	174,042,856	-	240,451,823	240,451,823	-	226,750,217	226,750,217	94%
		TF017904	-	200,288,519	200,288,519	-	155,527,744	155,527,744	-	134,374,133	134,374,133	86%
	Total 004 - ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO (USAID-GAFSP)		-	374,331,375	374,331,375	-	395,979,567	395,979,567	-	361,124,350	361,124,350	91%
2	005 - PROYECTO DE ADMINISTRACION FINANCIERA PUBLICA (PROGRAMA UMBRAL)	MCC - THR13HND13001	-	22,155,228	22,155,228	-	23,479,448	23,479,448	-	23,474,444	23,474,444	100%
3	006 - PROYECTO ASOCIACIONES PUBLICO-PRIVADAS (PROGRAMA UMBRAL)	MCC - THR13HND13001	-	2,191,348	2,191,348	-	4,671,206	4,671,206	-	4,671,204	4,671,204	100%
4	007 - ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA, MONITOREO Y EVALUACIÓN (PROGRAMA UMBRAL)	MCC - THR13HND13001	-	9,192,259	9,192,259	-	9,824,269	9,824,269	-	9,467,473	9,467,473	96%
5	010 - PROGRAMA VIAL DE INTEGRACION VIAL REGIONAL II	BID-3815/BL-HO	-	485,331,941	485,331,941	3,844,078	608,399,462	612,243,540	3,722,975	592,691,774	596,414,749	97%
6	011 - CORREDOR PACÍFICO-PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL REGIONAL	BID_2470/BL-HO-1	-	547,092,510	547,092,510	-	425,403,033	425,403,033	-	401,736,507	401,736,507	94%
		BID_2470BL-HO-2	-	311,426,512	311,426,512	-	13,233,398	13,233,398	-	13,229,949	13,229,949	100%
	Total 011 - CORREDOR PACÍFICO-PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL REGIONAL		-	858,519,022	858,519,022	-	438,636,431	438,636,431	-	414,966,456	414,966,456	95%
7	012 - CENTROS DE ATENCION INTEGRAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES HONDUREÑAS (CIUDAD MUJER)	BID-3771/BL-HO	-	174,876,663	174,876,663	-	124,813,686	124,813,686	-	121,953,359	121,953,359	98%
8	013 - REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE ORIENTE, CARRETERA TEGUCIGALPA-DANLI, FASE I: TRAMO NETEAPA-DANLI	BID_2470/BL-HO-1	-	-	-	-	140,705,797	140,705,797	-	140,705,769	140,705,769	100%
		BID-3815/BL-HO	-	-	-	-	14,622,176	14,622,176	-	14,439,758	14,439,758	99%

SECRETARÍA DE FINANZAS
INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE 2019
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Gabinete / Institución / Proyecto	Número de Convenio	Aprobado			Vigente			Devengado Aprobado Anual			
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% (Devengado / Vigente)
	Total 013 - REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE ORIENTE, CARRETERA TEGUCIGALPA-DANLÍ, FASE I: TRAMO NETEPA-DANLÍ		-	-	-	-	155,327,973	155,327,973	-	155,145,527	155,145,527	100%
9	014 - PROGRAMA PILOTO DE RESILIENCIA CLIMÁTICA (PPCR)	PPCR-TFOA4893	-	19,339,856	19,339,856	-	26,604,118	26,604,118	-	19,847,033	19,847,033	75%
10	015 - CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA CA-5 SUR: TEGUCIGALPA - JICARO GALÁN	BCIE-2162	-	-	-	-	66,739,639	66,739,639	-	66,739,637	66,739,637	100%
11	016 - PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - CAMASCA	BCIE-2162	-	-	-	-	37,930,013	37,930,013	-	36,911,701	36,911,701	97%
12	019 - PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS (COMRURAL)	BM-6046-HN	-	384,772,401	384,772,401	-	324,300,866	324,300,866	-	320,626,484	320,626,484	99%
13	020 - CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR LOGÍSTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III	BCIE 2116	-	11,094,437	11,094,437	9,020,531	6,970,677	15,991,208	6,256,908	5,803,254	12,060,162	75%
		BCIE-2205	-	1,361,246,030	1,361,246,030	-	873,255,394	873,255,394	-	872,449,609	872,449,609	100%
	Total 020 - CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGÍSTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III		-	1,372,340,467	1,372,340,467	9,020,531	880,226,071	889,246,602	6,256,908	878,252,863	884,509,771	99%
14	021 - Ampliación y Mejoramiento de Carretera CA-5 Norte Segmentos I y II (Sección 2A). Tramo Las Mercedes-Empalme Villa de San Antonio	BCIE - 2098	10,177,814	341,054,956	351,232,770	10,177,814	183,672,401	193,850,215	10,177,814	181,423,862	191,601,676	99%
15	022 - PROYECTO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN, SECCION I-A Y I-B (FINANCIAMIENTO ADICIONAL)	BCIE 2177	-	-	-	-	67,736,540	67,736,540	-	67,736,539	67,736,539	100%
		FN-INVEST-H-BIP-21700	-	-	-	719,550	-	719,550	708,708	-	708,708	98%
	Total 022 - PROYECTO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN, SECCION I-A Y I-B (FINANCIAMIENTO ADICIONAL)		-	-	-	719,550	67,736,540	68,456,090	708,708	67,736,539	68,445,247	100%
21	0120 - Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos		389,597,565	1,951,321,567	2,340,919,132	734,746,442	1,092,699,732	1,827,446,174	666,479,953	1,052,588,705	1,719,068,658	94%
1	001 - MICROPROYECTOS DE OBRAS VARIAS EN LA CAPITAL (POR ADMINISTRACIÓN)	FONDOS NACIONALES	-	-	-	4,393,477	-	4,393,477	4,393,176	-	4,393,176	100%
2	001 - Rehabilitación de Carreteras a nivel de Sub Base en los Departamentos de Comayagua, El Paraíso, Olancho, Lempira, Yoro, Atlántida, Colón, Santa Bárbara, Copán, Intibucá, La Paz y Choluteca.	FN-INSEP-23511-1	-	-	-	45,840,000	-	45,840,000	41,579,210	-	41,579,210	91%
3	002 - ESTUDIO, DISEÑO Y RECONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS, CONSIDERADOS PATRIMONIO NACIONAL	FONDOS NACIONALES	-	-	-	21,105,854	-	21,105,854	21,072,699	-	21,072,699	100%
4	002 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAÍS	FONDOS NACIONALES	-	-	-	2,457,530	-	2,457,530	2,457,491	-	2,457,491	100%
5	002 - OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA EROSIÓN Y SEDIMENTOS EN EL PAÍS (POR ADMON.)	FONDOS NACIONALES FNSOP01-07	-	-	-	4,783,405	-	4,783,405	4,749,218	-	4,749,218	99%
6	005 - AMPLIACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE INTIBUCA Y LEMPIRA	FN-INSEP-23361	-	-	-	20,000,000	-	20,000,000	19,869,327	-	19,869,327	99%
7	008 - CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE RECREO EN EL PAÍS	FONDOS NACIONALES	-	-	-	8,363,817	-	8,363,817	7,729,111	-	7,729,111	92%
8	014 - Construcción y/o Rehabilitación de Obras de Drenaje en los departamentos de Lempira, Intibucá, Olancho, Ocotepeque, Francisco Morazán, Comayagua, Copan y Choluteca.	FN-INSEP-23502-2019-HN	-	-	-	6,343,501	-	6,343,501	6,343,377	-	6,343,377	100%
9	023 - Construcción de Puente Los Niños con una longitud aproximada de 260 Ml, localizado en Cantarranas, Departamento de Francisco Morazán.	FN-INSEP-22852-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	023 - CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LOS DEPARTAMENTOS FRANCISCO MORAZÁN, EL PARAÍSO, CHOLUTECA, CORTÉS, COMAYAGUA, COPÁN, ATLÁNTIDA, COLÓN, INTIBUCÁ, LEMPIRA, OCOTEPEQUE, YORO, ISLAS DE LA BAHÍA	FN-INSEP-23414	-	-	-	50,841,799	-	50,841,799	49,678,082	-	49,678,082	98%
11	024 - Construcción de Pavimentos de Concreto Hidráulico en Vías Urbanas en los Departamentos de El Paraíso, Cortes, Olancho, Copan, La Paz, Francisco Morazán, Yoro, Santa Bárbara, Intibucá, Valle, Atlántida	FN-INSEP-23496-2019-HN	-	-	-	235,832,663	-	235,832,663	234,789,236	-	234,789,236	100%
12	101 - RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA LA LIBERTAD - LAS L	FONDOS NACIONALES 72500	55,400,000	-	55,400,000	55,400,000	-	55,400,000	54,067,732	-	54,067,732	98%
13	116 - CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS-CUEVAS DE TALGUA	FONDOS NACIONALES 0000003-13	55,000,000	-	55,000,000	30,097,129	-	30,097,129	8,842,284	-	8,842,284	29%
	total 116 - CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS-CUEVAS DE TALGUA		55,000,000	-	55,000,000	30,097,129	-	30,097,129	8,842,284	-	8,842,284	29%
14	121 - REHABILITACIÓN VIAL DEL CORREDOR DE OCCIDENTE: LA ENTRADA - COPAN RUINAS - EL FLORIDO Y LA ENTRADA-SANTA ROSA DE COPAN	BCIE-2156	-	1,025,407,060	1,025,407,060	-	567,959,403	567,959,403	-	563,028,392	563,028,392	99%
		BEI-FI No. 84859	59,197,565	793,353,072	852,550,637	43,879,201	492,011,841	535,891,042	31,236,479	475,712,778	506,949,257	95%
		DCI-ALA/2015/369-566	-	74,908,352	74,908,352	-	10,908,352	10,908,352	-	5,792,729	5,792,729	53%
		TA2015034 HN LIF	-	57,653,083	57,653,083	-	21,820,136	21,820,136	-	8,054,806	8,054,806	37%
	Total 121 - REHABILITACIÓN VIAL DEL CORREDOR DE OCCIDENTE: LA ENTRADA - COPAN RUINAS - EL FLORIDO Y LA ENTRADA-SANTA ROSA DE COPAN		59,197,565	1,951,321,567	2,010,519,132	43,879,201	1,092,699,732	1,136,578,933	31,236,479	1,052,588,705	1,083,825,184	95%
15	140 - REHABILITACIÓN DEL TRAMO CARRETERO VIRREY - MACULIZO - AZACUALPA, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 10 KM, LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.	FN-INSEP-23138	-	-	-	1,042,962	-	1,042,962	1,042,962	-	1,042,962	100%
16	141 - CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO ¿SAN NICOLÁS-ATIMAL¿, ETAPA I TRAMO ¿SAN NICOLÁS-SANTA CRUZ¿, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 5 KM., LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA.	FN-INSEP-23209-1	-	-	-	7,188,594	-	7,188,594	7,188,593	-	7,188,593	100%
17	142 - REHABILITACIÓN DE BULEVAR ¿LOS POETAS¿, LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO	FN-INSEP-23192	-	-	-	1,630,141	-	1,630,141	1,630,140	-	1,630,140	100%
18	143 - CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON DOBLE TRATAMIENTO DEL TRAMO CARRETERO SANTA ANA DE YUSGUARE - EL CORPUS, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 10 KM, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA	FN-INSEP-23165	-	-	-	1,796,369	-	1,796,369	1,796,368	-	1,796,368	100%

SECRETARÍA DE FINANZAS
INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE 2019
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Gabinete / Institución / Proyecto	Número de Convenio	Aprobado			Vigente			Devengado Aprobado Anual			
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% (Devengado / Vigente)
	144 - CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DEL TRAMO CARRETERO VALLADOLID - LA VIRTUD ¿ MAPULACA, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 30 KM, LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.	FN-INSEP-23245	220,000,000	-	220,000,000	182,432,830	-	182,432,830	157,258,753	-	157,258,753	86%
	145 - DISEÑO, CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CON DOBLE TRATAMIENTO DEL TRAMO CARRETERO OROCUINA (RIO CHIQUITO) - APACILAGUA, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 3 KM, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.	FN-INSEP-23469-1	-	-	-	3,817,862	-	3,817,862	3,592,698	-	3,592,698	94%
	146 - CONSTRUCCION A CUATRO (4) CARRILES DEL BULEVAR DE COMAYAGUA, ETAPA II: ESTACION 2+500 - HACIA DESVIO DE AJUTERIQUE, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 1 KM, LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEPARTAME	FN-INSEP-23441-1	-	-	-	7,499,308	-	7,499,308	7,163,015	-	7,163,015	96%
1	0144 - Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible		14,833,000	52,004,792	66,837,792	14,833,000	259,546	15,092,546	13,957,207	259,545	14,216,752	94%
	010 - PROYECTO DE ENERGÍA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE	EDCF No. HND-5	14,833,000	52,004,792	66,837,792	14,833,000	259,546	15,092,546	13,957,207	259,545	14,216,752	94%
1	PRO-ENERGÍA RURAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	0801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica		48,300,000	796,292,557	844,592,557	133,926,335	903,631,186	1,037,557,521	55,267,944	814,428,530	869,696,474	84%
	012 - APOYO AL PLAN ESTRATÉGICO DE ACCESO UNIVERSAL A ELECTRICIDAD	ATN/OC-16427-HO-BID	-	4,296,000	4,296,000	-	2,796,000	2,796,000	-	-	-	0%
	016 - PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III (PIEDRAS AMARILLAS)	ICBC-CHINA A/ E No. 268	-	-	-	85,626,335	544,437,361	630,063,696	51,576,248	543,022,585	594,598,833	94%
	018 - PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVEVAL-RÍO LINDO	BID 3435/BL-HO	37,000,000	259,358,195	296,358,195	37,000,000	220,967,199	257,967,199	1,469,001	212,472,583	213,941,583	83%
		JICA HO-P6	-	500,000,000	500,000,000	-	14,538,434	14,538,434	-	14,538,433	14,538,433	100%
	Total 018 - PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVEVAL-RÍO LINDO		37,000,000	759,358,195	796,358,195	37,000,000	235,505,633	272,505,633	1,469,001	227,011,015	228,480,016	84%
	020 - APOYO A LA INTEGRACIÓN DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)	BID 3103/BL-HO	11,300,000	32,638,362	43,938,362	11,300,000	12,105,192	23,405,192	2,222,695	11,999,387	14,222,082	61%
		GRT/SX-16864-HO	-	-	-	-	102,515,000	102,515,000	-	30,524,812	30,524,812	30%
	Total 020 - APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)		11,300,000	32,638,362	43,938,362	11,300,000	114,620,192	125,920,192	2,222,695	42,524,199	44,746,894	36%
	021 - APOYO AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES	ATN/SX-16689-HO	-	-	-	-	3,472,000	3,472,000	-	1,583,240	1,583,240	46%
	022 - ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LUGARES AISLAOS	BID-GRT/SX-17123-HO	-	-	-	-	2,800,000	2,800,000	-	287,491	287,491	10%
1	0803 - Empresa Nacional Portuaria		-	-	-	29,996,481	-	29,996,481	16,833,217	-	16,833,217	56%
	390 - CONSTRUCCIÓN OBRAS DE FACILITACIÓN DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES	FP-23771	-	-	-	29,996,481	-	29,996,481	16,833,217	-	16,833,217	56%
1	0804 - Empresa Hondureña de Telecomunicaciones		78,439,176	-	78,439,176	78,439,176	-	78,439,176	1,471,733	-	1,471,733	2%
	001 - Proyecto Servicios Convergentes de Nueva Generación	FP-HONDUTEL-22102	78,439,176	-	78,439,176	78,439,176	-	78,439,176	1,471,733	-	1,471,733	2%
2	Gabinete de Prevención, Seguridad y Defensa		-	316,896,564	316,896,564	-	207,293,658	207,293,658	-	202,256,336	202,256,336	98%
1	0041 - Comisión Permanente de Contingencias		-	117,506,288	117,506,288	-	101,915,703	101,915,703	-	100,079,129	100,079,129	98%
	001 - PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	IDA 5190-HN	-	117,506,288	117,506,288	-	101,915,703	101,915,703	-	100,079,129	100,079,129	98%
1	0070 - Secretaría de Seguridad		-	199,390,276	199,390,276	-	105,377,955	105,377,955	-	102,177,207	102,177,207	97%
	004 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS	BID/4518/BL-HO	-	199,390,276	199,390,276	-	105,377,955	105,377,955	-	102,177,207	102,177,207	97%
17	Gabinete Económico		29,934,503	1,194,065,678	1,224,000,181	29,628,372	1,368,898,745	1,398,527,117	14,830,657	1,194,888,098	1,209,718,755	86%
2	0028 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal		9,485,136	153,559,730	163,044,866	9,485,136	131,053,040	140,538,176	8,751,477	128,942,978	137,694,454	98%
	001 - MEDIDA COMPLEMENTARIA AL PROYECTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL COMUNAL Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN RÍO PLÁTANO (MC-PROTEP)	PN 2016 70 124	2,713,069	31,055,286	33,768,355	2,713,069	14,045,770	16,758,839	2,462,408	11,935,850	14,398,259	86%
	006 - ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL (CLIFOR)	DCI-AL-4/2012/023-5 l0	6,772,067	122,504,444	129,276,511	6,772,067	117,007,270	123,779,337	6,289,068	117,007,128	123,296,196	100%
1	0051 - Centro Nacional de Educación para el Trabajo		-	-	-	-	5,390,904	5,390,904	-	1,378,768	1,378,768	26%
	001 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA LA FORMACION DE EMPRENDEDORES EMPRESARIALES INNOVADORES, UBICADO EN LOS MUNICIPIOS DE COMAYAGUA, JESUS DE OTORO Y YAMARANGUILA IXCHEL	TDR-CENET-23352-1	-	-	-	-	5,390,904	5,390,904	-	1,378,768	1,378,768	26%
5	0100 - Secretaría de Finanzas		-	187,564,596	187,564,596	-	172,532,092	172,532,092	-	95,228,572	95,228,572	55%
	027 - PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS, (COMRURAL)	BM-4465	-	720,000	720,000	-	220,000	220,000	-	-	-	0%
	051 - PROYECTO MEJORA DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE LAS FINANZAS PUBLICAS	ATN/OC-15875-HO	-	3,589,600	3,589,600	-	10,843,748	10,843,748	-	9,654,489	9,654,489	89%
	052 - MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES	BID3878/BL-HO	-	173,678,573	173,678,573	-	158,438,684	158,438,684	-	83,205,708	83,205,708	53%
	053 - APOYO A LA ESTRATEGIA DE INVERSION PUBLICA DE MEDIANO PLAZO	BID ATN/OC-15878-HO	-	1,232,000	1,232,000	-	693,112	693,112	-	493,111	493,111	71%
	054 - APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE LA ALIANZA PARA LA PROSPERIDAD DEL TRIÁNGULO NORTE (PAPTIN)	ATN/OC-15961-HO	-	8,344,423	8,344,423	-	2,336,548	2,336,548	-	1,875,263	1,875,263	80%
1	0130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social		5,449,367	54,493,667	59,943,034	5,143,236	54,493,667	59,636,903	4,554,686	43,075,391	47,630,077	80%
	001 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JÓVENES EN HONDURAS (EURO-LABOR)	DCI-ALA/2014/026-851	5,449,367	54,493,667	59,943,034	5,143,236	54,493,667	59,636,903	4,554,686	43,075,391	47,630,077	80%
6	0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería		15,000,000	794,754,740	809,754,740	15,000,000	985,240,899	1,000,240,899	1,524,495	909,346,066	910,870,561	91%
	003 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PARA LA REGION SUR (EMPRENDESUR)	FIDA 816-HN	-	111,588,401	111,588,401	-	156,599,675	156,599,675	-	138,849,093	138,849,093	89%
	005 - PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL PRO-LENCA	FIDA-I-899-HN	-	85,000,000	85,000,000	-	65,988,726	65,988,726	-	47,475,797	47,475,797	72%
		FIDA-II-200000125200	-	33,000,000	33,000,000	-	19,682,123	19,682,123	-	19,126,068	19,126,068	97%

SECRETARÍA DE FINANZAS
INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE 2019
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Gabinete / Institución / Proyecto	Número de Convenio	Aprobado			Vigente			Devengado Aprobado Anual			
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% (Devengado / Vigente)
		GEF-FSS-05-HN	-	35,097,000	35,097,000	-	30,097,000	30,097,000	-	20,388,631	20,388,631	68%
	Total 005 - PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL PRO-LENCA		-	153,097,000	153,097,000	-	115,767,849	115,767,849	-	86,990,495	86,990,495	75%
3	007 - PROYECTO DE DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO (PDABR)	BCIE-2101	15,000,000	433,679,873	448,679,873	15,000,000	305,592,549	320,592,549	1,524,495	282,042,966	283,567,461	88%
4	010 - PROYECTO DE DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO DEL VALLE DE JAMAISTRAN FASE 1	IN-DI98134500295569L	-	93,337,527	93,337,527	-	5,000	5,000	-	-	-	0%
5	011 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP), DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA (SAG) EN HONDURAS.	DN-No.200001838-FIDA-SAG	-	3,051,939	3,051,939	-	3,051,939	3,051,939	-	1,674,391	1,674,391	55%
6	012 - PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN EN REGADÍO EN LA RIBERA DEL AGUÁN	ING-BANK CREDITO-S/N	-	-	-	-	404,223,887	404,223,887	-	399,789,121	399,789,121	99%
1	0145 - Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria		-	-	-	-	15,189,460	15,189,460	-	14,271,668	14,271,668	94%
1	001 - CONSTRUCCIÓN Y REMODELACION DE LABORATORIOS VETERINARIOS REGIONALES DE SENASA EN LAS CIUDADES DE TOCOA, SAN PEDRO SULA, DANLÍ Y CHOLUTECA	Donación Taiwán 09/11/2017	-	-	-	-	15,189,460	15,189,460	-	14,271,668	14,271,668	94%
1	0515 - Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación		-	3,692,945	3,692,945	-	4,998,683	4,998,683	-	2,644,654	2,644,654	53%
1	001 - Apoyo al Fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Honduras.	ATN/OC-16177-HO	-	3,692,945	3,692,945	-	4,998,683	4,998,683	-	2,644,654	2,644,654	53%
22	Gabinete Social		158,525,242	1,238,131,509	1,396,656,751	172,316,069	1,101,496,304	1,273,812,373	141,368,428	925,800,364	1,067,168,792	84%
3	0050 - Secretaría de Educación		252,931	274,394,641	274,647,572	252,931	128,395,972	128,648,903	139,195	126,874,723	127,013,918	99%
1	007 - PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)	2014 67 414 (KFW) / PHIS - SE	-	4,015,600	4,015,600	244,858	4,876,947	5,121,805	131,122	4,460,713	4,591,835	90%
		SE/PHIS VIII No. 2008-66-178	252,931	-	252,931	8,073	-	8,073	8,073	-	8,073	100%
	Total 007 - PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)		252,931	4,015,600	4,268,531	252,931	4,876,947	5,129,878	139,195	4,460,713	4,599,908	90%
2	009 - Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven	4449/BL-HO	-	202,378,826	202,378,826	-	123,519,025	123,519,025	-	122,414,010	122,414,010	99%
3	010 - Fortalecimiento del Desarrollo Profesional Docente	USAID (No.522-0501 y 522-0502)	-	68,000,215	68,000,215	-	-	-	-	-	-	
7	0060 - Secretaría de Salud		-	430,032,377	430,032,377	-	384,685,306	384,685,306	-	254,175,121	254,175,121	66%
1	015 - CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DEL HOSPITAL REGIONAL DEL SUR EN CHOLUTECA	EDCF No. HND-4	-	250,000,000	250,000,000	-	71,177,257	71,177,257	-	-	-	0%
	018 - PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS Y LEISHMANIASIS (PENCHALE)	Acuerdo de Contrib. A-033640	-	-	-	-	670,388	670,388	-	670,364	670,364	100%
3	019 - REEQUIPAMIENTO BIOMEDICO HOSPITAL MARIA ESPECIALIDADES PEDIATRICAS (HMEP)	ITALIA-HOS/MARIA	-	93,576,144	93,576,144	-	58,813,596	58,813,596	-	23,328,119	23,328,119	40%
4	023 - PROYECTO DE MEJORA DE LA GESTION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO-NEONATAL	BID 4619/BL-HO	-	-	-	-	76,479,215	76,479,215	-	76,241,985	76,241,985	100%
5	025 - PROGRAMA APOYO A LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE	BID 3723/BL-HO	-	86,456,233	86,456,233	-	154,270,561	154,270,561	-	134,811,511	134,811,511	87%
6	026 - HONDURAS SALUD MESOAMERICA 2015 (HO-G1003) FASE II	GRT/HE-16838-HO	-	-	-	-	22,683,289	22,683,289	-	19,123,142	19,123,142	84%
7	027 - PROYECTO HONDURAS - INICIATIVA REGIONAL DE ELIMINACIÓN DE LA MALARIA (IREM EN MESOAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA	GRT/MM-17339-40-HO	-	-	-	-	591,000	591,000	-	-	-	0%
8	0240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social		144,640,200	486,771,612	631,411,812	145,931,027	520,789,894	666,720,921	128,645,814	501,949,217	630,595,031	95%
1	006 - BOLSON ESCOLAR Y EQUIPO DE UTILES	FN-BOLSON ESCOLAR-14-08	-	7,000,000	-	7,000,000	6,960,731	-	6,960,731	6,960,505	-	100%
2	015 - ATENCIÓN A MUJERES, JOVENES, NIÑOS Y NINAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL	FN-0000015-14	29,856,800	-	29,856,800	27,563,355	-	27,563,355	22,947,382	-	22,947,382	83%
3	016 - OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR	FN-0000016-14	34,924,900	-	34,924,900	32,587,874	-	32,587,874	23,683,066	-	23,683,066	73%
4	017 - CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	FN-0000017-14	72,858,500	-	72,858,500	78,819,067	-	78,819,067	75,054,860	-	75,054,860	95%
5	018 - PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO VIDA MEJOR) BID 3371/BL-HO	BID 3371/BL-HO	-	213,215,453	213,215,453	-	234,707,672	234,707,672	-	216,842,152	216,842,152	92%
6	019 - SEGUNDO FINANCIAMIENTO ADICIONAL PARA EL PROYECTO DE PROTECCION SOCIAL(BONO VIDA MEJOR) BM 5603	IDA 5603-HN	-	20,702,563	20,702,563	-	39,291,279	39,291,279	-	39,291,272	39,291,272	100%
7	020 - PROGRAMA APOYO A LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE	BID 3723/BL-HO	-	252,853,596	252,853,596	-	205,358,623	205,358,623	-	204,383,472	204,383,472	100%
8	021 - PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL / 6401-HN	6401-HN	-	-	-	-	41,432,320	41,432,320	-	41,432,320	41,432,320	100%
1	0244 - Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer		-	19,249,634	19,249,634	-	19,249,634	19,249,634	-	10,363,288	10,363,288	54%
1	001 - Centros de Atención Integral para mejorar las condiciones de vida de las mujeres hondureñas (Ciudad Mujer)	BID-3771/BL-HO	-	19,249,634	19,249,634	-	19,249,634	19,249,634	-	10,363,288	10,363,288	54%
2	0702 - Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán		12,045,398	-	12,045,398	24,545,398	-	24,545,398	11,053,908	-	11,053,908	45%
1	003 - Construcción de Edificio Multifuncional de Talleres y Laboratorios en el Centro Universitario Regional de San Pedro Sula de la UPNFM	FN 0000057-11 UPNFM	12,045,398	-	12,045,398	12,045,398	-	12,045,398	5,819,030	-	5,819,030	48%
2	004 - Construcción de Edificio Multifuncional de Deporte y Cultura en el Centro Universitario Regional de Nacaome	FN 23655-1	-	-	-	12,500,000	-	12,500,000	5,234,878	-	5,234,878	42%
1	0703 - Universidad Nacional de Agricultura		1,586,713	27,683,245	29,269,958	1,586,713	48,375,498	49,962,211	1,529,511	32,438,014	33,967,525	68%
1	005 - PROYECTO INCLUSIÓN SOCIAL A LA EDUCACIÓN SUPERIOR E IMPULSO DE LA PRODUCCIÓN SUSTENTABLE (UNA/INAPROS)	BCIE 2069	1,586,713	27,683,245	29,269,958	1,586,713	48,375,498	49,962,211	1,529,511	32,438,014	33,967,525	68%
100	Sub total PIP		761,744,370	10,291,464,394	11,053,208,764	1,255,775,568	8,871,350,972	10,127,126,540	967,823,000	8,197,266,992	9,165,089,991	91%
	Reserva Presupuestaria para Proyectos*/			825,717,941	825,717,941		825,717,941	825,717,941				0%

SECRETARÍA DE FINANZAS
INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE 2019
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Gabinete / Institución / Proyecto	Número de Convenio	Aprobado			Vigente			Devengado Aprobado Anual			
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% (Devengado / Vigente)
	Sub Total General		761,744,370	11,249,300,724	12,011,045,094	1,255,775,568	9,697,068,913	10,952,844,481	967,823,000	8,197,266,992	9,165,089,991	84%
1	Fondo Social Reducción de la Pobreza (Vida Mejor)		4,500,000,000	-	4,500,000,000	4,949,917,174		4,949,917,174	4,949,917,174		4,949,917,174	100%
6	Proyectos APP		6,509,000,000	-	6,509,000,000	4,350,880,000		4,350,880,000	2,426,469,836		2,426,469,836	56%
1	Programa Vial		2,000,000,000	-	2,000,000,000	1,901,508,454		1,901,508,454	1,474,116,432		1,474,116,432	78%
108	Total General		13,770,744,370	11,249,300,724	25,020,045,094	12,458,081,196	9,697,068,913	21,329,432,168	9,818,326,443	8,197,266,992	18,015,593,434	84%

*/ Monto de Inversión que no fue transferido a la Alcaldía Municipal y Recursos presupuestarios que furen reservados para su posterior ejecución.
