



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE FINANZAS

**SECRETARÍA DE FINANZAS**

**DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS**

# **Informe de Avance Físico y Financiero**

## **Secretaría de Educación (SEDUC)**

**Al IV trimestre, 2020**

**Tegucigalpa M. D. C.**

**Honduras, C.A.**

**Enero, 2021**

## 3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Secretaría de Educación (SEDUC) encargada de la formulación, coordinación, ejecución y evaluación de las políticas relacionadas con todos los niveles del Sistema Educativo Formal; para el IV Trimestre del año 2020 contó con la asignación de tres proyectos y que representa el 6% del Presupuesto Vigente en el Gabinete Social. En el cuadro No. 1 se presenta el Presupuesto de Inversión y ejecución financiera de la Secretaría de Educación para el cierre de año 2020.

Cuadro No. 01  
Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del 2020

Cifras en Lempiras


Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	452,905,060
Presupuesto Vigente	195,354,924
Devengado IV Trimestre	1,035,488
<b>% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)</b>	<b>0.5%</b>
Devengado Anual	27,616,835
<b>% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)</b>	<b>14%</b>

Fuente: SIAFI, 31/12/2020

Con el propósito de atender de manera responsable e integral la crisis por la cual atraviesan actualmente las finanzas públicas, derivado de la acelerada disminución de los ingresos a consecuencia de la Pandemia causada por el COVID-19, se emite el Decreto Legislativo No. 92-2020, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,326 con el propósito de mantener el equilibrio presupuestario y dada la emergencia nacional del COVID-19, efecto que ocasionó la baja actividad productiva de los diferentes sectores económicos y productivos del país; se autorizó a la SEFIN aplicar medidas pertinentes en materia de racionalización del gasto público, mediante la disminución/reserva en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República del año 2020. Afectando a la SEDUC en L 155,197,257, para espacio presupuestario en proyectos de Inversión Pública específicamente en la Fuente 21,

## FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Gráfico No. 01  
Financiamiento de la Inversión por Fuente  
(Cifras en Lempiras)

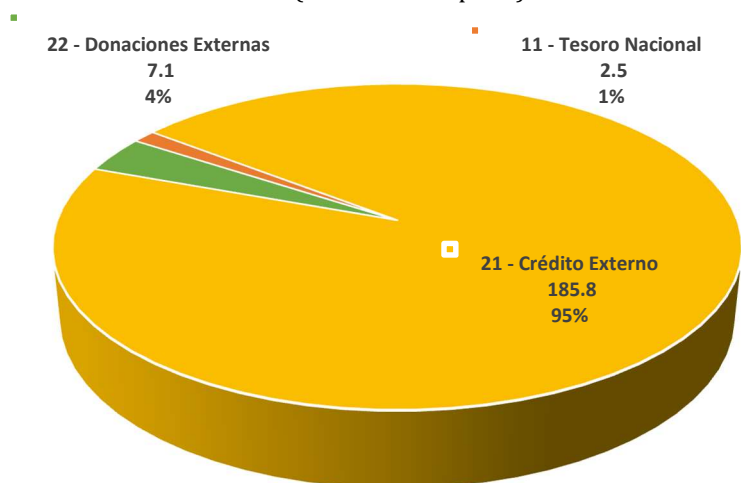

El Programa de Inversión vigente de la SEDUC, es financiado por recursos de Crédito Externo (95%) proveniente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Banco Mundial (BM), Donaciones Externas (4%) por parte del Gobierno Alemán (KFW) y el restante 1% con Recursos Nacionales como contraparte nacional de la donación.

Para el Cuarto trimestre del 2020, se contó con un Presupuesto Vigente de L195.4 millones ejecutando en el período L27.6 millones (14%) a nivel de devengado de los recursos asignados en relación a dicho

## SECRETARIA DE FINANZAS

Presupuesto. El financiamiento de la inversión para la Secretaría de Educación se refleja en el gráfico No. 1.

En forma comparativa al cuarto trimestre del año 2019, donde la SEDUC contó con un Presupuesto Vigente de L128.6 millones de los cuales registró ejecución en 99% (L127.0 millones); para el año 2020, la asignación incrementó en 51.9% (L66.7 millones) y registró ejecución financiera baja del 14% (L.27.6 millones) principalmente por las acciones de ejecución realizadas por la SEDUC previo al traslado del "Proyecto Joven" en cumplimiento al PCM-004-2020. Cabe considerar, que la ejecución del resto de los Proyectos adscritos a la SEDUC, se vieron afectados principalmente por las restricciones para mantener el control del gasto público, como consecuencia de la Emergencia Sanitaria por COVID-19, declarada a partir del mes de febrero del año 2020.

Ver Detalle de Proyectos, Ejecución Financiera en Anexo No. 4.

### 3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

A continuación se detalla la ejecución financiera trimestral y acumulada de la vida de los proyectos adscritos a la Secretaría de Educación:

**Proyecto: "Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo", Proyecto Joven:**

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$	Lempiras	
Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven	BID 4449/BL-HO	US\$	45,000,000	02/02/2018 03/10/2023
		Lempiras	1,113,925,500	
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Ejecutado (Devengado)</b>	<b>% Ejecución</b>
IV Trimestre 2020	443,317,192	181,738,506	-	0%
Acumulado 2020	443,317,192	181,738,506	26,541,243	15%
Acumulado Vida del Proyecto *	1,492,170,000	1,113,925,500	151,859,623	14%

**Nota:** Mediante Contratos Modificatorios suscritos el 30/06/2020; El Convenio BID 4449/BL-HO que financia el "Proyecto Joven", modifica su Organismo Ejecutor a la Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales (AEPAS-H), así mismo, se reorientan US\$15.0 millones para financiar Proyecto "Respuesta Inmediata de Salud para Contener y Controlar el Coronavirus (COVID-19) y mitigar su efecto en la prestación del Servicio en Honduras", a ser ejecutado por la Secretaría de Salud.

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 31/12/2020 (BCH): L24.7539 por US\$1.00

El objetivo del proyecto es contribuir al desarrollo de las habilidades para el trabajo y la vida de los jóvenes hondureños por medio de la mejora del acceso y calidad de los aprendizajes en el tercer ciclo de Educación Básica en los municipios priorizados por el proyecto; a fin de contribuir a la reducción de los factores de riesgo a la migración en adolescentes y la reinserción de los

Ejecución al IV Trimestre 2020; Secretaría de Educación

## SECRETARIA DE FINANZAS

jóvenes emigrantes retornados. Su localización geográfica está en los Departamentos de: Copán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Santa Bárbara, Cortés y Francisco Morazán.

Con la Publicación del **Decreto Ejecutivo número PCM-004-2020**, se crea la Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H), encargada del diseño, ejecución, supervisión y administración de proyectos productivos, ambientales y sociales, que le sean asignados, como resultado de la formalización de contratos, convenios y acuerdos de financiamiento internacionales, convenios interinstitucionales o designación directa de los órganos de decisión por el Gobierno de la República de Honduras.

En ese sentido y por mandato en el Artículo 24 del Decreto Ejecutivo; la AEPAS-H asume en definitiva la ejecución de todos los recursos previstos en los contratos, convenios y acuerdos de financiamiento internacionales, así como los recursos de contraparte; por lo que en cumplimiento a dicho mandato, a partir del mes de Agosto los saldos disponibles para ejecución del Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven, son trasladados a la Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales (AEPAS-H).

En fecha 30 de junio de 2020; se suscriben los Convenios modificatorios con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por el cambio de Organismo Ejecutor y por la reorientación de US\$15.0 millones en apoyo a las acciones del Gobierno de Honduras para atender la Emergencia Sanitaria por el Coronavirus (COVID-19).

Este proceso de traslado ya ha hecho efectivo el cambio del Organismo ejecutor mediante la Enmienda a Nota de Prioridad No 2, así mismo se enmendó el Alineamiento Estratégico (CeA-048-2020) y se realizó la Enmienda No 3 por disminución del monto del Proyecto en US\$15.0 millones; se cuenta con la migración de las estructuras presupuestarias y asignación de disponibilidades en los Sistemas Nacionales (SNIPH – SIAFI).

### **Programa: “Mejora de la Infraestructura Escolar (PROMINE/KFW, FASE IV)” (Componente SEDUC):**

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
Programa: “Mejora de la Infraestructura Escolar (PROMINE/KFW, FASE IV)” (Componente SEDUC)	2014 67 414 (KFW) / FHIS - SE	Lempiras	59,554,506	03/12/2015 30/11/2022
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
IV Trimestre 2020	9,587,868	9,587,868	1,035,488	10.8%
Acumulado 2020	9,587,868	9,587,868	1,075,592	11.2%
Acumulado Vida del Proyecto *	59,554,506	59,554,506	30,600,786	51%

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 31/12/2020 (BCH): L24.7539 por US\$1.00

El Programa se enfoca en dotar de una infraestructura educativa adecuada, que permita una educación en condiciones pedagógicas modernas, considerando también el uso de los espacios exteriores, promoviendo una educación por valores. Además, está la incorporación del rol de las escuelas en la prevención de la violencia y los espacios escolares seguros, con locales adecuados a las diversas condiciones climáticas y culturales de Honduras.

La modalidad de ejecución de proyectos es " Proyectos Ejecutados por la Comunidad" (PEC), que se desarrolla en el marco de la descentralización y bajo una Gerencia Comunitaria. Para esto, los fondos son transferidos a las municipalidades y de su parte a las comunidades, las cuales son debidamente organizadas, capacitadas y asesoradas, para que realicen las actividades administrativas, organizativas logísticas y técnicas, asumiendo la responsabilidad en la ejecución eficiente y transparente de los recursos financieros. En general la ejecución PEC genera el empoderamiento y apropiamiento de los proyectos y los actores comunitarios y municipales (padres, docentes, autoridades educativas y municipales) que son previamente capacitados para cumplir de forma adecuada su gestión.

Para el año 2020, se programó en el Plan Operativo Anual (POA-Presupuesto SIAFI) las siguientes actividades:

- Diseño y formulación de 15 proyectos de Obra de Infraestructura Escolar (Fase IV).
- Supervisión de 30 Centros Educativos con proyectos de Obra de Infraestructura Educativa en los niveles Pre básica y Básica en los Departamentos: Ocotepeque, Lempira, Copán, Francisco Morazán, Valle, Choluteca, Comayagua y Gracias a Dios. (Fase IV)
- Diseño y formulación de 15 proyectos de Obra de Infraestructura Escolar (Fase V).
- Fortalecer con material didáctico, 200 Centros Educativos a nivel de Bachilleratos Técnicos Profesional (BTP). (Fase V)
- Supervisión de 528 Centros Educativos con proyectos Obra de Infraestructura Educativa en los niveles Pre básica y Básica en los Departamentos: Copán, Lempira, Intibucá, La Paz, Santa Bárbara, Ocotepeque y Gracias a Dios. (Fase V)

Al IV trimestre no presenta ejecución física en ninguna de las actividades programadas en el SIAFI. Adicionalmente, las actividades programadas para la Fase V, no iniciaron su ejecución en el año 2020.

Durante el año 2020, a raíz de la Pandemia COVID-19 no se logró realizar las actividades planificadas en el PACC y POA 2020, que conllevan al logro y ejecución física y financiera del Programa PROMINE, debido a las restricciones por contención del gasto mediante las Circulares DGP-003-2020 con fecha 23 de marzo de 2020, y DGIP-003-2020 con fecha 31 de marzo de 2020. Lo anterior considerando que el Programa realiza su ejecución mediante las visitas a centros educativos y realizar la Formulación, Supervisión y Recepción de Proyectos de Infraestructura Educativa ejecutados por SEDECOAS, así mismo confirmar la implementación de la normativa de Planificación de la Infraestructura de Centros Educativos.

Al Cuarto Trimestre, no se logró la ejecución física y la ejecución financiera reportada únicamente atiente a gastos de funcionamiento del Programa (contratación de 7 consultores: Formulator y

Diseñador (Arquitecto), Formulador y supervisor (Estructural), Supervisor Proyectos Eléctricos, Coordinador Seguridad Alimentaria /Cambio Climático Mosquitia, Coordinador Seguridad Alimentaria/ Cambio Climático Occidente / Corredor Seco, Asistente Administrativo y un Asesor Legal), mobiliario de oficina, viáticos, pago de impuestos sobre ventas, compra de llantas.).

De acuerdo a lo reportado por la Unidad Ejecutora, en relación a la ejecución de Fondos Externos el desfase de la ejecución física y financiera del programa PROMINE, se justifica por la tardía aprobación de la modificación presupuestaria solicitada a la Gerencia Administrativa de la SEDUC, misma que se aprobó únicamente para dar cumplimiento con compromiso adquirido en la gestión 2019 con un proveedor, y todas las otras actividades planificadas según PACC y POA 2020 no se pudieron realizar.

Para el caso de los Fondos Nacionales, se repite la situación anterior, con la diferencia que la modificación presupuestaria fue aprobada para varios objetos del gasto para realizar las actividades planificadas; sin embargo, la tardanza en procesar y autorizar la misma, implicó que no se pudiera publicar todos los procesos de adquisición de bienes y servicios solicitados y los que fueron adjudicados los proveedores no confirmaron la notificación de adjudicación por lo cual se declaró el proceso como eliminado.

**Proyecto: “Mejoramiento de la Calidad de la Educación Prebásica en Honduras” (IDA 6560-HN):**

En fecha 16 de junio de 2020, el Gobierno de Honduras suscribe con la Asociación Internacional del Fomento (Banco Mundial) y la Alianza Mundial para la Educación (AME), Acuerdo de Financiamiento (No. 6560-HN) y Acuerdo de Subvención (No. TF0B2218-HN) respectivamente para el financiamiento por un monto total de US\$39.5 millones (alrededor de L.973.8 millones), el cual se encuentra en proceso de homologación sistemática para definir la ejecución del Proyecto, considerando los diferentes financiamientos y las regulaciones en la ejecución de los mismos.

El proyecto consiste en la mejora de la capacidad institucional de Secretaría de Educación (SE) para la gestión de este nivel educativo; las prácticas de enseñanza de docentes y educadoras a nivel nacional; y los entornos de aprendizaje físico en centros de Prebásica que atienden educandos vulnerables de regiones seleccionadas.

Con este Proyecto, se busca mejorar la calidad de las prácticas pedagógicas de enseñanza en las aulas de Educación Prebásica aumentando la relevancia en el Diseño y Herramientas Curriculares, proporcionando materiales de aprendizaje y apoyando en la mejora de las prácticas pedagógicas en los docentes y/o educadoras. Se estarán beneficiando un total de 7,900 docentes y educadoras de Educación Prebásica con la dotación de herramientas curriculares y 178,400 educandos con materiales de aprendizaje. En cuanto al mejoramiento de los entornos de aprendizaje físico (infraestructura) en centros de Educación Prebásica que atienden a educandos, el Proyecto prevé la construcción y/o mejora de 224 aulas en los centros del nivel Prebásica, este mejoramiento incluye: obra de infraestructura, áreas recreativas y mobiliario para docentes y educandos, garantizando así que los educandos de comunidades desfavorecidas puedan acceder a entornos físicos de calidad.



Al cierre del año 2020, se contó con asignación presupuestaria para dar inicio a la ejecución del proyecto, en relación a la contratación del personal de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP), se contrató el Coordinador del Proyecto y el Especialista Financiero; sin embargo, no se logró concretar la solicitud del primer desembolso por parte del Organismo Financiero.

### 3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Durante el cuarto Trimestre se realizaron las siguientes actividades y/o acciones en apoyo a los proyectos de inversión:

- Revisión y actualización de la Proyección Mensual (Octubre- Noviembre - Diciembre) de ejecución para el Año 2020.
- Apoyo en seguimiento a las solicitudes de cuotas de compromiso mensuales de Crédito Externo para su gestión ante TGR en función de las proyecciones de ejecución reportadas por las Unidades ejecutoras de Proyectos.
- Se realizaron reuniones de seguimiento y monitoreo de los procesos y pagos correspondientes al cuarto trimestre del año, con las Unidades Ejecutoras de Proyectos.
- Se emitió Dictamen Técnico para la Ampliación al Plazo de Ejecución y Último Desembolso para la Fase IV del Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar (PROMINE), hasta el 30 de noviembre de 2022.
- Apoyo en la gestión y modificación presupuestaria para la identificación de espacio presupuestario para incorporar el Proyecto Mejoramiento de la Calidad de la Educación Prebásica en Honduras” (IDA 6560-HN) por un monto de L.4.0 millones.
- Actualización de la Inversión Municipal Año 2020, para los Departamentos de Comayagua, Cortés, Choluteca, Lempira y Olancho.
- Se participó en las actividades de cierre coordinadas por la Contaduría General de la República.

### Conclusiones

- En el mes de Febrero del año 2020, se Decretó Emergencia Nacional por la Pandemia del Coronavirus (COVID19), situación que afecta la normal ejecución de las actividades y procesos programados por las Unidades Ejecutoras de Proyectos, principalmente aquellos cuyas intervenciones se realizan en campo, como es el caso de los adscritos a la SEDUC; debido a que se prioriza la ejecución de los recursos en aras de atender y salvaguardar la salud de la población hondureña.
- Al término del año 2020, la ejecución reportada por la SEDUC registra un 14% (L27.6 millones) en relación al Presupuesto Vigente asignado.
- El Proyecto: “Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo” Proyecto Joven”, por mandato del Decreto Ejecutivo número PCM-004-2020, se trasladó a la agencia ejecutora AEPAS-H; adicionalmente, producto de la Emergencia Sanitaria el Gobierno de Honduras tomó la decisión de reorientar recursos de operaciones activas con el BID para poder dar atención inmediata en servicios de salud y contener la propagación del COVID-19.

- El Programa PROMINE actualmente se encuentra ejecutando la fase IV con recursos de Donación Externa (KFW) y Contraparte Nacional; en relación a la fase V se ha considerado el desfase de su inicio para el año 2021, considerando que durante el año se limitó la normal ejecución de los recursos por la contención del gasto, así mismo las limitaciones en la movilización, debido a la emergencia sanitaria del COVID-19.

### Recomendaciones

- Para la gestión 2020, las unidades ejecutoras deberán realizar una programación financiera que les permita contar con todos los recursos necesarios según las actividades y procesos que estas realicen, priorizar actividades haciendo uso eficiente de los recursos, tomando en consideración las medidas giradas por parte de la Secretaría de Finanzas
- Se recomienda registrar la programación y ejecución física en SIAFI conforme a los planes de ejecución de los Proyectos.



ANEXO No. 04  
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS  
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública  
**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE 2020**  
Cifras en Lempiras

No.	Gabinete / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio Fin	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Devengado Anual				Devengado IV Trimestre			
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./ Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./ Vig.)
3	Gabinete Social			2,497,156	450,407,904	452,905,060	2,497,156	192,857,768	195,354,924	430,664	27,186,171	27,616,835	14%	390,560	644,928	1,035,488	1%
3	0050 - Secretaría de Educación			2,497,156	450,407,904	452,905,060	2,497,156	192,857,768	195,354,924	430,664	27,186,171	27,616,835	14%	390,560	644,928	1,035,488	0.5%
1	007 - PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE IV)	2014 67 414 (KFW) / FHIS - SE	10/07/2012 31/07/2023	2,497,156	7,090,712	9,587,868	2,497,156	7,090,712	9,587,868	430,664	644,928	1,075,592	11%	390,560	644,928	1,035,488	11%
	<b>Total 007 - PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)</b>			<b>2,497,156</b>	<b>7,090,712</b>	<b>9,587,868</b>	<b>2,497,156</b>	<b>7,090,712</b>	<b>9,587,868</b>	<b>430,664</b>	<b>644,928</b>	<b>1,075,592</b>	<b>11%</b>	<b>390,560</b>	<b>644,928</b>	<b>1,035,488</b>	<b>11%</b>
2	009 - Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven	4449/BL-HO	05/02/2018 05/02/2023	-	443,317,192	443,317,192	-	181,738,506	181,738,506	-	26,541,243	26,541,243	15%	-	-	-	0%
	<b>Total 009 - Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven</b>			<b>-</b>	<b>443,317,192</b>	<b>443,317,192</b>	<b>-</b>	<b>181,738,506</b>	<b>181,738,506</b>	<b>-</b>	<b>26,541,243</b>	<b>26,541,243</b>	<b>15%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
3	011 - MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN PREBÁSICA EN HONDURAS	6560-HN	31/07/2020 31/07/2025	-	-	-	-	4,028,550	4,028,550	-	-	-	0%	-	-	-	0%
	<b>Total 011 - MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN PREBÁSICA EN HONDURAS</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,028,550</b>	<b>4,028,550</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>

Fuente: SIAFI al 31/12/2020.

**ANEXO No. 05**  
**SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS**  
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública  
**Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al IV Trimestre, 2020**

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			IV Trimestre 2020		
			Prog.	Ejecución	% Ejecución	Prog.	Ejecución	% Ejecución
<b>Secretaría de Educación</b>								
<b>007 - PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)</b>	12 - Diseño y formulación de proyectos obra de infraestructura escolar.	Proyecto	1	0	0%	1	0	0%
	13 - Supervisión de proyectos obra de infraestructura educativa en los niveles Prebásica y básica en los departamentos de: Ocotepeque, Lempira y Copán en la zona de occidente. Francisco Morazán, valle, Choluteca, Comayagua y Gracias a Dios.	Centro Educativo	1	0	0%	1	0	0%
	14 - Diseño y formulación de proyectos obra de infraestructura escolar.	Proyecto	10	0	0%	10	0	0%
	15 - Bachilleratos Técnicos Profesional (BTP) fortalecidos con material didáctico.	Centro Educativo	200	0	0%	200	0	0%
	16 - Supervisión de proyectos obra de infraestructura educativa en los niveles Pre básica y básica en los departamentos de: Copán, Lempira, Intibucá, La Paz, Santa Bárbara, Ocotepeque y Gracias a Dios.	Centro Educativo	280	0	0%	45	0	0%
<b>009 - Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven</b>	07 - Jóvenes del Tercer Ciclo de Educación Básica atendidos por la Modalidad Educativa Alternativa (IHER)	1016 - EDUCANDO	1	0	0%	1	0	0%
	08 - Docentes con formación inicial y permanente en el Tercer Ciclo de la educación básica en el área de su desempeño	Docente	400	0	0%	400	0	0%
	09 - Diseño de herramienta tecnológica para fortalecer el sistema integrado de información educativa (SIIE).	Porcentaje	25	0	0%	25	0	0%
	10 - Evaluación anual financiera y de cumplimiento del proyecto joven.	Informe de Auditoría	1	0	0%	1	0	0%
<b>011 - MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN PREBÁSICA EN HONDURAS</b>	18 - Plan de oferta educativa con estrategia de comunicación inclusiva con equidad en los diferentes modalidades de atención en Educación Prebásica implementado.	Consultoría	178,400	0	0%	0	0	0%
	20 - Diseños curriculares actualizados de los niveles de educación Inicial, Pre Básica, Básica y Media de acuerdo a las necesidades y demandas del siglo XXI, del mundo del trabajo, avances tecnológicos y científicos para la implementación del Modelo Educativo con enfoque inclusivo y de calidad.	Consultoría	2	0	0%	2	0	0%
	21 - Centros educativos ampliados, reparados y nuevos	Consultoría	4	0	0%	4	0	0%
	22 - Fortalecidos los procesos técnicos pedagógicos y administrativos de la gestión Institucional de la Secretaría de Educación.	Consultoría	11	0	0%	11	0	0%
	24 - Instancias de Participación comunitaria y escolar (CODDE, CED, AECOS, APF, GE, EPMFTE, CAE, CCE, ORMA, CODECE y otras), debidamente organizadas y funcionando de acuerdo a las directrices de la descentralización	Consultoría	1	0	0%	1	0	0%

Fuente: SIAFI, al 31/12/2020
