



★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

**SECRETARÍA DE DESARROLLO
COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO
(SEDECOAS/FHIS)**

Cuarto Trimestre, 2020

Enero, 2021

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A.

IV. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

4.1 EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA


La Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS)-Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) cuya finalidad es la de promover el mejoramiento de las condiciones de vida de los grupos sociales marginados en el área rural y urbana, mediante el otorgamiento de financiamientos para programas y proyectos de desarrollo social o económico, con el propósito de aumentar su productividad, sus niveles de empleo y de ingresos y de contribuir a la satisfacción de sus necesidades básicas.

Cuadro No. 05
Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del 2020
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	504,159,571
Presupuesto Vigente	483,134,402
Devengado IV Trimestre-2020	176,438,572
% Ejecución (Devengado IV Trim-2020 / Vigente)	37%
Devengado Anual	303,297,378
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	63%

Fuente: SIAFI, 31/12/2020

Gráfica No.6
Presupuesto Vigente
Financiamiento por Organismo Financiero
Cifras en millones de Lempiras

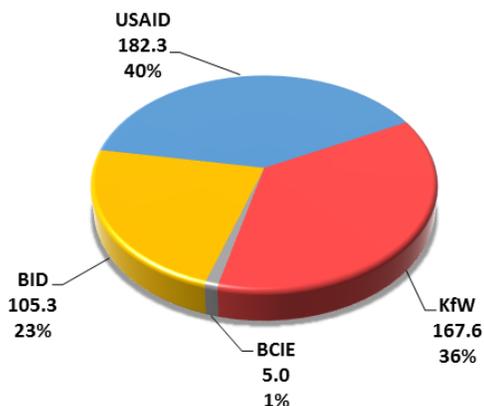

Al cuarto trimestre del año 2020 la institución reportó un presupuesto vigente de inversión pública de **L 483,134,402** y la ejecución presupuestaria del trimestre asciende a un monto de **L 176,438,572** lo que representa el (37%) con relación al presupuesto vigente, de igual forma presenta una ejecución acumulada anual de **L 303,297,378** (63%) tal como se detalla en el Cuadro No. 5.

Del total del financiamiento, el 66% corresponde a fondos de donaciones externas expresado en términos monetarios por un monto de L.318,928,991 y el 29.2% a recursos de crédito externo por un monto de L.141,225,148 la

contraparte nacional corresponde a gastos operativos con un presupuesto vigente de L.22,980,263 equivalente a 4.8%.

Dicha ejecución se llevó a cabo a través de (6) seis proyectos enfocados en Agua y Saneamiento, Electrificación Rural y Caminos Rurales, Infraestructura Social, Infraestructura Escolar, Fortalecimiento de Capacidades para Jóvenes, Recuperación de Espacios Públicos y Mejora de la Infraestructura Básica. Ver Detalle de Ejecución Física en Anexo No. 5

Con relación al presupuesto vigente con recursos externos para la ejecución de los proyectos ésta se distribuye por; KfW Banco Alemán con 36%, BID con el 26%, USAID con el 40% y BCIE con el 1%.

El presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento-Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS para proyectos de Inversión Pública específicamente en la Fuente 21, al cuarto trimestre del 2020, muestra una reducción/reserva de L 29,297,933.00 del Presupuesto Aprobado L 150,188,491.00; esto como parte de una disciplina presupuestaria en materia de racionalización del gasto público que permita el uso eficiente de los recursos financieros, en cumplimiento al Decreto Legislativo No. 92-2020. No obstante, la ejecución de los proyectos impacta directamente en la ejecución del Programa de Inversión Pública (PIP), dado que la mayoría de los proyectos están orientados a generar beneficios económicos al país.

4.2 PRINCIPALES PROYECTOS

Los proyectos que tuvieron esta contención del gasto fueron: Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB) L 23,513,032.00, Programa de Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes (CONVIVIR) L 4,969,397.00 y el Proyecto de Infraestructura Rural (PIR) L 815,504.00.

La inversión en el cuarto trimestre del año 2020 se concentró en los siguientes proyectos:

1. Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y su Gestión Local (PROMINE).
2. Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB).
3. Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (ICS).
4. Proyecto de Infraestructura Rural (PIR-BCIE).
5. Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras (PIOH).
6. Proyecto Convivencia y Espacios Seguros para los Jóvenes en Honduras (CONVIVIR).

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros de los principales proyectos de acuerdo a su presupuesto vigente:

Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y de su Gestión Local (PROMINE) FASE IV

PROMINE tiene por objetivo general fortalecer la rectoría Sectorial en Infraestructura Educativa de la Secretaría de Educación y la gestión local participativa, así como mejorar el acceso de los alumnos y alumnas de las comunidades pobres al Centro Educativo de calidad que operan de manera sostenible. De esa manera se pretende contribuir al aumento de la eficiencia y de la calidad del sistema educativo (pre-básico y básico).

Con relación a la Fase IV, actualmente se han considerado 44 proyectos de los cuales, 27 ya cuentan con la factibilidad institucional y con sus respectivas no objeciones por parte del organismo financiador, de los cuales 15 proyectos están en ejecución con un avance físico del 50% en promedio. En general la ejecución del Programa en el año 2020, se vio afectada por la pandemia COVID-19, los huracanes ETA e IOTA, sin embargo, al finalizar el año se logró una ejecución del 93%.

A continuación, véase la ejecución histórica del Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y de su Gestión Local (PROMINE), cuarto trimestre 2020:

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto*/	Inicio-Fin	
Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y de su Gestión Local (PROMINE)	SE/FHIS VIII No.2008-66-178 2014 67 414 (KFW) / FHIS - SE	1,345,320,646	2012-2022	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
IV Trimestre 2020	135,907,777	132,274,269	98,452,984	74
Acumulado 2020	135,907,777	132,274,269	123,221,616	93
Acumulado Vida del Proyecto*/	1,345,320,646	1,345,320,646	1,038,027,865	77

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Ver Detalle de Ejecución Física en Anexo No. 5

Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB)

Consisten en contribuir a mejorar la convivencia ciudadana en Honduras a través de la mejora en la calidad de vida en barrios vulnerables y la reducción de la incidencia de delitos violentos. Los objetivos específicos son: (I) mejorar el hábitat de barrios urbanos vulnerables, aumentando el acceso a infraestructura de servicios básicos y de prevención para disminuir delitos de robos y violaciones sexuales; (II) reducir los niveles de incidencia de homicidios y violencia intrafamiliar (VIF) en los municipios intervenidos mejorando los servicios de prevención y atención a víctimas de la violencia; y (III) mejorar la efectividad policial en investigación criminal, a través del incremento de la proporción de casos de homicidio con agresor identificado e informe de investigación aceptado por el Ministerio Público.

A continuación, véase los avances por productos al 31 de diciembre de 2020:

Proyectos Integrales de Mejoramiento de Barrios.

- Los Proyectos de integración urbana el cual incluye: Ampliación, Mejoramiento y/o Construcción de sistemas de alcantarillado sanitario, agua potable, drenaje pluvial, mejoramiento vial y obras de mitigación de riesgos, colonias 25 de enero, Australia, Nueva España, Nueva Galilea, inicio la ejecución de obras el día 20 de diciembre de 2019. La duración prevista de finalización del contrato para dichas obras es al mes de junio del año 2021 (período ampliado debido a la pandemia por el COVID-19). Al mes de diciembre de 2020 se logró la instalación de servicios básicos de agua potable, alcantarillado sanitario, drenaje pluvial y pavimentación de calles en sectores de los barrios beneficiados; el porcentaje de avance físico de este producto es de un 59.5% y tiene un avance financiero de 65% en relación al monto contratado que es de L 128,592,322.09.

El proyecto de equipamiento social el cual incluye, Reparación de Cancha Polideportiva, Colonia Nueva Galilea, Construcción de Centro Comunal, Colonia Nueva Galilea, Ampliación de Jardín de Niños; Colonia Nueva España, Ampliación Escuela David Corea Sánchez, Colonia Australia, Construcción Centro Comunal, Colonia Australia y Construcción Centro Comunal, Colonia 25 de enero, inició el día

23 de noviembre de 2019. Al mes de diciembre de 2020 se tiene un avance físico promedio del 75% y un avance financiero del 78% en relación al monto contratado que es de L 10,967,584.51.

- El Programa de Deportes y Valores. En el programa participan 1,337 niños y jóvenes en 16 secciones deportivas, sin embargo, debido a la pandemia del COVID-19 se ha comenzado a realizar clases virtuales para el entrenamiento en deportes y a estas sólo tienen acceso quienes en sus viviendas cuentan con un servicio de internet; en este sentido se ha creó un canal en YouTube, para el aprovechamiento de clases. En este producto se provee la capacitación en valores y emprendimiento, iniciaron en el mes de octubre del año 2020; la meta a alcanzar inicialmente programada era 2,000 asistencias a capacitación, sin embargo, al mes de diciembre ante la emergencia solo se obtuvo una asistencia total de 921 participantes.

A continuación, véase la ejecución histórica del Programa al cuarto trimestre 2020:

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto*/	Inicio-Fin	
Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB)	BID/4518/BL-HO ATN/OC-17135-HO	369,377,190	2018-2023	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
IV Trimestre 2020	134,871,251	105,302,450	35,376,856	34
Acumulado 2020	134,871,251	105,302,450	71,201,382	68
Acumulado Vida del Proyecto*/	369,377,190	369,377,190	153,889,605	42

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Ver Detalle de Ejecución Física en Anexo No. 5

Cabe mencionar que del Presupuesto Aprobado del Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB), como parte de una disciplina presupuestaria en materia de racionalización del gasto público la SEFIN en cumplimiento del Decreto Legislativo 92-2020 aprobó la reducción de L 23,513,032.00 con el objetivo de permitir hacer uso eficiente de los recursos financieros.

Entre otros proyectos ejecutados por la SEDECOAS/FHIS están:

Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (USAID/ICS)

El propósito del Programa es incrementar la resiliencia de las comunidades y los individuos a la violencia y al crimen a través de mejoras en la infraestructura pública de pequeña escala. Esto incluye el mejoramiento en las estructuras comunitarias que mitiguen el crimen eliminando o disminuyendo el riesgo de oportunidad, creando espacios comunitarios más seguros, aumento en los servicios de calidad que protejan contra la violencia, mejoramiento en la participación de los sistemas de seguridad y rendimiento de justicia nacional y municipal, mejoramiento en la participación ciudadana con los sectores de justicia y seguridad.

Monto del Convenio es de \$14,637,541.74, de los cuales, fondos de donación de USAID: \$11,710,033.39; fondos de contraparte de Gobierno de Honduras: \$2,927,508.35 (efectivo: \$2,127,508.35 y especies: \$800,000.00), al 31 de diciembre contó con un presupuesto vigente de L 139,162,129.00 y una ejecución anual del L 60,678,681.68 que representó el

44%, recursos invertidos para la rehabilitación de 6 centros escolares y 2 Unidades Departamentales de Prevención y Seguridad Comunitaria de la Policía Nacional y proyectos para fortalecer el sistema de salud, según Decreto Legislativo No. 77-2020.

Cabe mencionar que, por el estado de emergencia emitido mediante decreto, se suspendió la ejecución de proyectos, a la fecha se han priorizado proyectos de Infraestructura y Equipamiento de establecimientos de salud con el objetivo de hacer frente a los desafíos en esta etapa de emergencia que atraviesa el país.

Programa de Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes (CONVIVIR)

El programa abarca la construcción, el mejoramiento y el equipamiento de infraestructura social para jóvenes y espacios públicos, financiamiento y/o cofinanciamiento del trabajo con jóvenes y la capacitación de jóvenes, la capacitación de personal de las instituciones involucradas, las municipalidades seleccionadas, las comunidades de barrio y servicios de consultoría.

La ejecución de los proyectos es a través de Municipios Mancomunidades y Comunidades que interactúan en función a la ejecución de los proyectos, bajo la modalidad de Proyectos Ejecutados por la Comunidad (PEC) para lo cual son debidamente asesorados y capacitados. Los fondos destinados para la ejecución de este Programa en su Fase I son €10,000,000.00. El tipo de financiamiento es un contrato de Préstamo.

El Programa contó con un presupuesto vigente para el 2020 de L 35,812,458.00 y el ejecutado de L 30,674,408.45 al cierre del cuarto trimestre alcanza a un 86% de ejecución. Cabe mencionar que a pesar de la situación actual de la Pandemia del COVID-19, el paso de los huracanes ETA e IOTA, los proyectos y procesos sociales lograron culminar y así lograr las metas de cierre del Programa CONVIVIR de Fase I, quedando pendientes 2 proyectos de infraestructura que aún están en ejecución, Remodelación Centro de Aprender para Emprender, Instituto Técnico Vocacional Valle de Sula en la Lima y la Construcción Casa de la Cultura de Siguatepeque.

Cabe mencionar que del Presupuesto Aprobado del Programa de Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes (CONVIVIR), como parte de una disciplina presupuestaria en materia de racionalización del gasto público la SEFIN en cumplimiento del Decreto Legislativo 92-2020 realizó una reducción de L 4,969,397.00 con el objetivo de permitir hacer uso eficiente de los recursos financieros.

4.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- La SEFIN autorizó modificación presupuestaria en atención a la solicitud presentada por el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) mediante Oficio No.SE-SEDECOAS-FHIS-250/2020 de fecha 01 de octubre del presente año, a través del cual requiere redistribuir objetos del gasto comprendidos en el Grupo de Gasto 40000 Bienes Capitalizables correspondientes al Proyecto Convivencia y Espacios Seguros para los Jóvenes en Honduras con el propósito de realizar la compra de muebles varios de oficina en el marco del Convenio de Crédito Externo KFW CONVIVIR bajo

el Componente Mejoramiento de Capacidades de Actores Relevantes, por un monto de L 300,000.00.

- De fecha 28 de octubre la SEFIN autorizó modificación presupuestaria en atención al Oficio No.SE-SEDECOAS-FHIS-275/2020 donde el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), solicita trasladar recursos con el propósito de realizar una reprogramación en las asignaciones correspondientes del Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y su Gestión Local, para realizar gestiones de construcciones y mejoras de bienes en dominio público en el marco del convenio de Donación Externa No.2014 67 414, por un monto de L 8,421,484.00.
- La SEFIN autorizó modificación tipo aprovechamiento de espacio presupuestario entre proyectos solicitado por el Fondo Hondureño de Inversión Social mediante Oficio No.SE-SEDECOAS-FHIS-306/2020 de fecha 12 de Noviembre del 2020, dicha disminución se realizó al Proyecto de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB) convenio de préstamo No.4518/BL-HO, con la finalidad de ampliar el espacio presupuestario del Proyecto Programa de Convivencia y Espacio para Jóvenes en Honduras (CONVIVIR) en el marco del convenio de préstamo KFW-CONVIVIR para el pago de garantías de cumplimiento para las consultorías por un monto de L 20,000.00
- De fecha 18 de noviembre el Fondo Hondureño de Inversión Social solicita a la SEFIN mediante Oficio No. SE-SEDECOAS-FHIS-309/2020 autorización para traslado presupuestario de las actividades centrales y el Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y su Gestión Local para poder realizar actividades de inspección y formulación de proyectos en el marco de la Emergencia Nacional por los huracanes ETA e IOTA.
- Mediante Oficio No. SE-SEDECOAS-FHIS-318/2020 de fecha 23 de noviembre de 2020 la Secretaría de Finanzas recibe la primera solicitud de ampliación de Plazo por dos años del Programa en su Fase IV, es decir hasta el 30 de noviembre de 2022, esto a raíz de los desfases del Programa en su concepción inicial, desfases en cronograma de ejecución producto de la paralización de los proyectos a causa de la Pandemia del COVID-19 y las tormentas tropicales ETA e IOTA, los cuales quedaron proyectos pendientes de inicio así como las actividades de capacitación del componente de fortalecimiento, lo cual de acuerdo al análisis la SEFIN otorgó la ampliación solicitada.
- Finalmente, la SEFIN aprueba modificación presupuestaria, en atención al Oficio No.SE-SEDECOAS-FHIS-319/2020 de fecha 24 de Noviembre del presente año, mediante el cual el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), donde solicita a esta Secretaría de Estado autorizar el traslado de asignaciones consignadas en el Proyecto denominado Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar (PROMINE) Fase IV, con el propósito de honrar compromisos contractuales pendientes de pago por la realización de obras de infraestructura por un monto de L 4,090,289.00.

Conclusiones

- La ejecución presupuestaria al cierre del año 2020 experimentó una ejecución acumulada del 63%, relativo a L 303,297,378 con respecto al presupuesto vigente de L 483,134,402, cabe mencionar que el presupuesto disponible final tomando en cuenta la contención del gasto fue de L453,836,469.00.
- El monto reservado ascendió a L 29,297,933.00 como medida de racionalización del gasto público, derivado por la caída de los ingresos, de la Pandemia causada por el COVID-19 y los fenómenos naturales como los huracanes Eta e Iota.
- Para este trimestre se realizaron modificaciones presupuestarias entre proyectos de la misma institución con el fin de ir cubriendo las metas establecidas por el ajuste de la programación de acuerdo a los planes operativos ajustados de cada uno de los proyectos.

Recomendaciones

- Ante las ampliaciones de cierre de los proyectos, se recomienda realizar una ruta crítica, ya que con ella se puede tomar medidas correctivas en tiempo y forma sin ningún problema de retraso, en vista que esto incurre en costos adicionales al Gobierno de Honduras.
- Coordinar gestiones para acelerar la ejecución física y financiera de los proyectos, tomar acciones correctivas, ceder espacio presupuestario a otros proyectos en vista de lo reprogramado con el objetivo de alcanzar las metas establecidas en los Planes Operativos Anuales institucionales.

SECRETARÍA DE FINANZAS

ANEXO No. 04

SECRETARÍA DE FINANZAS

Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE 2020

Cifras en Lempiras

No.	Gabinete / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Devengado Anual				Devengado IV Trimestre			
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./ Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./ Vig.)
6	0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social			35,042,089	469,117,482	504,159,571	22,980,263	460,154,139	483,134,402	14,531,153	288,766,225	303,297,378	63%	8,049,479	168,389,093	176,438,572	37%
1	008 - PROGRAMA MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SU GESTIÓN LOCAL	2014 67 414 (KFW) / FHS - SE	05/04/2013 -	2,824,000	9,995,100	12,819,100	1,109,007	117,469,594	118,578,601	22,875	98,430,109	98,452,984	83%	22,875	98,430,109	98,452,984	83%
		BMZ 2016 68 763	30/11/2022	-	-	-	1,082,000	9,995,100	11,077,100	-	-	-	0%	-	-	-	0%
		SE/FHS VIII No.2008-66-178		1,298,432	121,790,245	123,088,677	461,917	24,310,851	24,772,768	457,785	24,310,848	24,768,633	100%	-	-	-	0%
	Total 008 - PROGRAMA MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SU GESTIÓN LOCAL			4,122,432	131,785,345	135,907,777	488,924	131,785,345	132,274,269	480,660	122,740,956	123,221,616	93%	22,875	98,430,109	98,452,984	74%
2	011 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA	522-0501-4	19/10/2017 - 19/10/2021	28,651,501	116,670,790	145,322,291	22,491,339	116,670,790	139,162,129	14,050,493	46,628,188	60,678,682	44%	8,026,604	6,378,096	14,404,700	10%
	Total 011 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA			28,651,501	116,670,790	145,322,291	22,491,339	116,670,790	139,162,129	14,050,493	46,628,188	60,678,682	44%	8,026,604	6,378,096	14,404,700	10%
3	012 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS	ATNOC-17135-HO	01/10/2018 - 01/10/2023	-	4,889,760	4,889,760	-	4,889,760	4,889,760	-	1,338,850	1,338,850	27%	-	1,215,050	1,215,050	25%
		BID/4518/BL-HO		-	129,981,491	129,981,491	-	100,412,690	100,412,690	-	69,862,532	69,862,532	70%	-	34,161,806	34,161,806	34%
	Total 012 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS			-	134,871,251	134,871,251	-	105,302,450	105,302,450	-	71,201,382	71,201,382	68%	-	35,376,856	35,376,856	34%
4	014 - PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS	BMZ Nr. 2016 65348	06/12/2013 -	-	-	-	2,268,156	4,000,000	1,731,844	-	-	-	0%	-	-	-	0%
		KFW-CONVIR	31/12/2023	2,268,156	20,207,000	22,475,156	2,268,156	31,812,458	34,080,614	-	30,674,408	30,674,408	90%	-	24,013,446	24,013,446	70%
	Total 014 - PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS			2,268,156	20,207,000	22,475,156	-	35,812,458	35,812,458	-	30,674,408	30,674,408	86%	-	24,013,446	24,013,446	67%
5	047 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)	BCIE-1736	24/07/2012 - 30/09/2020	-	-	-	-	5,000,000	5,000,000	-	4,184,495	4,184,495	84%	-	-	-	0%
	Total 047 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)			-	-	-	-	5,000,000	5,000,000	-	4,184,495	4,184,495	84%	-	-	-	0%
6	060 - ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS	522-0502 Cd E No.9	31/10/2018 - 30/04/2021	-	65,583,096	65,583,096	-	65,583,096	65,583,096	-	13,336,794	13,336,794	20%	-	4,190,586	4,190,586	6%
	Total 060 - ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS			-	65,583,096	65,583,096	-	65,583,096	65,583,096	-	13,336,794	13,336,794	20%	-	4,190,586	4,190,586	6%

Fuente: SIAFI al 31/12/2020
