



★ ★ ★ ★ ★  
SECRETARÍA DE FINANZAS

**Secretaría de Finanzas**

**Dirección General de Inversiones Públicas**

# Informe de Avance Físico y Financiero

**SECRETARÍA DE DESARROLLO  
COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO  
(SEDECOAS/FHIS)**

Segundo Trimestre, 2021

Julio, 2021

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A.

## IV. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

### 4.1 EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Cuadro No. 05

#### Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del 2021

Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	1,482,326,322
Presupuesto Vigente	1,174,914,383
Devengado II Trimestre-2021	72,832,110
<b>% Ejecución (Devengado I Trim-2021 / Vigente)</b>	<b>6%</b>
Devengado Anual	105,361,906
<b>% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)</b>	<b>9%</b>
Comprometido (Devengado + Compromiso)	128,692,127
<b>% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)</b>	<b>11%</b>

Fuente: SIAFI, 30/06/2021


La Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS)-Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) cuya finalidad es la de promover el mejoramiento de las condiciones de vida de los grupos sociales marginados en el área rural y urbana, mediante el otorgamiento de financiamientos para programas y proyectos de desarrollo social o económico, con el propósito de aumentar su productividad, sus niveles de empleo y de ingresos y de contribuir a la satisfacción de sus necesidades básicas.

**Gráfico No. 06**

Presupuesto Vigente

Financiamiento por Organismo

Cifras en Millones de Lempiras

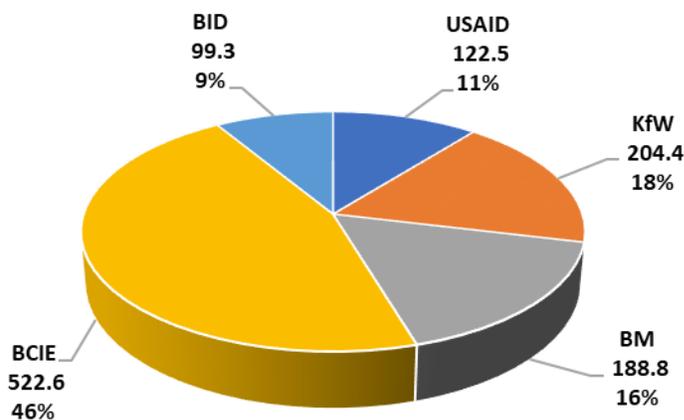

Al segundo trimestre del año 2021 la institución reportó un presupuesto vigente de inversión pública de **L 1,174,914,383** y la ejecución presupuestaria del trimestre asciende a un monto de **L 72,832,100** lo que representa el (6%) con relación al presupuesto vigente, de igual forma la ejecución más el compromiso asciende a **L 128,692,127** (11%) tal como se detalla en el Cuadro No. 5.

Del total del financiamiento, el 69.9% corresponde a fondos provenientes de crédito externo expresado en términos monetarios por un monto de L 821,119,655 y el 26.9% a recursos de donaciones externas por un monto de L 316,449,295; La contraparte nacional corresponde a gastos operativos con un presupuesto vigente de L 37,345,433. equivalente a 3.2%.

Dicha ejecución se llevó a cabo a través de (7) siete proyectos enfocados en Agua y Saneamiento, Electrificación Rural y Caminos Rurales, Infraestructura Social, Infraestructura Escolar, Fortalecimiento de Capacidades para Jóvenes, Recuperación de Espacios Públicos y Mejora de la Infraestructura Básica. Ver Detalle de Ejecución Financiera en Anexo No. 4

Con relación al presupuesto vigente con recursos externos para la ejecución de los proyectos ésta se distribuye por; BCIE con el 46%, KfW Banco Alemán con 18%, USAID con el 11%, BM 16% y BID con el 9%.

## 4.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión en el segundo trimestre del año 2021 se concentró en los siguientes proyectos:

- 1 Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y su Gestión Local (PROMINE).
- 2 Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB).
- 3 Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras (MIFE).
- 4 Proyecto Convivencia y Espacios Seguros para los Jóvenes en Honduras (CONVIVIR).
- 5 Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (ICS).
- 6 Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras (PIOH).
- 7 Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras (PRE).

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros de los principales proyectos de acuerdo a su presupuesto vigente:

### **Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y de su Gestión Local (PROMINE) FASE IV y V**

PROMINE tiene por objetivo general fortalecer la rectoría Sectorial en Infraestructura Educativa de la Secretaría de Educación y la gestión local participativa, así como mejorar el acceso de los alumnos y alumnas de las comunidades pobres al Centro Educativo de calidad que operan de manera sostenible. De esa manera se pretende contribuir al aumento de la eficiencia y de la calidad del sistema educativo (prebásico y básico).

Con relación a la Fase IV, actualmente se han considerado 44 proyectos de los cuales, 34 se encuentran formulados (de estos 29 están contratados y el resto en proceso de contratación), 7 en formulación, 2 no factibles y 1 pendiente de formulación.

Avance Físico al 30 de junio:

Los principales avances al II trimestre se describen a continuación:

- Se iniciaron todos los proyectos en el departamento de Gracias a Dios.
- Se han comenzado actividades previas para el inicio de la fase V.

A continuación, véase la ejecución histórica del Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y de su Gestión Local (PROMINE), segundo trimestre 2021:

## SECRETARÍA DE FINANZAS

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto*/	Inicio-Fin	
Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y de su Gestión Local (PROMINE)	SE/FHIS VIII No.2008-66-178 2014 67 414 (KFW) / FHIS - SE Fondos de Donación	1,608,626,596	10/07/2012 - 31/07/2023	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
II Trimestre 2021	126,155,838	196,848,639	26,431,228	13
Acumulado 2021	126,155,838	196,848,639	38,236,269	19
Acumulado Vida del Proyecto*/	1,608,626,596	1,608,626,596	1,107,755,542	69

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

### Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB)

Consisten en contribuir a mejorar la convivencia ciudadana en Honduras a través de la mejora en la calidad de vida en barrios vulnerables y la reducción de la incidencia de delitos violentos. Los objetivos específicos son: (I) mejorar el hábitat de barrios urbanos vulnerables, aumentando el acceso a infraestructura de servicios básicos y de prevención para disminuir delitos de robos y violaciones sexuales; (II) reducir los niveles de incidencia de homicidios y violencia intrafamiliar (VIF) en los municipios intervenidos mejorando los servicios de prevención y atención a víctimas de la violencia; y (III) mejorar la efectividad policial en investigación criminal, a través del incremento de la proporción de casos de homicidio con agresor identificado e informe de investigación aceptado por el Ministerio Público.

Avance Físico del Programa al 30 de junio de 2021:

#### Proyectos Integrales de Mejoramiento de Barrios.

- Los Proyectos de integración urbana el cual incluye: Ampliación, Mejoramiento y/o Construcción de sistemas de alcantarillado sanitario, agua potable, drenaje pluvial, mejoramiento vial y obras de mitigación de riesgos, al 30 de junio tienen el siguiente avance:
  - Proyecto de Integración Urbana Colonia 25 de enero 86%
  - Proyecto de Integración Urbana Colonia Nueva Australia 79%
  - Proyecto de Integración Urbana Colonia Nueva España 55%
  - Proyecto de Integración Urbana Colonia Nueva Galilea 62%
- El proyecto de equipamiento social el cual incluye las siguientes obras y avance físico:
  - Ampliación de Jardín De Niños Colonia Nueva España. 100%
  - Ampliación de La Escuela David Corea Sánchez. 100%
  - Construcción de Centro Comunal Colonia 25 de enero. 100%
  - Construcción de Centro Comunal Colonia Australia. 100%
  - Construcción de Centro Comunal Colonia Nueva Galilea. 100%
  - Reparación de Cancha Polideportiva Colonia Nueva Galilea. 100%

Se finalizó el diseño de obras del Proyecto de Integración Urbana en colonias Montes de los Olivos, Nueva Jerusalén No. 2, Brisas del Mogote Altos de la Quezada, La Huerta, Villas San Miguel, Brisas del Roble, y Altos del Mirador para un total de 3,035, predios. Se ha iniciado el proceso de licenciamiento ambiental.

## SECRETARÍA DE FINANZAS

A continuación, véase la ejecución histórica del Programa al segundo trimestre 2021:

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto*/	Inicio-Fin	
<b>Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB)</b>	BID/4518/BL-HO ATN/OC-17135-HO	369,377,190	01/10/2018 - 01/10/2023	
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Devengado</b>	<b>% Ejec.</b>
II Trimestre 2021	102,691,427	96,225,104	27,823,835	29
Acumulado 2021	102,691,427	96,225,104	46,122,922	48
Acumulado Vida del Proyecto*/	369,377,190	369,377,190	210,139,936	57

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto  
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

### Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras (MIFE)

Este Programa tiene como objetivo fortalecer la educación en Honduras para que los educandos tengan un acceso eficiente, con la permanencia necesaria en los Centros Educativos Media y sean promovidos con la calidad requerida. El programa estará localizado en los departamentos de: Atlántida, Choluteca, Colon, Comayagua, Copan, Cortes, El Paraíso, Francisco Morazán, Gracias a Dios, Intibucá, Islas de la Bahía, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Santa Bárbara, Valle, Yoro.

El Programa beneficiará 480 niños de Educación prebásica, 40,759 niños de Educación Básica y 43,801 jóvenes de Educación Media, haciendo un total de 85,040 educandos de los tres niveles del sistema educativo, así mismo 3,821 docentes de Educación Prebásica, 3,821 docentes de Educación Básica, 15,285 docentes de educación media, haciendo un total de 22,923 docentes. La duración del programa es de 4 años desde el 2020 hasta el 2023 donde habrá un desarrollo gradual de la infraestructura y la dotación de equipo, así como la formación permanente y la plataforma virtual para emprendimiento, con un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por US\$80,000,000.00

A continuación, véase la ejecución histórica del Programa al segundo trimestre 2021:

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto*/	Inicio-Fin	
<b>Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras (MIFE)</b>	BCIE - 2239	1,971,360,000	30/09/2020 - 30/09/2023	
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Devengado</b>	<b>% Ejec.</b>
II Trimestre 2021	973,686,940	522,588,163	-	-
Acumulado 2021	973,686,940	522,588,163	-	-
Acumulado Vida del Proyecto*/	1,971,360,000	1,971,360,000	-	-

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto  
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

El Programa MIFE a nivel de ejecución financiera no tiene ninguna que reportar y según su proyección iniciará ejecución hasta el III trimestre del presente año.

Sin embargo, ha tenido otros avances en otras actividades como:

1. Firma del Plan de Inicio con el PNUD para la compra de tabletas por el monto de \$4.62 millones de dólares, proceso que ya fue realizado y evaluado por el PNUD, donde se estarán desembolsando dicha cantidad una vez se apruebe la modificación presupuestaria solicitada.
2. Se realizó el proceso para la contratación de formuladores encontrándose el informe de adjudicación en previa revisión por parte del Organismo Financiador.

Los retrasos en la ejecución se deben:

1. No se ha contratado aún la Unidad Coordinadora con énfasis en el Coordinador General, Coordinador de Adquisiciones y Coordinador Financiero.

Entre otros proyectos ejecutados por la SEDECOAS/FHIS están:

### **Programa de Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes (CONVIVIR I y II)**

El programa abarca la construcción, el mejoramiento y el equipamiento de infraestructura social para jóvenes y espacios públicos, financiamiento y/o cofinanciamiento del trabajo con jóvenes y la capacitación de jóvenes, la capacitación de personal de las instituciones involucradas, las municipalidades seleccionadas, las comunidades de barrio y servicios de consultoría.

La ejecución de los proyectos es a través de Municipios Mancomunidades y Comunidades que interactúan en función a la ejecución de los proyectos, bajo la modalidad de Proyectos Ejecutados por la Comunidad (PEC) para lo cual son debidamente asesorados y capacitados. Los fondos destinados para la ejecución de este Programa en su Fase I son €10,000,000.00 y €6,000,000.00 de Fase II. El tipo de financiamiento es un contrato de Préstamo.

El Programa contó con un presupuesto vigente al segundo trimestre del 2021 de L 17,591,004 el presupuesto ejecutado es de L817,968.51 la Fase II aún no presenta ejecución al segundo trimestre el Programa en ambas fases alcanza un 4.6% de ejecución. Bajo la Fase I del Programa se logró priorizar 37 proyectos de los cuales dos (2) se encuentran en proceso de cierre financiero y administrativo, se logró alcanzar de manera directa 3556 jóvenes, logrando fortalecer sus competencias sociales y laborales, se estima que fueron desarrollados 28 procesos de formación en habilidades sociales y 56 procesos de formación en habilidades laborales con un total de 84 Capacitaciones. En cuanto a los procesos de emprendimiento Juveniles el programa logró identificar y fortalecer la capacidad de 96 jóvenes emprendedores en los 3 municipios.

De igual manera se han logrado identificar jóvenes en actividades con emprendimiento de tiempo completo y de medio tiempo, siendo 57 jóvenes que han logrado mantener su emprendimiento de tiempo completo. Se fortalecieron a 2,115 actores relevantes de los tres municipios y a nivel central institucional, con el propósito de instalar capacidades que mejoraron su intervención en el trabajo con juventud y comunidad, a través de capacitaciones y diplomados, se lograron desarrollar 110 procesos de formación. Cabe mencionar que esta Fase cerró el 30 de junio de 2021.

Avance Físico del Programa al 30 de junio de 2021:

El Programa CONVIVIR Fase II, actualmente se encuentra en proceso de inicio, por lo que a continuación se detallan datos importantes de sus avances:

- Tiene fecha de inicio del 14 de julio del año 2021, el cual inicia con la presencia de la Asistencia Técnica.
- Actualmente se reprogramo el POA 2021, tomando en cuenta los tiempos de los procesos para la ejecución de los fondos.

A continuación, véase la ejecución histórica del Programa al segundo trimestre 2021:

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto*/	Inicio-Fin	
<b>Proyecto Convivencia y Espacios Seguros para los Jóvenes en Honduras (CONVIVIR)</b>	KFW-CONVIVIR BMZ Nr. 2016 65348 Crédito Externo	466,400,000	06/12/2013 - 31/12/2023	
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Devengado</b>	<b>% Ejec.</b>
II Trimestre 2021	27,230,004	17,591,004	-	-
Acumulado 2021	27,230,004	17,591,004	-	-
Acumulado Vida del Proyecto*/	466,400,000	466,400,000	289,688,149	62

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

### Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (USAID/ICS)

El propósito del Programa es incrementar la resiliencia de las comunidades y los individuos a la violencia y al crimen a través de mejoras en la infraestructura pública de pequeña escala. Esto incluye el mejoramiento en las estructuras comunitarias que mitiguen el crimen eliminando o disminuyendo el riesgo de oportunidad, creando espacios comunitarios más seguros, aumento en los servicios de calidad que protejan contra la violencia, mejoramiento en la participación de los sistemas de seguridad y rendimiento de justicia nacional y municipal, mejoramiento en la participación ciudadana con los sectores de justicia y seguridad.

Monto del Convenio actual es de \$9,622,517.75, de los cuales, fondos de donación de USAID: \$7,698,014.20; fondos de contraparte de Gobierno de Honduras: \$1,924,503.55, al 30 de junio contó con un presupuesto vigente de L 90,509,866.00 y una ejecución acumulada de L 16,956,482.58 que representó el 19%, recursos invertidos para la rehabilitación de seis (6) centros escolares y dos (2) Unidades Departamentales de Prevención y Seguridad Comunitaria de la Policía Nacional y un (1) proyecto para fortalecer el sistema de salud, según Decreto Legislativo No. 77-2020.

Avance Físico del Programa al 30 de junio de 2021:

Se llevaron a cabo capacitaciones a los comités y personal de mano de obra en temas de Bioseguridad, también se ha fortalecido a la comunidad en temas de Género, cumpliendo los indicadores del Plan de monitoreo y Plan de Género del programa.

A continuación, véase la ejecución histórica del Programa al segundo trimestre 2021:

SECRETARÍA DE FINANZAS

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto*/	Inicio-Fin	
<b>Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (USAID/ICS)</b>	522-0501-4 Donación Externa	226,129,167	19/10/2017 - 30/09/2022	
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Devengado</b>	<b>% Ejec.</b>
II Trimestre 2021	198,677,019	90,509,866	15,348,781	17
Acumulado 2021	198,677,019	90,509,866	16,956,483	19
Acumulado Vida del Proyecto*/	226,129,167	226,129,167	115,587,872	51

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto  
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

**Proyecto de Respuesta a Emergencia Generados por los Huracanes Eta e Iota (PRE)**

Tiene como objetivo Coordinar, impulsar y fortalecer capacidades para el conocimiento del riesgo, reducción del mismo y manejo de desastre, como una estrategia para mejorar la eficiencia en la preparación para la respuesta y la recuperación post desastre naturales.

Su propósito es la atención de la infraestructura dañada por el Huracán y Tormenta Tropical ETA: rehabilitación de pasos y caminos terciarios, reparación y construcción de cajas puentes rehabilitación y construcción de sistemas de drenaje, puentes (Bailey), construcción de calles terciarias, obras de mitigación entre otras.

Monto del Convenio actual es de \$ 150,000,000 recursos provenientes de crédito externo, al 30 de junio contó con un presupuesto vigente de L 188,804,388.00 sin ejecución a la fecha.

**4.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN**

- La SEFIN autoriza modificación presupuestaria tipo aprovechamiento de espacio presupuestario con el propósito de crear el espacio presupuestario del Proyecto de Recuperación por la Emergencia a Causa de los Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras (PRE), en el marco del Convenio de Crédito Externo No.AIF 6822-HN disminuyendo el espacio del Proyecto "Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras (MIFE)" financiado del Convenio de Crédito Externo No.2239-HO, la creación de espacio presupuestario es necesario para la incorporación y puesta en marcha del proyecto de atención de la emergencia antes mencionado, movimiento por un monto de L 188,804,388.00.
- La SEFIN autoriza la presente modificación tipo aprovechamiento de espacio presupuestario en atención al Oficio No.SE-SEDECOAS-FHIS-319/2021 de fecha 16 de junio del presente año, con el propósito de disminuir asignaciones del Proyecto "Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras (MIFE), para ampliar el espacio presupuestario del Proyecto Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB), por un monto de L 21,000,000.00.
- La SEFIN autoriza la presente modificación presupuestaria en atención al Oficio No.SE-SEDECOAS-FHIS-320/2021 de fecha 16 de junio 2021, mediante el cual el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), requiere traslado entre líneas presupuestarias

correspondiente a asignaciones consignadas en el Proyecto Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB), por un monto de L 7,600,000.00.

- De fecha 17 de junio de 2021 mediante Oficio No. PCCMB SEDECOAS-FHIS-188-2021 la SEFIN autoriza modificación presupuestaria entre categorías programáticas del convenio de préstamo 4518BL/HN del Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios, para cubrir ejecución de actividades, por un monto de L 3,130,000.00.
- Mediante Memorando DGIP-PROGSEG-0227-2021 de fecha 24 de junio 2021 emitido por la Dirección General de Inversión Pública, se solicita proceder con las gestiones de incorporación presupuestarias en ingresos y gastos de fondos de fuente 21 Crédito Externo provenientes del organismo financiador Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), de acuerdo a la información proporcionada por la Dirección de Política Macro Fiscal en atención a la cláusula de excepción contenida en el Decreto Legislativo 027-2021 del 13 de mayo de 2021, se amplió el techo del déficit fiscal del SPNF así como el techo de financiamiento por lo que el monto a incorporarse L 26,900,000.00.

### Conclusiones

- La ejecución presupuestaria al segundo trimestre del año 2021 experimentó una ejecución acumulada de solamente 6%, relativo a L 72,832,110.00 con respecto al presupuesto vigente de L 1,174,914,383, cabe mencionar que el presupuesto devengado y comprometido asciende a L 128,692,127.00.
- Para este trimestre se realizaron modificaciones presupuestarias entre proyectos de la misma institución con el fin de ir cubriendo las metas establecidas por el ajuste de la programación de acuerdo a los planes operativos ajustados de cada uno de los proyectos.
- Se incorporó para este trimestre el Proyecto de Respuesta a Emergencia Generados por los Huracanes Eta e Iota (PRE) asignándole un presupuesto de L 188,804,388.00, mediante aprovechamiento de espacio presupuestario del Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras (MIFE) de la misma institución.

### Recomendaciones

- Agilizar los procesos de formulación de los nuevos proyectos con el objetivo de entregar oportunamente los beneficios a la población objetivo, básicamente aquellas personas que han sufrido por emergencias naturales y de salud.
- Coordinar gestiones para acelerar la ejecución física y financiera de los proyectos, tomar acciones correctivas, ceder espacio presupuestario a otros proyectos en vista de lo reprogramado con el objetivo de alcanzar las metas establecidas en los Planes Operativos Anuales institucionales.

# SECRETARÍA DE FINANZAS

## ANEXO 4

Secretaría de Finanzas

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE, 2021

Cifras en Lempiras

No.	Gabinete / Institución / Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado (Devengado Anual)			
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejec. (Dev./Vig.)
<b>1</b>	<b>EDUCACION</b>		<b>6,962,055</b>	<b>119,193,783</b>	<b>126,155,838</b>	<b>5,962,055</b>	<b>190,886,584</b>	<b>196,848,639</b>	<b>97,250</b>	<b>38,139,019</b>	<b>38,236,269</b>	<b>19%</b>
<b>1</b>	<b>0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social</b>		<b>6,962,055</b>	<b>119,193,783</b>	<b>126,155,838</b>	<b>5,962,055</b>	<b>190,886,584</b>	<b>196,848,639</b>	<b>97,250</b>	<b>38,139,019</b>	<b>38,236,269</b>	<b>19%</b>
1	008 - PROGRAMA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SU GESTION LOCAL	2014 67 414 (KFW)/ FHS - SE	-	-	-	1,988,953	81,811,681	83,800,634	97,250	38,139,019	38,236,269	46%
		BMZ 2016 68 763	6,962,055	119,193,783	126,155,838	3,973,102	109,074,903	113,048,005	-	-	-	0%
<b>3</b>	<b>PROTECCION SOCIAL</b>		<b>27,294,374</b>	<b>1,196,380,320</b>	<b>1,223,674,694</b>	<b>27,294,374</b>	<b>645,103,515</b>	<b>672,397,889</b>	<b>4,559,202</b>	<b>13,447,780</b>	<b>18,006,983</b>	<b>3%</b>
<b>3</b>	<b>0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social</b>		<b>27,294,374</b>	<b>1,196,380,320</b>	<b>1,223,674,694</b>	<b>27,294,374</b>	<b>645,103,515</b>	<b>672,397,889</b>	<b>4,559,202</b>	<b>13,447,780</b>	<b>18,006,983</b>	<b>3%</b>
1	011 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA	522-0501-4	27,294,374	171,382,645	198,677,019	19,305,249	71,204,617	90,509,866	3,508,702	13,447,780	16,956,483	19%
2	013 - PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y FORMACION EDUCATIVA EN HONDURAS	BCIE - 2239		973,686,940	973,686,940		522,588,163	522,588,163				0%
3	060 - ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS	522-0502 Cd E No.9	-	51,310,735	51,310,735	7,989,125	51,310,735	59,299,860	1,050,500		1,050,500	2%
<b>2</b>	<b>SEGURIDAD Y DEFENSA</b>		<b>4,578,004</b>	<b>127,917,786</b>	<b>132,495,790</b>	<b>4,089,004</b>	<b>112,774,463</b>	<b>116,863,467</b>	<b>-</b>	<b>49,118,655</b>	<b>49,118,655</b>	<b>42%</b>
<b>2</b>	<b>0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social</b>		<b>4,578,004</b>	<b>127,917,786</b>	<b>132,495,790</b>	<b>4,089,004</b>	<b>112,774,463</b>	<b>116,863,467</b>	<b>-</b>	<b>49,118,655</b>	<b>49,118,655</b>	<b>42%</b>
1	012 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS	ATNOC-17135-HO		2,574,359	2,574,359		3,047,359	3,047,359		2,177,764	2,177,764	71%
		BID/4518/BL-HO		102,691,427	102,691,427		96,225,104	96,225,104		46,122,922	46,122,922	48%
2	014 - PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS	BMZ Nr. 2016 65348	4,578,004	22,652,000	27,230,004	4,089,004	13,502,000	17,591,004				0%
		KFW-CONVIVIR		-	-		-	-		817,969	817,969	0%
<b>1</b>	<b>TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>188,804,388</b>	<b>188,804,388</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>1</b>	<b>0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>188,804,388</b>	<b>188,804,388</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
1	001 - Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras.	6822-HN					188,804,388	188,804,388				0%
<b>7</b>	<b>Total general</b>		<b>38,834,433</b>	<b>1,443,491,889</b>	<b>1,482,326,322</b>	<b>37,345,433</b>	<b>1,137,568,950</b>	<b>1,174,914,383</b>	<b>4,656,452</b>	<b>100,705,454</b>	<b>105,361,906</b>	<b>9%</b>

Fuente: SIAFI
