



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE FINANZAS

# **Informe General de la Inversión Pública Al III Trimestre, Año 2021**

**Tegucigalpa M.D.C**

**Honduras C.A.**

**Octubre, 2021**

# Contenido

INVERSIÓN PÚBLICA AL TERCER TRIMESTRE DEL 2021 .....	1
PRESENTACION .....	1
I. ANÁLISIS GLOBAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA AL TERCER TRIMESTRE 2021 ..	2
1.1 Inversión Pública Global 2021 .....	2
1.2 Programas y Proyectos de Inversión Pública por Estructura del Sector Público ..	5
1.3 La Inversión Pública a Nivel de Sector de Inversión.....	6
1.4 Inversión Ejecutada a Nivel de Fideicomisos y Alianza Público Privadas (APP's).....	7
1.5 Financiamiento de la Inversión .....	7
1.6 Ejecución Física a Nivel de Sectores .....	8
a) SECTOR CARRETERAS .....	8
b) SECTOR DE PROTECCIÓN SOCIAL .....	11
c) SECTOR ENERGÍA.....	16
d) SECTOR EDUCACIÓN .....	18
e) SECTOR SALUD.....	21
f) SECTOR DESARROLLO PRODUCTIVO Y RIEGO.....	23
g) SECTOR SEGURIDAD Y DEFENSA .....	27
h) SECTOR RECURSOS FORESTALES Y AMBIENTE .....	29
i) SECTOR MODERNIZACIÓN DEL ESTADO.....	32
j) SECTOR TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS.....	34
1.7 Factores que han Incidido en la Ejecución de la Inversión Pública, para el Tercer Trimestre del Año 2021.....	35

## INVERSIÓN PÚBLICA AL TERCER TRIMESTRE DEL 2021

### PRESENTACION

El presente apartado, muestra el análisis del comportamiento de la ejecución física y financiera de la Inversión Pública correspondiente al Tercer Trimestre del ejercicio fiscal 2021. Este documento es elaborado por la Dirección General de Inversiones Públicas (DGIP) de la Secretaría de Finanzas (SEFIN) en el marco de sus competencias como ente técnico coordinador del Programa de Inversión Pública (PIP).

El monto aprobado por el Congreso Nacional para la Inversión Pública (PIP) para el ejercicio fiscal asciende a **L24,023.4 millones**, el cual incluye **L12,408.1 millones** para el Programa de Inversión Pública; se adiciona la inversión bajo la modalidad de Asociación Público Privada por un monto de **L3,048.8 millones**, así como el Programa de Solidaridad y Protección Social para la Reducción de la Pobreza, que asciende a **L4,500.0 millones**, **L2,850.0 millones** para proyectos de Infraestructura Vial y **L1,087.3 millones** del Fideicomiso de Inversiones y Asignaciones (FINA), de igual manera Fideicomiso Nacional de Apoyo y Promoción del Deporte **L40.0 millones**, Fideicomiso: Mejoramiento de la Infraestructura Vial de los Departamentos de Colón y Atlántida **L39.2 millones** y Fideicomiso: Mejoramiento de la Infraestructura y Servicios del Departamento de Islas de la Bahía por un monto de **L50.0 millones**.

Al Tercer Trimestre del 2021, la Inversión Pública, alcanzó un presupuesto Vigente de **L26,508.4 millones**, un incremento significativo con relación al Presupuesto Aprobado con el objetivo de reactivar la economía nacional para la ejecución de **119** proyectos de los cuales el último trimestre se incorporaron proyectos de agua potable, protección social y salud como el Proyecto de Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana, incremento en el Fideicomiso de Reducción de la Pobreza, Proyecto de Respuesta a Emergencia Honduras COVID-19 entre otros, incluidos cinco proyectos financiados a través de la modalidad Asociaciones Público-Privadas (APP) **L2,590.4 millones** y seis proyectos bajo el mecanismo de ejecución de Fideicomisos; el Fideicomiso de Infraestructura Vial **L3,454.5 millones**, Fondo Social para la Reducción de la Pobreza (Vida Mejor) **L6,220.0 millones**, Fideicomiso de Inversiones y Asignaciones (FINA) **L656.6 millones**, Fideicomiso: Mejoramiento de la Infraestructura y Servicios del Departamentos de Islas de la Bahía **L50.0 millones**, Fideicomiso: Mejoramiento de la Infraestructura Vial de los Departamentos de Colón y Atlántida **L39.2 millones**, y Fideicomiso Nacional de Apoyo y Promoción del Deporte **L40.0 millones**; y 86 proyectos que conforman el Programa de Inversión Pública (PIP), que están registrados en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIPH) con un presupuesto vigente de **L13,457.7 millones**.

El presupuesto vigente de la Inversión Pública al Tercer Trimestre refleja un incremento global de **L2,485.0 millones**, respecto al presupuesto aprobado, esto debido al incremento por la cantidad de **L1,720.0 millones** en el Fideicomiso Fondo Social Reducción de la Pobreza (Vida Mejor), así como un aumento en el Fideicomiso de Infraestructura Vial de **L604.5 millones**, así mismo, el PIP también reporta un aumento de **L1049.7**, producto de incorporaciones presupuestarias para la reactivación económica, llegando a un presupuesto vigente de **L13,457.7 millones**, también se puede observar disminuciones en el Fideicomiso de Inversiones y Asignaciones (FINA) por la cantidad de **L430.7 millones**, de igual manera se observa una reducción de **L458.4** en los Proyectos Alianza Público Privada (APP's), producto de ajustes y reasignaciones presupuestarias.

## I. ANÁLISIS GLOBAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA AL TERCER TRIMESTRE 2021

### 1.1 Inversión Pública Global 2021

El presupuesto global de la Inversión Pública al Tercer Trimestre del 2021 reporta un presupuesto vigente de **L26,508.4 millones** que representa el **4.3% del PIB<sup>1</sup>** para el 2021, el cual muestra un incremento global de **L2,485.0 millones** respecto al presupuesto aprobado por el Congreso Nacional.

Cuadro No. 01  
Inversión Pública por Institución al mes de septiembre de 2021  
Cifras en Millones de Lempiras

INSTITUCION	Presupuesto	Presupuesto	Ejecutado	% Ejecución
	Aprobado	Vigente	Devengado	(Dev./Vig.)
0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social	1,482.3	1,141.0	307.5	27.0%
0028 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal	99.1	32.2	2.5	7.9%
0030 - Secretaría de la Presidencia	0.0	4.7	0.0	0.0%
0031 - Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)	2,003.2	1,870.0	1,175.1	62.8%
0037 - Servicio de Administración de Rentas	291.0	100.9	50.3	49.9%
0041 - Comisión Permanente de Contingencias	0.0	23.6	18.1	76.6%
0050 - Secretaría de Educación	311.7	203.8	8.2	4.0%
0060 - Secretaría de Salud	459.7	1,412.7	926.0	65.6%
0070 - Secretaría de Seguridad	412.1	434.3	114.2	26.3%
0100 - Secretaría de Finanzas	162.0	165.0	63.3	38.4%
0120 - Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	618.4	817.5	462.6	56.6%
0130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social	86.7	55.4	38.2	68.9%
0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería	876.2	851.4	154.1	18.1%
0144 - Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible	51.5	51.5	0.0	0.0%
0180 - Registro Nacional de las Personas	101.5	796.8	775.7	97.4%
0240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social	992.3	1,317.1	910.2	69.1%
0244 - Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer	9.2	12.9	5.8	44.9%
0402 - Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras	577.4	881.8	251.3	28.5%
0703 - Universidad Nacional de Agricultura	5.2	5.4	2.5	46.7%
0801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica	1,722.5	1,722.5	303.3	17.6%
0803 - Empresa Nacional Portuaria	20.4	21.9	0.3	1.3%
1801 - Alcaldía Municipal del Distrito Central	0.0	567.3	116.5	20.5%
<b>Sub-Total Programas y Proyectos</b>	<b>10,282.4</b>	<b>12,489.6</b>	<b>5,685.9</b>	<b>45.5%</b>
1801 - Alcaldía Municipal del Distrito Central	281.1	0.0	0.0	0.0%
0449 - Reserva Presupuestaria para Proyectos	1,844.5	968.2	0.0	0.0%
<b>Total Programa de Inversión de Pública (PIP)</b>	<b>12,408.0</b>	<b>13,457.7</b>	<b>5,685.9</b>	<b>42.3%</b>
Fondo Social Reducción de la Pobreza (Vida Mejor)	4,500.0	6,220.0	2,915.1	46.9%
Superintendencia de Alianza Público Privada (Proyectos APP's)	3,048.8	2,590.4	644.8	24.9%
Programa de Infraestructura Vial	2,850.0	3,454.5	1,882.8	54.5%
Fideicomiso de Inversiones y Asignaciones (FINA II)	1,087.3	656.6	188.9	28.8%
Infraestructura y Servicios del Departamento de Islas de la Bahía	50.0	50.0	19.9	39.9%
Infraestructura Vial de los Departamentos de Colón y Atlántida	39.2	39.2	0.0	0.0%
Apoyo y Promoción del Deporte (FINAPRODE)	40.0	40.0	0.0	0.0%
<b>Sub-Total Inversión en Fideicomisos y APP's</b>	<b>11,615.3</b>	<b>13,050.7</b>	<b>5,651.5</b>	<b>43.3%</b>
<b>TOTAL PLAN INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>24,023.3</b>	<b>26,508.4</b>	<b>11,337.5</b>	<b>42.8%</b>

Fuente: SIAFI, al 30 de septiembre de 2021


Cifras proyectadas, proporcionadas por la Dirección de Contingencias Fiscales, Superintendencia de Alianza Público-Privada (SAPP). Circular No.CGG-002-2021, No. CGG-354-2021, emitidas por la SCGG en cumplimiento al Decreto Ejecutivo PCM-044-2019.

<sup>1</sup> El Producto Interno Bruto (PIB) estimado para el año 2021 asciende a L657,737,000,000, según cifra proporcionadas por la DPMF/SEFIN.

El Plan de Inversión Pública en su conjunto, muestra una ejecución financiera al 30 de septiembre del 2021 de **L11,337.5** millones reflejando un **42.8%** de ejecución a nivel de ejecutado devengado, para la ejecución de los 119 proyectos públicos. En el caso específico del Programa de Inversión Pública (PIP) se observa un incremento en la ejecución presupuestaria de 19.0 puntos porcentuales en comparación con la ejecución al III Trimestre del 2020 (L2,567.7 en valores monetarios), lo anterior se debe a que a septiembre del 2020 la economía del país se encontraba prácticamente paralizada por la llegada de la pandemia COVID-19 en el tercer trimestre de ese año.

El desempeño de la ejecución de la Inversión Pública al Tercer Trimestre del 2021 a nivel de ejecutado global muestra un aumento de 13.3 puntos porcentuales (L3,664.1 en términos monetarios) en comparación con el tercer trimestre del año 2020, cabe mencionar que la ejecución del año 2019 fue muy similar a la de 2021, lo anterior se debe a retrasos en las ejecuciones de los fideicomisos que forman parte de la inversión pública en gran medida ocasionados por la Emergencia Sanitaria declarada por el Gobierno de Honduras a través del Decreto PCM-05-2020, ampliado y modificado a través del Decreto PCM-023-2020 y PCM-146-2020 al 31 de diciembre del 2021, mediante el cual se proroga la vigencia de la declaratoria de Estado de Emergencia a nivel nacional, por los efectos de las fuertes lluvias ocasionadas por las Tormentas Tropicales “ETA” e “IOTA”, hasta el 31 de diciembre del 2021, decretada en todo el territorio nacional, en la infraestructura vial y sector productivo del País situación que ha ocasionado los lentos procesos de adquisiciones, la paralización de las obras ejecutadas por los proyectos, así como las actividades programadas en sus Planes Operativos Anuales por lo que se deberán de buscar mecanismos para agilizar la ejecución de proyectos para el último trimestre de 2021, ya que la baja ejecución impacta directamente en la economía del país.

Gráfico No.01  
Comparativo Inversión Pública 2020-2021  
Vigente/Ejecutado al III Trimestre  
Cifras en Millones de Lempiras

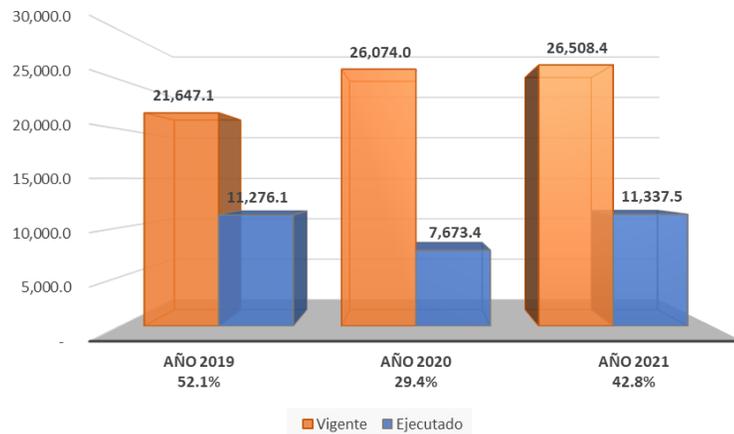

Honduras a través del Decreto PCM-05-2020, ampliado y modificado a través del Decreto PCM-023-2020 y PCM-146-2020 al 31 de diciembre del 2021, mediante el cual se proroga la vigencia de la declaratoria de Estado de Emergencia a nivel nacional, por los efectos de las fuertes lluvias ocasionadas por las Tormentas Tropicales “ETA” e “IOTA”, hasta el 31 de diciembre del 2021, decretada en todo el territorio nacional, en la infraestructura vial y sector productivo del País situación que ha ocasionado los lentos procesos de adquisiciones, la paralización de las obras ejecutadas por los proyectos, así como las actividades programadas en sus Planes Operativos Anuales por lo que se deberán de buscar mecanismos para agilizar la ejecución de proyectos para el último trimestre de 2021, ya que la baja ejecución impacta directamente en la economía del país.

En cuanto a la ejecución del Fondo Social Reducción de la pobreza (Vida Mejor) se reporta una ejecución de L2,915.1 millones alcanzando el 46.9% con relación a su presupuesto vigente y el Programa de Infraestructura Vial, por L1882.8 millones de ejecución alcanzando el 54.5% de ejecución con relación a su presupuesto vigente, proyectos de Alianzas Público Privadas por L644.8 millones y el Fideicomiso Mejoramiento de la Infraestructura y Servicios del Departamento de Islas de la Bahía por L19.9 millones, Fideicomisos de Inversiones y Asignaciones (FINA II) por un monto de ejecución e L188.9 millones, el resto de los Fideicomisos como el Fideicomiso Nacional de Apoyo y Promoción del Deporte (FINAPRODE), Fideicomiso de Mejoramiento de la Infraestructura Vial de los Departamentos de Colón y Atlántida y no presentan ejecución. Por otra parte, los proyectos que están registrados en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIPH) y que conforman el Programa de Inversión Pública (PIP) cuentan con una ejecución de L5,685.9 millones, representando un 42.3% respecto a su presupuesto vigente.

En el cuadro No.1 se ve reflejada la disminución debido a las proyecciones de los fondos de inversión bajo la modalidad de Asociación Público Privada (APP), por la cantidad de L458.4 millones, en el Fideicomiso de Inversiones y Asignaciones (FINA II) por un monto de L430.7 millones con relación a su presupuesto aprobado. Por otro lado, se reporta un incremento bastante significativo de L1,720.0 millones en el Fideicomiso Fondo Social de Reducción de la Pobreza y el Programa de Inversión Pública (PIP) de L1,049.7 millones.

Para principios del año 2021 la mayoría de los centros económicos del país, iniciaron con la apertura de sus negocios pero con restricciones y medidas de bioseguridad condicionadas por SINAGER, por lo que, la ejecución de los proyectos siempre se ve afectada a causa de la pandemia mundial ocasionada por el COVID-19 y en parte por las tormentas Eta e Iota que afectaron el norte del país el año 2020, repercusiones que impactan directamente en la ejecución de la Inversión Pública en su mayoría los proyectos orientados a generar un beneficio económico en el país.

En el Programa de Inversión Pública (PIP) se ejecutan programas y proyectos que contribuyen al incremento de los activos no financieros de las entidades que integran el Sector Público y los bienes y servicios de dominio público, con el fin de iniciar, ampliar, mejorar, modernizar, reponer o reconstruir la capacidad productiva de bienes y la prestación de servicios nacionales.

Adicionalmente, las restricciones en la aprobación de cuotas de compromiso durante el tercer trimestre del año, en cierta manera afectan la ejecución de los proyectos para honrar compromisos que no se encuentran en la proyección original de ejecución presupuestaria al 31 de diciembre del presente año en atención al Artículo 217 de las Disposiciones Generales de Presupuesto vigente. Dichas medidas han sido consideradas con el propósito de ejecutar fondos estrictamente para la emergencia nacional y controlar el gasto y déficit fiscal. Sin embargo, se han efectuado traslados de estructuras presupuestarias a fin de compensar espacio presupuestario para la incorporación de los recursos de crédito externo, con esto se pretende lograr que la ejecución de la Inversión Pública 2021 sea ejecutado conforme a la disponibilidad presupuestaria.

**Cabe señalar, que la responsabilidad de ejecutar los recursos es exclusiva de la Unidad Ejecutora, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2, numeral 34, del Reglamento de las Disposiciones Generales del Presupuesto Vigente (Acuerdo Ejecutivo No. 019-2021), Artículo 2, numeral 34 el cual literalmente dice:**

*"UNIDAD EJECUTORA: Es la unidad responsable de la ejecución, vigilancia y alcance de los objetivos y metas, con los recursos y los costos previstos. Desde el punto de vista de la administración presupuestaria constituye el área de una dependencia o entidad, con facultades para adquirir, contratar y cubrir compromisos. Esta figura orgánica y funcional se establece para efectos del ejercicio presupuestario, en su aceptación más amplia, representa el ente responsable de la administración y ejecución de los programas, sub programas y proyectos."*

Para el ejercicio fiscal 2021 en las Disposiciones Generales de Presupuesto Vigente, se incluyeron lineamientos específicos orientados a ordenar y agilizar la ejecución de proyectos, acorde a las restricciones fiscales, así como en la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, Control de las Exoneraciones y Medidas Anti evasión y la Ley de Responsabilidad Fiscal.


## 1.2 Programas y Proyectos de Inversión Pública por Estructura del Sector Público

El monto total de la Inversión Pública a nivel de presupuesto vigente al Tercer Trimestre del presente ejercicio fiscal, se concentra en su mayor parte en las instituciones de la **Administración Central**, con **91.3%**. Los proyectos que conforman el Programa de Inversión Pública (PIP) absorben el 50.8% de la Inversión Pública Total, el presupuesto vigente del PIP es de L13,457.7 millones, del total del PIP el 62% es absorbido por la siguientes instituciones; Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) quien posee el mayor presupuesto de inversión L1,870.0 millones seguido por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) con una inversión de L1,722.5, en orden descendente quien sigue es la Secretaría de Salud (SESAL) con un monto de L1,412.7 millones, Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS) con un monto de inversión de L1,317.9 millones, el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) con una inversión de L1,141.0 y la Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras con un monto de L881.8 millones; el resto de instituciones poseen un presupuesto vigente de inversión de L5,026.4 millones representando el 38% de la inversión total que conforman el Programa de Inversión Pública (PIP).

Los proyectos ejecutados bajo la modalidad de Fideicomisos, siendo el Fideicomiso Fondo Social Reducción de la Pobreza el de mayor monto vigente de inversión (L6,220.0 millones) abarcando el 23.5% del total de presupuesto vigente, seguido por los fideicomisos de Infraestructura Vial y los proyectos ejecutados bajo la modalidad Alianzas Público Privadas sumando en su conjunto L6,044.9 millones representativos del 22.8% del presupuesto Vigente; en su conjunto los proyectos ejecutados bajo la modalidad de Fideicomisos y Asociaciones Público Privadas, absorben una inversión de L13,050.7 millones (49.2%) del total de la inversión pública.

### Distribución del Inversión Pública por Estructura del Sector Público


La distribución del PIP para el año 2021 de acuerdo a la Clasificación del Sector Público se

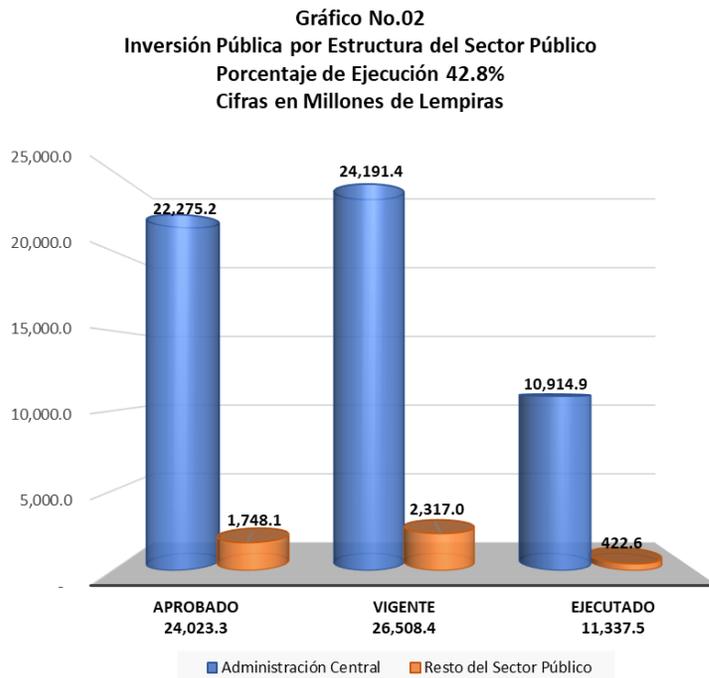

aprecia en el Gráfico No.2. El cual muestra un Presupuesto Aprobado por la cantidad de **L24,023.4 millones**; destinando para a la **Administración Central (AC) L22,275.3 millones** y el **Resto del Sector Público (RSP) L1,748.1 millones**; por otra parte; el Presupuesto Vigente asciende a **L26,508.4 millones** de los cuales **L24,191.4 millones** corresponden a la AC y **L2,317.0 millones** para el (RSP). Asimismo, refleja una ejecución de **L11,337.5 millones (L10,914.9 millones AC y L422.6 millones RSP)** representando un **42.8%** de ejecución presupuestaria con relación al presupuesto vigente total.

### 1.3 La Inversión Pública a Nivel de Sector de Inversión

En cuanto a la inversión Sectorial, el **Sector Protección Social** cuenta con el mayor porcentaje de inversión con **L8,284.5 Millones (31%)**. La institución que ejecuta proyectos en apoyo a este sector es La Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), con una inversión de 1,317.1 millones para la ejecución de algunos proyectos tales como: Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social (Bono Vida Mejor), Programa

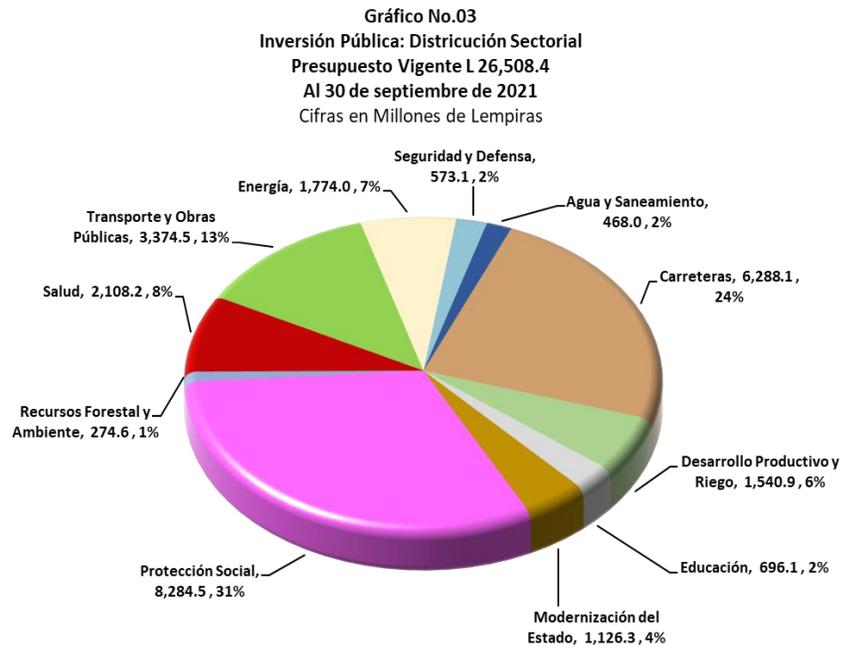

Apoyo a la Red de Inclusión Social con Prioridad en Occidente, Proyecto de Integración de la Protección Social, y otros programas de Atención a Personas con Capacidades Especiales y Adultos Mayores en Situación de Vulnerabilidad. Se incluye en este Sector el fideicomiso de Fondo Social para la Reducción de la Pobreza, apoyando las iniciativas de Gobierno tales como Criando con amor, Vivienda Saludable, Guías de Familia, Ecofogones, Merienda Escolar, Bolsa Solidaria Adulto Mayor, entre otras;

En el **Sector Carretero** con una inversión **L6,288.1 millones (24%)**, Las principales instituciones que concentran este sector son (INVEST-H) con una inversión de L1,870.0 millones para la ejecución de los principales proyectos Construcción del Corredor Logístico Villa de San Antonio-Goascorán Sección II y III, el Programa de Integración Vial Regional II, Rehabilitación y Mejoramiento del Corredor de Oriente, Carretera Tegucigalpa-Danlí, tramo Neteapa – Danlí entre otros, e (INSEP) con L817.5 millones, para ejecutar algunos de los proyectos como ser: Rehabilitación Vial del Corredor de Occidente: La Entrada - Copán Ruinas - El Florido y La Entrada - Santa Rosa de Copán, Construcción y Pavimentación Carretera Catacamas-Cuevas de Talgua, Construcción y Pavimentación con Concreto Hidráulico del Tramo Carretero Valladolid-La Virtud-Mapulaca con una Longitud Aproximada de 30 Km Localizado en el Departamento De Lempira, Corredor Turístico Distrito de los Lagos Etapa 1: Rehabilitación con Concreto Hidráulico Tramos: 1- Cañaverál-Río Lindo-Caracol Sección 1. Además, se incluye el Plan de Infraestructura Vial a través del Fideicomiso, los proyectos financiados a través de Alianzas Público Privada (APP's); para la ejecución del Corredor Lenca.

En el **Sector de Transporte y Obras Públicas** se reporta una inversión de **L3,374.5 millones (13%)** el cual incluye la ejecución de proyectos como: La Construcción Obras de Facilitación de Acceso al Recinto Portuario en Puerto Cortés (**ENP**). Asimismo, algunos proyectos de APP's como la construcción del Aeropuerto de Palmerola, obras complementarias del Centro Cívico Gubernamental (CCG), rehabilitación de los aeropuertos de S.P.S, la Ceiba e Islas de la Bahía.

Con una inversión en el **Sector Salud de L2,108.2 millones, (8%)**; para ejecutar proyectos principalmente en apoyo a la emergencia por el COVID-19, entre los principales proyectos se encuentran: Respuesta Inmediata de Salud para Contener y Controlar el Coronavirus (COVID-19) y Mitigar su Efecto en la Prestación del Servicio, en Honduras, Programa Apoyo a La Red de Inclusión Social con Prioridad en Occidente, Proyecto de Mejora de la Gestión, Calidad de los Servicios de Salud Materno-Neonatal y Apoyo para la Implementación del Plan Nacional de Introducción de la Vacuna contra el Coronavirus.

En el **Sector Energía L1,774.0 millones (7%)**; para la ejecución de los proyectos de: Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral-Río Lindo, Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Regional (MER). Electrificación Rural en Lugares Aislados y Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica.

El **Sector Productivo y Riego L1,540.9 millones, (6%)**; en apoyo a la población más vulnerable de la zona del corredor seco, con el proyecto Alianza Para El Corredor Seco (USAID- GAFSP), proyecto Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II, beneficiando a los agricultores mediante la cadena agrícola, Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur Occidental Pro-Lenca, y el apoyo productivo a través del Fideicomiso de Inversiones y Asignaciones (FINA 2) para la cosechas de agua.

#### **1.4 Inversión Ejecutada a Nivel de Fideicomisos y Alianza Público Privadas (APP's)**

Al Tercer Trimestre de 2021 según la información proporcionadas por la Dirección de Contingencias Fiscales mediante Memorando UCF-072-2021; Superintendencia de Alianza Público Privada (SAPP), Circular No. CGG-008-2021, No. CGG-781-2021 y No. CGG-GS-010-2021; emitidas por la SCGG en cumplimiento al Decreto Ejecutivo PCM-044-2019, la Ejecución nivel de fideicomisos y APP's, asciende a **L5,651.5 millones**, representando un 43.3% respecto al presupuesto vigente (**L13,050.7 millones**). Dicha ejecución corresponde al Fondo Social Reducción de la Pobreza (Vida Mejor), por la cantidad de **L2,915.1 millones** representando un **46.9%**, respecto al presupuesto vigente (**L6,220.0 millones**) según el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) y el Fideicomiso de Infraestructura Vial con una ejecución de **L1882.8 millones** representativo de **54.5%** de ejecución, respecto al presupuesto vigente (**L3,454.5 millones**), mientras que la Superintendencia de Alianzas Público Privadas reporta una ejecución de **L644.8 millones** representa **54.5%** en proyectos APP's, los cuales cuentan con presupuesto vigente de **L2,590.4** de ejecución, el resto de los fideicomisos no cuentan con ejecución en el presente trimestre.

#### **1.5 Financiamiento de la Inversión**

El **53.7%** de la Inversión Pública Global del Presupuesto Vigente es financiado por fuentes nacionales (*incluye Fideicomiso Vida Mejor, Infraestructura Vial, Apoyo al Deporte, Infraestructura a los departamentos de Islas de la Bahía, Colón y Atlántida, así como el Fideicomiso de Inversiones y Asignaciones (FINA II) y recursos para financiaran proyectos APP's*) y el **46.3%** por fondos externos; de estos el 92.3% es financiado por crédito externo (Fuente 21) y el **7.7%** por donaciones externas (Fuente 22). Principalmente con recursos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Banco Mundial (BM), Unión Europea (UE) y Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID). Ver cuadro No.2.

Las instituciones que concentran el mayor porcentaje de recursos, destacan Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS), orientado a la construcción de carreteras, Empresa Nacional de Energía Eléctrica para proyectos de energía, Fondo Hondureño de Inversión Social, Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, Secretaría de Agricultura y Ganadería para la construcción de sistemas de riego, planes de negocio, Fondo Social Reducción de la Pobreza (Vida Mejor, Microempresas) entre otras.

Cuadro No. 02

**Inversión Pública por Fuente de Financiamiento al mes de septiembre de 2021**

Cifras en Millones de Lempiras

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado Devengado	% Ejecución (Dev./ Vig.)
Nacionales	12,743.7	14,229.0	6,156.9	43.3%
Crédito Externo	9,861.5	11,338.8	4,821.6	42.5%
Donaciones Externas	1,418.2	940.6	358.9	38.2%
<b>Total Plan de Inversión</b>	<b>24,023.4</b>	<b>26,508.4</b>	<b>11,337.5</b>	<b>42.8%</b>

**Fuente:** SIAFI, al 30 de septiembre de 2021

En seguimiento a las Disposiciones Generales de Presupuesto del Año 2021, en su Artículo 27, que literalmente expresa que; *“Sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 36 de la Ley Orgánica del Presupuesto, para fines de agilizar la incorporación de los recursos externos provenientes de donaciones, el Formulario (FMP-05) denominado “Documento de Modificación Presupuestaria” generado por el SIAFI, tendrá el mismo efecto de una Resolución Interna y se adicionarán en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el presente Ejercicio Fiscal, siempre que se cuente con la contraparte nacional, cuando corresponda”*.

Los avances de la ejecución física respecto al PIP y a Nivel de Sector se muestran a continuación:

**1.6 Ejecución Física a Nivel de Sectores**

**a) SECTOR CARRETERAS**

Al tercer trimestre las distintas Instituciones del Sector registraron una ejecución acumulada de 47.7% con relación a su presupuesto vigente, para la ejecución de diferentes proyectos de construcción de carreteras ejecutados a través de INVEST-H e INSEP entre los cuales están:

**Proyectos ejecutados por Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H)**

- **Corredor Pacífico-Programa de Integración Vial Regional (BID\_2470/BL-HO-1 y BID\_2470BL-HO-2):** el 20 de septiembre, se hizo el llamado a Licitación Pública Nacional para ejecución de las: “Obras de Reparación de la Carretera CA-1, Tramo 2 Lote A: Júcaro Galán– Santa Elena (Desvío a Cedeño), Km. 40+680 – Km. 76+504, L = 35.824 Km”, del cual se esperan recibir ofertas el día 21 de octubre. Las obras de reparación tendrán una ejecución de tres (3) meses. La contratación de la firma Supervisora que estará a cargo de la supervisión de las obras de reparación, de acuerdo con la solución propuesta en los resultados del Estudio de Ingeniería

Forense de la Estructura de Pavimento desarrollado por el National Center for Asphalt Technology (NCAT), fue contratada el 14 de julio del presente año. De acuerdo con la planificación este proceso cerrará todas las actividades del programa en el mes de marzo 2022.

- **Programa de Integración Vial Regional II (BID 3815/BL-HO):** las obras de rehabilitación y ampliación a 4 carriles del tramo La Barca-Pimienta alcanzaron un avance físico y financiero del 100% en el año 2020. Se ha continuado trabajando en la gestión del traspaso de bienes a la Concesionaria Vial (COVI), se mantiene en proceso hasta terminar las reparaciones que la carretera requiere, efecto de las tormentas tropicales Eta e Iota, que afectaron el territorio nacional a mediados del mes de noviembre 2020 y que han dejado daños que deben ser reparados, recuperando los niveles de servicio contractuales para finalizar el traspaso de obras a COVI. Estas serán cubiertas con Fondos Nacionales.

Durante el mes de agosto 2021, se dio orden de inicio a la implementación de la Estrategia de Sostenibilidad para la Asociación de Mujeres Carpinteras “Ellas en acción”, la cual está a cargo de la Fundación para el Desarrollo Empresarial Rural (FUNDER), el objetivo de la consultoría es brindar asistencia técnica en temas de inclusión y sostenibilidad a la Asociación de Mujeres Carpinteras, en el mercado industrial de la región, con lo cual se pretende aportar un capital de trabajo, que sirva para la compra de materia prima, gastos de producción, gastos generales, pago de salarios, entre otros. El plazo de ejecución será de seis (6) meses; de conformidad con el diseño de la estrategia durante los primeros cinco (5) meses se financiará el funcionamiento del Taller de Carpintería, así como el pago de la asistencia de FUNDER, se estima que los últimos dos meses, la Asociación de Mujeres puedan tener un negocio auto sostenible con margen de ganancia para mejorar su calidad de vida.

- **Ampliación y Mejoramiento de Carretera CA-5 Norte, Segmentos I y II (Sección 2ª), Tramo Las Mercedes-Empalme Villa de San Antonio:** Al cierre del año 2020 se logró finalizar toda la obra física programada para el proyecto, pavimentando y ampliando a cuatro carriles 4.8 kilómetros del Corredor Logístico y actualmente se trabaja en la recepción final y el traspaso de las obras al Concesionario Vial para su respectivo mantenimiento.

#### **Proyectos ejecutados por la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP)**

- **Construcción y Pavimentación con Concreto Hidráulico del Tramo Carretero Valladolid - la Virtud-Mapulaca con Una Longitud Aproximada de 30 Km Localizado en el Departamento de Lempira, (FN-INSEP-23245):** Al cierre del tercer trimestre de 2021, el proyecto presenta un avance físico del 95.12%, teniendo pendiente la realización de las siguientes obras: limpieza, estructura de pavimento (losa de concreto), obras de drenaje menor, dos cajas puentes sobre las quebradas las Pozas y la hacienda, finalización de puentes sobre los ríos Joron y Mocal.

A finales del mes de agosto del presente año, la INSEP solicitó una ampliación de plazo del proyecto al 30 de junio de 2022 a través de Oficio DM 1248-2021 con el objetivo de lograr realizar el cierre físico y financiero del proyecto.

- **Rehabilitación Vial del Corredor de Occidente: la Entrada - Copán Ruinas - el Florido y la Entrada - Santa Rosa de Copán, (BCIE-2156, BEI-FI No.84859, DCI-ALA/2015/369-566, TA2015034 HN LIF):** La ejecución física del proyecto cuenta con los siguientes entregables:

1. Infraestructura: 119.07 kms. Rehabilitados.
2. Patrimonio Cultural: Rescate Arqueológico Lote 3.
3. Plan de Reasentamiento: Construcción de 67 viviendas a familias ubicadas en sitios vulnerables.
4. Seguridad Vial: Auditorias, capacitaciones de seguridad Vial/acompañamiento de TYPASA–AEC.
5. Convenio con los Pueblos Indígenas: Mejoramiento de caminos de accesos, obras menores de drenaje y Dotación de insumos agrícolas entre otros.
6. Elaboración de estudios en las diferentes fallas situadas a lo largo del proyecto

El proyecto tiene contemplado la realización de 25 obras de rehabilitación de daños ocasionados por las tormentas ETA e IOTA en los tramos 1, 2 y 3 del Corredor de Occidente, los cuales comenzarán sus procesos de contratación en el presente año y finalizarán la ejecución física y financiera en el año 2022.

- **Proyecto "Construcción y Pavimentación Carretera Catacamas-Cuevas de Talgua en el Departamento de Olancho, con una longitud aproximada de 8.93 Kilómetros"(Fondos Nacionales 0000003-13):** La ejecución física del proyecto presente el siguiente avance al 30 de septiembre:

- El proyecto al 30 de septiembre de 2022 presenta el siguiente avance físico:
- Construcción de 8.93 kilometres de carretera de concrete hidráulico Clase A, de 15 centímetros de espesor. En los primeros 0.975 kilometres se construyó a continuación de la sección típica del bulevar existente de 4 carriles (2 de cada lado).
- Pavimentación de la zona interna del estacionamiento del Parque Arqueológico Cuevas de Talgua con concrete hidráulico Clase A y 15 centímetros de espesor.
- Construcción de obras de drenaje menor que consistieron en la instalación de tuberías de concrete reforzado (TCR) de diferentes diámetros.
- Obras complementarias como ser: accesos, muros cabezales, cunetas revestidas, tragantes, bordillos, entre otros en el tramo del bulevar.

- **Construcción a Cuatro (4) Carriles del Bulevar de Comayagua, Etapa II: Estación 2+500 - Hacia Desvió de Ajuterique, con Una Longitud Aproximada de 1 Km, Localizado en la ciudad de Comayagua.** El proyecto a la fecha ha finalizado a su totalidad su ejecución física. Pendiente efectuar pagos finales de cierre del proyecto.

- **Plan de Implementación de Infraestructura Vial (Fideicomiso Vial):** Los proyectos que se ejecutan bajo la modalidad del Fideicomiso Vial no se encuentran registrados en el SNIPH debido a que en su mayoría corresponden a obras de mantenimiento de la Red Vial Pavimentada y No Pavimentada. En relación con los proyectos de la Dirección de conservación del Patrimonio Vial, al 30 de septiembre de 2021 la Dirección desarrollo las siguientes actividades:

En el **Programa de Acceso a Cabeceras Municipales de la Red Vial No Pavimentada**, inicio en el año 2019 teniendo como propósito principal, atender todas las carreteras no pavimentadas que conducen a todas las Cabeceras Municipales. Actualmente el Programa incluye un universo de 4,204.57 km, de los cuales se han intervenido 3,952.94 km acumulados, equivalente al 94.02% de lo programado. Para el 2021 la meta está establecida en 1,424 km de los cuales se han concluido 578 km, representando el 41% de avance al tercer trimestre 2021.

El **Programa de Acceso Zonas Productivas (Zonas Cafetaleras)** Grupo 1. La cantidad de kilómetros a atender bajo este Programa es de 1,520.50 km, distribuidos en 11 departamentos del país y agrupados 6 (Seis) Zonas y en 57 Lotes. En fechas anteriores se realizó el proceso de adjudicación y contratación de obras, donde posteriormente varios lotes fueron declarados fracasados, por lo que es necesario volver a realizar el proceso adecuado para su reactivación, originalmente se contrataron la cantidad de 1,089.78 km, iniciando su ejecución en el mes de enero del presente año.

Para la implementación del “**Programa de Apoyo al sector Productivo Cafetero y Aceleración Económica** (Grupo 2), el cual tiene su origen en el Decreto Legislativo No. 31-2020, y en la denominada Ley Especial de Aceleración Económica y Protección Social Frente a los Efectos del Coronavirus Covid-19, se requirió la contratación de empresas consultoras y constructoras, que desarrollen obras de limpieza de derecho de vía, remoción de derrumbes menores, suministro, transporte y colocación de alcantarillas TCR 30" Ø, limpieza de alcantarillas y otras estructuras de drenaje, conformación de carretera de tierra, construcción, reparación y mantenimiento de estructuras menores, conformación de carretera balastada sin reposición de dicho material, reposición de capa balasto 15.00 cm, reparación de zonas inestables y la consideración de trabajos imprevistos. Las obras que serán construidas están distribuidas en 13 departamentos del país y agrupados 8 (ocho) Zonas en 21 Lotes.

Para ambos programas de Café, la programación para el 2021 es de 2,532 km de los cuales se han concluido 1,971 km representando el 78% de avance hasta el tercer trimestre 2021.

En relación con el Programa “**Estudios y Diseños de Pavimentación de Accesos a Cabeceras Municipales y Zonas Turísticas**” **Red Vial Oficial No Pavimentada**, con este Programa se planifica que en un periodo de seis años sean mejorados aproximadamente 3,000 km para conectar eficientemente a 180 Cabeceras Municipales.

## **b) SECTOR DE PROTECCIÓN SOCIAL**

Los principales rubros de inversión están destinadas a inversión en desarrollo humano en las poblaciones más vulnerables. Al tercer trimestre se cuenta con una ejecución acumulada de 48.7% con relación a su presupuesto vigente de acuerdo a las distintas Instituciones del Sector, registran los siguientes avances físicos:

### **Proyectos Ejecutados por Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS)**

- **Programa de Apoyo a la Red de Protección Social III (3371/BL-HO):** Avance al 30 de septiembre del **Componente V:** Centros Educativos de Educación Básica con

Instalaciones, en el tercer trimestre de 2021, se continuó con el cierre financiero de las obras de ampliación en 24 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (1), Copán (5), La Paz (5), Lempira (6), Santa Bárbara (6) y Ocotepeque (1) distribuidos en doce (12) lotes.

Se realizó el pago de la estimación No. 4 del lote B; devolución de calidad de los lotes D, E, G y H del proceso de los 24 CEB's, se realizó el pago de la estimación No. 4 y 5 del proceso de los siete (7) CEB's. se realizaron los pagos a las empresas supervisoras de los procesos de obras de los 24 CEB's y 7 CEB's.

**Componente IV:** Gestión y Auditoría del Programa, se efectuaron los pagos por servicios para Reproducción de Textos de Lectura de Primero a Noveno Grado, para apoyar a Centros Educativos que pertenecen a las Redes Educativas de los 275 CEB del Tercer Ciclo. También, se efectuó el pago por el suministro de un (1) Licenciamiento de SW de Virtualización (Licenciamiento Vm Ware Essentials Plus (para 3 servidores con 2 procesadores cada uno) con 3 años de soporte y servicios conexos, para el Sistema de Información Gerencial (SIG-SSIS) y la adquisición de seis (6) Licencias de Diseño Gráfico (ADOBE) para el Centro Nacional de Información del Sector Social (CENISS), adquiridas a través de la LPN-009-SSIS-BID-3371-2019.

De igual manera, se efectuó el pago del personal de la UCP/SSIS que apoyó el Proyecto de ampliación de la Cobertura del Tercer Ciclo en el marco del Programa Bono Vida Mejor siendo: Técnico junior en infraestructura y Oficial de Seguimiento y Supervisión de Infraestructura se concluyó la auditoría al estado de fuentes y usos de fondos por categorías del gasto por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.

Es importante mencionar que este proyecto se encuentra en etapa de cierre financiero, administrativo y contable, mediante oficio No. DGIP-PROG-SEG-379-2021 de fecha 27 de septiembre de 2021, se emitió Dictamen Técnico de ampliación de plazo de cierre de Proyecto al 30 de noviembre de 2021.

- **Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social con Prioridad en Occidente (3723/BL-HO):** Avance al 30 de septiembre del **Componente I:** Transferencias Monetarias Condicionadas: En el tercer trimestre 2021, se realizó la transferencia al ente pagador para el pago de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) y pago de Comisión Bancaria para la entrega a los participantes del Programa Bono Vida Mejor (PBVM), del periodo 2021.

La entrega de TMC con recursos de esta operación se realiza a través del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda. (BANHPROVI), el operativo de entrega inició el 20 de septiembre y finalizará el 14 de octubre, en esta entrega se pagarán los 12 meses. Con recursos de esta operación se espera beneficiar a un total de 2,770 hogares en el departamento de Intibucá en los municipios de: Colomoncagua (1,792 hogares), San Antonio (451 hogares) y Santa Lucía (527 hogares).

- **Proyecto de Integración de la Protección Social (6401-HN):** Avance físico al 30 de septiembre: Componente de Transferencias Monetarias Condicionadas Urbano, se realizó la transferencia al ente pagador para el pago de Transferencias

Monetarias Condicionadas (TMC) y pago de Comisión Bancaria para la entrega a los participantes del Programa Bono Vida Mejor (PBVM), del periodo 2021.

La entrega de TMC con recursos de esta operación se realiza a través del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), el operativo de entrega inició el 20 de septiembre y finalizará el 14 de octubre, en esta entrega se pagarán los 12 meses. Con recursos de esta operación se espera beneficiar a un total de los 45,149 hogares, según detalle por departamento: Atlántida (1,612 hogares), Choluteca (3,273 hogares), Colón (1,287 hogares), Comayagua (3,394 hogares), Copán (1156 hogares), Cortés (5,739 hogares), El Paraíso (3,469 hogares), Francisco Morazán (14,121 hogares), Intibucá (875 hogares), La Paz (1,466 hogares), Olancho (2,798 hogares), Santa Bárbara (176 hogares), Valle (1,349 hogares) y Yoro (4,434 hogares).

- **Programa de Apoyo al Sistema Integral de Protección Social (5008/BL-HO):** Avance Físico al 30 de septiembre del **Componente Transferencias Monetarias Condicionadas:** se recibió la liquidación presentada por el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), de la entrega del año 2020. Asimismo, se realizó la transferencia al ente pagador para el pago de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) y pago de comisión bancaria para la entrega a los participantes del Programa Bono Vida Mejor (PBVM), del periodo 2021.

La entrega de TMC con recursos de esta operación se realiza a través del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), el operativo de entrega inició el 20 de septiembre y finalizará el 14 de octubre, en esta entrega se pagarán los 12 meses. Con recursos de esta operación se espera beneficiar a un total de 56,430 hogares distribuidos en los departamentos de: Choluteca (3,038 hogares), Copán (5,461 hogares), Cortés (1,085 hogares), Francisco Morazán (1,906 hogares), Intibucá (9,061 hogares), La Paz (10,921 hogares), Lempira (18,946 hogares), Ocotepeque (2,308 hogares), Olancho (1,961 hogares), Santa Bárbara (782 hogares) y Valle (961 hogares).

- **Fideicomiso "Fondo Solidaridad y Protección Social para la Reducción de la Pobreza", Año 2021:** El Fideicomiso de Protección Social ejecutado por la SEDIS cuenta con un presupuesto de L3,412.5 millones está fundamentado en 17 Proyectos de inversión, de los cuales al tercer trimestre presentan ejecución catorce proyectos que se detallan a continuación:
  1. **Vivienda Saludable: (Monto Presupuestado L648.4 millones),** incluye casas, pisos y techos, ejecución financiera al tercer trimestre de L213.0 millones.
  2. **Guías de Familia: (Monto Presupuestado L1,067.2 millones),** ejecución financiera al tercer trimestre de L674.0 millones, beneficiando a 44,717 familias.
  3. **Eco-fogones: (Monto Presupuestado L68.5 millones),** ejecución financiera al tercer trimestre de L44.7 millones, estufas mejoradas beneficiando a 2,831 familias.
  4. **Paquete Humanitario Familias para Víctimas de las Tormentas ETA y IOTA: (Monto Presupuestado L70.0 millones),** ejecución financiera al tercer trimestre de L70.0 millones

5. **Mejores Familias: (Monto Presupuestado L240.0 millones)** ejecución financiera al tercer trimestre de L156.8 millones, beneficiando a 6,258 familias participantes.
6. **Prevención de Embarazos en Adolescentes: (Monto Presupuestado L8.3 millones)** ejecución financieros al tercer trimestre de L4.3 millones.
7. **Bolsa Solidaria Adulto Mayor: (Monto Presupuestado L451.0 millones)** ejecución financiera al tercer trimestre de L175.4 millones, beneficiando a 48,852 beneficiarios personas adultas mayores.
8. **Especies Menores: (Monto Presupuestado L44.3 millones)** ejecución financiera al tercer trimestre de L21.7 millones, talleres para personas con discapacidad.
9. **Honduras para Todos: (Monto Presupuestado L25.6 millones)** ejecución financiera al tercer trimestre de L24.2 millones.
10. **Bono para Educación y Salud: (Monto Presupuestado L525.4 millones)** ejecución financiera al tercer trimestre de L423.9 millones.
11. **Conducción y Supervisión de Proyectos Vida Mejor: (Monto Presupuestado L25.0 millones)** ejecución financiera al tercer trimestre de L5.3 millones.
12. **Impulso a Microempresas de Alimentos: (Monto Presupuestado L31.4 millones)** ejecución financiera al tercer trimestre de L17.2 millones.
13. **Entrega de útiles escolares y Zapatos Escolares: (Monto Presupuestado L8.4 millones)** ejecución financiera al tercer trimestre de L4.8 millones.
14. **Programa "Criando con Amor": (Monto Presupuestado L19.0 millones)** ejecución financiera al tercer trimestre de L5.7 millones.

### **Proyecto Ejecutado por la Dirección Nacional Ciudad Mujer**

- **Proyecto “Centros de Atención Integral para mejorar las Condiciones de Vida de las Mujeres Hondureñas (Ciudad Mujer)” BID 3371/BL-HO:** Se presente el siguiente avance al tercer trimestre **Centro Ciudad Mujer Tegucigalpa:** Durante el tercer trimestre del presente año se atendió a 14,056 mujeres, de las cuales 3,648 nuevos ingresos (26%) del total y 10,408 (74%) visitas subsecuentes y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 29,229, incrementando en un 12% los servicios con respecto al mes anterior producto de la oferta de servicios tanto presenciales como virtuales que ofrece el Centro.

**Centro Ciudad Mujer Choloma:** Durante el tercer trimestre 2021 se atendió a 16,095 mujeres de las cuales 7,642 fueron nuevos ingresos (47%) del total y 8,453 (53%) visitas subsecuentes y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 40,168, superior en 64% las atenciones y en 66%, con respecto al trimestre anterior, resultado de la oferta de servicios tanto presenciales como virtuales que ofrece el Centro.

**Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula:** Durante el tercer trimestre se atendió a 14,596 mujeres de las cuales 6,899 fueron nuevos ingresos (47%) del total y 7,697 (53%) visitas subsecuentes y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 43,599, incrementándose en 13% en atenciones y en 16% en servicios con respecto al trimestre anterior, resultado de la oferta de servicios tanto presenciales como virtuales que ofrece el Centro.

**Centro Ciudad Mujer La Ceiba:** Durante el tercer trimestre 2021 se atendió a 10,604 mujeres, de las cuales 4,834 fueron nuevos ingresos (45%) del total y 5,770 (55%) visitas subsecuentes y los servicios brindados por los diferentes módulos disminuyeron a 27,711, redujeron 9% en atenciones y 12% en servicios con respecto al trimestre anterior, resultado de la oferta de servicios tanto presenciales como virtuales que ofrece el Centro.

**Centro Ciudad Mujer Juticalpa:** En el tercer trimestre del presente año se atendió a 7,542 mujeres, de las cuales 3,134 fueron nuevos ingresos (42%) del total y 4,408 (68%) visitas subsecuentes al Centro, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida en los diferentes módulos, atendiendo un promedio diario de 65 visitas y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 24,265 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez, descendiendo en 10 % en atenciones y en 9.4% en servicios con respecto al trimestre anterior, resultado de la oferta de servicios tanto presenciales como virtuales que ofrece el Centro.

**Centro Ciudad Mujer Choluteca:** En el tercer trimestre del presente año se atendió a 10,352 mujeres, de las cuales 4,936 fueron nuevos ingresos (48%) del total y 5,416 (52%) visitas subsecuentes al Centro, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida en los diferentes módulos, atendiendo un promedio diario de 92 visitas y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 20,868 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez, incrementándose en 249% en atenciones y en 73% en servicios con respecto al trimestre anterior, resultado de la oferta de servicios tanto presenciales como virtuales que ofrece el Centro.

**Centro Ciudad Mujer Móvil:** En este trimestre se atendió a 3,896 mujeres, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida en los diferentes módulos, atendiendo un promedio diario de 40 visitas y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 3,118 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez, se observa aumento tanto en atenciones como servicios de alrededor 70% con respecto al trimestre anterior.

### **Proyecto ejecutado por el Fondo Hondureño de Inversión Social**

- **Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB):** Avance Físico del Programa al 30 de septiembre de 2021: **Proyectos Integrales de Mejoramiento de Barrios:** Los Proyectos de integración urbana el cual incluye: Ampliación, Mejoramiento y/o Construcción de sistemas de alcantarillado sanitario, agua potable, drenaje pluvial, mejoramiento vial y obras de mitigación de riesgos, al 30 de septiembre tienen el siguiente avance:
  - Proyecto de Integración Urbana Colonia 25 de enero 95%
  - Proyecto de Integración Urbana Colonia Nueva Australia 94%
  - Proyecto de Integración Urbana Colonia Nueva España 91%
  - Proyecto de Integración Urbana Colonia Nueva Galilea 92%

El proyecto de equipamiento social el cual incluye las siguientes obras y avance físico:

- Ampliación de Jardín De Niños Colonia Nueva España. 100%
- Ampliación de La Escuela David Corea Sánchez. 100%

- Construcción de Centro Comunal Colonia 25 de enero. 100%
- Construcción de Centro Comunal Colonia Australia. 100%
- Construcción de Centro Comunal Colonia Nueva Galilea. 100%
- Reparación de Cancha Polideportiva Colonia Nueva Galilea. 100%

Se finalizó el diseño de obras del Proyecto de Integración Urbana en colonias Montes de los Olivos, Nueva Jerusalén No. 2, Brisas del Mogote Altos de la Quezada, La Huerta, Villas San Miguel, Brisas del Roble, y Altos del Mirador para un total de 3,035, predios. Se ha iniciado el proceso de licenciamiento ambiental y adquisición de obra y supervisión, se espera la adjudicación (colonias: Brisas del Mogote Altos de la Quezada, La Huerta, Villas San Miguel, Brisas del Roble, y Altos del Mirador) al mes de diciembre del año 2021.

### **Proyectos ejecutados por Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H)**

- **Centros de Atención Integral para mejorar las condiciones de vida de las Mujeres Hondureñas (Ciudad Mujer) (BID3371/BL-HO):** el 01 de marzo de 2021, finalizó contractualmente en un 100% la construcción del Centro Ciudad Mujer en la ciudad de Choluteca (el último de los tres centros construidos por el presente proyecto), presentando un área de construcción de 3,400.96 metros cuadrados, en un terreno de aproximadamente dos y media manzanas. Los edificios que forman el complejo se denominan de la siguiente manera: Atención a la Violencia, Autonomía Económica, Salud Sexual y Productiva, Cuidado Infantil, Atención a las Adolescentes, Recepción y Cafetería. El complejo también cuenta con un cuarto de bombas, una cisterna para aguas lluvias, cisterna para agua potable, un cuarto de máquinas, un cuarto para desechos y una caseta para vigilancia. El 13 de abril de 2021, se firmó el Acta de Traspaso de Obras para el Contrato de Servicios de Construcción del Centro Ciudad Mujer Choluteca, entre los representantes de INVEST-Honduras y del Centro Ciudad Mujer/Dirección Nacional del Programa Presidencial Ciudad Mujer, entrando dicho centro en operación a partir del mes de mayo de 2021, beneficiando a unas 220,000 mujeres de la zona sur, quienes recibirán más de 40 servicios gratuitos de calidad y brindados con calidez por 14 instituciones del Estado. Durante el trimestre se trabajó en el proceso de recepción de bienes por parte de la Dirección de Bienes Nacionales, quedando pendiente la gira de inspección a los centros Ciudad Mujer de La Ceiba y San Pedro Sula.

### **c) SECTOR ENERGÍA**

El Sector destina su inversión a la construcción, operación y mantenimiento de las centrales hidroeléctricas, inversión en obras relacionadas con la integración de Honduras al SIEPAC, electrificación de viviendas y transmisión eléctrica teniendo como propósito mejorar y ampliar la cobertura del servicio eléctrico para contribuir al crecimiento y desarrollo económico y social del país, mediante los Proyectos de Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral-Río Lindo, Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional (MER), Apoyo al Desarrollo Sostenible de las Energías Renovables, Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica, Electrificación Rural en Lugares Aislados y Sistemas Fotovoltaicos de la Red. A la fecha se registra el 17.1% de ejecución con relación a su presupuesto vigente, los avances al tercer trimestre se presentan a continuación:

## **Proyectos ejecutados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)**

- **Programa de Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional (MER)-BID:** Durante el tercer trimestre del 2021 el proyecto se encuentra en ejecución obteniendo los resultados en el informe final de la resolución de los Pasivos Ambientales y Sociales, LT de Las Flores-Erandique y Danlí-Chichicaste, para solicitar desembolso al BID y realizar los pagos pendientes del Convenio, la Recepción y evaluación del Proceso AIHMER-13-LPI-B- “Adquisición de Medidores para Sistema de Medición Comercial para la Red de Transmisión Nacional”, Auditoría del año 2020 con “Opinión Limpia” y Suscripción del Contrato No. 065/2021 Auditoría Ambiental.
- **Proyecto de Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaverl-Río Lindo:** se ha tenido avances en el tercer trimestre del 2021 con la finalización de la firma del Contrato con la empresa Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation, para el proyecto Lote-I Equipo Generador de la Central Hidroeléctrica Cañaverl (Adquisición e Instalación de los Equipos Principales y Auxiliares) y Negociación finalizada para firma de Contrato de consultoría de la Batimetría del Lago de Yojoa y Consultoría técnicas para analizar la calidad de agua e identificar fuentes de contaminación deterioro ambiental del Lago de Yojoa.
- **Proyecto de Apoyo al Plan Estratégico de Acceso Universal a Electricidad:** Durante el tercer trimestre 2021 el proyecto se encuentra en ejecución, se suscribió la Orden de Compra a la Adquisición de Software para Diseño de Redes de Distribución y Capacitación – DIREC-CAD y los procesos “Director y Supervisor de Obras Electromecánicas del Proyecto “Suministro de Bienes y Servicios Conexos para Sistemas de Generación con Energías Renovables mediante Micro Redes en Brus Laguna, Departamento de Gracias a Dios y Guanaja, Departamento de Isla, Supervisión Externa de Obras Civiles del Proyecto “Diseño y Construcción de Equipo, Instalación y Pruebas para Sistemas de Generación con Energía Renovable (Fotovoltaica) en Brus Laguna y Guanaja.
- **Apoyo al Desarrollo Sostenible de las Energías Renovables:** Se dio la Orden de inicio del Contrato 069/2021 "Construcción de un Proyecto Piloto de Climatización con Energía Solar Térmica para la Piscina Olímpica del Complejo Deportivo José Simón Azcona Hoyo" y en notificación de adjudicación al Consultor de la Consultoría para la “Elaboración de Guías y Procedimientos para la Incorporación de Buenas Prácticas Internacionales de Relacionamento Comunitario Anticipado (BPRCA) en Proyectos de Generación de Energía Renovable que fortalezcan el Componente Social.”
- **Electrificación Rural en Lugares Aislados:** En el tercer trimestre 2021 esta proceso se solicitud de firma de adjudicación PERLA-30-LPI-B- para el “Suministro de Bienes y Servicios Conexos para Sistemas de Generación Con Energías Renovables Mediante Micro Redes en Brus Laguna, Departamento de Gracias a Dios y Guanaja, Departamento de Islas de La Bahía”, LOTE también se encuentra en proceso se solicitud de firma de adjudicación PERLA-29-LPI-B- para el “Suministro de Bienes y Servicios Conexos para Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios en el Corpus Y Concepción de María, Departamento de Choluteca” y en marcha el Contrato No. 068/2021 Consultoría para el Diseño de la Estrategia de Participación Femenina en la Construcción, Operación y Supervisión de Proyectos

de Sistemas de Generación Eléctrica-Fotovoltaica en Lugares Aislados (Segunda Vuelta).

- **Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica:** Durante el tercer trimestre 2021 se emitió la Orden de inicio del Contrato 039/2021 “Proyecto Ampliación Subestación San Buenaventura en 230 kV, Ampliación Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV 150 MVA, Construcción Línea de Transmisión San Buena Ventura - San Pedro Sula Sur en 230 kV, Doble Circuito” (12/7/2021), en trámite de No objeción por parte de la CREE de la adjudicación de los contratos desde el 01 de septiembre de 2021: Proceso ENEE-59-LPI-O- “Ampliación de las Subestaciones: Miraflores, Laínez, Toncontín, Siguatepeque, Bellavista, Choloma y Construcción Subestación El Centro; Construcción Línea de Transmisión: Miraflores - Laínez, 138 kV y Bellavista - El Centro, 138 kV” (conocido como Paquete 2) y en no Objeción en el organismo financiador el informe de propuestas técnicas del proceso ENEE-61-SBCC-CF- “Supervisión y Gestión de los Proyectos Construcción de Ampliación de las Subestaciones: Miraflores, Laínez, Toncontín, Siguatepeque, Bellavista, Choloma, La Puerta, Bermejo, Comayagua, Santa Marta, Progreso y San Pedro Sula Sur; Construcción de las nuevas Subestaciones El Centro, Calpules, El Sitio, La Victoria; y Construcción de las Líneas de Transmisión 138 kV: “Miraflores-Laínez”, “Bellavista-El Centro” y “San Pedro Sula Sur-Santa Marta-Progreso”.

#### **d) SECTOR EDUCACIÓN**

Este sector apoya la mejora de la calidad educativa a través de la capacitación a docentes, construcción de Aulas mediante los proyectos de Infraestructura escolar y Proyecto de Mejora de la Calidad educativa (proyecto Joven), Proyecto: “Mejoramiento de la Calidad de la Educación Prebásica en Honduras. A la fecha se registra el 20.8% de ejecución con relación a su presupuesto vigente, los avances físicos al tercer trimestre en los proyectos son los siguientes:

#### **Proyecto Ejecutado por la Secretaría de Educación**

- **Programa: “Mejora de la Infraestructura Escolar (PROMINE/KFW, FASE IV)” (Componente SEDUC):** Para el año 2021, se programó en el Plan Operativo Anual (POA-Presupuesto SIAFI) las siguientes actividades:
  - Formador y Diseñador (Arquitecto) para la supervisión y seguimiento de proyectos en La Paz e Intibucá.
  - Formador y Diseñador (Estructural) para la supervisión y seguimiento de proyectos en Ocotepeque, Copán y Santa Bárbara.
  - Supervisor de Proyectos Eléctricos (supervisión y seguimiento de proyectos en La Paz, Intibucá, Lempira Ocotepeque, Copán, Santa Bárbara y Gracias a Dios).
  - Desarrollador de Sistema de Planificación de Infraestructura Educativa (SIPLIE) (Consultoría en Francisco Morazán).
  - Coordinador de Seguridad Alimentaria Cambio Climático Occidente / Corredor Seco para la supervisión y seguimiento de proyectos en La Paz, Intibucá, Lempira Ocotepeque, Copán y Santa Bárbara.
  - Asistente Administrativo (supervisión y seguimiento de proyectos en Francisco Morazán).
  - Asesor legal (seguimiento de procesos legales y titulación de tierra de centros educativos) para La Paz, Intibucá, Lempira Ocotepeque, Copán, Santa Bárbara, Choluteca, valle, Comayagua y Gracias a Dios.

- **Proyecto: “Mejoramiento de la Calidad de la Educación Pre básica en Honduras” (IDA 6560-HN):** Al tercer trimestre de acuerdo a las principales actividades realizadas por la UCP, se reporta:
  - Habilitación de usuarios en HONDUCOMPRAS I y en el sistema SIAFI-GES para el ingreso del proyecto.
  - Validación ajustes y aprobación de los cinco Módulos e instructivo para el facilitador de la Consultoría de Diseño del Programa de Fortalecimiento a los Consejos Municipales Desarrollo Educativo (COMDE).
  - Publicación y avisos de expresión de interés de las consultorías siguientes:
    - ✓ Oficial Financiero para el desembolso del Proyecto de Mejoramiento de la Calidad en la Educación Pre básica
    - ✓ Oficial Contable para el desembolso del Proyecto de Mejoramiento de la Calidad en la Educación Pre básica
    - ✓ Oficial Técnico para el Mejoramiento de la Organización de la Planeación y el Monitoreo, proceso adjudicado.
    - ✓ Elaboración de Propuestas arquitectónicas Bioclimáticas para Centros Educativos de Educación Prebásica, proceso adjudicado.
  - Propuesta de Manual de Organización de procesos y procedimientos de la SDGEPB.
  - Aprobación del II desembolso de fondos para el proyecto por parte del BM, por un monto de USD\$500,000.00.
  - Aprobación del I informe semestral por la SSATP y BM.
  - Aprobada la exoneración del ISV del proyecto por parte de la DGFA de SEFIN, para el periodo agosto 2021 a mayo 2022.
  - Aprobación de Modificación presupuestaria solicitada a SEFIN.
  - Aprobación de la propuesta de conformación de la Mesa Técnica de Educación Prebásica por parte de la SSATP.
  - Habilitación de usuarios para el SNIHP, los cuales fueron creados y la DGIP-SEFIN, ha asignado un técnico para acompañamiento en el proceso de ajuste al SNIHP y actualización en el sistema SNIHP el Presupuesto Plurianual del Proyecto.
  - Elaborado el primer documento sobre la revisión del CNB del nivel de Educación Prebásica. En proceso de revisión en la DGCE.
  - Remisión del POA y PAC 2021 ajustado a la Subsecretaría de Asuntos Técnico Pedagógicos para su respectiva aprobación, aprobada No Objeción por el BM y publicado en el portal de HONDUCOMPRAS.

**Proyecto Ejecutado por la Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H)**

- **Proyecto Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven, (BID 4449/BL-HO):** De acuerdo a la Unidad Ejecutora, los avances físicos alcanzados al tercer trimestre se describen a continuación:

**Componente 1:** Cobertura de servicios del tercer ciclo de Educación Básica con énfasis en zonas rurales del occidente del país.

**Producto 1.1:** Convenios/contratos de prestación de servicios educativos en Modalidad Alternativa para el tercer ciclo firmados de acuerdo con los requerimientos de la SEDUC: está en ejecución el Convenio para la Prestación de Servicios Técnicos para la Atención del Tercer Ciclo de Educación Básica año 2021.

Este convenio tiene una cobertura en centros educativos de comunidades rurales de los departamentos de Intibucá, La Paz, Lempira, Copán, Santa Bárbara y Ocotepeque en el tercer ciclo de Educación Básica donde no se tiene posibilidades de acceso a los servicios educativos de este ciclo bajo la oferta tradicional, atendiendo 11,574 educandos en 272 CEB's, así como también son beneficiados los 672 gestores educativos.

El IHER ha asumido la responsabilidad total de atención de 200 CEB, en los cuales se atiende a 7425 educandos con 434 gestores educativos. Y por su parte la Secretaría de Educación mantiene su compromiso de sostenibilidad de 75 CEB, donde 238 gestores educativos atienden a 4149 educandos.

Producto 1.2: Escuelas con módulos de tres aulas del tercer ciclo construidos y equipados: con el fin de apoyar el fortalecimiento de la cobertura escolar en tercer ciclo, se logró la formulación de las 50 carpetas de factibilidad de proyectos de infraestructura educativa.

A la fecha ya se cuenta con la No Objeción al Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación de Contrato del proceso de Licitación Pública Internacional para la “Construcción de Obras de Ampliación de Infraestructura Educativa para el Tercer Ciclo en: 27 Centros de Educación Básica (CEB) ubicados en los Departamentos de Lempira (9), Ocotepeque (5), Santa Bárbara (5), Intibucá (4) y Copán (4), distribuidos en Nueve (9) Lotes”, por un monto total de L. 50,651,850.11. También se cuenta con la No Objeción al Contrato Negociado del proceso de “Supervisión de Obras de Infraestructura Educativa en los Departamentos de Copán (3), Intibucá (4), Lempira (8), Ocotepeque (4) y Santa Bárbara (5)”.

Por otra parte, se está preparando y revisando los documentos de licitación para las 23 carpetas restantes. En este contexto, se tiene previsto iniciar el proceso de licitación para la adquisición de Mobiliario y Equipo pedagógico para módulos de escuelas priorizadas.

### **Proyecto Ejecutado por el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)**

- **Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y de su Gestión Local (PROMINE) FASE IV y V:** Avance Físico al 30 de septiembre:
  - Los principales avances al tercer trimestre se describen a continuación:
  - Se han comenzado las formulaciones de proyectos que serán considerados para completar la disponibilidad de la fase IV.
  - Se han realizado la actualización al Manual PEC -2021.
- **Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras (MIFE):** Avance Físico del Programa al 30 de septiembre de 2021, se realizó la compra de 26,215 tabletas a través del PNUD las cuales fueron entregadas a la Secretaría de Educación para su distribución. El programa actualmente se encuentra en actividades previas para su ejecución, la diferencia en cuando a producción planificada para este trimestre corresponden a un reajuste de las actividades las cuales se están reprogramando para el año 2022 y la diferencia con respecto a lo financiero corresponde a los diferenciales de tasa de cambio cuando se realizó la planificación.

## e) SECTOR SALUD

Sus intervenciones van orientadas al mejoramiento y cobertura de los servicios de salud y la red hospitalaria del País, a través de la contratación de gestores en el Primer Nivel y Segundo Nivel de atención mediante el proyecto de Mejora de la Gestión y Calidad de los servicios de salud materno-neonatal, y el Programa de Apoyo a la red de Inclusión Social con Prioridad en Occidente y Proyecto Respuesta Inmediata de Salud (RISP) para Contener y Controlar El Coronavirus (COVID-19) y Mitigar su Efecto en la Prestación del Servicio, en Honduras. A la fecha se registra el 61.8% de ejecución con relación a su presupuesto vigente, los avances físicos se muestran en la Secretaría de Salud y AEPAS-H.

Los avances al tercer trimestre en los proyectos son los siguientes:

### **Proyectos Ejecutados por Secretaría de Salud (SESAL)**

- **Programa: “Apoyo a la Red de Inclusión Social con Prioridad en Occidente”:** Según lo reportado por la Unidad Ejecutora de Proyectos BID (GESALUD), cuentan con un 100% de avance físico al tercer trimestre, misma que corresponde a la planificación de ejecución en 10 municipios para el año 2021, conforme al siguiente detalle:
  - Gestores descentralizados de Primer nivel: Garantizar la atención de servicios en 10 municipios priorizados:
    - ✓ Adjudicación y Firmado contrato con el Gestor Health Access Initiative, Inc. (CHAI) para la prestación de servicios de I Nivel.
  - Fortalecimiento de Hospitales: Adjudicado contrato para la adquisición de equipo de radiografía digital:
    - ✓ Firmado contrato para la adquisición de equipo de radiografía digital.
    - ✓ Instalado el equipo de radiografía digital en el Hospital Enrique Aguilar Cerrato.
  - Gestión del Proyecto y Auditoría: Contratación e Informe de auditoría del Proyecto:
    - ✓ Contratación de la Auditoría con el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
    - ✓ Gestión de cierre del Programa.
- **Proyecto Respuesta Inmediata de Salud (RISP) para Contener y Controlar El Coronavirus (COVID-19) y Mitigar su Efecto en la Prestación del Servicio, en Honduras:** Al tercer trimestre, la Unidad Ejecutora de Proyectos BID (GESALUD), cuenta con un 100% de avance físico que corresponde a Informes de los Consultores de la Unidad Ejecutora, pago de convenios de Gestores de I y II nivel de atención y desembolsos en el marco del Acuerdo de Asistencia con el PNUD; se lograron avances significativos en otras actividades:
  - Conducción de la respuesta a nivel del país:
    - ✓ Recibido equipo para el equipamiento de la Sala Situacional.
    - ✓ Contratados los 3 desarrolladores para el Sistema de Información.
    - ✓ Evaluados los candidatos para el soporte a las regiones.
    - ✓ Contratados 14 digitadores para apoyo al Sistema de Información.

- Detección y seguimiento de los casos:
  - ✓ Ejecutado el contrato para el mantenimiento del Laboratorio Nacional.
  - ✓ Firmado contrato para la Adquisición de Equipo de Cómputo y Tablet.
  - ✓ Firmado contrato con la empresa para la compra de reactivos, recibidos y pagados los reactivos.
- Interrupción de la cadena de transmisión:
  - ✓ Firmado contrato para el desarrollo de la Estrategia de Comunicación.
  - ✓ Firmado contrato con la Empresa para la impresión de materiales.
- Mejoramiento a la capacidad de provisión de servicios de salud:
  - ✓ En ejecución los Servicios de Telemedicina en las Regiones Priorizadas.
  - ✓ Firmada enmienda al acuerdo con PNUD para la adquisición de más ambulancias.
  - ✓ Contrato firmado para la adquisición de equipo de cómputo para el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).
  - ✓ Firmado contrato con la empresa para la compra de reactivos, recibidos y pagados los reactivos.
- Administración del Programa:
  - ✓ Firmado contrato con el TSC para el proceso de Auditoría.
- **Proyecto Apoyo para la Implementación del Plan Nacional de Introducción de la Vacuna contra la COVID-19 en Honduras (BCIE 2271):** Al tercer trimestre, los avances reportados del Programa se listan a continuación:
  - Contratado el personal del Staff del Programa.
  - Regularización de los US\$87,500.00 correspondientes a la comisión bancaria del BCIE.
  - Revisión a los documentos de liquidación, así como al I informe bimestral a presentar por UAFCE-SESAL.
  - Seguimiento y monitoreo por parte de la UAFCE-SESAL, referente al número de personas vacunadas con 1 y 2 dosis de vacunas PFIZER adquiridas con el préstamo No.2271

**Proyecto Ejecutado por la Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H)**

- **Proyecto: “Mejora de la Gestión y Calidad de los Servicios de Salud Materno Neonatal”:** Avance Físico: De acuerdo a la Unidad Ejecutora, los avances físicos alcanzados al tercer trimestre se describen a continuación:

Componente I: Fortalecimiento de la gestión y calidad de los servicios obstétricos neonatales.

Para este período se garantizó la cobertura de atención a una población de 425,045 habitantes, a través de la prestación de servicios de salud con gestores descentralizados en el primer y segundo nivel de atención. Así mismo.

A través de los gestores descentralizados de primer nivel se brindaron entre otras las siguientes atenciones: 821 embarazadas captadas antes de las 12 semanas de gestación; 717 puérperas que recibieron por lo menos 5 atenciones prenatales por personal calificado de acuerdo a los criterios de la norma; 850 mujeres que tuvieron su parto y que recibieron una atención puerperal por personal calificado dentro de

los 3 a 7 días postparto; 848 partos institucionales atendidos; 34,033 visitas domiciliarias a población prioritaria o en riesgo realizadas, 4,397 niños que asisten a la reunión mensual de AIN-C.

A través de los gestores descentralizados de segundo nivel se brindaron entre otras las siguientes atenciones: 9,509 atenciones de consulta externa; 18,229 atenciones de emergencia; 5,911 atenciones por complicaciones obstétricas y 1,585 por complicaciones neonatales; 4,618 partos atendidos.

En ejecución contratos de personal médico, promotores y auxiliares de enfermería para conformación de Equipos de Salud Familiar (ESFAM). Adjudicado a Publigráficas, contrato para la reproducción de materiales ESFAM. En ejecución consultoría nacional para la implementación y revisión del Modelo de Gestión Hospitalaria.

Componente II: Mejoramiento del Equipamiento e Infraestructura de los Servicios de Salud. En proceso Contratación de una Firma Consultora para el "Diseño y Supervisión de las Obras en el Hospital Regional de Occidente; Hospital Roberto Suazo Córdova; Hospital San Francisco; Hospital Santa Teresa y Hospital Escuela".

Componente III: Mejoramiento del Equipamiento de los Servicios de Salud. En proceso "Adquisición de Ultrasonidos Móviles y Fijos para los Equipos de Salud Familiar (ESFAM) y Gestores de Salud.

Componente IV: Fortalecimiento Institucional, Innovaciones Tecnológicas y Sistema de Información. En ejecución asistencias técnicas programadas para la implementación del programa en las regiones sanitarias y para el seguimiento y monitoreo de gestores de primer y segundo nivel. En ejecución consultorías para Hospitales. En ejecución consultorías para el fortalecimiento de la Unidad Técnica de Gestión de Proyectos de la SESAL.

Componente V: Administración y Evaluación del Programa. En proceso contratación de firma, para realizar el levantamiento de la Línea Base y Evaluaciones del proyecto.

#### **f) SECTOR DESARROLLO PRODUCTIVO Y RIEGO**

Los principales rubros de inversión están enfocados en la ejecución de Planes de Negocios, implementación de Sistemas de Riego, incremento los ingresos de las poblaciones rurales en el Corredor Seco a fin de prepararse para los efectos del cambio climático y abordar la inseguridad alimentaria. A la fecha se registra el 33.4% de ejecución con relación a su presupuesto vigente, las distintas Instituciones del Sector, registran los siguientes avances físicos:

#### **Proyectos Ejecutados por Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)**

- **El Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR), (BCIE-2101):** las actividades físicas reportadas por la Unidad Ejecutora al 30 de septiembre de 2021 son:

**El subproyecto sistema de riego Sulaco:** presenta los siguientes avances:

- ✓ Se realizaron 21 M<sup>3</sup> fundición de tanque amortiguador en presa con concreto de 4,000 PSI.
- ✓ Se realizaron 8.50 M<sup>3</sup> de fundición del muro de encauce con concreto de 4,000 PSI.
- ✓ Se realizaron 12.50 M<sup>3</sup> de fundición del muro de encauce con concreto de 4,000 PSI.
- ✓ Fundición en tanque amortiguador y muro de encauce del lado izquierdo aguas abajo de la presa del Sub Proyecto Tascalapa, equivalente a 72.80 M<sup>3</sup> de concreto de 4,000 Psi, para un acumulado total del proyecto de 5,779.71 M<sup>3</sup>, que representa un avance del 85.28% de un total contratado equivalente a 6,777.71 M<sup>3</sup>.
- ✓ La ejecución física según estimación N°27 presenta en general un avance acumulado total de fundición de concreto en presas de 5,536.91 M<sup>3</sup> de un total contratado de 6,599.17 M<sup>3</sup>, lo que representa un 81 % de avance.
- ✓ En obra toma se continua con un acumulado a la fecha de 551.51 M<sup>3</sup> que representa un avance del 86.63% de un total contratado equivalente a 636.60 M<sup>3</sup>, así mismo se mantiene en tubería un acumulado de 128,017.21 metros lineales que corresponde a un 98.56% de avance del de un total contratado de 129,889.67 metros lineales.

**Construcción, Rehabilitación y Modernización del Sistema de Riego Selguapa, Comayagua:** presenta los siguientes avances:

- ✓ Desfogue/Aliviadero descargando en Rio Tepanguare. Es proyectado en estación 11+669.24, iniciando en lado derecho del Canal Principal y descargando en Rio Tepanguare, aguas arriba del sifón de cruce del Rio, donde el nivel de aguas de crecidas afectaría la evacuación del caudal de descarga del aliviadero.
- ✓ Se acordó replantear alineamiento de canal de desfogue para elaborar detalles constructivos de acuerdo a altimetría en la zona de la obra. Así mismo se definiría el cruce de muro de gaviones construido en margen izquierda del rio, aguas abajo del sifón de cruce del mismo.

**El Subproyecto Sistema de Riego de San Sebastián:** presenta los siguientes avances:

- ✓ La Supervisión del Proyecto San Sebastián ha propuesto una salida de 12" de diámetro desde foso de derivación de desarenador de Proyecto San Sebastián, para abastecer el área de 50 hectáreas Lamani; considerar cortina intermedia en foso de derivación de desarenador para control de caudales a derivar, tanto para 50 hectáreas – Lamani (Q max = 43 l/s), como para Proyecto San Sebastián (Q max = 190 l/s); incorporar válvula intermedia en Línea de Conducción 50 hectáreas – Lamani para regular presión en parte alta; incluir medidor y regulador de caudal; incorporación de válvulas de aire y de válvulas de limpieza de acuerdo a su ubicación en el primer kilómetro de la LCP de Proyecto San Sebastián.
- ✓ El representante de UCP/PDABR/SAG indicó que es urgente contar con diseño final de proyecto (50 hectáreas Lamani) para que el Contratista prepare su cotización, la Asociación de Regantes Lamani demanda diseño final del Proyecto 50 hectáreas – Lamani, por lo que se requiere fijar fecha de entrega de cotización por parte de Contratista, y así proceder a gestionar No Objeción por parte del BCIE.

- ✓ Se instruyó en cuanto a considerar válvulas de control para cada hidrante en derecho de vía de camino intermedio de área de 50 hectáreas – Lamaní.
- ✓ Finalmente, se definió depurar el diseño de 50 hectáreas – Lamaní el cual presenta un avance en líneas de conducción Principal: 771.90 ml y Laterales y Sub-laterales: 2,836.43 ml Terciaria: 10,314.01 ml presentando un avance físico de obra de un 34.15%.

**Subproyecto Sistema de Riego de Olomán:** presenta los siguientes avances:

- ✓ Este Contrato de obra se encuentra en adenda de tiempo en el BCIE por un periodo de (20 meses) del 30 de agosto 2021 al 30 de abril de 2023 suscrito con la Empresa NANDANJAIN MEXICO S.A. de C.V, por un monto de \$10,046,549.02, del cual ha ejecutado financieramente \$1,508,869.28 que representa el 15% del anticipo otorgado del monto total del contrato.
- ✓ Es de mencionar que el contrato inicial se firmó el 13 de octubre del 2017, pero debido a que los Diseños finales no cumplían a satisfacción del BCIE y la SAG con lo requerido, se volvieron a realizar los estudios, mismos que está pendiente de entrega los cuales se espera para finales del mes de octubre 2021 de acuerdo a reuniones sostenidas con la Unidad Ejecutora.

- **Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur Occidental PROLENCA, (Financiado por préstamo FIDA I y II FIDA y Donación GEF):** Se elaboraron y Formulación de 65 Planes de inversión, durante el trimestre se evaluaron las ofertas económicas, se elaboró el informe y se elaboraron los borradores de contratos y se obtuvo la no objeción por parte del FIDA.

Se tienen elaborados los contratos referentes a los planes de negocio, mismos que se encuentran en proceso de firma por parte del ministro. Durante el trimestre se han realizado talleres orientados a la sensibilización en género y seguridad alimentaria en organizaciones; capacitando mediante 16 jornadas en el departamento de Intibucá 235 de las cuales 145 son mujeres y 90 son hombres.

Se realizaron Desembolsos a 40 Organizaciones Beneficiadas (OB) con planes de inversión aprobados por un monto de L.45,568,347.20.

En la ejecución de los Planes de Inversión se está brindando asistencia técnica a 70 Organizaciones Beneficiadas, la asistencia técnica se está realizando en el área organizativa, empresarial, área productiva, genero, inclusión social y comercialización.

Mediante el convenio con Fundación Capital se han realizado ya 23 jornadas de capacitación con la participación de 127 líderes representantes de organizaciones.

Los avances en campo son muy significativos; se han capacitado 5,602 personas capacitadas, de las cuales el 58% son mujeres y hombres jóvenes; 36% de hombres adultos capacitados en temas de educación financiera evidenciando condición inclusiva del proyecto la cual mantenemos monitoreada, con el uso individual de tablets que no requieren conexión a wifi, las cuales son confiadas a los líderes.

En el trimestre según los informes de asistencia técnica con la ejecución de las diferentes iniciativas, se han generado 165 nuevos empleos temporales valorados en L 1,894,021 de estos empleos 102 beneficiarios son hombres y 63 son mujeres.

Rehabilitación de 14.95 kms Caminos Rurales Terciarios en el Municipio de La Esperanza, Departamento de Intibucá.

Rehabilitación de 13.80 kms de Caminos Rurales Terciarios en el Municipio de San Marcos de la Sierra, Departamento de Intibucá.

Rehabilitación de 8 Caminos Rurales Terciarios en el Municipio de Yamaranguila, Departamento de Intibucá.

Rehabilitación de 9,7 Kms Caminos Rurales Terciarios en el Municipio de Gracias, Departamento de Lempira.

- **Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego del Valle de Jamastran Fase 1:** Entre las actividades físicas reportadas por la Unidad Ejecutora están se resaltan las siguientes:

Para el tercer trimestre el proyecto no presenta ejecución física ni financiera, sin embargo, el proyecto a través de la SAG deberá realizar pagos que no están contemplados en el convenio financiero como ser la contratación de especialista ambiental y pagos referentes a los permisos ambientales, compra de reservorio, Carta de Crédito (BCH-EXIM Bank de India), adecuación de predio que servirá como bodega, costos de trámite de exención de impuesto, gastos de monitoreo.

La SAG ha solicitado el presupuesto necesario para realizar las actividades descritas y se está solicitando esos fondos para poder hacer frente a los compromisos contractuales alrededor de L.25.0 millones de fondos nacionales

#### **Proyecto ejecutado por Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)**

- **Proyecto Alianza para el Corredor Seco (CAS-USAID y GAFSP):** A partir del segundo semestre del año 2020, y hasta el primer semestre del 2021, el proyecto se encuentra en la implementación de una estrategia de salida para consolidar las capacidades productivas de los productores beneficiados con sistemas de riego en los 6 departamentos de la zona de influencia del proyecto.

Dicha estrategia planificó incorporación de US\$8.0 millones (L.200.00 millones, en cumplimiento a los Decretos PCM-030-2020 y PCM-041-2020) de fondos nacionales adicionales que a la fecha no se ha realizado, para ejecutar acciones de emergencia de reactivación productiva como respuesta a la crisis del COVID-19, lo que implicó ampliar en primera instancia, mediante Carta de Ejecución No. 36, la fecha de cierre de las firmas implementadoras que originalmente tenían contemplado finalizar en diciembre de 2020 hasta el segundo semestre de 2021 y que en la actualidad se ha considerado necesario que cierren en junio de 2022. Con la mencionada ampliación de 6 meses, la cual extendió el proyecto hasta junio de 2022 y cuya documentación se comenzó a preparar en el presente trimestre, se podrá ejecutar la totalidad de los remanentes de los fondos USAID para realizar las reparaciones requeridas en los distritos de riego que sufrieron daños por las tormentas tropicales ETA e IOTA.

Los fondos nacionales se encuentran comprometidos para cubrir las acciones de emergencia para reactivación del sector agroalimentario en el Corredor Seco,

incluyendo bonos agrícolas, mercados bioseguros, centrales de abasto con bioseguridad y centros de acopio con bioseguridad. A la fecha, se ha recibido por parte de BANHPROVI fondos nacionales (L70 millones de L170 millones aprobados), por tanto, las metas programadas para cubrir las acciones de emergencia para la reactivación del sector agroalimentario en el Corredor Seco en este trimestre se reprograman para cumplirse entre diciembre del presente año el primer trimestre del siguiente año.

Por otra parte, a septiembre de 2021, en cuanto a la asistencia técnica se han impartido 34,870 días cliente a hogares con planes de seguridad alimentaria y negocios agrícolas, de los cuales 11,158 Días/ Cliente, equivalente a 32% fueron brindados a mujeres. Al cierre del tercer trimestre de 2021 se alcanzan 1075 hectáreas bajo riego aprobadas y 811 instaladas, contempladas en Planes de Seguridad Alimentaria y Planes de Negocio Agrícolas. Además, se encuentran en implementación 281 planes de negocio (128 en el Clúster 1 y 153 en el Clúster 2), 176 agrícolas, en los mismos participan 3,393 hogares, y 105 no agrícolas donde participan 860 hogares de los cuales el 56% son liderados por mujeres. En relación con el componente de salud y nutrición, se alcanza un total de 3,372 niños menores atendidos en sesiones de monitoreo de crecimiento como parte de los Planes de Nutrición Comunitaria, a través de Planes de Nutrición Comunitarios y 3,900 hogares con inversiones de higiene.

#### **g) SECTOR SEGURIDAD Y DEFENSA**

Para el presente año ejecuta proyectos, a fin de contribuir a mejorar la convivencia ciudadana en Honduras a través de la mejora en la calidad de vida en barrios vulnerables y la reducción de la incidencia de delitos violentos, a la fecha se registra el 35.6% de ejecución con relación a su presupuesto vigente, las principales metas ejecutadas al tercer trimestre son:

#### **Proyecto ejecutado por Secretaría de Seguridad**

- **Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB):** Las actividades realizadas al tercer trimestre del presente año que la Unidad Ejecutora reporta, son las siguientes:

#### ***Componente: Atención y Servicio al Ciudadano en Materia de Convivencia Ciudadana en Municipios.***

- **Licitación Pública Internacional (LPI); Construcción de Jefaturas Policiales, en los municipios de Yoro y Olanchito, departamento de Yoro y Tela, departamento de Atlántida.** Estado: **Olanchito:** Contrato suscrito empresa CACORA; avance físico: 22.21%; avance financiero: 33.30%; avance diseño urbanístico: 100%; licencia ambiental emitida: 05 mayo 2021; entrega de orden de inicio: 22 mayo 2021. **Tela:** Contrato suscrito empresa GEO-CONSTRUCCIONES, avance físico: 2.67%; avance financiero: 21.89% (Anticipo), avance diseño urbanístico: 100%; licencia ambiental emitida: 09 agosto 2021; en proceso formalización de enmienda por un monto aproximado de: L.13.8 millones.
- **Licitación Pública Internacional (LPI); Construcción de Jefaturas Policiales, en el municipio de SPS (La Puerta), Cortes y en el municipio de La Vegas, Santa Barbará.** Estado: Estado: **Las Vegas, SB:** Contrato

suscrito con la empresa Salvador García; Avance físico: 21.94%; Avance financiero: 36.46%. En proceso formalización de enmienda por un monto de: L4,291,919.87. **La Puerta, SPS:** Contrato suscrito con la empresa SIT. Avance físico: 8.69%; Avance Financiero: 25.52%; Licencia ambiental emitida: 06 mayo 2021. Entrega de orden de inicio: 19 mayo 2021. En proceso formalización de enmienda por un monto de: L2,264,901.42.

- **Contratación de la Empresa de Supervisión para la Construcción de Unidad Metropolitana Policial SPS y Municipal Las Vegas, Santa Bárbara.** Estado: Contrato suscrito con la empresa Taller de Arquitectura Santos Horneros (TASH); orden de inicio emitida 01 diciembre 2020, avance físico: 33.33%, avance financiero: 27.11%
- **Contratación de la Empresa de Supervisión para la Construcción de Jefaturas Municipales en Yoro, Yoro; Tela, Atlántida y Olanchito Yoro.** Estado: Contrato suscrito con la empresa CAM, avance físico: 20%, avance financiero: 18.41%.
- **Licitación Pública Internacional (LPI); Adquisición de Mobiliario para cuatro (4) Jefaturas de Policía (San Pedro Sula, Cortés; Las Vegas, Santa Bárbara; Tela, Atlántida; Olanchito, Yoro) y la Unidad de Tutoría y Mentoría de Policía Nacional de Honduras (PNH).** Estado: Adjudicado.
- **Licitación Pública Internacional (LPI); Adquisición de Equipo Informático para cuatro (4) Jefaturas de Policía (San Pedro Sula, Cortés; Las Vegas, Santa Bárbara; Tela, Atlántida; Olanchito, Yoro) y la Unidad de Tutoría y Mentoría de PNH.** Estado: En gestión de firma la solicitud de no objeción del BID para su adjudicación.
- **Licitación Pública Nacional (LPN); Adquisición de menaje para Jefaturas Policiales (ropa de cama y almohadas).** Estado: En gestión de firma la solicitud de no objeción del BID para su adjudicación.
- **Adquisición de radios de comunicación para el fortalecimiento del modelo de Patrullaje de la Dirección de Operaciones de la PNH.** Estado: Contrato en ejecución empresa AMK TRADING, avance físico: 57.50%, avance financiero: 57.50%.
- **Remodelación de las Jefaturas Policiales para el fortalecimiento de los Servicios de atención integral para Violencia Intrafamiliar (VIF) y el Módulo de Atención Integral Especializado, (MAIE), en Nacaome, de acuerdo con el protocolo de servicios.** Estado: En gestión de firma la solicitud de no objeción del BID para su adjudicación.
- **Supervisión del Acondicionamiento de Módulo Integral para atención VIF, en Jefaturas Policiales de los municipios de Nacaome, Valle y Choluteca, Choluteca.** Estado: Evaluación de hojas de vida.
- **Componente: Efectividad Policial**
- **Adquisición de Kits de reactivos para pruebas toxicológicas para aspirantes ITP y ANAPO.** Estado: Contrato en ejecución empresa DICOSA, avance físico:

37%; avance financiero: 37%. Contrato en ejecución empresa INTERSEG; avance físico: 80%; avance financiero: 80%.

- **Consultoría para el apoyo de la gestión curricular ANAPO.** Estado: Gestión firma notificación adjudicación señor ministro.
- **Contratación de 5 consultores para la elaboración de textos para licenciaturas y especialidades para la ANAPO.** Estado: Contratos en ejecución.
- **Contratación para el Mantenimiento y actualización de tres escáneres forenses para laboratorios de investigación criminal y servicios de capacitación.** Estado: Contrato en ejecución, suscrito empresa LEICA (Fabricante), avance físico: 70%; avance financiero: 60%.
- **Adquisición de reactivos para uso en investigación y levantamiento de indicios en escenas del crimen para la DPI.** Estado: Contrato en ejecución, suscrito empresa INTERSEG con fecha 19 de marzo del 2021; avance físico: 100%; avance financiero: 100%.
- **Construcción de un Complejo Especializado para la Simulación de Intervenciones Policiales, ubicado en la Ciudad de La Paz.** Estado: Contrato firmado, gestión de orden de inicio. En proceso formalización de enmienda
- **Supervisión Complejo Especializado para la Simulación de Intervenciones Policiales ciudad de la Paz, departamento de la Paz.** Estado: Contrato firmado.
- **Programa de Mentoría para graduados del ITP, diseñado y funcionando.** Estado: En ejecución pilotaje para la implementación de la Estrategia de Tutoría y Mentoría del Servicio Policial.

### **Proyecto ejecutado por el Fondo Hondureño de Inversión Social**

- **Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (USAID/ICS):** Avance Físico del Programa al 30 de septiembre de 2021: Se llevaron a cabo capacitaciones a los comités y personal de mano de obra en temas de Bioseguridad, también se ha fortalecido a la comunidad en temas de Género, cumpliendo los indicadores del Plan de monitoreo y Plan de Género del programa.

### **h) SECTOR RECURSOS FORESTALES Y AMBIENTE**

Contempla la Reforestación y restauración de 34,000 hectáreas en zonas afectadas por el gorgojo y la gestión de riesgo de desastres, a través del Programa Manejo Sostenible de Bosques y el Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres y la Implementación de las Medidas de Conservación y Manejo de los Recursos Naturales en las Áreas Protegidas mediante el proyecto de Fortalecimiento del Sistema Nacional de áreas Protegidas de Honduras - SINAPH (LIFEWEB). A la fecha se registra el 21.1% de ejecución con relación a su presupuesto vigente, los avances físicos al tercer trimestre se muestran a continuación:

## **Proyectos Ejecutados por la Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H)**

- **Proyecto Manejo Sostenible de Bosques:** De acuerdo a la Unidad Ejecutora, los avances físicos alcanzados al tercer trimestre se describen a continuación:

### **Componente 1. Restauración de bosques afectados por la plaga del gorgojo:**

- El avance acumulado a septiembre 2021 de 40 planes de restauración (PR) elaborados equivalentes a 32,614.02 hectáreas, lo que representa un 96% en relación a la meta del proyecto (34,000 has).
- Las actividades de restauración de los 31 planes en ejecución se llevan a cabo en 23 municipios de los departamentos de Francisco Morazán, Comayagua y Yoro.
- Se continuó con la entrega del equipo para protección, seguridad y prevención de incendios y materiales e insumos para la producción de plantas, para las organizaciones beneficiarias de los planes de restauración en ejecución, según solicitud de las organizaciones.
- En proceso de firma tres (3) nuevos convenios con organizaciones, para igual número de planes de restauración en bosque público.
- Se encuentra en proceso de elaboración, los términos de referencia para la contratación de una nueva firma para brindar asistencia técnica a las organizaciones ejecutoras de planes de restauración en bosque público.

### **Componente 2. Fortalecimiento del sistema de sanidad forestal y mejora de la resiliencia de los bosques al Cambio Climático**

- Aprobados los “Lineamientos para el Financiamiento y el Desarrollo de Investigaciones de Salud y Sanidad Forestal, Manejo Forestal Sostenible y Especies Resilientes al Cambio Climático”, en el cual se define el procedimiento para la selección de las entidades para el financiamiento y desarrollo de 7 investigaciones en el marco del proyecto.
- Elaborados y aprobados los Términos de Referencia para la realización de las siete (7) investigaciones de salud y sanidad forestal priorizadas por el ICF.
- Realizado el proceso de expresión de interés de las instituciones miembros del Sistema Nacional de Investigación Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (SINFOR), para el desarrollo de las investigaciones. A la fecha, en revisión y ajustes el informe de evaluación de expresión de interés.
- Aprobado el producto final (5) del contrato para el diseño del Sistema de Prevención y Alerta Temprana (SPAT). Documento Final de Diseño del Sistema de Alerta Temprana para el Gorgojo Descortezador del Pino en Honduras (SAT).
- Adjudicado el proceso de adquisición de equipo de infotecnología, para el Sistema de Alerta Temprana a Plagas, a Componente El Orbe y PBS (pendiente la entrega y recepción de un ítem y accesorios del equipo).

### **Componente 3. Mejora del acceso a financiamiento climático para promover el MFS**

- Finalizado el contrato para el estudio de prefactibilidad para el diseño de mecanismos financieros para la compensación por servicios ambientales en cuencas prioritarias para la provisión de agua en Honduras, en desarrollo a través de The Nature Conservancy. (aprobado producto final).

#### **Componente 4 y 5: Gestión del Proyecto y Evaluaciones y Auditorías**

- Finalizado contrato de adquisición de equipo hidrometeorológico para el monitoreo del indicador hídrico (proveedor: Industrias Metálicas M&M).
- En proceso Adquisición de Equipo Hidrometeorológico adicional y servicios conexos para la Medición y Monitoreo del Indicador Hídrico.
- Finalizado contrato de la consultoría para el Diseño de la Metodología y Protocolos para el Monitoreo de la Biodiversidad y Ecología de los Bosques de Pino afectados por la plaga del gorgojo y bajo restauración. Aprobado producto final.
- En ejecución Consultoría Individual para el Monitoreo del Indicador Hídrico.
- Desarrollado el taller sobre sobre instrumentalización para el monitoreo del indicador hídrico.
- Adjudicado el proceso para la contratación de local y alimentación para el desarrollo del taller sobre metodologías para la estimación de C02eq.

#### **Proyecto Ejecutado por Instituto Nacional de Conservación Forestal (ICF)**

- **Proyecto Fortalecimiento del Sistema Nacional de áreas Protegidas de Honduras - SINAPH (LIFEWEB): (KFW BMZ-No. 2011 65 984):** De acuerdo a la Unidad Ejecutora, los avances físicos alcanzados al tercer trimestre se describen a continuación:
  - ✓ Se concluyó con la incorporación del personal técnico de apoyo al Departamento de Áreas Protegidas que será cubierto con fondos externos.
  - ✓ Se ha continuado con el desarrollo de jornadas de capacitación (2 horas/semana), impartidas por el Asesor Técnico Principal del Proyecto y dirigidas al personal técnico del ICF.
  - ✓ Se realizó taller para la elaboración de Planes específicos en 4 Áreas Protegidas de la Bahía de Tela, jornada en la que se capacitó a personal del ICF, organizaciones comanejadoras, municipalidades y socios claves de las Áreas Protegidas, en la construcción de planes de aprovechamiento de bienes y servicios ecosistémicos, planes de Investigación y Monitoreo biológica y planes de adaptación y mitigación al cambio climático.
  - ✓ Se realizó un proceso de inducción administrativa al personal técnico y administrativo de las regiones forestales de Atlántida, Noroccidente y Yoro, con el fin de establecer lineamientos y mecanismos efectivos que apoyen la implementación efectiva de recursos financieros en el marco de las actividades definidas en el Plan Operativo 2021.
  - ✓ Se realizó proceso para el establecimiento de carta y convenio de ejecución de recursos financieros entre el ICF y la Fundación Cayos Cochinos (co-manejadora) para el desarrollo del proceso de actualización del plan de manejo del Monumento Natural Marino
  - ✓ Archipiélago Cayos Cochinos, se espera durante el mes de julio se firme y dé inicio a la implementación.
  - ✓ Se continúan con las gestiones y establecimiento de alianzas para la publicación e implementación de las consultorías para Actualización del Plan de Manejo Parque Nacional Pico Bonito; y se desarrolla propuesta/mecanismo para el desarrollo de Evaluación.

- ✓ Ecológica Rápida (EER) y Caracterización Socioeconómica (CSE) de la Reserva Forestal Guanaja bajo una modalidad diferente y mucho más eficiente.
- ✓ Se ha avanzado en procesos para la consolidación de convenios de comanejo, logrando la firma de convenio para el Monumento Natural Marino Archipiélagos de Cayos Cochinos, y se cuenta con los respaldos de las municipalidades de La Másica y Esparta para la firma de convenio para el RVS Cuero y Salado y la Municipalidad de Jutiapa para el Parque Nacional Nombre de Dios. Así mismo se han identificado y se ha tenido acercamiento con otros actores interesados en sumarse al comanejo como ser la organización Rainforest Alliance en Honduras y el Colegio de Profesionales Forestales de Honduras.
- ✓ Se sostuvieron reuniones de revisión y ajuste a Términos de Referencia para el desarrollo de las consultorías revisión/actualización de la normativa y formatos para el funcionamiento efectivo del comanejo, estas consultorías se desarrollarán como parte de la asistencia técnica previstas a desarrollar desde la empresa consultora GFA.

### **Proyecto Ejecutado por Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO)**

- **Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres (PGRD) (IDA 5190-HN):** Al 30 de septiembre del 2021, se continuó con las actividades de cierre del proyecto, y culminando las actividades administrativas de los Planes de Atención a la Emergencia de COVID-19 y Tormentas Tropicales Eta e Iota (Componente V), entre las cuales podemos mencionar:
  - ✓ Archivar, numerar y enlistar la documentación financiera, adquisiciones y técnica de la implementación del Proyecto desde el 2013 a la fecha.
  - ✓ Inicio de la Auditoría Externa del proyecto del periodo del 01 de enero de 2021 hasta el 30 de junio de 2021 incluido el periodo de gracia y el Componente Contingente de Respuesta Emergencias (CCRE).
  - ✓ Preparación y Remisión de informes varios solicitados por la SEFIN, Despacho Ministerial, UPEG y otros.
  - ✓ Actualización del sistema de Seguimiento Sistemático de los Intercambios en las Adquisiciones (STEP) del Banco Mundial.
  - ✓ Preparación de información de documentación de desembolsos de las cuentas especiales del proyecto.
  - ✓ Presentación de declaraciones de impuestos ante el SAR.
  - ✓ Pagos relacionados a la ejecución del Componente Contingente de Respuesta a emergencias (CCRE).
  - ✓ Informe final de implementación del Proyecto al Banco Mundial.

#### **i) SECTOR MODERNIZACIÓN DEL ESTADO**

Sus inversiones están destinadas para la ejecución del Proyecto Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Tributaria, el cual está orientado a mejorar los niveles de recaudación tributaria con miras a generar el espacio fiscal necesario para financiar gastos prioritarios y el Proyecto Modernización del Documento Nacional de Identificación en Honduras (Identificate), orientado a mejorar los procesos de identificación del Registro Nacional de las Personas a fin de garantizar confianza en la población hondureña cuyo objetivo central es el documento de identificación de 6,692,680 personas y la actualización de la base de datos del Registro Nacional de las

Personas. A la fecha se registra el 82.5% de ejecución con relación a su presupuesto vigente, los avances físicos en la ejecución al tercer trimestre se detallan:

### **Proyecto Ejecutado por el Registro Nacional de las Personas (RNP)**

- **Proyecto Modernización del Documento Nacional de Identificación en Honduras (Identificate) (BCIE 2235-TRAMO B):** Durante el tercer trimestre del 2021, se continuó con el mapeo, actividad que además de permitir recolectar información de base para la buena planificación, levantar listados de ciudadanos y de organizaciones de sociedad civil dispuestos a realizar veeduría hacia lo interno del proyecto, éstos insumos fueron solicitados y verificados por la ONG, Asociación para una Sociedad más Justa, ASJ, quien elaboró un informe de veeduría y lo presentó al proyecto, en donde se le está dando la atención debida por medio de la unidad de monitoreo para seguimiento y cumplimiento de los hallazgos y recomendaciones.

Al 30 de septiembre el proyecto ha generado 5,429,593 ciudadanos enrolados a nivel nacional de una meta de 5,500,000 de los cuales se han emitido 5,197,733 Documentos de Identificación Nacional (DNI), de las cuales se han entregado 4,353,174 encontrándose pendiente de entrega 844,559 y en proceso de impresión 231,860 Identidades que también están en proceso de correcciones de inconsistencias, por lo anterior, se reporta un porcentaje de ejecución física de 94.50%.

El Proyecto actualmente cuenta con la contratación de 978 empleados entre personal técnico administrativo y Enroladores, para que se desplieguen en los diferentes departamentos y municipios a nivel nacional hasta el 30 de noviembre del 2021.

### **Proyecto Ejecutado por el Servicio de Administración de Rentas (SAR)**

- **Proyecto Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Tributaria:** A continuación, una breve descripción de la ejecución física y financiera del proyecto:

Componente 2.1 Sistema Integrado e Implantado de la Administración Tributaria (AT). En fecha 21 de julio del año en curso se emitió Orden de Inicio al representante legal de la empresa Gestión Tributaria Territorial S.A. (GTT) para la ejecución del “Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas (SIISAR)” actualmente el contrato se encuentra en ejecución así mismo, se otorgó el anticipo correspondiente al 10% del monto del contrato, avalado con una Garantía Bancaria por el mismo valor del anticipo.

Componente 2.2 Infraestructura Tecnológica de Software SAR. En relación con el Sistema Integrado de Bienes y Talento Humano ERP, durante el periodo reportado se concluyó con los módulos correspondiente a la Dirección Nacional de Talento Humano (DNTH) y la Dirección Nacional de Administración Financiera (DNAF). En línea con los objetivos del proyecto y los objetivos estratégicos del SAR, mediante el Fortalecimiento Tecnológico de la Dirección Nacional de Tecnología (DNT), se están llevando a cabo los procesos de adquisición del equipo para el Centro de Datos y actualizar el equipo de Comunicaciones e informático a fin de fortalecer la Red Institucional, actualmente las ofertas de la Licitación Pública Internacional se

encuentran en evaluación, esperando concluir a inicios del IV trimestre para lograr someter a aprobación del Congreso Nacional los contratos que resulten de dicho proceso debido a que trascienden el presente período de gobierno.

El SAR requiere contratar los servicios de acompañamiento durante la evolución tecnológica que se realizará sobre la plataforma PKI-SAR para validar el cumplimiento con los requisitos WebTrust y con ello garantizar la seguridad y privacidad de las transacciones de firma electrónica realizadas por terceros, actualmente el proceso se encuentra en etapa de evaluación de la oferta, también se requiere la adquisición de equipo de redundancia para la plataforma actual, así como el servicio de Sellado de Tiempo (TSA) para seguir la evolución tecnológica de la plataforma de firma electrónica, por tal motivo desde el mes de mayo se iniciaron las primeras acciones para iniciar el proceso de contratación, la adquisición de este Equipo de Redundancia de Firma, el proceso de contratación se encuentra adjudicado, esperando concluir el proceso de firmas para someterlo a aprobación del Congreso Nacional.

#### Componente 3.4 Producto 4 Sistemática de Gestión de Cambio Implantada.

Durante el período reportado se obtuvo la No Objeción del BID para la contratación de la firma que desarrollará la Consultoría para la Implementación de un Plan de Gestión del Cambio Organizacional en el Servicio de Administración de Rentas (SAR), la cual se espera iniciar a finales del mes de octubre del año en curso, misma que está siendo coordinada y liderada por la Dirección Nacional de Talento Humano.

### **j) SECTOR TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS**

Sus inversiones están destinadas para la ejecución para la generación de activos fijos como la Construcción de Obras de Facilitación de Acceso al Recinto Portuario en Puerto Cortés, rehabilitación de obras públicas a causa de las tormentas tropicales Eta e Iota, así como edificaciones de públicas. A la fecha se registra el 22.8% de ejecución con relación a su presupuesto vigente, los avances físicos en la ejecución al tercer trimestre se detallan:

#### **Proyecto ejecutado por el Fondo Hondureño de Inversión Social**

- **Proyecto de Recuperación de Emergencia a causa de los Ciclones Tropicales Eta e Iota (PRE 6822-HN):** A la fecha se han realizado estas y otras actividades al respecto:
  - Revisión de 90 expedientes de subproyectos formulados de los cuales 52 subproyectos han sido elegibles de acuerdo a los criterios de BM.
  - Subsanación a los expedientes de los 52 subproyectos elegibles de acuerdo a los criterios de Elegibilidad y Priorización del BM.
  - Elaboración de ficha técnica conteniendo la información cualitativa y cuantitativa para cada uno de los subproyectos elegibles.
  - Categorización de Gestión del Riesgo a Desastres (GRD) a cada uno de los subproyectos elegibles mediante revisión y evaluación de los expedientes en conjunto con la Dirección de Proyectos de SEDECOAS. (Elaboración de Constancias).
  - Solicitud de información ambiental y social mediante constancias y fichas de información cuantitativa a la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) y Unidad Técnica de Capacitación (UTC).

- Elaboración de una estrategia de intervención de las obras y supervisión de acuerdo a la zona geográfica de estos primeros 52 subproyectos elegibles, planteados en siete paquetes de obra y dos paquetes de supervisión.
- Solicitud de la actualización de los presupuestos de obra de cada subproyecto a la Dirección de Proyectos de la SEDECOAS
- Elaboración y solicitud de No Objeción al BM del Plan de Adquisiciones y Contrataciones (PAC).
- Solicitud de revisión y No Objeción por parte del BM de los expedientes en digital del primer paquete de obras (ocho subproyectos).
- Solicitud de revisión y No Objeción por parte del BM del documento base para el primer paquete de Supervisión (incluye paquetes de Obra 1, 4, 6 y7).
- Se trabaja en la subsanación de las actividades antes mencionadas de los demás paquetes de obra que incluyen los 44 expedientes de subproyectos elegibles.

**Proyecto ejecutado por la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP)**

- **Construcción del edificio anexo del Tribunal Superior de Cuenta, ubicado en la ciudad de Comayagüela, Municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán:** El proyecto inicio su etapa de ejecución durante el tercer trimestre de 2021, lo que representa el inicio de obras de construcción del edificio anexo del Tribunal Superior de Cuentas, ubicado en la ciudad de Comayagüela, M.D.C. Se ha realizado el pago del anticipo y se han recibido las solicitudes de pago por presentación de las estimaciones 2, 3 y 4 por parte de la empresa constructora Salvador García & Asociados.

**1.7 Factores que han Incidido en la Ejecución de la Inversión Pública, para el Tercer Trimestre del Año 2021**

Durante la ejecución de programas y proyectos, se presenta una serie de obstáculos que limitan la normal ejecución de los mismos, en términos físicos y financieros, sin cumplir el objetivo esperado, y por ende la ausencia de impacto en la población meta. Entre los problemas relevantes sobresalen:

Área	Problemas	Acciones
<b>Técnica</b>	<p>La declaratoria de emergencia nacional por COVID-19, según decreto ejecutivo No. 005-2020, PCM-023-2020 y PCM-146-2020 ampliado al 31 de diciembre del 2021, Decreto Ejecutivo PCM-147-2021, emitido el 29 de diciembre 2020, mediante el cual se prorroga la vigencia de la declaratoria de Estado de Emergencia a nivel nacional, por los efectos de las fuertes lluvias ocasionadas por las Tormentas Tropicales “ETA” e “IOTA”, hasta el 31 de diciembre del 2021, decretada en todo el territorio nacional, en la infraestructura vial y sector productivo del País. Ocasionó la paralización de las obras ejecutadas por los proyectos. Así como las actividades programadas en sus Planes Operativos Anuales.</p>	<p>Las unidades ejecutoras deberán de realizar las modificaciones a sus planes operativos y planes de ejecución de sus proyectos, a fin de dar continuidad a las obras pendientes, ampliar fechas de extensión de contratos, o suspensión de contratos.</p> <p>Buscar mecanismos para agilizar la ejecución de proyectos, ya que la baja ejecución impacta directamente en la economía del país.</p>
	<p>Debilidad en el ciclo de pre inversión, lo que se traduce en la modificación o reformulación de los proyectos, incrementando el costo de los mismos, teniendo que ser cubiertos por el Gobierno.</p>	<p>Se debe dar mayor importancia a la elaboración de los diseños y estudios de proyectos, pasando por todos los niveles de pre inversión: idea, perfil, pre factibilidad y factibilidad; y de acuerdo a la Guía metodológica de Formulación de proyectos de Inversión de la DGIP.</p>
	<p>La inadecuada planificación por parte de las unidades ejecutoras de proyectos, ocasiona reprogramación de metas, lo que implica solicitar al Organismo Financiado su No Objeción (en caso de los préstamos), ocasionando retrasos en la ejecución.</p>	<p>Brindar por parte de la DGIP, asistencia técnica a las instituciones gubernamentales en la identificación, formulación y evaluación de proyectos.</p>
	<p>Lentos procesos de adquisiciones y contrataciones, desfasando la ejecución oportuna de los proyectos.</p>	<p>Realizar una revisión de los posibles puntos débiles en los procesos de adquisiciones, prever tiempos para cada proceso y tomar en cuenta los tiempos que estipulan los organismos de financiamiento.</p>

Área	Problemas	Acciones
Administrativa-Financiera	Desfase de la ejecución, considerando la tardía presentación de estimaciones de avance por parte de los proveedores.	Identificar mecanismos de control para establecer tiempos de entrega en los informes de estimaciones, tratando de programar los pagos de acuerdo al tiempo que corresponde.
	El proceso de cumplimiento de condiciones previas para que declaren vigente el préstamo los organismos financiadores y el cumplimiento de condiciones previas al Segundo desembolso, es lento.	La Unidad Ejecutora responsable y la SEFIN, deben dar un seguimiento puntual para mejorar dichos procesos.
	Falta de un mecanismo para acelerar las exoneraciones de impuestos que están sujetos los proyectos de inversión	Implementar acciones con la Dirección General de Franquicias Aduaneras, para mejorar la atención a las gestiones de proyectos y otorgar una respuesta oportuna a las unidades ejecutoras.
Legal	Problemas con las licencias ambientales para iniciará proceso de construcción lo que viene a atrasar el inicio de las obras	Las instituciones gubernamentales deberán revisar los procesos a fin de acelerar el otorgamiento de las licencias ambientales a los proyectos.

ANEXO II  
Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública  
**PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE, 2021**  
Cifras en Lempiras

Sector / Institución / Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado (Devengado Anual)				Ejecutado (Devengado III Trimestre)				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
		Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comp./Vig.)
<b>Agua y Saneamiento</b>		-	1,085,876,163	1,085,876,163	-	467,990,614	467,990,614	-	80,288,844	80,288,844	17	-	77,704,630	77,704,630	17	-	84,643,614	84,643,614	18
<b>0031 - Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)</b>		-	-	-	-	15,218,021	15,218,021	-	354,004	354,004	2	-	354,004	354,004	2	-	1,440,600	1,440,600	9
023 - PROYECTO DE SEGURIDAD HIDRICA EN EL CORREDOR SECO DE HONDURAS	IDA-6680-HN	-	-	-	-	11,009,000	11,009,000	-	354,004	354,004	3	-	354,004	354,004	3	-	1,440,600	1,440,600	13
<b>Total 023 - PROYECTO DE SEGURIDAD HIDRICA EN EL CORREDOR SECO DE HONDURAS</b>		-	-	-	-	11,009,000	11,009,000	-	354,004	354,004	3	-	354,004	354,004	3	-	1,440,600	1,440,600	13
024 - Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana	IDA 6696-HN	-	-	-	-	4,209,021	4,209,021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total 024 - Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana</b>		-	-	-	-	4,209,021	4,209,021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1801 - Alcaldía Municipal del Distrito Central</b>		-	166,597,069	166,597,069	-	452,772,593	452,772,593	-	79,934,841	79,934,841	18	-	77,350,626	77,350,626	17	-	83,203,014	83,203,014	18
001 - Proyecto para Fortalecer la Prestación de Agua Potable de Tegucigalpa	IDA 6460	-	166,597,069	166,597,069	-	452,772,593	452,772,593	-	79,934,841	79,934,841	18	-	77,350,626	77,350,626	17	-	83,203,014	83,203,014	18
<b>Total 001 - Proyecto para Fortalecer la Prestación de Agua Potable de Tegucigalpa</b>		-	166,597,069	166,597,069	-	452,772,593	452,772,593	-	79,934,841	79,934,841	18	-	77,350,626	77,350,626	17	-	83,203,014	83,203,014	18
<b>0449 - Servicios Financieros de la Administración Central</b>		-	919,279,094	919,279,094	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO URBANO DE AGUA POTABLE EN HONDURAS US\$ 45.0		-	743,942,364	743,942,364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROYECTO SEGURIDAD HIDRICA EN EL CORREDOR SECO DE HONDURAS US\$ 85.00		-	175,336,730	175,336,730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Carreteras</b>		3,418,815,929	1,408,013,091	4,826,829,020	4,089,844,786	2,198,266,599	6,288,111,385	2,299,069,174	696,399,711	2,995,468,885	48	156,265,567	201,495,695	357,761,262	6	2,390,024,135	732,465,216	3,122,489,350	50
<b>0031 - Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)</b>		-	1,116,879,945	1,116,879,945	561,000	923,745,578	924,306,578	554,897	590,022,220	590,577,117	64	554,897	170,259,945	170,814,842	18	554,897	624,119,734	624,674,631	68
010 - PROGRAMA VIAL DE INTEGRACION VIAL REGIONAL II	BID-3815/BL-HO	-	42,293,952	42,293,952	-	35,101,748	35,101,748	-	13,406,042	13,406,042	38	-	5,111,483	5,111,483	15	-	25,517,523	25,517,523	73
<b>Total 010 - PROGRAMA VIAL DE INTEGRACION VIAL REGIONAL II</b>		-	42,293,952	42,293,952	-	35,101,748	35,101,748	-	13,406,042	13,406,042	38	-	5,111,483	5,111,483	15	-	25,517,523	25,517,523	73
011 - CORREDOR PACIFICO-PROGRAMA DE INTEGRACION VIAL REGIONAL	BID_2470BL-HO-2	-	71,628,163	71,628,163	-	97,719,637	97,719,637	-	25,085,328	25,085,328	26	-	21,944,992	21,944,992	22	-	26,852,368	26,852,368	27
<b>Total 011 - CORREDOR PACIFICO-PROGRAMA DE INTEGRACION VIAL REGIONAL</b>		-	71,628,163	71,628,163	-	97,719,637	97,719,637	-	25,085,328	25,085,328	26	-	21,944,992	21,944,992	22	-	26,852,368	26,852,368	27
013 - REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE ORIENTE, CARRETERA TEGUCIGALPA-DANLI, FASE I: TRAMO NETEAPA-DANLI	BID_2470BL-HO-2	-	302,025,782	302,025,782	-	246,713,096	246,713,096	-	160,085,718	160,085,718	65	-	-	-	-	-	172,813,201	172,813,201	70
<b>Total 013 - REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE ORIENTE</b>		-	459,085,484	459,085,484	-	369,168,955	369,168,955	-	275,643,920	275,643,920	75	-	43,398,364	43,398,364	12	-	294,998,962	294,998,962	80
015 - Libramiento Anillo Periférico CA-5 Sur	BCIE 2221	-	252,085,623	252,085,623	-	13,084,320	13,084,320	-	3,684,954	3,684,954	28	-	3,056,369	3,056,369	23	-	4,134,548	4,134,548	32
<b>Total 015 - Libramiento Anillo Periférico CA-5 Sur</b>		-	252,085,623	252,085,623	-	13,084,320	13,084,320	-	3,684,954	3,684,954	28	-	3,056,369	3,056,369	23	-	4,134,548	4,134,548	32
020 - CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III	BCIE 2116	-	-	-	561,000	1,451,335	2,012,335	554,897	1,437,475	1,992,372	99	554,897	-	554,897	28	554,897	1,437,934	1,992,832	99
	BCIE-2205	-	-	-	-	2,429,499	2,429,499	-	1,674,798	1,674,798	69	-	-	-	-	-	1,674,798	1,674,798	69
<b>Total 020 - CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO</b>		-	-	-	561,000	3,880,834	4,441,834	554,897	3,112,273	3,667,170	83	554,897	-	554,897	12	554,897	3,112,732	3,667,629	83
021 - Ampliación y Mejoramiento de Carretera CA-5 Norte Segmentos I y II (Sección 2A), Tramo Las Mercedes-Empalme Villa de San Antonio	BCIE - 2098	-	2,500,000	2,500,000	-	1,841,500	1,841,500	-	1,277,803	1,277,803	69	-	449,600	449,600	24	-	1,691,700	1,691,700	92
<b>Total 021 - Ampliación y Mejoramiento de Carretera CA-5 Norte Segmentos</b>		-	2,500,000	2,500,000	-	1,841,500	1,841,500	-	1,277,803	1,277,803	69	-	449,600	449,600	24	-	1,691,700	1,691,700	92
022 - PROYECTO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN, SECCION I	BCIE 2177	-	289,286,723	289,286,723	-	402,948,584	402,948,584	-	267,811,901	267,811,901	66	-	96,299,136	96,299,136	24	-	267,811,901	267,811,901	66
<b>Total 022 - PROYECTO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN, SECCION I</b>		-	289,286,723	289,286,723	-	402,948,584	402,948,584	-	267,811,901	267,811,901	66	-	96,299,136	96,299,136	24	-	267,811,901	267,811,901	66
<b>0120 - Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos</b>		533,657,648	37,753,908	571,411,556	599,114,254	191,812,062	790,926,316	387,032,553	69,848,165	456,880,718	58	145,175,990	12,613,991	157,789,982	20	477,987,513	69,848,165	547,835,678	69
016 - Construcción y/o Rehabilitación de Obras de Drenaje en los Departamentos de Francisco Morazán y Lempira	FN-24057-1	5,269,000	-	5,269,000	5,269,000	-	5,269,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total 016 - Construcción y/o Rehabilitación de Obras de Drenaje en los Departamentos de Francisco Morazán y Lempira</b>		5,269,000	-	5,269,000	5,269,000	-	5,269,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
023 - Construcción del Puente Los Niños, con una Longitud Aproximada de 260 metros lineales, Localizado en Cantarranas, Departamento de Francisco Morazán.	FN-23879-1	77,401,192	-	77,401,192	77,401,192	-	77,401,192	11,882,872	-	11,882,872	15	11,882,872	-	11,882,872	15	62,051,163	-	62,051,163	80
<b>Total 023 - Construcción del Puente Los Niños, con una Longitud Aproximada de 260 metros lineales, Localizado en Cantarranas, Departamento de Francisco Morazán.</b>		77,401,192	-	77,401,192	77,401,192	-	77,401,192	11,882,872	-	11,882,872	15	11,882,872	-	11,882,872	15	62,051,163	-	62,051,163	80
024 - RECONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO JOCOMICO, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 25.4 ML, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA ENCARNACION DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE.	FN-24020-1	10,425,461	-	10,425,461	10,425,461	-	10,425,461	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total 024 - RECONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO JOCOMICO, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 25.4 ML, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA ENCARNACION DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE.</b>		10,425,461	-	10,425,461	10,425,461	-	10,425,461	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
027 - CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES EN LOS DEPARTAMENTOS VALLE, COMAYAGUA, INTIBUCA, EL PARAISO, LEMPIRA, COPAN, OCOTEPEQUE, ATLANTIDA, COLON, LA PAZ, YORO, FRANCISCO MORAZAN, OLANCHO, CHOLUTECA, C	FN-24002-1	81,839,965	-	81,839,965	102,296,571	-	102,296,571	78,738,118	-	78,738,118	77	7,996,723	-	7,996,723	8	80,655,904	-	80,655,904	79
<b>Total 027 - CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES EN LOS DEPARTAMENTOS VALLE, COMAYAGUA, INTIBUCA, EL PARAISO, LEMPIRA, COPAN, OCOTEPEQUE, ATLANTIDA, COLON, LA PAZ, YORO, FRANCISCO MORAZAN, OLANCHO, CHOLUTECA, C</b>		81,839,965	-	81,839,965	102,296,571	-	102,296,571	78,738,118	-	78,738,118	77	7,996,723	-	7,996,723	8	80,655,904	-	80,655,904	79

ANEXO II  
Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública  
**PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE, 2021**  
Cifras en Lempiras

Sector / Institución / Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado (Devengado Anual)				Ejecutado (Devengado III Trimestre)				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
		Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comp./Vig.)
028 - Obras de Construcción de Pavimentos de Concreto Hidráulico en Vías Urbanas en los Departamentos de Paraiso, Cortes, Olancho, Copan, La Paz, Francisco Morazan, Santa Barbara, Intibucá, Valle, Atlántida,	FN-24084-1	150,165,746	-	150,165,746	150,165,746	-	150,165,746	141,389,607	-	141,389,607	94	97,281,950	-	97,281,950	65	148,986,373	-	148,986,373	99
<b>Total 028 - Obras de Construcción de Pavimentos de Concreto Hidráulico en</b>		<b>150,165,746</b>	<b>-</b>	<b>150,165,746</b>	<b>150,165,746</b>	<b>-</b>	<b>150,165,746</b>	<b>141,389,607</b>	<b>-</b>	<b>141,389,607</b>	<b>94</b>	<b>97,281,950</b>	<b>-</b>	<b>97,281,950</b>	<b>65</b>	<b>148,986,373</b>	<b>-</b>	<b>148,986,373</b>	<b>99</b>
116 - CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS-CUEVAS DE TALGUA	FONDOS NACIONALES 0000003-13	-	-	-	45,000,000	-	45,000,000	22,566,614	-	22,566,614	50	-	-	-	-	45,000,000	-	45,000,000	100
<b>Total 116 - CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS-CL</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>45,000,000</b>	<b>-</b>	<b>45,000,000</b>	<b>22,566,614</b>	<b>-</b>	<b>22,566,614</b>	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>45,000,000</b>	<b>-</b>	<b>45,000,000</b>	<b>100</b>
121 - REHABILITACIÓN VIAL DEL CORREDOR DE OCCIDENTE: LA ENTRADA - COPAN RUINAS - EL FLORIDO Y LA ENTRADA-SANTA ROSA DE COPAN	BCIE-2156	-	-	-	-	34,569,655	34,569,655	-	30,423,301	30,423,301	88	-	12,613,991	12,613,991	36	-	30,423,301	30,423,301	88
	BEI-FI No.84859	1,797,480	37,753,908	39,551,388	1,797,480	146,571,927	148,369,407	1,291,019	37,086,838	38,377,857	26	-	-	-	-	1,291,019	37,086,838	38,377,857	26
	DCI-ALA/2015/369-566	-	-	-	-	2,620,650	2,620,650	-	2,338,025	2,338,025	89	-	-	-	-	-	2,338,025	2,338,025	89
	TA2015034 HN LIF	-	-	-	-	8,049,830	8,049,830	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total 121 - REHABILITACIÓN VIAL DEL CORREDOR DE OCCIDENTE: LA ENTRADA - COPAN RUINAS - EL FLORIDO Y LA ENTRADA-SANTA ROSA DE COPAN</b>		<b>1,797,480</b>	<b>37,753,908</b>	<b>39,551,388</b>	<b>1,797,480</b>	<b>191,812,062</b>	<b>193,609,542</b>	<b>1,291,019</b>	<b>69,848,165</b>	<b>71,139,184</b>	<b>37</b>	<b>-</b>	<b>12,613,991</b>	<b>12,613,991</b>	<b>7</b>	<b>1,291,019</b>	<b>69,848,165</b>	<b>71,139,184</b>	<b>37</b>
144 - CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL TRAMO CARRETERO VALLADOLID - LA VIRTUD ¿ MAPULACA, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 30 KM, LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.	FN-INSEP-23245	100,300,000	-	100,300,000	100,300,000	-	100,300,000	95,207,281	-	95,207,281	95	22,956,119	-	22,956,119	23	98,970,745	-	98,970,745	99
<b>Total 144 - CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL TRAMO CARRETERO VALLADOLID - LA VIRTUD ¿ MAPULACA, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 30 KM, LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.</b>		<b>100,300,000</b>	<b>-</b>	<b>100,300,000</b>	<b>100,300,000</b>	<b>-</b>	<b>100,300,000</b>	<b>95,207,281</b>	<b>-</b>	<b>95,207,281</b>	<b>95</b>	<b>22,956,119</b>	<b>-</b>	<b>22,956,119</b>	<b>23</b>	<b>98,970,745</b>	<b>-</b>	<b>98,970,745</b>	<b>99</b>
146 - CONSTRUCCION A CUATRO (4) CARRILES DEL BULEVAR DE COMAYAGUA, ETAPA II: ESTACION 2+500 - HACIA DESVIO DE AJUTERIQUE, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 1 KM, LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEPARTAME	FN-INSEP-23441-1	37,577,959	-	37,577,959	37,577,959	-	37,577,959	32,502,691	-	32,502,691	86	5,058,326	-	5,058,326	13	37,577,959	-	37,577,959	100
<b>Total 146 - CONSTRUCCION A CUATRO (4) CARRILES DEL BULEVAR DE COMAYAGUA, ETAPA II: ESTACION 2+500 - HACIA DESVIO DE AJUTERIQUE, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 1 KM, LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEPARTAME</b>		<b>37,577,959</b>	<b>-</b>	<b>37,577,959</b>	<b>37,577,959</b>	<b>-</b>	<b>37,577,959</b>	<b>32,502,691</b>	<b>-</b>	<b>32,502,691</b>	<b>86</b>	<b>5,058,326</b>	<b>-</b>	<b>5,058,326</b>	<b>13</b>	<b>37,577,959</b>	<b>-</b>	<b>37,577,959</b>	<b>100</b>
148 - CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, DE BULEVAR A CUATRO (4) CARRILES CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 544 Mts. Y CALLE DE ACCESO CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 429 Mts.; LOCALIZADO EN	FN-23931-1	21,033,049	-	21,033,049	21,033,049	-	21,033,049	3,454,351	-	3,454,351	16	-	-	-	-	3,454,351	-	3,454,351	16
<b>Total 148 - CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, DE BULEVAR A CUATRO (4) CARRILES CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 544 Mts. Y CALLE DE ACCESO CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 429 Mts.; LOCALIZADO EN</b>		<b>21,033,049</b>	<b>-</b>	<b>21,033,049</b>	<b>21,033,049</b>	<b>-</b>	<b>21,033,049</b>	<b>3,454,351</b>	<b>-</b>	<b>3,454,351</b>	<b>16</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,454,351</b>	<b>-</b>	<b>3,454,351</b>	<b>16</b>
149 - Construcción y Pavimentación a Cuatro (4) Carriles de Bulevar Enrique Weddle (0.51 Kms) y Bulevar Choroteaga (1.24 Kms), y Construcción y Pavimentación de Tramo de Conexión a dos (2) Carriles entre Bul	FN-24137-1	47,847,796	-	47,847,796	47,847,796	-	47,847,796	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total 149 - Construcción y Pavimentación a Cuatro (4) Carriles de Bulevar Enrique Weddle (0.51 Kms) y Bulevar Choroteaga (1.24 Kms), y Construcción y Pavimentación de Tramo de Conexión a dos (2) Carriles entre Bul</b>		<b>47,847,796</b>	<b>-</b>	<b>47,847,796</b>	<b>47,847,796</b>	<b>-</b>	<b>47,847,796</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1801 - Alcaldía Municipal del Distrito Central</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>114,525,416</b>	<b>114,525,416</b>	<b>-</b>	<b>36,529,326</b>	<b>36,529,326</b>	<b>32</b>	<b>-</b>	<b>18,621,759</b>	<b>18,621,759</b>	<b>16</b>	<b>-</b>	<b>38,497,317</b>	<b>38,497,317</b>	<b>34</b>
001 - PROYECTO DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TEGUCIGALPA - COMAYAGUELA)	BID-2465/BL-HO	-	-	-	-	114,525,416	114,525,416	-	36,529,326	36,529,326	32	-	18,621,759	18,621,759	16	-	38,497,317	38,497,317	34
<b>Total 001 - PROYECTO DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>114,525,416</b>	<b>114,525,416</b>	<b>-</b>	<b>36,529,326</b>	<b>36,529,326</b>	<b>32</b>	<b>-</b>	<b>18,621,759</b>	<b>18,621,759</b>	<b>16</b>	<b>-</b>	<b>38,497,317</b>	<b>38,497,317</b>	<b>34</b>
049 - Servicios Financieros de la Administración Central		-	253,379,238	253,379,238	-	968,183,543	968,183,543	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROYECTOS EN EL MARCO DEL GASTO DE MEDIANO PLAZO		-	253,379,238	253,379,238	-	968,183,543	968,183,543	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4620 - Superintendencia de Alianza Público Privada (SAPP)</b>		<b>35,158,281</b>	<b>-</b>	<b>35,158,281</b>	<b>35,671,895</b>	<b>-</b>	<b>35,671,895</b>	<b>28,649,877</b>	<b>-</b>	<b>28,649,877</b>	<b>80</b>	<b>10,534,679</b>	<b>-</b>	<b>10,534,679</b>	<b>30</b>	<b>28,649,877</b>	<b>-</b>	<b>28,649,877</b>	<b>80</b>
PROYECTOS APP - CORREDOR LENCA		35,158,281	-	35,158,281	35,671,895	-	35,671,895	28,649,877	-	28,649,877	80	10,534,679	-	10,534,679	30	28,649,877	-	28,649,877	80
69270 - Fideicomiso de Infraestructura Vial		2,850,000,000	-	2,850,000,000	3,454,497,637	-	3,454,497,637	1,882,831,847	-	1,882,831,847	55	-	-	-	-	1,882,831,847	-	1,882,831,847	55
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL		2,850,000,000	-	2,850,000,000	3,454,497,637	-	3,454,497,637	1,882,831,847	-	1,882,831,847	55	-	-	-	-	1,882,831,847	-	1,882,831,847	55
<b>Desarrollo Productivo y Riego</b>		<b>307,035,359</b>	<b>1,666,695,699</b>	<b>1,973,731,058</b>	<b>90,035,359</b>	<b>1,520,884,498</b>	<b>1,610,919,857</b>	<b>5,306,345</b>	<b>509,150,326</b>	<b>514,456,670</b>	<b>32</b>	<b>4,584,956</b>	<b>215,374,899</b>	<b>219,959,855</b>	<b>14</b>	<b>5,306,345</b>	<b>543,914,438</b>	<b>549,220,783</b>	<b>34</b>
<b>0031 - Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)</b>		<b>-</b>	<b>757,415,140</b>	<b>757,415,140</b>	<b>-</b>	<b>693,999,773</b>	<b>693,999,773</b>	<b>-</b>	<b>360,831,118</b>	<b>360,831,118</b>	<b>52</b>	<b>-</b>	<b>177,158,692</b>	<b>177,158,692</b>	<b>26</b>	<b>-</b>	<b>395,595,231</b>	<b>395,595,231</b>	<b>57</b>
004 - ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO (USAID-GAFSP)	Carta de Ejecución No. 7 USAID	-	-	-	-	54,613,104	54,613,104	-	21,885,444	21,885,444	40	-	-	-	-	21,885,444	-	21,885,444	40
	TF017904	-	147,955,358	147,955,358	-	175,990,845	175,990,845	-	113,732,495	113,732,495	65	-	42,209,369	42,209,369	24	-	137,620,847	137,620,847	78
<b>Total 004 - ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO (USAID-GAFSP)</b>		<b>-</b>	<b>147,955,358</b>	<b>147,955,358</b>	<b>-</b>	<b>230,603,949</b>	<b>230,603,949</b>	<b>-</b>	<b>135,617,939</b>	<b>135,617,939</b>	<b>59</b>	<b>-</b>	<b>42,209,369</b>	<b>42,209,369</b>	<b>18</b>	<b>-</b>	<b>159,506,437</b>	<b>159,506,437</b>	<b>69</b>
009 - Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II)	IDA-6448-HN	-	-	-	-	255,134,127	255,134,127	-	139,598,905	139,598,905	55	-	120,843,977	120,843,977	47	-	148,426,572	148,426,572	58
<b>Total 009 - Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>255,134,127</b>	<b>255,134,127</b>	<b>-</b>	<b>139,598,905</b>	<b>139,598,905</b>	<b>55</b>	<b>-</b>	<b>120,843,977</b>	<b>120,843,977</b>	<b>47</b>	<b>-</b>	<b>148,426,572</b>	<b>148,426,572</b>	<b>58</b>



ANEXO II  
Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública  
**PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE, 2021**  
Cifras en Lempiras

Sector / Institución / Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado (Devengado Anual)				Ejecutado (Devengado III Trimestre)				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
		Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comp./Vig.)
010 - PROYECTO DE ENERGÍA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PRO-ENERGÍA RURAL	EDCF No. HND-5	-	51,532,013	51,532,013	-	51,532,013	51,532,013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total 010 - PROYECTO DE ENERGÍA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PRO-ENERGÍA RURAL</b>		-	<b>51,532,013</b>	<b>51,532,013</b>	-	<b>51,532,013</b>	<b>51,532,013</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>0801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica</b>		<b>147,485,000</b>	<b>1,575,004,696</b>	<b>1,722,489,696</b>	<b>147,485,000</b>	<b>1,575,004,696</b>	<b>1,722,489,696</b>	<b>2,434,608</b>	<b>300,897,843</b>	<b>303,332,452</b>	<b>18</b>	<b>950,761</b>	<b>56,805,252</b>	<b>57,756,012</b>	<b>3</b>	<b>2,461,609</b>	<b>512,094,883</b>	<b>514,556,492</b>	<b>30</b>
012 - APOYO AL PLAN ESTRATÉGICO DE ACCESO UNIVERSAL A ELECTRICIDAD	ATN/OC-16427-HO-BID	-	10,000,000	10,000,000	-	12,459,500	12,459,500	-	5,772,284	5,772,284	46	-	5,772,284	5,772,284	46	-	6,870,263	6,870,263	55
<b>Total 012 - APOYO AL PLAN ESTRATÉGICO DE ACCESO UNIVERSAL A ELECTRICIDAD</b>		-	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	-	<b>12,459,500</b>	<b>12,459,500</b>	-	<b>5,772,284</b>	<b>5,772,284</b>	<b>46</b>	-	<b>5,772,284</b>	<b>5,772,284</b>	<b>46</b>	-	<b>6,870,263</b>	<b>6,870,263</b>	<b>55</b>
018 - PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO	ATN/JF-17247-HO	-	10,465,000	10,465,000	-	8,005,500	8,005,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BID 3435/BL-HO	128,000,000	32,493,500	160,493,500	128,000,000	38,163,500	166,163,500	1,724,779	13,238,531	14,963,310	9	733,500	2,047,630	2,781,130	2	1,751,757	26,808,275	28,560,032	17
	JICA HO-P6	-	573,277,196	573,277,196	-	573,277,196	573,277,196	-	6,722,488	6,722,488	1	-	956,026	956,026	0	-	6,722,488	6,722,488	1
<b>Total 018 - PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO</b>		<b>128,000,000</b>	<b>616,235,696</b>	<b>744,235,696</b>	<b>128,000,000</b>	<b>619,446,196</b>	<b>747,446,196</b>	<b>1,724,779</b>	<b>19,961,019</b>	<b>21,685,798</b>	<b>3</b>	<b>733,500</b>	<b>3,003,656</b>	<b>3,737,156</b>	<b>0</b>	<b>1,751,757</b>	<b>33,530,762</b>	<b>35,282,520</b>	<b>5</b>
020 - APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)	GRT/SX-16864-HO	-	40,400,000	40,400,000	-	40,400,000	40,400,000	-	3,499,997	3,499,997	9	-	1,080,476	1,080,476	3	-	10,290,008	10,290,008	25
<b>Total 020 - APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)</b>		-	<b>40,400,000</b>	<b>40,400,000</b>	-	<b>40,400,000</b>	<b>40,400,000</b>	-	<b>3,499,997</b>	<b>3,499,997</b>	<b>9</b>	-	<b>1,080,476</b>	<b>1,080,476</b>	<b>3</b>	-	<b>10,290,008</b>	<b>10,290,008</b>	<b>25</b>
021 - APOYO AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES	ATN/SX-16689-HO	-	17,904,000	17,904,000	-	17,904,000	17,904,000	-	4,040,288	4,040,288	23	-	2,533,609	2,533,609	14	-	7,878,250	7,878,250	44
<b>Total 021 - APOYO AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES</b>		-	<b>17,904,000</b>	<b>17,904,000</b>	-	<b>17,904,000</b>	<b>17,904,000</b>	-	<b>4,040,288</b>	<b>4,040,288</b>	<b>23</b>	-	<b>2,533,609</b>	<b>2,533,609</b>	<b>14</b>	-	<b>7,878,250</b>	<b>7,878,250</b>	<b>44</b>
022 - ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LUGARES AISLADOS	BID-GRT/SX-17123-HO	-	90,465,000	90,465,000	-	90,465,000	90,465,000	-	1,084,725	1,084,725	1	-	146,437	146,437	0	-	1,680,545	1,680,545	2
<b>Total 022 - ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LUGARES AISLADOS</b>		-	<b>90,465,000</b>	<b>90,465,000</b>	-	<b>90,465,000</b>	<b>90,465,000</b>	-	<b>1,084,725</b>	<b>1,084,725</b>	<b>1</b>	-	<b>146,437</b>	<b>146,437</b>	<b>0</b>	-	<b>1,680,545</b>	<b>1,680,545</b>	<b>2</b>
023 - APOYO AL PROGRAMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	BID-4598/BL-HO	19,485,000	757,960,000	777,445,000	19,485,000	752,290,000	771,775,000	709,830	254,614,629	255,324,459	33	217,261	44,276,439	44,493,700	6	709,852	410,088,780	410,798,631	53
	BID-4599/SX-HO	-	42,040,000	42,040,000	-	42,040,000	42,040,000	-	11,924,900	11,924,900	28	-	7,650	7,650	0	-	41,756,275	41,756,275	99
<b>Total 023 - APOYO AL PROGRAMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>		<b>19,485,000</b>	<b>800,000,000</b>	<b>819,485,000</b>	<b>19,485,000</b>	<b>794,330,000</b>	<b>813,815,000</b>	<b>709,830</b>	<b>266,539,529</b>	<b>267,249,359</b>	<b>33</b>	<b>217,261</b>	<b>44,268,789</b>	<b>44,486,050</b>	<b>5</b>	<b>709,852</b>	<b>451,845,055</b>	<b>452,554,906</b>	<b>56</b>
Modernización del Estado		165,143,893	725,299,356	890,443,249	168,143,893	954,431,866	1,122,575,759	65,497,860	862,536,186	928,034,047	83	41,441,794	176,900,690	218,342,484	19	100,603,411	864,725,835	965,329,246	86
<b>0037 - Servicio de Administración de Rentas</b>		-	<b>290,997,105</b>	<b>290,997,105</b>	-	<b>100,863,712</b>	<b>100,863,712</b>	-	<b>50,297,989</b>	<b>50,297,989</b>	<b>50</b>	-	<b>29,739,762</b>	<b>29,739,762</b>	<b>29</b>	-	<b>52,007,302</b>	<b>52,007,302</b>	<b>52</b>
001 - Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Tributaria	BID-3541/BL-HO	-	290,997,105	290,997,105	-	100,863,712	100,863,712	-	50,297,989	50,297,989	50	-	29,739,762	29,739,762	29	-	52,007,302	52,007,302	52
<b>Total 001 - Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Tributaria</b>		-	<b>290,997,105</b>	<b>290,997,105</b>	-	<b>100,863,712</b>	<b>100,863,712</b>	-	<b>50,297,989</b>	<b>50,297,989</b>	<b>50</b>	-	<b>29,739,762</b>	<b>29,739,762</b>	<b>29</b>	-	<b>52,007,302</b>	<b>52,007,302</b>	<b>52</b>
<b>0100 - Secretaría de Finanzas</b>		<b>162,000,000</b>	-	<b>162,000,000</b>	<b>165,000,000</b>	-	<b>165,000,000</b>	<b>63,331,779</b>	-	<b>63,331,779</b>	<b>38</b>	<b>40,983,064</b>	-	<b>40,983,064</b>	<b>25</b>	<b>97,827,327</b>	-	<b>97,827,327</b>	<b>59</b>
001 - Modernización Integral de la Gestión de las Finanzas Públicas	FN 23753-1	162,000,000	-	162,000,000	165,000,000	-	165,000,000	63,331,779	-	63,331,779	38	40,983,064	-	40,983,064	25	97,827,327	-	97,827,327	59
<b>Total 001 - Modernización Integral de la Gestión de las Finanzas Públicas</b>		<b>162,000,000</b>	-	<b>162,000,000</b>	<b>165,000,000</b>	-	<b>165,000,000</b>	<b>63,331,779</b>	-	<b>63,331,779</b>	<b>38</b>	<b>40,983,064</b>	-	<b>40,983,064</b>	<b>25</b>	<b>97,827,327</b>	-	<b>97,827,327</b>	<b>59</b>
<b>0130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social</b>		<b>3,143,893</b>	<b>83,518,319</b>	<b>86,662,212</b>	<b>3,143,893</b>	<b>52,294,841</b>	<b>55,438,734</b>	<b>2,166,081</b>	<b>36,033,403</b>	<b>38,199,485</b>	<b>69</b>	<b>458,730</b>	<b>10,322,703</b>	<b>10,781,433</b>	<b>19</b>	<b>2,776,084</b>	<b>36,033,403</b>	<b>38,809,487</b>	<b>70</b>
001 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JÓVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR)	DCI-ALA/2014/026-851	3,143,893	83,518,319	86,662,212	3,143,893	52,294,841	55,438,734	2,166,081	36,033,403	38,199,485	69	458,730	10,322,703	10,781,433	19	2,776,084	36,033,403	38,809,487	70
<b>Total 001 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JÓVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR)</b>		<b>3,143,893</b>	<b>83,518,319</b>	<b>86,662,212</b>	<b>3,143,893</b>	<b>52,294,841</b>	<b>55,438,734</b>	<b>2,166,081</b>	<b>36,033,403</b>	<b>38,199,485</b>	<b>69</b>	<b>458,730</b>	<b>10,322,703</b>	<b>10,781,433</b>	<b>19</b>	<b>2,776,084</b>	<b>36,033,403</b>	<b>38,809,487</b>	<b>70</b>
<b>0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería</b>		-	-	-	-	<b>4,450,000</b>	<b>4,450,000</b>	-	<b>475,430</b>	<b>475,430</b>	<b>11</b>	-	<b>475,430</b>	<b>11</b>	-	<b>955,766</b>	<b>955,766</b>	<b>21</b>	
011 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP), DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG) EN HONDURAS.	DN-No.2000001838-FIDA-SAG	-	-	-	-	4,450,000	4,450,000	-	475,430	475,430	11	-	475,430	11	-	955,766	955,766	21	
<b>Total 011 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP), DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG) EN HONDURAS.</b>		-	-	-	-	<b>4,450,000</b>	<b>4,450,000</b>	-	<b>475,430</b>	<b>475,430</b>	<b>11</b>	-	<b>475,430</b>	<b>11</b>	-	<b>955,766</b>	<b>955,766</b>	<b>21</b>	
<b>0180 - Registro Nacional de las Personas</b>		-	<b>101,465,520</b>	<b>101,465,520</b>	-	<b>796,823,313</b>	<b>796,823,313</b>	-	<b>775,729,364</b>	<b>775,729,364</b>	<b>97</b>	-	<b>136,362,794</b>	<b>136,362,794</b>	<b>17</b>	-	<b>775,729,364</b>	<b>775,729,364</b>	<b>97</b>
001 - PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACION EN HONDURAS "Identificate"	2235-TRAMO A	-	-	-	-	-	-	-	31,691,220	31,691,220	-	-	-	-	-	-	31,691,220	31,691,220	-
	2235-TRAMO B	-	101,465,520	101,465,520	-	626,836,844	626,836,844	-	607,675,349	607,675,349	97	-	-	-	-	-	607,675,349	607,675,349	97
	2262-TRAMO C	-	-	-	-	136,986,469	136,986,469	-	136,362,794	136,362,794	100	-	136,362,794	136,362,794	100	-	136,362,794	136,362,794	100
	FN-NT-02-01-2019	-	-	-	-	33,000,000	33,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total 001 - PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACION EN HONDURAS "Identificate"</b>		-	<b>101,465,520</b>	<b>101,465,520</b>	-	<b>796,823,313</b>	<b>796,823,313</b>	-	<b>775,729,364</b>	<b>775,729,364</b>	<b>97</b>	-	<b>136,362,794</b>	<b>136,362,794</b>	<b>17</b>	-	<b>775,729,364</b>	<b>775,729,364</b>	<b>97</b>
0449 - Servicios Financieros de la Administración Central		-	249,318,412	249,318,412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROYECTO AGENDA DIGITAL		-	249,318,412	249,318,412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Protección Social</b>		<b>4,671,934,574</b>	<b>2,214,517,466</b>	<b>6,886,452,040</b>	<b>6,629,405,574</b>	<b>1,840,956,711</b>	<b>8,470,362,285</b>	<b>2,949,055,484</b>	<b>1,073,343,280</b>	<b>4,022,398,763</b>	<b>47</b>	<b>28,002,030</b>	<b>905,064,598</b>	<b>933,066,628</b>	<b>11</b>	<b>2,949,064,552</b>	<b>1,100,986,245</b>	<b>4,050,050,797</b>	<b>48</b>
<b>0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social</b>		<b>27,294,374</b>	<b>1,196,380,320</b>	<b>1,223,674,694</b>	<b>27,294,374</b>	<b>628,435,425</b>	<b>655,729,799</b>	<b>14,893,658</b>	<b>147,150,350</b>	<b>162,044,008</b>	<b>25</b>	<b>10,334,455</b>	<b>133,702,570</b>	<b>144,037,025</b>	<b>22</b>	<b>14,893,658</b>	<b>147,150,350</b>	<b>162,044,008</b>	<b>25</b>
011 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA	522-0501-4	27,294,374	171,382,645	198,677,019	19,305,249	71,204,617	90,509,866	10,749,187	13,447,780	24,196,967	27	7,240,484	-	7,240,484	8	10,749,187	13,447,780	24,196,967	27
<b>Total 011 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA</b>		<b>2</b>																	

ANEXO II  
Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública  
**PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE, 2021**  
Cifras en Lempiras

Sector / Institución / Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado (Devengado Anual)				Ejecutado (Devengado III Trimestre)				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
		Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comp./Vig.)
060 - ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS	522-0502 Cd E No.9	-	51,310,735	51,310,735	7,989,125	51,310,735	59,299,860	4,144,471	24,138,346	28,282,817	48	3,093,971	24,138,346	27,232,317	46	4,144,471	24,138,346	28,282,817	48
<b>Total 060 - ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS</b>		-	<b>51,310,735</b>	<b>51,310,735</b>	<b>7,989,125</b>	<b>51,310,735</b>	<b>59,299,860</b>	<b>4,144,471</b>	<b>24,138,346</b>	<b>28,282,817</b>	<b>48</b>	<b>3,093,971</b>	<b>24,138,346</b>	<b>27,232,317</b>	<b>46</b>	<b>4,144,471</b>	<b>24,138,346</b>	<b>28,282,817</b>	<b>48</b>
<b>0031 - Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)</b>		-	<b>34,770,405</b>	<b>34,770,405</b>	-	<b>61,331,867</b>	<b>61,331,867</b>	-	<b>48,180,947</b>	<b>48,180,947</b>	<b>79</b>	-	<b>64,123</b>	<b>64,123</b>	<b>0</b>	-	<b>49,700,142</b>	<b>49,700,142</b>	<b>81</b>
012 - CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES HONDUREÑAS (CIUDAD MUJER)	BID-3771/BL-HO	-	34,770,405	34,770,405	-	61,331,867	61,331,867	-	48,180,947	48,180,947	79	-	64,123	64,123	0	-	49,700,142	49,700,142	81
<b>Total 012 - CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES HONDUREÑAS (CIUDAD MUJER)</b>		-	<b>34,770,405</b>	<b>34,770,405</b>	-	<b>61,331,867</b>	<b>61,331,867</b>	-	<b>48,180,947</b>	<b>48,180,947</b>	<b>79</b>	-	<b>64,123</b>	<b>64,123</b>	<b>0</b>	-	<b>49,700,142</b>	<b>49,700,142</b>	<b>81</b>
<b>0240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social</b>		<b>144,640,200</b>	<b>833,255,880</b>	<b>977,896,080</b>	<b>144,640,200</b>	<b>1,138,307,720</b>	<b>1,282,947,920</b>	<b>19,099,002</b>	<b>872,228,124</b>	<b>891,327,126</b>	<b>69</b>	<b>17,667,574</b>	<b>769,857,126</b>	<b>787,524,700</b>	<b>61</b>	<b>19,108,070</b>	<b>896,677,198</b>	<b>915,785,269</b>	<b>71</b>
006 - BOLSON ESCOLAR Y EQUIPO DE UTILES	FN-BOLSON ESCOLAR-14-08	7,000,000	-	7,000,000	7,000,000	-	7,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total 006 - BOLSON ESCOLAR Y EQUIPO DE UTILES</b>		<b>7,000,000</b>	-	<b>7,000,000</b>	<b>7,000,000</b>	-	<b>7,000,000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
015 - ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL	FN-0000015-14	29,856,800	-	29,856,800	29,856,800	-	29,856,800	8,094,420	-	8,094,420	27	6,662,992	-	6,662,992	22	8,103,488	-	8,103,488	27
<b>Total 015 - ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL</b>		<b>29,856,800</b>	-	<b>29,856,800</b>	<b>29,856,800</b>	-	<b>29,856,800</b>	<b>8,094,420</b>	-	<b>8,094,420</b>	<b>27</b>	<b>6,662,992</b>	-	<b>6,662,992</b>	<b>22</b>	<b>8,103,488</b>	-	<b>8,103,488</b>	<b>27</b>
016 - OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR	FN-0000016-14	34,924,900	-	34,924,900	34,924,900	-	34,924,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total 016 - OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR</b>		<b>34,924,900</b>	-	<b>34,924,900</b>	<b>34,924,900</b>	-	<b>34,924,900</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
017 - CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	FN-0000017-14	72,858,500	-	72,858,500	72,858,500	-	72,858,500	11,004,582	-	11,004,582	15	11,004,582	-	11,004,582	15	11,004,582	-	11,004,582	15
<b>Total 017 - CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD</b>		<b>72,858,500</b>	-	<b>72,858,500</b>	<b>72,858,500</b>	-	<b>72,858,500</b>	<b>11,004,582</b>	-	<b>11,004,582</b>	<b>15</b>	<b>11,004,582</b>	-	<b>11,004,582</b>	<b>15</b>	<b>11,004,582</b>	-	<b>11,004,582</b>	<b>15</b>
018 - PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO VIDA MEJOR) BID 3371/BL-HO	BID 3371/BL-HO	-	38,024,813	38,024,813	-	64,487,507	64,487,507	-	41,807,835	41,807,835	65	-	22,027,750	22,027,750	34	-	43,298,810	43,298,810	67
<b>Total 018 - PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO VIDA MEJOR) BID 3371/BL-HO</b>		-	<b>38,024,813</b>	<b>38,024,813</b>	-	<b>64,487,507</b>	<b>64,487,507</b>	-	<b>41,807,835</b>	<b>41,807,835</b>	<b>65</b>	-	<b>22,027,750</b>	<b>22,027,750</b>	<b>34</b>	-	<b>43,298,810</b>	<b>43,298,810</b>	<b>67</b>
021 - PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL / 6401-HN	6401-HN	-	202,360,871	202,360,871	-	328,327,269	328,327,269	-	241,759,232	241,759,232	74	-	196,238,835	196,238,835	60	-	243,191,881	243,191,881	74
<b>Total 021 - PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL / 6401-HN</b>		-	<b>202,360,871</b>	<b>202,360,871</b>	-	<b>328,327,269</b>	<b>328,327,269</b>	-	<b>241,759,232</b>	<b>241,759,232</b>	<b>74</b>	-	<b>196,238,835</b>	<b>196,238,835</b>	<b>60</b>	-	<b>243,191,881</b>	<b>243,191,881</b>	<b>74</b>
022 - APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 5008/BL-HO	5008/BL-HO	-	592,870,196	592,870,196	-	745,492,944	745,492,944	-	588,661,056	588,661,056	79	-	551,590,541	551,590,541	74	-	610,186,507	610,186,507	82
<b>Total 022 - APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 5008/BL-HO</b>		-	<b>592,870,196</b>	<b>592,870,196</b>	-	<b>745,492,944</b>	<b>745,492,944</b>	-	<b>588,661,056</b>	<b>588,661,056</b>	<b>79</b>	-	<b>551,590,541</b>	<b>551,590,541</b>	<b>74</b>	-	<b>610,186,507</b>	<b>610,186,507</b>	<b>82</b>
<b>0244 - Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer</b>		-	<b>9,203,991</b>	<b>9,203,991</b>	-	<b>12,881,699</b>	<b>12,881,699</b>	-	<b>5,783,859</b>	<b>5,783,859</b>	<b>45</b>	-	<b>1,440,780</b>	<b>1,440,780</b>	<b>11</b>	-	<b>7,458,554</b>	<b>7,458,554</b>	<b>58</b>
001 - Centros de Atención Integral para mejorar las condiciones de vida de las mujeres hondureñas (Ciudad Mujer)	BID-3771/BL-HO	-	9,203,991	9,203,991	-	9,203,991	9,203,991	-	5,057,235	5,057,235	55	-	1,190,154	1,190,154	13	-	6,349,599	6,349,599	69
<b>Total 001 - Centros de Atención Integral para mejorar las condiciones de vida de las mujeres hondureñas (Ciudad Mujer)</b>		-	<b>9,203,991</b>	<b>9,203,991</b>	-	<b>9,203,991</b>	<b>9,203,991</b>	-	<b>5,057,235</b>	<b>5,057,235</b>	<b>55</b>	-	<b>1,190,154</b>	<b>1,190,154</b>	<b>13</b>	-	<b>6,349,599</b>	<b>6,349,599</b>	<b>69</b>
003 - SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y UN ENTORNO FAVORABLE PARA LAS EMPRESARIAS DE HONDURAS	ATN/WE-17867-HO	-	-	-	-	3,677,708	3,677,708	-	726,624	726,624	20	-	250,626	250,626	7	-	1,108,955	1,108,955	30
<b>Total 003 - SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y UN ENTORNO FAVORABLE PARA LAS EMPRESARIAS DE HONDURAS</b>		-	-	-	-	<b>3,677,708</b>	<b>3,677,708</b>	-	<b>726,624</b>	<b>726,624</b>	<b>20</b>	-	<b>250,626</b>	<b>250,626</b>	<b>7</b>	-	<b>1,108,955</b>	<b>1,108,955</b>	<b>30</b>
<b>0449 - Servicios Financieros de la Administración Central</b>		-	<b>140,906,870</b>	<b>140,906,870</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROYECTO DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL		-	140,906,870	140,906,870	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>69153 - Fideicomiso Fondo Social Reducción de la Pobreza (Vida Mejor, Reducción de la Pobreza)</b>		<b>4,500,000,000</b>	-	<b>4,500,000,000</b>	<b>6,220,000,000</b>	-	<b>6,220,000,000</b>	<b>2,915,062,824</b>	-	<b>2,915,062,824</b>	<b>47</b>	-	-	-	-	<b>2,915,062,824</b>	-	<b>2,915,062,824</b>	<b>47</b>
<b>Fideicomiso de Inversiones y Asignaciones FINA</b>		-	-	-	<b>237,471,000</b>	-	<b>237,471,000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emergencia ETA e IOTA		-	-	-	34,471,000	-	34,471,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Programa Honduras Se Levanta		-	-	-	110,000,000	-	110,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vivienda Saludables por componentes		-	-	-	93,000,000	-	93,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Recursos Forestal y Ambiente</b>		<b>5,737,793</b>	<b>337,761,815</b>	<b>343,499,608</b>	<b>5,737,793</b>	<b>268,833,151</b>	<b>274,570,944</b>	<b>2,358,866</b>	<b>55,605,356</b>	<b>57,964,222</b>	<b>21</b>	<b>1,507,763</b>	<b>28,871,108</b>	<b>30,378,870</b>	<b>11</b>	<b>2,358,866</b>	<b>156,883,023</b>	<b>159,241,890</b>	<b>58</b>
<b>0028 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal</b>		<b>5,737,793</b>	<b>93,357,101</b>	<b>99,094,894</b>	<b>5,737,793</b>	<b>26,507,350</b>	<b>32,245,143</b>	<b>2,358,866</b>	<b>186,540</b>	<b>2,545,406</b>	<b>8</b>	<b>1,507,763</b>	<b>186,540</b>	<b>1,694,303</b>	<b>5</b>	<b>2,358,866</b>	<b>186,540</b>	<b>2,545,406</b>	<b>8</b>
001 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS DE HONDURAS- SINAPH (LIFEWEB)	BMZ No201165984	5,737,793	93,357,101	99,094,894	5,737,793	26,507,350	32,245,143	2,358,866	186,540	2,545,406	8	1,507,763	186,540	1,694,303	5	2,358,866	186,540	2,545,406	8
<b>Total 001 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS DE HONDURAS- SINAPH (LIFEWEB)</b>		<b>5,737,793</b>	<b>93,357,101</b>	<b>99,094,894</b>	<b>5,737,793</b>	<b>26,507,350</b>	<b>32,245,143</b>	<b>2,358,866</b>	<b>186,540</b>	<b>2,545,406</b>	<b>8</b>	<b>1,507,763</b>	<b>186,540</b>	<b>1,694,303</b>	<b>5</b>	<b>2,358,866</b>	<b>186,540</b>	<b>2,545,406</b>	<b>8</b>
0041 - Comisión Permanente de Contingencias		-	-	-	-	23,647,475	23,647,475	-	18,121,042	18,121,042	77	-	6,562,362	6,562,362	28	-	18,260,322	18,260,322	77
001 - PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	IDA 5190-HN	-	-	-	-	23,647,475	23,647,475	-	18,121,042	18,121,042	77	-	6,562,362	6,562,362	28	-	18,260,322	18,260,322	77
<b>Total 001 - PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES</b>		-	-	-	-	<b>23,647,475</b>	<b>23,647,475</b>	-	<b>18,121,042</b>	<b>18,121,042</b>	<b>77</b>	-	<b>6,562,362</b>	<b>6,562,362</b>	<b>28</b>	-	<b>18,260,322</b>	<b>18,260,322</b>	<b>77</b>
0402 - Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales		-	209,337,366	209,337,366	-	218,678,326	218,678,326	-	37,297,774	37,297,774	17	-	22,122,206	22,122,206	10	-	138,436,161	138,436,161	63
001 - MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES	BID3878/BL-HO	-	209,337,366	209,337,366	-	211,916,705	211,916,705	-	37,297,774	37,297,774	18	-	22,122,206	22,122,206	10	-	138,436,161	138,436,161	65
<b>Total 001 - MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES</b>		-	<b>209,337,366</b>	<b>209,337,366</b>	-	<b>211,916,705</b>	<b>211,916,705</b>	-	<b>37,297,774</b>	<b>37,297,774</b>	<b>18</b>	-	<b>22,122,206</b>	<b>22,122,206</b>	<b>10</b>	-	<b>138,436,161</b>	<b>138,436,161</b>	<b>65</b>

ANEXO II  
Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública  
**PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE, 2021**  
Cifras en Lempiras

Sector / Institución / Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado (Devengado Anual)				Ejecutado (Devengado III Trimestre)				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
		Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comp./Vig.)
004 - PROGRAMA DE RESTAURACIÓN DE BOSQUES RESILIENTES AL CLIMA Y SILVICULTURA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS RELACIONADOS CON EL AGUA.	GRT/GN-17771-HO	-	-	-	-	6,761,621	6,761,621	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total 004 - PROGRAMA DE RESTAURACIÓN DE BOSQUES RESILIENTES AL CLIMA Y SILVICULTURA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS RELACIONADOS CON EL AGUA.</b>		-	-	-	-	<b>6,761,621</b>	<b>6,761,621</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0449 - Servicios Financieros de la Administración Central		-	35,067,348	35,067,348	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROYECTO RESILIENTE DEL CLIMA FONDO VERDE		-	35,067,348	35,067,348	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salud		131,000,000	607,140,905	738,140,905	50,000,000	1,960,848,343	2,010,848,343	-	1,255,955,405	1,255,955,405	62	-	582,964,679	582,964,679	29	-	1,364,397,946	1,364,397,946	68
<b>0030 - Secretaría de la Presidencia</b>		-	-	-	-	<b>4,713,368</b>	<b>4,713,368</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
002 - Equipamiento de Áreas críticas del Hospital Básico Gabriela Alvarado de la Ciudad de Danlí, El Paraíso y Hospital General de Santa Teresa en la Ciudad de Comayagua, Comayagua	DI-91-2020	-	-	-	-	4,713,368	4,713,368	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total 002 - Equipamiento de Áreas críticas del Hospital Básico Gabriela Alvarado de la Ciudad de Danlí, El Paraíso y Hospital General de Santa Teresa en la Ciudad de Comayagua, Comayagua</b>		-	-	-	-	<b>4,713,368</b>	<b>4,713,368</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>0031 - Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)</b>		-	<b>94,114,164</b>	<b>94,114,164</b>	-	<b>175,113,899</b>	<b>175,113,899</b>	-	<b>175,113,895</b>	<b>175,113,895</b>	<b>100</b>	-	<b>303,323</b>	<b>303,323</b>	<b>0</b>	-	<b>175,113,895</b>	<b>175,113,895</b>	<b>100</b>
001 - Proyecto de Respuesta a Emergencias Honduras COVID-19	IDA 6626-HN	-	72,715,019	72,715,019	-	175,113,899	175,113,899	-	175,113,895	175,113,895	100	-	303,323	303,323	0	-	175,113,895	175,113,895	100
<b>Total 001 - Proyecto de Respuesta a Emergencias Honduras COVID-19</b>		-	<b>72,715,019</b>	<b>72,715,019</b>	-	<b>175,113,899</b>	<b>175,113,899</b>	-	<b>175,113,895</b>	<b>175,113,895</b>	<b>100</b>	-	<b>303,323</b>	<b>303,323</b>	<b>0</b>	-	<b>175,113,895</b>	<b>175,113,895</b>	<b>100</b>
017 - FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA RED DE ATENCIÓN DE TRAUMAS Y URGENCIAS DE TEGUCIGALPA	BID No. 4713/BL-HO	-	21,399,145	21,399,145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total 017 - FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA RED DE ATENCIÓN DE TRAUMAS Y URGENCIAS DE TEGUCIGALPA</b>		-	<b>21,399,145</b>	<b>21,399,145</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>0060 - Secretaría de Salud</b>		-	<b>459,672,298</b>	<b>459,672,298</b>	-	<b>1,412,669,873</b>	<b>1,412,669,873</b>	-	<b>926,030,347</b>	<b>926,030,347</b>	<b>66</b>	-	<b>520,580,862</b>	<b>520,580,862</b>	<b>37</b>	-	<b>956,482,968</b>	<b>956,482,968</b>	<b>68</b>
019 - REEQUIPAMIENTO BIOMEDICO HOSPITAL MARIA ESPECIALIDADES PEDIATRICAS (HMEP)	ITALIA-HOS/MARIA	-	-	-	-	10,200,000	10,200,000	-	7,703,888	7,703,888	76	-	5,988,908	5,988,908	59	-	7,703,888	7,703,888	76
<b>Total 019 - REEQUIPAMIENTO BIOMEDICO HOSPITAL MARIA ESPECIALIDADES PEDIATRICAS (HMEP)</b>		-	-	-	-	<b>10,200,000</b>	<b>10,200,000</b>	-	<b>7,703,888</b>	<b>7,703,888</b>	<b>76</b>	-	<b>5,988,908</b>	<b>5,988,908</b>	<b>59</b>	-	<b>7,703,888</b>	<b>7,703,888</b>	<b>76</b>
023 - PROYECTO DE MEJORA DE LA GESTION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO-NEONATAL	BID 4619/BL-HO	-	326,072,625	326,072,625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total 023 - PROYECTO DE MEJORA DE LA GESTION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO-NEONATAL</b>		-	<b>326,072,625</b>	<b>326,072,625</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
024 - RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID - 19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, EN HONDURAS	BID 4449/BL-HO-2	-	-	-	-	7,804,673	7,804,673	-	25,312,222	25,312,222	324	-	-	-	-	-	9,220,979	9,220,979	118
	BID 3815/BL-HO-2	-	-	-	-	138,543,961	138,543,961	-	126,193,972	126,193,972	91	-	7,635,731	7,635,731	6	-	126,193,972	126,193,972	91
	BID 4449/BL-HO-2	-	-	-	-	149,019,827	149,019,827	-	127,997,798	127,997,798	86	-	41,838,273	41,838,273	28	-	144,089,041	144,089,041	97
	BID 4518/BL-HO-3	-	23,299,050	23,299,050	-	218,681,499	218,681,499	-	178,913,654	178,913,654	82	-	45,853,819	45,853,819	21	-	190,003,482	190,003,482	87
<b>Total 024 - RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID - 19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, EN HONDURAS</b>		-	<b>23,299,050</b>	<b>23,299,050</b>	-	<b>514,049,960</b>	<b>514,049,960</b>	-	<b>458,417,646</b>	<b>458,417,646</b>	<b>89</b>	-	<b>95,327,823</b>	<b>95,327,823</b>	<b>19</b>	-	<b>469,507,474</b>	<b>469,507,474</b>	<b>91</b>
025 - PROGRAMA APOYO A LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE	BID 3723/BL-HO	-	46,623,337	46,623,337	-	50,897,857	50,897,857	-	38,730,843	38,730,843	76	-	9,613,161	9,613,161	19	-	49,725,600	49,725,600	98
<b>Total 025 - PROGRAMA APOYO A LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE</b>		-	<b>46,623,337</b>	<b>46,623,337</b>	-	<b>50,897,857</b>	<b>50,897,857</b>	-	<b>38,730,843</b>	<b>38,730,843</b>	<b>76</b>	-	<b>9,613,161</b>	<b>9,613,161</b>	<b>19</b>	-	<b>49,725,600</b>	<b>49,725,600</b>	<b>98</b>
026 - HONDURAS SALUD MESOAMERICA GRT/HE-16838-HO	GRT/HE-16838-HO	-	-	-	-	15,232,902	15,232,902	-	1,964,657	1,964,657	13	-	363,728	363,728	2	-	2,485,458	2,485,458	16
<b>Total 026 - HONDURAS SALUD MESOAMERICA GRT/HE-16838-HO</b>		-	-	-	-	<b>15,232,902</b>	<b>15,232,902</b>	-	<b>1,964,657</b>	<b>1,964,657</b>	<b>13</b>	-	<b>363,728</b>	<b>363,728</b>	<b>2</b>	-	<b>2,485,458</b>	<b>2,485,458</b>	<b>16</b>
027 - PROYECTO HONDURAS - INICIATIVA REGIONAL DE ELIMINACIÓN DE LA MALARIA (IREM EN MESOAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA)	GRT/MM-17339-40-HO	-	21,301,932	21,301,932	-	32,625,526	32,625,526	-	13,029,950	13,029,950	40	-	4,622,794	4,622,794	14	-	20,006,811	20,006,811	61
<b>Total 027 - PROYECTO HONDURAS - INICIATIVA REGIONAL DE ELIMINACIÓN DE LA MALARIA (IREM EN MESOAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA)</b>		-	<b>21,301,932</b>	<b>21,301,932</b>	-	<b>32,625,526</b>	<b>32,625,526</b>	-	<b>13,029,950</b>	<b>13,029,950</b>	<b>40</b>	-	<b>4,622,794</b>	<b>4,622,794</b>	<b>14</b>	-	<b>20,006,811</b>	<b>20,006,811</b>	<b>61</b>
028 - APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 5008/BL-HO	5008/BL-HO	-	42,375,354	42,375,354	-	27,598,362	27,598,362	-	2,453,059	2,453,059	9	-	934,143	934,143	3	-	3,323,432	3,323,432	12
<b>Total 028 - APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 5008/BL-HO</b>		-	<b>42,375,354</b>	<b>42,375,354</b>	-	<b>27,598,362</b>	<b>27,598,362</b>	-	<b>2,453,059</b>	<b>2,453,059</b>	<b>9</b>	-	<b>934,143</b>	<b>934,143</b>	<b>3</b>	-	<b>3,323,432</b>	<b>3,323,432</b>	<b>12</b>
029 - APOYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE INTRODUCCIÓN DE LA VACUNA CONTRA LA COVID-19 EN HONDURAS	BCIE 2271	-	-	-	-	746,064,146	746,064,146	-	403,730,305	403,730,305	54	-	403,730,305	403,730,305	54	-	403,730,305	403,730,305	54
<b>Total 029 - APOYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE INTRODUCCIÓN DE LA VACUNA CONTRA LA COVID-19 EN HONDURAS</b>		-	-	-	-	<b>746,064,146</b>	<b>746,064,146</b>	-	<b>403,730,305</b>	<b>403,730,305</b>	<b>54</b>	-	<b>403,730,305</b>	<b>403,730,305</b>	<b>54</b>	-	<b>403,730,305</b>	<b>403,730,305</b>	<b>54</b>
031 - PROYECTO DE RESPUESTA A EMERGENCIA HONDURAS COVID-19	IDA 6626-HN	-	-	-	-	16,001,120	16,001,120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IDA 6868-HN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total 031 - PROYECTO DE RESPUESTA A EMERGENCIA HONDURAS COVID-19</b>		-	-	-	-	<b>16,001,120</b>	<b>16,001,120</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>0240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social</b>		-	<b>14,421,699</b>	<b>14,421,699</b>	-	<b>34,146,413</b>	<b>34,146,413</b>	-	<b>18,876,337</b>	<b>18,876,337</b>	<b>55</b>	-	<b>18,401,660</b>	<b>18,401,660</b>	<b>54</b>	-	<b>19,258,178</b>	<b>19,258,178</b>	<b>56</b>
020 - PROGRAMA APOYO A LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE	BID 3723/BL-HO	-	14,421,699	14,421,699	-	34,146,413	34,146,413	-	18,876,337	18,876,337	55	-	18,401,660	18,401,660	54	-	19,258,178	19,258,178	56
<b>Total 020 - PROGRAMA APOYO A LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE</b>		-	<b>14,421,699</b>	<b>14,421,699</b>	-	<b>34,146,413</b>	<b>34,146,413</b>	-	<b>18,876,337</b>	<b>18,876,337</b>	<b>55</b>	-	<b>18,401,660</b>	<b>18,401,660</b>	<b>54</b>	-	<b>19,258,178</b>	<b>19,258,178</b>	<b>56</b>
<b>0402 - Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales</b>		-	-	-	-	<b>334,204,790</b>	<b>334,204,790</b>	-	<b>135,934,826</b>	<b>135,934,826</b>	<b>41</b>	-	<b>43,678,835</b>	<b>43,678,835</b>	<b>13</b>	-	<b>213,542,905</b>	<b>213,542,905</b>	<b>64</b>

ANEXO II  
Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública  
**PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE, 2021**  
Cifras en Lempiras

Sector / Institución / Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado (Devengado Anual)				Ejecutado (Devengado III Trimestre)				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
		Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comp./Vig.)
003 - PROYECTO DE MEJORA DE LA GESTION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO-NEONATAL	BID 4619/BL-HO	-	-	-	-	312,805,645	312,805,645	-	135,934,826	135,934,826	43	-	43,678,835	43,678,835	14	-	213,542,905	213,542,905	68
<b>Total 003 - PROYECTO DE MEJORA DE LA GESTION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO-NEONATAL</b>		-	-	-	-	<b>312,805,645</b>	<b>312,805,645</b>	-	<b>135,934,826</b>	<b>135,934,826</b>	<b>43</b>	-	<b>43,678,835</b>	<b>43,678,835</b>	<b>14</b>	-	<b>213,542,905</b>	<b>213,542,905</b>	<b>68</b>
004 - FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA RED DE ATENCIÓN DE TRAUMAS Y URGENCIAS DE TEGUCIGALPA	BID No. 4713/BL-HO	-	-	-	-	21,399,145	21,399,145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total 004 - FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA RED DE ATENCIÓN DE TRAUMAS Y URGENCIAS DE TEGUCIGALPA</b>		-	-	-	-	<b>21,399,145</b>	<b>21,399,145</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0449 - Servicios Financieros de la Administración Central		-	38,932,744	38,932,744	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROYECTO TELESALUD PARA MITIGAR EL CORONAVIRUS Y MEJORAR EL ACCESO A LA SALUD EN HONDURAS		-	11,489,110	11,489,110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REEQUIPAMIENTO BIOMÉDICO HOSPITAL MARIA ESPECIALIDADES PEDIÁTRICAS (HMEP)		-	27,443,634	27,443,634	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Fideicomiso de Inversiones y Asignaciones FINA</b>		<b>131,000,000</b>	-	<b>131,000,000</b>	<b>50,000,000</b>	-	<b>50,000,000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INFRAESTRUCTURA EN SALUD (FINA) /Hospital Escuela		131,000,000	-	131,000,000	50,000,000	-	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Seguridad y Defensa</b>		<b>4,578,004</b>	<b>540,065,711</b>	<b>544,643,715</b>	<b>4,578,004</b>	<b>568,519,357</b>	<b>573,097,361</b>	<b>75,117</b>	<b>203,858,173</b>	<b>203,933,291</b>	<b>36</b>	<b>75,117</b>	<b>81,644,386</b>	<b>81,719,503</b>	<b>14</b>	<b>75,117</b>	<b>516,608,654</b>	<b>516,683,771</b>	<b>90</b>
<b>0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social</b>		<b>4,578,004</b>	<b>127,917,786</b>	<b>132,495,790</b>	<b>4,578,004</b>	<b>134,241,463</b>	<b>138,819,467</b>	<b>75,117</b>	<b>89,625,102</b>	<b>89,700,219</b>	<b>65</b>	<b>75,117</b>	<b>40,506,447</b>	<b>40,581,565</b>	<b>29</b>	<b>75,117</b>	<b>114,801,881</b>	<b>114,876,999</b>	<b>83</b>
012 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS	ATN/OC-17135-HO	-	2,574,359	2,574,359	-	3,047,359	3,047,359	-	2,849,764	2,849,764	94	-	672,000	672,000	22	-	2,849,764	2,849,764	94
	BID/4518/BL-HO	-	102,691,427	102,691,427	-	117,225,104	117,225,104	-	81,897,434	81,897,434	70	-	35,774,512	35,774,512	31	-	107,074,214	107,074,214	91
<b>Total 012 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS</b>		-	<b>105,265,786</b>	<b>105,265,786</b>	-	<b>120,272,463</b>	<b>120,272,463</b>	-	<b>84,747,199</b>	<b>84,747,199</b>	<b>70</b>	-	<b>36,446,512</b>	<b>36,446,512</b>	<b>30</b>	-	<b>109,923,978</b>	<b>109,923,978</b>	<b>91</b>
014 - PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS	BMZ Nr. 2016 65348	4,578,004	22,652,000	27,230,004	4,578,004	13,969,000	18,547,004	75,117	4,059,935	4,135,052	22	75,117	4,059,935	4,135,052	22	75,117	4,059,935	4,135,052	22
	KFW-CONVIVIR	-	-	-	-	-	-	-	817,969	817,969	-	-	-	-	-	-	-	817,969	-
<b>Total 014 - PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS</b>		<b>4,578,004</b>	<b>22,652,000</b>	<b>27,230,004</b>	<b>4,578,004</b>	<b>13,969,000</b>	<b>18,547,004</b>	<b>75,117</b>	<b>4,877,903</b>	<b>4,953,021</b>	<b>27</b>	<b>75,117</b>	<b>4,059,935</b>	<b>4,135,052</b>	<b>22</b>	<b>75,117</b>	<b>4,877,903</b>	<b>4,953,021</b>	<b>27</b>
<b>0070 - Secretaría de Seguridad</b>		-	<b>412,147,925</b>	<b>412,147,925</b>	-	<b>434,277,894</b>	<b>434,277,894</b>	-	<b>114,233,072</b>	<b>114,233,072</b>	<b>26</b>	-	<b>41,137,939</b>	<b>41,137,939</b>	<b>9</b>	-	<b>401,806,772</b>	<b>401,806,772</b>	<b>93</b>
004 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS	BID/4518/BL-HO	-	412,147,925	412,147,925	-	397,927,080	397,927,080	-	107,872,499	107,872,499	27	-	34,777,366	34,777,366	9	-	374,978,052	374,978,052	94
	GRT/CF-17829-HO	-	-	-	-	36,350,814	36,350,814	-	6,360,573	6,360,573	17	-	6,360,573	6,360,573	17	-	26,828,721	26,828,721	74
<b>Total 004 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS</b>		-	<b>412,147,925</b>	<b>412,147,925</b>	-	<b>434,277,894</b>	<b>434,277,894</b>	-	<b>114,233,072</b>	<b>114,233,072</b>	<b>26</b>	-	<b>41,137,939</b>	<b>41,137,939</b>	<b>9</b>	-	<b>401,806,772</b>	<b>401,806,772</b>	<b>93</b>
<b>Transporte y Obras Públicas</b>		<b>3,719,577,805</b>	<b>114,525,416</b>	<b>3,834,103,221</b>	<b>3,031,414,653</b>	<b>188,337,388</b>	<b>3,219,752,041</b>	<b>830,964,499</b>	-	<b>830,964,499</b>	<b>26</b>	<b>158,826,908</b>	-	<b>158,826,908</b>	<b>5</b>	<b>845,741,349</b>	-	<b>845,741,349</b>	<b>26</b>
<b>0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social</b>		-	-	-	-	<b>188,337,388</b>	<b>188,337,388</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
001 - Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras.	6822-HN	-	-	-	-	188,337,388	188,337,388	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total 001 - Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras.</b>		-	-	-	-	<b>188,337,388</b>	<b>188,337,388</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>0120 - Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos</b>		<b>47,000,000</b>	-	<b>47,000,000</b>	<b>26,543,394</b>	-	<b>26,543,394</b>	<b>5,697,279</b>	-	<b>5,697,279</b>	<b>21</b>	<b>2,967,060</b>	-	<b>2,967,060</b>	<b>11</b>	<b>20,474,128</b>	-	<b>20,474,128</b>	<b>77</b>
006 - CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ANEXO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA, UBICADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGÜELA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN	FN-23959-1	25,000,000	-	25,000,000	25,000,000	-	25,000,000	5,697,279	-	5,697,279	23	2,967,060	-	2,967,060	12	20,474,128	-	20,474,128	82
<b>Total 006 - CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ANEXO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA, UBICADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGÜELA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN</b>		<b>25,000,000</b>	-	<b>25,000,000</b>	<b>25,000,000</b>	-	<b>25,000,000</b>	<b>5,697,279</b>	-	<b>5,697,279</b>	<b>23</b>	<b>2,967,060</b>	-	<b>2,967,060</b>	<b>12</b>	<b>20,474,128</b>	-	<b>20,474,128</b>	<b>82</b>
007 - CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO POLIDEPORTIVO EN EL INSTITUTO SUPERACIÓN, II ETAPA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE QUIMISTAN, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA.	FN-24039-1	22,000,000	-	22,000,000	1,543,394	-	1,543,394	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total 007 - CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO POLIDEPORTIVO EN EL INSTITUTO SUPERACIÓN, II ETAPA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE QUIMISTAN, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA.</b>		<b>22,000,000</b>	-	<b>22,000,000</b>	<b>1,543,394</b>	-	<b>1,543,394</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>0803 - Empresa Nacional Portuaria</b>		<b>20,443,462</b>	-	<b>20,443,462</b>	<b>21,858,462</b>	-	<b>21,858,462</b>	<b>285,521</b>	-	<b>285,521</b>	<b>1</b>	<b>99,880</b>	-	<b>99,880</b>	<b>0</b>	<b>285,521</b>	-	<b>285,521</b>	<b>1</b>
390 - Construcción de Obras de Facilitación de Acceso al Recinto Portuario en Puerto Cortés	FP-23771	20,443,462	-	20,443,462	21,858,462	-	21,858,462	285,521	-	285,521	1	99,880	-	99,880	0	285,521	-	285,521	1
<b>Total 390 - Construcción de Obras de Facilitación de Acceso al Recinto Portuario en Puerto Cortés</b>		<b>20,443,462</b>	-	<b>20,443,462</b>	<b>21,858,462</b>	-	<b>21,858,462</b>	<b>285,521</b>	-	<b>285,521</b>	<b>1</b>	<b>99,880</b>	-	<b>99,880</b>	<b>0</b>	<b>285,521</b>	-	<b>285,521</b>	<b>1</b>
<b>1801 - Alcaldía Municipal del Distrito Central</b>		-	<b>114,525,416</b>	<b>114,525,416</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROYECTO DE TRANSPORTE PÚBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TEGUCIGALPA - COMAYAGÜELA)	BID-2465/BL-HO	-	114,525,416	114,525,416	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4620 - Superintendencia de Alianza Público Privada (SAPP)</b>		<b>3,013,634,343</b>	-	<b>3,013,634,343</b>	<b>2,554,682,797</b>	-	<b>2,554,682,797</b>	<b>616,145,210</b>	-	<b>616,145,210</b>	<b>24</b>	<b>155,759,969</b>	-	<b>155,759,969</b>	<b>6</b>	<b>616,145,210</b>	-	<b>616,145,210</b>	<b>24</b>
PROYECTOS APP - CENTRO CÍVICO		40,509,814	-	40,509,814	72,142,290	-	72,142,290	8,949,292	-	8,949,292	12	1,523,560	-	1,523,560	2	8,949,292	-	8,949,292	12
PROYECTOS APP - PALMEROLA		2,013,063,242	-	2,013,063,242	1,747,186,958	-	1,747,186,958	531,940,484	-	531,940,484	30	154,236,409	-	154,236,409	9	531,940,484	-	531,940,484	30
PROYECTOS APP - REPRESA EL TABLÓN		-	-	-	481,293,137	-	481,293,137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROYECTOS APP - RESTO DE AEROPUERTOS		523,662,463	-	523,662,463	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROYECTOS APP - SIGLO XXI		436,398,824	-	436,398,824	254,060,411	-	254,060,411	75,255,434	-	75,255,434	30	-	-	-	-	75,255,434	-	75,255,434	30
<b>69155 - Fideicomiso: Mejoramiento De La Infraestructura Y Servicios Del Depto. de Occidente</b>		<b>50,000,000</b>	-	<b>50,000,000</b>	<b>50,000,000</b>	-	<b>50,000,000</b>	<b>19,936,490</b>	-	<b>19,936,490</b>	<b>40</b>	-	-	-	-	<b>19,936,490</b>	-	<b>19,936,490</b>	<b>40</b>
INFRAESTRUCTURA DE LAS ISLAS DE LA BAHÍA		50,000,000	-	50,000,000	50,000,000	-	50,000,000	19,936,490	-	19,936,490	40	-	-	-	-	19,936,490	-	19,936,490	40

ANEXO II  
 Secretaría de Finanzas  
 Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública  
**PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE, 2021**  
 Cifras en Lempiras

Sector / Institución / Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado (Devengado Anual)				Ejecutado (Devengado III Trimestre)				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
		Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comp./Vig.)
69156 - Fideicomiso: Mejoramiento de la Infraestructura Vial de los Departamentos de COLÓN Y ATLÁNTIDA		39,200,000	-	39,200,000	39,200,000	-	39,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INFRAESTRUCTURA DE LOS DEPARTAMENTOS DE COLÓN Y ATLÁNTIDA		39,200,000	-	39,200,000	39,200,000	-	39,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69220 - Fideicomiso Nacional De Apoyo Y Promoción Del Deporte		40,000,000	-	40,000,000	40,000,000	-	40,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INFRAESTRUCTURA EN APOYO Y PROMOCIÓN AL DEPORTE		40,000,000	-	40,000,000	40,000,000	-	40,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Inversiones y Asignaciones FINA		509,300,000	-	509,300,000	299,130,000	-	299,130,000	188,900,000	-	188,900,000	63	-	-	-	-	188,900,000	-	188,900,000	63
INFRAESTRUCTURA (CARRETERAS, TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS)		-	-	-	145,530,000	-	145,530,000	91,901,906	-	91,901,906	63	-	-	-	-	91,901,906	-	91,901,906	63
INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL (CENTRO CÍVICO Y CÁRCELES) - FINA/ Centro Cívico Gubernamental		368,600,000	-	368,600,000	85,000,000	-	85,000,000	53,677,331	-	53,677,331	63	-	-	-	-	53,677,331	-	53,677,331	63
INFRAESTRUCTURA SOCIAL (CIUDAD MUJER Y PARQUES) - FINA/ Ciudad Mujer		140,700,000	-	140,700,000	50,300,000	-	50,300,000	31,764,350	-	31,764,350	63	-	-	-	-	31,764,350	-	31,764,350	63
Obras Bicentenario		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plaza de la Cultura Gracias, Lempira		-	-	-	18,300,000	-	18,300,000	11,556,414	-	11,556,414	63	-	-	-	-	11,556,414	-	11,556,414	63
<b>Total general</b>		<b>12,743,673,490</b>	<b>11,279,702,558</b>	<b>24,023,376,048</b>	<b>14,229,010,195</b>	<b>12,279,382,532</b>	<b>26,508,392,726</b>	<b>6,171,870,460</b>	<b>5,417,342,415</b>	<b>11,589,212,875</b>	<b>44</b>	<b>392,732,072</b>	<b>2,394,316,727</b>	<b>2,787,048,799</b>	<b>11</b>	<b>6,297,802,517</b>	<b>6,075,363,296</b>	<b>12,373,165,812</b>	<b>47</b>

Fuente: SIAFI, al 30 de septiembre de 2021

\*/ Cifras proyectadas, proporcionadas por la Dirección de Contingencias Fiscales, Superintendencia de Alianza Público-Privada (SAPP)

\*/ Cifras según Circular No. CGG-014-2021, CGG-1574-2021 emitidas por la SCGG en cumplimiento al Decreto Ejecutivo PCM-044-2019.

ANEXO II  
Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública  
**PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE, 2021**  
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado (Devengado Anual)				Ejecutado (Devengado III Trimestre)				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
		Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comp./Vig.)
<b>1</b>	<b>Entes adscritos a la Presidencia de la República</b>	-	-	-	-	<b>4,713,368</b>	<b>4,713,368</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	0030 - Secretaría de la Presidencia	-	-	-	-	4,713,368	4,713,368	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>12</b>	<b>Entes que no forman parte del Ejecutivo</b>	-	<b>1,946,013,360</b>	<b>1,946,013,360</b>	-	<b>1,765,006,856</b>	<b>1,765,006,856</b>	-	<b>775,729,364</b>	<b>775,729,364</b>	<b>44</b>	-	<b>136,362,794</b>	<b>136,362,794</b>	<b>8</b>	-	<b>775,729,364</b>	<b>775,729,364</b>	<b>44</b>
1	0180 - Registro Nacional de las Personas	-	101,465,520	101,465,520	-	796,823,313	796,823,313	-	775,729,364	775,729,364	97	-	136,362,794	136,362,794	17	-	775,729,364	775,729,364	97
11	0449 - Servicios Financieros de la Administración Central	-	1,844,547,840	1,844,547,840	-	968,183,543	968,183,543	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>47</b>	<b>Gabinete de Infraestructura, Servicios y Empresas Públicas</b>	<b>787,420,543</b>	<b>5,392,084,645</b>	<b>6,179,505,188</b>	<b>834,396,543</b>	<b>5,357,195,766</b>	<b>6,191,592,309</b>	<b>411,407,881</b>	<b>1,953,852,049</b>	<b>2,365,259,930</b>	<b>38</b>	<b>160,495,158</b>	<b>704,965,952</b>	<b>865,461,110</b>	<b>14</b>	<b>517,166,691</b>	<b>2,266,929,452</b>	<b>2,784,096,143</b>	<b>45</b>
7	0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social	38,834,433	1,443,491,889	1,482,326,322	38,834,433	1,102,139,848	1,140,974,281	15,403,023	292,139,691	307,542,713	27	10,746,571	191,434,237	202,180,808	18	15,403,023	317,316,470	332,719,493	29
17	0031 - Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)	-	2,003,179,654	2,003,179,654	561,000	1,869,409,138	1,869,970,138	554,897	1,174,502,184	1,175,057,081	63	554,897	348,140,087	348,694,984	19	554,897	1,245,969,602	1,246,524,500	67
13	0120 - Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	580,657,648	37,753,908	618,411,556	625,657,648	191,812,062	817,469,710	392,729,832	69,848,165	462,577,997	57	148,143,050	12,613,991	160,757,041	20	498,461,642	69,848,165	568,309,807	70
1	0144 - Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible	-	51,532,013	51,532,013	-	51,532,013	51,532,013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	0801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica	147,485,000	1,575,004,696	1,722,489,696	147,485,000	1,575,004,696	1,722,489,696	2,434,608	300,897,843	303,332,452	18	950,761	56,805,252	57,756,012	3	2,461,609	512,094,883	514,556,492	30
1	0803 - Empresa Nacional Portuaria	20,443,462	-	20,443,462	21,858,462	-	21,858,462	285,521	-	285,521	1	99,880	-	99,880	0	285,521	-	285,521	1
2	1801 - Alcaldía Municipal del Distrito Central	-	281,122,485	281,122,485	-	567,298,009	567,298,009	-	116,464,167	116,464,167	21	-	95,972,385	95,972,385	17	-	121,700,331	121,700,331	21
<b>2</b>	<b>Gabinete de Prevención, Seguridad y Defensa</b>	-	<b>412,147,925</b>	<b>412,147,925</b>	-	<b>457,925,369</b>	<b>457,925,369</b>	-	<b>132,354,114</b>	<b>132,354,114</b>	<b>29</b>	-	<b>47,700,300</b>	<b>47,700,300</b>	<b>10</b>	-	<b>420,067,094</b>	<b>420,067,094</b>	<b>92</b>
1	0041 - Comisión Permanente de Contingencias	-	-	-	-	23,647,475	23,647,475	-	18,121,042	18,121,042	77	-	6,562,362	6,562,362	28	-	18,260,322	18,260,322	77
1	0070 - Secretaría de Seguridad	-	412,147,925	412,147,925	-	434,277,894	434,277,894	-	114,233,072	114,233,072	26	-	41,137,939	41,137,939	9	-	401,806,772	401,806,772	93
<b>8</b>	<b>Gabinete Económico</b>	<b>190,917,045</b>	<b>1,324,023,624</b>	<b>1,514,940,669</b>	<b>193,917,045</b>	<b>1,011,000,628</b>	<b>1,204,917,673</b>	<b>73,163,071</b>	<b>235,312,570</b>	<b>308,475,641</b>	<b>26</b>	<b>47,534,513</b>	<b>78,940,643</b>	<b>126,475,156</b>	<b>10</b>	<b>108,268,621</b>	<b>237,502,219</b>	<b>345,770,840</b>	<b>29</b>
1	0028 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal	5,737,793	93,357,101	99,094,894	5,737,793	26,507,350	32,245,143	2,358,866	186,540	2,545,406	8	1,507,763	186,540	1,694,303	5	2,358,866	186,540	2,545,406	8
1	0037 - Servicio de Administración de Rentas	-	290,997,105	290,997,105	-	100,863,712	100,863,712	-	50,297,989	50,297,989	50	-	29,739,762	29,739,762	29	-	52,007,302	52,007,302	52
1	0100 - Secretaría de Finanzas	162,000,000	-	162,000,000	165,000,000	-	165,000,000	63,331,779	-	63,331,779	38	40,983,064	-	40,983,064	25	97,827,327	-	97,827,327	59
1	0130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social	3,143,893	83,518,319	86,662,212	3,143,893	52,294,841	55,438,734	2,166,081	36,033,403	38,199,485	69	458,730	10,322,703	10,781,433	19	2,776,084	36,033,403	38,809,487	70
4	0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería	20,035,359	856,151,099	876,186,458	20,035,359	831,334,725	851,370,084	5,306,345	148,794,638	154,100,982	18	4,584,956	38,691,638	43,276,594	5	5,306,345	149,274,974	154,581,318	18
<b>27</b>	<b>Gabinete Social</b>	<b>150,043,278</b>	<b>2,205,433,004</b>	<b>2,355,476,282</b>	<b>150,043,278</b>	<b>3,683,540,545</b>	<b>3,833,583,823</b>	<b>20,804,485</b>	<b>2,083,318,867</b>	<b>2,104,123,352</b>	<b>55</b>	<b>18,407,753</b>	<b>1,426,347,038</b>	<b>1,444,754,791</b>	<b>38</b>	<b>20,840,956</b>	<b>2,375,135,167</b>	<b>2,395,976,123</b>	<b>62</b>
2	0050 - Secretaría de Educación	3,867,578	307,797,352	311,664,930	3,867,578	199,938,108	203,805,686	642,398	7,603,125	8,245,523	4	342,176	3,279,906	3,622,082	2	669,801	10,237,353	10,907,154	5
9	0060 - Secretaría de Salud	-	459,672,298	459,672,298	-	1,412,669,873	1,412,669,873	-	926,030,347	926,030,347	66	-	520,580,862	520,580,862	37	-	956,482,968	956,482,968	68
8	0240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social	144,640,200	847,677,579	992,317,779	144,640,200	1,172,454,133	1,317,094,333	19,099,002	891,104,461	910,203,463	69	17,667,574	788,258,786	805,926,360	61	19,108,070	915,935,377	935,043,447	71
2	0244 - Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer	-	9,203,991	9,203,991	-	12,881,699	12,881,699	-	5,783,859	5,783,859	45	-	1,440,780	1,440,780	11	-	7,458,554	7,458,554	58
5	0402 - Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras	-	577,421,784	577,421,784	-	881,752,732	881,752,732	-	251,345,266	251,345,266	29	-	111,334,896	111,334,896	13	-	483,569,107	483,569,107	55
1	0703 - Universidad Nacional de Agricultura	1,535,500	3,660,000	5,195,500	1,535,500	3,844,000	5,379,500	1,063,085	1,451,809	2,514,894	47	398,003	1,451,809	1,849,812	34	1,063,085	1,451,809	2,514,894	47
<b>97</b>	<b>Subtotal PIP</b>	<b>1,128,380,866</b>	<b>11,279,702,558</b>	<b>12,408,083,424</b>	<b>1,178,356,866</b>	<b>12,279,382,532</b>	<b>13,457,739,398</b>	<b>505,375,437</b>	<b>5,180,566,963</b>	<b>5,685,942,400</b>	<b>42</b>	<b>226,437,424</b>	<b>2,394,316,727</b>	<b>2,620,754,151</b>	<b>19</b>	<b>646,276,268</b>	<b>6,075,363,296</b>	<b>6,721,639,564</b>	<b>50</b>
6	4620 - Superintendencia de Alianza Público Privada (SAPP)*	3,048,792,624	-	3,048,792,624	2,590,354,692	-	2,590,354,692	644,795,087	-	644,795,087	25	166,294,648	-	166,294,648	6	644,795,087	-	644,795,087	25
1	69153 - Fideicomiso Fondo Social Reducción de la Pobreza (Vida*// Mejor, Reactivación Agrícola, Generación de Empleo, Subsidio Vivienda, Migración Progresiva de la Merienda al Plato Escolar)	4,500,000,000	-	4,500,000,000	6,220,000,000	-	6,220,000,000	2,915,062,824	-	2,915,062,824	47	-	-	-	-	2,915,062,824	-	2,915,062,824	47
1	69155 - Fideicomiso: Mejoramiento De La Infraestructura Y Servicios Del Departamentos De Islas De La Bahía*//	50,000,000	-	50,000,000	50,000,000	-	50,000,000	19,936,490	-	19,936,490	40	-	-	-	-	19,936,490	-	19,936,490	40
1	69156 - Fideicomiso: Mejoramiento de la Infraestructura Vial de los Departamentos de Colón y Atlántida*//	39,200,000	-	39,200,000	39,200,000	-	39,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	69220 - Fideicomiso Nacional De Apoyo Y Promoción Del Deporte*//	40,000,000	-	40,000,000	40,000,000	-	40,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	69270 - Fideicomiso de Infraestructura Vial*//	2,850,000,000	-	2,850,000,000	3,454,497,637	-	3,454,497,637	1,882,831,847	-	1,882,831,847	55	-	-	-	-	1,882,831,847	-	1,882,831,847	55
11	Fideicomiso de Inversiones y Asignaciones FINA*//	1,087,300,000	-	1,087,300,000	656,601,000	-	656,601,000	188,900,000	-	188,900,000	29	-	-	-	-	188,900,000	-	188,900,000	29
<b>119</b>	<b>Total general Inversión Pública</b>	<b>12,743,673,490</b>	<b>11,279,702,558</b>	<b>24,023,376,048</b>	<b>14,229,010,195</b>	<b>12,279,382,532</b>	<b>26,508,392,726</b>	<b>6,156,901,685</b>	<b>5,180,566,963</b>	<b>11,337,468,648</b>	<b>43</b>	<b>392,732,072</b>	<b>2,394,316,727</b>	<b>2,787,048,799</b>	<b>11</b>	<b>6,297,802,517</b>	<b>6,075,363,296</b>	<b>12,373,165,812</b>	<b>47</b>

Fuente: SIAFI, al 30 de septiembre de 2021

\*/ Cifras proyectadas, proporcionadas por la Dirección de Contingencias Fiscales, Superintendencia de Alianza Público-Privada (SAPP)

\*/ Cifras según Circular No. CGG-014-2021, CGG-1574-2021 emitidas por la SCGG en cumplimiento al Decreto Ejecutivo PCM-044-2019.
