



★ ★ ★ ★ ★  
SECRETARÍA DE FINANZAS

**Secretaría de Finanzas**

**Dirección General de Inversiones Públicas**

# Informe de Avance Físico y Financiero

**SECRETARÍA DE DESARROLLO  
COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO  
(SEDECOAS/FHIS)**

Tercer Trimestre, 2021

Septiembre, 2021

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A.

## IV. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA


### 4.1 EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

La Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS)-Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) cuya finalidad es la de promover el mejoramiento de las condiciones de vida de los grupos sociales marginados en el área rural y urbana, mediante el otorgamiento de financiamientos para programas y proyectos de desarrollo social o económico, con el propósito de aumentar su productividad, sus niveles de empleo y de ingresos y de contribuir a la satisfacción de sus necesidades básicas.

Cuadro No. 05  
Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2021  
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	1,482,326,322
Presupuesto Vigente	1,140,974,281
Devengado III Trimestre-2021	202,180,808
<b>% Ejecución (Devengado III Trim-2021/ Vigente)</b>	<b>18%</b>
Devengado Anual	307,542,713
<b>% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)</b>	<b>27%</b>
Comprometido (Devengado + Compromiso)	332,719,493
<b>% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)</b>	<b>29%</b>

Fuente: SIAFI, 30/09/2021

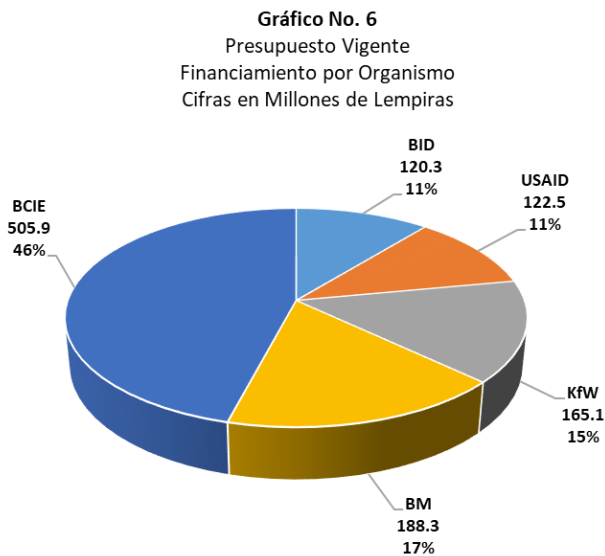

Al tercer trimestre del año 2021 la institución reportó un presupuesto vigente de inversión pública de **L 1,140,974,281.00** y la ejecución presupuestaria acumulada del trimestre asciende a un monto de **L 307,542,713.00** lo que representa el (27%) con relación al presupuesto vigente, de igual forma la ejecución más el compromiso asciende a **L 332,719,493.00** (29%) tal como se detalla en el Cuadro No. 5.

Del total del financiamiento, el 72.3% corresponde a fondos provenientes de crédito externo expresado en términos monetarios por un monto de L 825,451,565.00 y el 24.3% a recursos de donaciones externas por un monto de L 276,688,283.00; la contraparte

nacional corresponde a gastos operativos con un presupuesto vigente de L 38,834,433.00 equivalente a 3.4%.

Dicha ejecución se llevó a cabo a través de (7) siete proyectos enfocados en Agua y Saneamiento, Electrificación Rural y Caminos Rurales, Infraestructura Social, Infraestructura Escolar, Fortalecimiento de Capacidades para Jóvenes, Recuperación de Espacios Públicos y Mejora de la Infraestructura Básica. Ver Detalle de Ejecución Financiera en Anexo No. 4

Con relación al presupuesto vigente con recursos externos para la ejecución de los proyectos ésta se distribuye por; BCIE con el 46%, KfW Banco Alemán con 15%, USAID con el 11%, BM 17% y BID con el 11%.

## 4.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión en el tercer trimestre del año 2021 se concentró en los siguientes proyectos:

- 1 Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y su Gestión Local (PROMINE).
- 2 Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB).
- 3 Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras (MIFE).
- 4 Proyecto Convivencia y Espacios Seguros para los Jóvenes en Honduras (CONVIVIR).
- 5 Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (ICS).
- 6 Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras (PIOH).
- 7 Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras (PRE).

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros de los principales proyectos de acuerdo a su presupuesto vigente:

### **Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y de su Gestión Local (PROMINE) FASE IV y V**

PROMINE tiene por objetivo general fortalecer la rectoría Sectorial en Infraestructura Educativa de la Secretaría de Educación y la gestión local participativa, así como mejorar el acceso de los alumnos y alumnas de las comunidades pobres al Centro Educativo de calidad que operan de manera sostenible. De esa manera se pretende contribuir al aumento de la eficiencia y de la calidad del sistema educativo (prebásico y básico).

Con relación a la Fase IV, actualmente se han considerado 44 proyectos de los cuales, 34 se encuentran formulados (de estos 29 están contratados y el resto en proceso de contratación), 7 en formulación, 2 no factibles y 1 pendiente de formulación.

Avance Físico al 30 de septiembre:

Los principales avances al III trimestre se describen a continuación:

- Se han comenzado las formulaciones de proyectos que serán considerados para completar la disponibilidad de la fase IV.
- Se han realizado la actualización al Manual PEC -2021.

A continuación, véase la ejecución histórica del Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y de su Gestión Local (PROMINE), tercer trimestre 2021:

## SECRETARÍA DE FINANZAS

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto*/	Inicio-Fin	
Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y de su Gestión Local (PROMINE)	SE/FHIS VIII No.2008-66-178 2014 67 414 (KFW) / FHIS - SE Fondos de Donación	1,608,626,596	10/07/2012 - 31/07/2023	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
III Trimestre 2021	126,155,838	158,087,627	17,562,218	11
Acumulado 2021	126,155,838	158,087,627	55,798,486	35
Acumulado Vida del Proyecto*/	1,608,626,596	1,356,414,215	1,093,826,352	81

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

### Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB)

Consisten en contribuir a mejorar la convivencia ciudadana en Honduras a través de la mejora en la calidad de vida en barrios vulnerables y la reducción de la incidencia de delitos violentos. Los objetivos específicos son: (I) mejorar el hábitat de barrios urbanos vulnerables, aumentando el acceso a infraestructura de servicios básicos y de prevención para disminuir delitos de robos y violaciones sexuales; (II) reducir los niveles de incidencia de homicidios y violencia intrafamiliar (VIF) en los municipios intervenidos mejorando los servicios de prevención y atención a víctimas de la violencia; y (III) mejorar la efectividad policial en investigación criminal, a través del incremento de la proporción de casos de homicidio con agresor identificado e informe de investigación aceptado por el Ministerio Público.

Avance Físico del Programa al 30 de septiembre de 2021:

#### Proyectos Integrales de Mejoramiento de Barrios.

- Los Proyectos de integración urbana el cual incluye: Ampliación, Mejoramiento y/o Construcción de sistemas de alcantarillado sanitario, agua potable, drenaje pluvial, mejoramiento vial y obras de mitigación de riesgos, al 30 de septiembre tienen el siguiente avance:
  - Proyecto de Integración Urbana Colonia 25 de enero 95%
  - Proyecto de Integración Urbana Colonia Nueva Australia 94%
  - Proyecto de Integración Urbana Colonia Nueva España 91%
  - Proyecto de Integración Urbana Colonia Nueva Galilea 92%
- El proyecto de equipamiento social el cual incluye las siguientes obras y avance físico:
  - Ampliación de Jardín De Niños Colonia Nueva España. 100%
  - Ampliación de La Escuela David Corea Sánchez. 100%
  - Construcción de Centro Comunal Colonia 25 de enero. 100%
  - Construcción de Centro Comunal Colonia Australia. 100%
  - Construcción de Centro Comunal Colonia Nueva Galilea. 100%
  - Reparación de Cancha Polideportiva Colonia Nueva Galilea. 100%

Se finalizó el diseño de obras del Proyecto de Integración Urbana en colonias Montes de los Olivos, Nueva Jerusalén No. 2, Brisas del Mogote Altos de la Quezada, La Huerta, Villas San Miguel, Brisas del Roble, y Altos del Mirador para un total de 3,035, predios.

## SECRETARÍA DE FINANZAS

Se ha iniciado el proceso de licenciamiento ambiental y adquisición de obra y supervisión, se espera la adjudicación (colonias: Brisas del Mogote Altos de la Quezada, La Huerta, Villas San Miguel, Brisas del Roble, y Altos del Mirador) al mes de diciembre del año 2021

A continuación, véase la ejecución histórica del Programa al tercer trimestre 2021:

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto*/	Inicio-Fin	
<b>Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB)</b>	BID/4518/BL-HO ATN/OC-17135-HO	369,377,190	01/10/2018 - 01/10/2023	
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Devengado</b>	<b>% Ejec.</b>
III Trimestre 2021	105,265,786	120,272,463	36,446,512	30
Acumulado 2021	105,265,786	120,272,463	84,747,199	70
Acumulado Vida del Proyecto*/	369,377,190	327,886,899	246,586,448	75

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

### Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras (MIFE)

Este Programa tiene como objetivo fortalecer la educación en Honduras para que los educandos tengan un acceso eficiente, con la permanencia necesaria en los Centros Educativos Media y sean promovidos con la calidad requerida. El programa estará localizado en los departamentos de: Atlántida, Choluteca, Colón, Comayagua, Copán, Cortés, El Paraíso, Francisco Morazán, Gracias a Dios, Intibucá, Islas de la Bahía, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Santa Bárbara, Valle, Yoro.

El Programa beneficiará 480 niños de Educación prebásica, 40,759 niños de Educación Básica y 43,801 jóvenes de Educación Media, haciendo un total de 85,040 educandos de los tres niveles del sistema educativo, así mismo 3,821 docentes de Educación Prebásica, 3,821 docentes de Educación Básica, 15,285 docentes de educación media, haciendo un total de 22,923 docentes. La duración del programa es de 4 años desde el 2020 hasta el 2023 donde habrá un desarrollo gradual de la infraestructura y la dotación de equipo, así como la formación permanente y la plataforma virtual para emprendimiento, con un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por US\$80,000,000.00

A continuación, véase la ejecución histórica del Programa al tercer trimestre 2021:

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto*/	Inicio-Fin	
<b>Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras (MIFE)</b>	BCIE - 2239	1,971,360,000	30/09/2020 - 30/09/2023	
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Devengado</b>	<b>% Ejec.</b>
II Trimestre 2021	973,686,940	505,920,073	109,564,224	22
Acumulado 2021	973,686,940	505,920,073	109,564,224	22
Acumulado Vida del Proyecto*/	1,971,360,000	1,971,360,000	109,564,224	6

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Se realizó la compra de 26,215 tabletas a través del PNUD las cuales fueron entregadas a la Secretaría de Educación para su distribución.

El programa actualmente se encuentra en actividades previas para su ejecución, la diferencia en cuanto a producción planificada para este trimestre corresponde a un reajuste de las actividades las cuales se están reprogramando para el año 2022 y la diferencia con respecto a lo financiero corresponde a los diferenciales de tasa de cambio cuando se realizó la planificación.

Entre otros proyectos ejecutados por la SEDECOAS/FHIS están:

### **Programa de Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes (CONVIVIR I y II)**

El programa abarca la construcción, el mejoramiento y el equipamiento de infraestructura social para jóvenes y espacios públicos, financiamiento y/o cofinanciamiento del trabajo con jóvenes y la capacitación de jóvenes, la capacitación de personal de las instituciones involucradas, las municipalidades seleccionadas, las comunidades de barrio y servicios de consultoría.

La ejecución de los proyectos es a través de Municipios Mancomunidades y Comunidades que interactúan en función a la ejecución de los proyectos, bajo la modalidad de Proyectos Ejecutados por la Comunidad (PEC) para lo cual son debidamente asesorados y capacitados. Los fondos destinados para la ejecución de este Programa en su Fase I son €10,000,000.00 y €6,000,000.00 de Fase II. El tipo de financiamiento es un contrato de Préstamo

El Programa contó con un presupuesto vigente al tercer trimestre del 2021 de L 18,547,004.00 el presupuesto ejecutado es de L 4,953,021.00 alcanzando un 27% de ejecución. Bajo la Fase I del Programa se logró priorizar 37 proyectos de los cuales dos (2) se encuentran en proceso de cierre financiero y administrativo, se logró alcanzar de manera directa 3556 jóvenes, logrando fortalecer sus competencias sociales y laborales, se estima que fueron desarrollados 28 procesos de formación en habilidades sociales y 56 procesos de formación en habilidades laborales con un total de 84 Capacitaciones. En cuanto a los procesos de emprendimiento Juveniles el programa logró identificar y fortalecer la capacidad de 96 jóvenes emprendedores en los 3 municipios.

De igual manera se han logrado identificar jóvenes en actividades con emprendimiento de tiempo completo y de medio tiempo, siendo 57 jóvenes que han logrado mantener su emprendimiento de tiempo completo. Se fortalecieron a 2,115 actores relevantes de los tres municipios y a nivel central institucional, con el propósito de instalar capacidades que mejoraron su intervención en el trabajo con juventud y comunidad, a través de capacitaciones y diplomados, se lograron desarrollar 110 procesos de formación. Cabe mencionar que esta Fase cerró el 30 de junio de 2021.

Avance Físico del Programa al 30 de septiembre de 2021:

El Programa CONVIVIR Fase II, actualmente se encuentra en proceso de inicio, por lo que a continuación se detallan datos importantes de sus avances:

- El 14 de julio 2021 se dió Orden de Inicio a la Empresa FICHTNER WATER &



TRANSPORTATION (GMBH), por los servicios como Asistencia Técnica para la fase II del CONVIVIR. Se ejecuta el pago por Anticipo del contrato (euros 143,932.62).

- Se define con la Asistencia Técnica reprogramar la ejecución física de proyectos hasta conocer los resultados de los Estudios y Diagnósticos municipales y de Juventud.
- Se solicitó a la SEFIN un decremento presupuestario por un monto de L.7.298 millones, fondo externo y L.2.28 millones fondos nacionales, en los objetos previstos para ejecución y supervisión de obras y transferencias. Al 30 de septiembre queda pendiente su aprobación por la SEFIN.
- Se solicita la Dotación Inicial a la cuenta especial BCH por euros 77,914.72.

A continuación, véase la ejecución histórica del Programa al tercer trimestre 2021:

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto*/	Inicio-Fin	
<b>Proyecto Convivencia y Espacios Seguros para los Jóvenes en Honduras (CONVIVIR)</b>	KFW-CONVIVIR BMZ Nr. 2016 65348 Crédito Externo	466,400,000	06/12/2013 - 31/12/2023	
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Devengado</b>	<b>% Ejec.</b>
III Trimestre 2021	27,230,004	18,547,004	4,135,052	22
Acumulado 2021	27,230,004	18,547,004	4,953,021	27
Acumulado Vida del Proyecto*/	466,400,000	353,878,483	293,823,201	83

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

### Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (USAID/ICS)

El propósito del Programa es incrementar la resiliencia de las comunidades y los individuos a la violencia y al crimen a través de mejoras en la infraestructura pública de pequeña escala. Esto incluye el mejoramiento en las estructuras comunitarias que mitiguen el crimen eliminando o disminuyendo el riesgo de oportunidad, creando espacios comunitarios más seguros, aumento en los servicios de calidad que protejan contra la violencia, mejoramiento en la participación de los sistemas de seguridad y rendimiento de justicia nacional y municipal, mejoramiento en la participación ciudadana con los sectores de justicia y seguridad.

Monto del Convenio actual es de \$9,622,517.75, de los cuales, fondos de donación de USAID: \$7,698,014.20; fondos de contraparte de Gobierno de Honduras: \$1,924,503.55, al 30 de septiembre contó con un presupuesto vigente de L 90,509,866.00 y una ejecución acumulada de L 24,196,967.00 que representó el 27%, recursos invertidos para la rehabilitación 31 proyectos de cartera regular (reducción de la pobreza) y 04 proyectos de COVID-19.

Avance Físico del Programa al 30 de septiembre de 2021:

Se llevaron a cabo capacitaciones a los comités y personal de mano de obra en temas de Bioseguridad, también se ha fortalecido a la comunidad en temas de Género, cumpliendo los indicadores del Plan de monitoreo y Plan de Género del programa.

A continuación, véase la ejecución histórica del Programa al tercer trimestre 2021:

SECRETARÍA DE FINANZAS

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto*/	Inicio-Fin	
<b>Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (USAID/ICS)</b>	522-0501-4 Donación Externa	226,129,167	19/10/2017 - 30/09/2022	
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Devengado</b>	<b>% Ejec.</b>
III Trimestre 2021	198,677,019	90,509,866	7,240,484	8
Acumulado 2021	198,677,019	90,509,866	24,196,967	27
Acumulado Vida del Proyecto*/	226,129,167	313,680,219	167,563,871	53

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto  
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

**Proyecto de Respuesta a Emergencia Generados por los Huracanes Eta e Iota (PRE)**

Tiene como objetivo Coordinar, impulsar y fortalecer capacidades para el conocimiento del riesgo, reducción del mismo y manejo de desastre, como una estrategia para mejorar la eficiencia en la preparación para la respuesta y la recuperación post desastre naturales.

Su propósito es la atención de la infraestructura dañada por el Huracán y Tormenta Tropical ETA: rehabilitación de pasos y caminos terciarios, reparación y construcción de cajas puentes rehabilitación y construcción de sistemas de drenaje, puentes (Bailey), construcción de calles terciarias, obras de mitigación entre otras.

Monto del Convenio actual es de US\$150,000,000 recursos provenientes de crédito externo, al 30 de septiembre contó con un presupuesto vigente de L 188,804,388.00 sin ejecución a la fecha.

**4.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN**

- El 14 de septiembre se remitió mediante Oficio DGIP-PRE-0123-2021 a la SEFIN para la aprobación la Enmienda a la Nota de Prioridad para agregar la Fase III del Programa CONVIVIR con financiamiento No reembolsable
- El 07 de julio mediante Oficio No. PROMINE-FHIS-003/2021 se solicita la autorización a la SEFIN para la Modificación de fondos Externos y Nacionales del Programa: PROMINE, KFW FASE IV y V con el objetivo de estiman contratarse y adicionalmente otros requerimientos para la implementación de ambas fases por un monto L 1,878,961.00 de Donaciones Externas y L 999,665.00 de fondos del tesoro nacional.
- Mediante Oficio No. SE-SEDECOAS-FHIS-363/2021 de fecha 08 de julio de 2021 se solicita la autorización para la modificación presupuestaria entre Actividad Obra y objetos del gasto del Proyecto de Recuperación por la Emergencia a Causa de los Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras (PRE) debido a la actualización del Plan Operativo Anual (POA) por un monto de L 19,425,068.00
- El 23 de julio de 2021 se solicitó a la SEFIN modificación presupuestaria tipo traslado tipo traslado incrementando el Programa de Convivencia y Espacio para Jóvenes en Honduras (CONVIVIR) y disminuyendo el Proyecto de Recuperación de Emergencia a



causa de los Ciclones Tropicales Eta e Iota (PRE) con el propósito de reestablecer la asignación presupuestaria original en los objetos del gasto que el programa tiene comprometido por un monto de L 467,000.00

- Mediante Oficio No. SEDECOAS-FHIS-DIM 274/2021 de fecha 10 de agosto de 2021 se solicita la autorización para la modificación presupuestaria traslados entre objetos de gasto del Programa de Infraestructura de la Seguridad Ciudadana (ICS) por un monto de L 470,000.00 de fondos del tesoro y L 2,770,200.00 de fondos de donación.
- Finalmente, en fecha 16 de septiembre de 2021 se solicita a la SEFIN mediante Oficio No. SE-SEDECOAS-FHIS-464/2021 solicitando autorización para la modificación presupuestaria entre programas aumentando Programa de Convivencia y Espacio para Jóvenes en Honduras (CONVIVIR 11) y disminuyendo el Programa de Reconstrucción de la Infraestructura Nacional, por concepto de devolución de préstamo que realizaron los Convenios de PROMINE y CONVIVIR para el pago de la auditoría de Eta e Iota por un monto de L 1,489,000.00 de fondos del tesoro.

### Conclusiones

- La ejecución presupuestaria al tercer trimestre del año 2021 experimentó una ejecución acumulada del 27%, relativo a L 307,542,713.00 con respecto al presupuesto vigente de L 1,140,974,281, cabe mencionar que el presupuesto devengado y comprometido asciende a L 332,719,493.00 que representa el 29% con respecto al vigente.
- Para este trimestre se realizaron modificaciones presupuestarias entre proyectos y entre objetos de gasto con el fin de ir cubriendo las metas establecidas por el ajuste de la programación, POA's y compromisos de acuerdo a cada uno de los proyectos.

### Recomendaciones

- Agilizar los procesos de formulación de los nuevos proyectos con el objetivo de entregar oportunamente los beneficios a la población objetivo, básicamente aquellas personas que han sufrido por emergencias naturales y de salud.
- Coordinar gestiones para acelerar la ejecución física y financiera de los proyectos, tomar acciones correctivas, ceder espacio presupuestario a otros proyectos en vista de lo reprogramado con el objetivo de alcanzar las metas establecidas en los Planes Operativos Anuales institucionales.

# SECRETARÍA DE FINANZAS

## ANEXO II

Secretaría de Finanzas

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública  
**PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE, 2021**

Cifras en Lempiras

Sector / Institución / Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado (Devengado Anual)				Ejecutado (Devengado III Trimestre)				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
		Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comp./Vig.)
<b>0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social</b>		<b>38,834,433</b>	<b>1,443,491,889</b>	<b>1,482,326,322</b>	<b>38,834,433</b>	<b>1,102,139,848</b>	<b>1,140,974,281</b>	<b>15,403,023</b>	<b>292,139,691</b>	<b>307,542,713</b>	<b>27</b>	<b>10,746,571</b>	<b>191,434,237</b>	<b>202,180,808</b>	<b>18</b>	<b>15,403,023</b>	<b>317,316,470</b>	<b>332,719,493</b>	<b>29</b>
008 - PROGRAMA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SU GESTION LOCAL	2014 67 414 (KFW) / FHIS - SE	-	-	-	1,988,953	114,928,888	116,917,841	434,248	52,522,521	52,956,769	45	336,998	14,383,503	14,720,501	13	434,248	52,522,521	52,956,769	45
	BMZ 2016 68 763	6,962,055	119,193,783	126,155,838	4,973,102	36,196,684	41,169,786	-	2,841,717	2,841,717	7	-	2,841,717	2,841,717	7	-	2,841,717	2,841,717	7
<b>Total 008 - PROGRAMA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUC</b>		<b>6,962,055</b>	<b>119,193,783</b>	<b>126,155,838</b>	<b>6,962,055</b>	<b>151,125,572</b>	<b>158,087,627</b>	<b>434,248</b>	<b>55,364,239</b>	<b>55,798,486</b>	<b>35</b>	<b>336,998</b>	<b>17,225,220</b>	<b>17,562,218</b>	<b>11</b>	<b>434,248</b>	<b>55,364,239</b>	<b>55,798,486</b>	<b>35</b>
011 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA	522-0501-4	27,294,374	171,382,645	198,677,019	19,305,249	71,204,617	90,509,866	10,749,187	13,447,780	24,196,967	27	7,240,484	-	7,240,484	8	10,749,187	13,447,780	24,196,967	27
<b>Total 011 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGU</b>		<b>27,294,374</b>	<b>171,382,645</b>	<b>198,677,019</b>	<b>19,305,249</b>	<b>71,204,617</b>	<b>90,509,866</b>	<b>10,749,187</b>	<b>13,447,780</b>	<b>24,196,967</b>	<b>27</b>	<b>7,240,484</b>	<b>-</b>	<b>7,240,484</b>	<b>8</b>	<b>10,749,187</b>	<b>13,447,780</b>	<b>24,196,967</b>	<b>27</b>
013 - PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y FORMACION EDUCATIVA EN HONDURAS	BCIE - 2239	-	973,686,940	973,686,940	-	505,920,073	505,920,073	-	109,564,224	109,564,224	22	-	109,564,224	109,564,224	22	-	109,564,224	109,564,224	22
<b>Total 013 - PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA I</b>		<b>-</b>	<b>973,686,940</b>	<b>973,686,940</b>	<b>-</b>	<b>505,920,073</b>	<b>505,920,073</b>	<b>-</b>	<b>109,564,224</b>	<b>109,564,224</b>	<b>22</b>	<b>-</b>	<b>109,564,224</b>	<b>109,564,224</b>	<b>22</b>	<b>-</b>	<b>109,564,224</b>	<b>109,564,224</b>	<b>22</b>
060 - ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS	522-0502 Cdl E No.9	-	51,310,735	51,310,735	7,989,125	51,310,735	59,299,860	4,144,471	24,138,346	28,282,817	48	3,093,971	24,138,346	27,232,317	46	4,144,471	24,138,346	28,282,817	48
<b>Total 060 - ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OC</b>		<b>-</b>	<b>51,310,735</b>	<b>51,310,735</b>	<b>7,989,125</b>	<b>51,310,735</b>	<b>59,299,860</b>	<b>4,144,471</b>	<b>24,138,346</b>	<b>28,282,817</b>	<b>48</b>	<b>3,093,971</b>	<b>24,138,346</b>	<b>27,232,317</b>	<b>46</b>	<b>4,144,471</b>	<b>24,138,346</b>	<b>28,282,817</b>	<b>48</b>
012 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS	ATN/OC-17135-HO	-	2,574,359	2,574,359	-	3,047,359	3,047,359	-	2,849,764	2,849,764	94	-	672,000	672,000	22	-	2,849,764	2,849,764	94
	BID/4518/BL-HO	-	102,691,427	102,691,427	-	117,225,104	117,225,104	-	81,897,434	81,897,434	70	-	35,774,512	35,774,512	31	-	107,074,214	107,074,214	91
<b>Total 012 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJO</b>		<b>-</b>	<b>105,265,786</b>	<b>105,265,786</b>	<b>-</b>	<b>120,272,463</b>	<b>120,272,463</b>	<b>-</b>	<b>84,747,199</b>	<b>84,747,199</b>	<b>70</b>	<b>-</b>	<b>36,446,512</b>	<b>36,446,512</b>	<b>30</b>	<b>-</b>	<b>109,923,978</b>	<b>109,923,978</b>	<b>91</b>
014 - PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS	BMZ Nr. 2016 65348	4,578,004	22,652,000	27,230,004	4,578,004	13,969,000	18,547,004	75,117	4,059,935	4,135,052	22	75,117	4,059,935	4,135,052	22	75,117	4,059,935	4,135,052	22
	KFW-CONVIVIR	-	-	-	-	-	-	-	817,969	817,969	-	-	-	-	#DIV/0!	-	817,969	817,969	#DIV/0!
<b>Total 014 - PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PA</b>		<b>4,578,004</b>	<b>22,652,000</b>	<b>27,230,004</b>	<b>4,578,004</b>	<b>13,969,000</b>	<b>18,547,004</b>	<b>75,117</b>	<b>4,877,903</b>	<b>4,953,021</b>	<b>27</b>	<b>75,117</b>	<b>4,059,935</b>	<b>4,135,052</b>	<b>22</b>	<b>75,117</b>	<b>4,877,903</b>	<b>4,953,021</b>	<b>27</b>
001 - Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras.	6822-HN	-	-	-	-	188,337,388	188,337,388	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total 001 - Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de C</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>188,337,388</b>	<b>188,337,388</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Fuente: SIAFI
