



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

Informe de Avance Físico y Financiero

Secretaría de Educación (SEDUC)

Al III trimestre, 2021

Tegucigalpa M. D. C.

Honduras, C.A.

Octubre, 2021

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

Cuadro No. 01

Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2021
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	311,664,930
Presupuesto Vigente	203,805,686
Devengado III Trimestre-2021	3,622,082
% Ejecución (Devengado III Trim-2021/ Vigente)	2%
Devengado Anual	8,245,523
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	4%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	10,907,154
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	5%

Fuente: SIAFI, 30/09/2021

La Secretaría de Educación (SEDUC) encargada de la formulación, coordinación, ejecución y evaluación de las políticas relacionadas con todos los niveles del Sistema Educativo Formal; para el III Trimestre del año 2021 cuenta con 2 proyectos de inversión adscritos en el Programa de Inversión Pública, mismos que en su totalidad representan el 29% del Presupuesto Vigente en el Sector Educación. En el cuadro No. 1 se presenta el Presupuesto de Inversión y ejecución financiera al término del trimestre en evaluación.


Al tercer trimestre, la SEDUC reporta una ejecución presupuestaria de L8.2 millones (4%) a nivel de devengado y L.10.9 millones (5%) a nivel de compromisos; orientados al apoyo en el diseño y formulación en conjunto con SEDECOAS/FHIS para obras de infraestructura escolar, así como la participación en la supervisión de centros educativos beneficiarios; así mismo, la mejora de la capacidad institucional de la Secretaría para la gestión del Nivel Pre básica mediante el fortalecimiento de las prácticas de enseñanza de docentes y educadoras a nivel nacional; y los entornos de aprendizaje físico.

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

El Programa de Inversión vigente de la SEDUC, es financiado con recursos de Crédito Externo (95%) proveniente del Banco Mundial (BM), Donaciones Externas (3%) por parte del Gobierno Alemán (KFW) y Banco Mundial (BM); el restante 2% con Recursos Nacionales como contraparte a la contribución del KFW.

Al tercer trimestre del 2021, se cuenta con un Presupuesto Vigente de L203.8 millones ejecutando en el período un acumulado de L4.6 millones (2%) a nivel de devengado de los recursos asignados en relación a dicho Presupuesto. El financiamiento de la

Gráfico No. 01
Secretaría de Educación:
Financiamiento de la Inversión por Fuente
(Cifras en Lempiras)

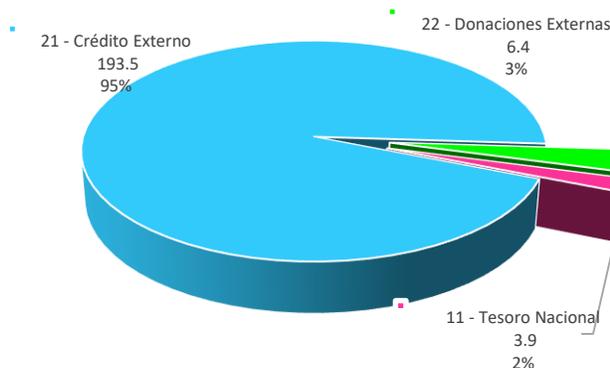

SECRETARÍA DE FINANZAS

inversión para la Secretaría de Educación se refleja en el gráfico No. 1.

En forma comparativa al Tercer Trimestre del año 2020, donde la SEDUC contó con un Presupuesto Vigente de L452.9 millones de los cuales registró ejecución en 0.01% (L26.6 millones); para el año 2021, la asignación disminuye en 2.3% (L249.1 millones) y registró ejecución financiera baja del 2% (L.4.6 millones) la que refleja principalmente el pago de honorarios por consultorías contratadas por la Unidad Ejecutora (BM), así como gastos administrativos y viáticos en el PROMINE.

Ver Detalle de Proyectos, Ejecución Financiera en Anexo No. 4.

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

A continuación, se detalla la ejecución financiera trimestral y acumulada de la vida de los proyectos adscritos a la Secretaría de Educación:

Programa: “Mejora de la Infraestructura Escolar (PROMINE/KFW, FASE IV)” (Componente SEDUC):

Proyecto	Convenio de Cooperación No Reembolsable	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)
Programa: “Mejora de la Infraestructura Escolar (PROMINE/KFW, FASE IV)” (Componente SEDUC)	2014 67 414 (KFW) / FHIS - SE	Lempiras	59,554,506	03/12/2015 30/11/2022
III Trimestre 2021	9,487,049	5,816,049	1,026,626	18%
Acumulado 2021	9,487,049	5,816,049	1,917,248	33%
Acumulado Vida del Proyecto *	59,554,506	59,554,506	32,518,034	55%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 30/09/2021 (BCH): L24.2499 por US\$1.00

Avance físico: El Programa se enfoca en dotar de una infraestructura educativa adecuada, que permita una educación en condiciones pedagógicas modernas, considerando también el uso de los espacios exteriores, promoviendo una educación por valores. Además, está la incorporación del rol de las escuelas en la prevención de la violencia y los espacios escolares seguros, con locales adecuados a las diversas condiciones climáticas y culturales de Honduras.

La modalidad de ejecución de proyectos es " Proyectos Ejecutados por la Comunidad" (PEC), que se desarrolla en el marco de la descentralización y bajo una Gerencia Comunitaria. Para esto, los fondos son transferidos a las municipalidades y de su parte a las comunidades, las cuales son debidamente organizadas, capacitadas y asesoradas, para que realicen las actividades administrativas, organizativas logísticas y técnicas, asumiendo la responsabilidad en la ejecución eficiente y transparente de los recursos financieros. En general la ejecución PEC genera el empoderamiento y apropiamiento de los proyectos y los actores comunitarios y

Ejecución al III Trimestre 2021; Secretaría de Educación

municipales (padres, docentes, autoridades educativas y municipales) que son previamente capacitados para cumplir de forma adecuada su gestión.

Para el año 2021, se programó en el Plan Operativo Anual (POA-Presupuesto SIAFI) las siguientes actividades:

- Diseño y formulación de 15 proyectos de Obra de Infraestructura Escolar.
- Supervisión de 24 Centros Educativos con proyectos de Obra de Infraestructura Educativa en los niveles Pre básica y Básica en los Departamentos: Ocotepeque, Lempira, Copán, Francisco Morazán, Valle, Choluteca, Comayagua y Gracias a Dios.
- Diseño y formulación de 12 proyectos de Obra de Infraestructura Escolar.
- Fortalecer con material didáctico, 200 Centros Educativos a nivel de Bachilleratos Técnicos Profesional (BTP).

Cabe señalar que no se evidencia ejecución física del POA en SIAFI, al III Trimestre del 2021.

De acuerdo a lo reportado por la Unidad Ejecutora, en el marco del PROMINE/KFW en relación a las actividades realizadas desde el ámbito de la Supervisión de Infraestructura, Seguridad Alimentaria y Temas Administrativos:

- ✓ Desarrollo de 7 consultorías en el fortalecimiento a la ejecución del PROMINE (Fase IV):
 - Formador y Diseñador (Arquitecto) para la supervisión y seguimiento de proyectos en La Paz e Intibucá.
 - Formador y Diseñador (Estructural) para la supervisión y seguimiento de proyectos en Ocotepeque, Copán y Santa Bárbara.
 - Supervisor de Proyectos Eléctricos (supervisión y seguimiento de proyectos en La Paz, Intibucá, Lempira Ocotepeque, Copán, Santa Bárbara y Gracias a Dios).
 - Desarrollador de Sistema de Planificación de Infraestructura Educativa (SIPLIE) (Consultoría en Francisco Morazán).
 - Coordinador de Seguridad Alimentaria Cambio Climático Occidente / Corredor Seco para la supervisión y seguimiento de proyectos en La Paz, Intibucá, Lempira Ocotepeque, Copán y Santa Bárbara.
 - Asistente Administrativo (supervisión y seguimiento de proyectos en Francisco Morazán).
 - Asesor legal (seguimiento de procesos legales y titulación de tierra de centros educativos) para La Paz, Intibucá, Lempira Ocotepeque, Copán, Santa Bárbara, Choluteca, valle, Comayagua y Gracias a Dios.
- ✓ Visitas realizadas por los Supervisores Departamentales para la supervisión y seguimiento de proyectos en ejecución:
 - Revisión de expedientes de proyectos.
 - Visitas de supervisión, verificación de calidad de materiales, verificación de protocolos de bioseguridad, verificación de actividades de proyectos, construcción de huertos educativos y productivos, generación de recomendaciones.
 - Recepcionar y dar seguimiento de expedientes de Legalización correspondientes a Centros Educativos del Programa PROMINE.

SECRETARÍA DE FINANZAS

- Visitas de difusión de Proceso de licitación de sistemas solares para el departamento de Gracias a Dios e investigación de empresas de distribución de sistemas de Energía Solar correspondientes al departamento de Cortés y Atlántida.

En relación con la ejecución del proyecto en la Fase V; la unidad ejecutora ha indicado que se reprogramará su inicio considerando la disponibilidad de recursos de la Fase IV, así mismo, por indicaciones del Cooperante se dará inicio hasta que haya finalizado la Auditoría correspondiente a la Fase IV (período 2018 -2020), y bajo esta premisa, mediante Nota Técnica No. 15-2021 se cedió espacio presupuestario por un monto de L.3,671,000.

Proyecto: “Mejoramiento de la Calidad de la Educación Pre básica en Honduras” (IDA 6560-HN):

Proyecto	Convenios de Crédito Externo /Donación Externa	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$		
Mejoramiento de la Calidad en la Educación Prebásica en Honduras	6560-HN TF0B2218-HN	39,500,000		31/07/2020
			949,271,900	31/07/2025
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
III Trimestre 2021	302,177,881	197,989,637	2,595,456	1.3%
Acumulado 2021	302,177,881	197,989,637	6,328,275	3.2%
Acumulado Vida del Proyecto *	957,871,050	957,871,050	6,328,275	0.7%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 30/09/2021 (BCH): L24.2499 por US\$1.00

Avance Físico: En fecha 16 de junio de 2020, el Gobierno de Honduras suscribe con la Asociación Internacional del Fomento (Banco Mundial) y la Alianza Mundial para la Educación (AME), Acuerdo de Financiamiento (No. 6560-HN) y Acuerdo de Subvención (No. TF0B2218-HN) respectivamente para el financiamiento por un monto total de US\$39.5 millones. El proyecto consiste en la mejora de la capacidad institucional de Secretaría de Educación (SEDUC) para la gestión de este nivel educativo; las prácticas de enseñanza de docentes y educadoras a nivel nacional; y los entornos de aprendizaje físico en centros de Pre básica que atienden educandos vulnerables de regiones seleccionadas.

Para el año 2021, se programó en el Plan Operativo Anual (POA-Presupuesto SIAFI) las siguientes actividades:

- Fortalecer la gestión institucional de la SEDUC mediante la actualización del Diseño Curricular para todas las modalidades de Atención del Nivel de Educación Pre básica (Elaboración de 3 documentos).
- Mejora del Diseño Curricular actualizado para todas las Modalidades de Atención del nivel de Educación Pre básica y Prácticas de Enseñanza en Centros de Educación pre básica (CEPB) y Centros Comunitarios de Educación pre básica (CCEPREB) (Elaboración de 2 documentos).

SECRETARIA DE FINANZAS

- Un Estudio de factibilidad para entornos físicos de aprendizaje ampliados y/o mejorados en Centros de Educación Pre básica Seleccionados que atienden a niños(as) en los departamentos focalizados: Gracias a Dios, Lempira, Yoro, Olancho, Copán, El Paraíso
- 4 Informes de gestión y evaluación del Proyecto.
- Fortalecida y funcionando la gestión institucional de la SEDUC con el Modelo de la Calidad en la Gestión de la Educación Pre básica (MEP), para todas las modalidades de atención del nivel e instancias de Participación Comunitaria y Escolar fortalecidas y funcionando (Elaboración de 1 documento).

De acuerdo a lo reportado por la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP), se encuentran en ejecución 11 contratos de consultorías: coordinación general, coordinación de adquisiciones, coordinación administrativa y financiera, (especialistas ambientales y sociales en proceso de contratación), técnico en formación permanente, especialista en monitoreo y evaluación, especialista en adquisiciones y contrataciones de infraestructura, oficial técnico en construcciones escolares, oficial técnico en educación pre básica, asesor legal para la Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles (DIGECEBI), oficial de adquisiciones para la UCP y la Consultoría individual para el Diseño del Programa de Fortalecimiento de los Consejos Municipales de Desarrollo Educativo (COMDE).

Al tercer trimestre de acuerdo a las principales actividades realizadas por la UCP, se reporta:

- Habilitación de usuarios en HONDUCMPRAS I y en el sistema SIAFI-GES para el ingreso del proyecto.
- Validación ajustes y aprobación de los cinco Módulos e instructivo para el facilitador de la Consultoría de Diseño del Programa de Fortalecimiento a los Consejos Municipales Desarrollo Educativo (COMDE).
- Publicación y avisos de expresión de interés de las consultorías siguientes:
 - ✓ Oficial Financiero para el desembolso del Proyecto de Mejoramiento de la Calidad en la Educación Pre básica
 - ✓ Oficial Contable para el desembolso del Proyecto de Mejoramiento de la Calidad en la Educación Pre básica
 - ✓ Oficial Técnico para el Mejoramiento de la Organización de la Planeación y el Monitoreo, proceso adjudicado.
 - ✓ Elaboración de Propuestas arquitectónicas Bioclimáticas para Centros Educativos de Educación Prebásica, proceso adjudicado.
- Propuesta de Manual de Organización de procesos y procedimientos de la SDGEPB.
- Aprobación del II desembolso de fondos para el proyecto por parte del BM, por un monto de USD\$500,000.00.
- Aprobación del I informe semestral por la SSATP y BM.
- Aprobada la exoneración del ISV del proyecto por parte de la DGFA de SEFIN, para el periodo agosto 2021 a mayo 2022.
- Aprobación de Modificación presupuestaria solicitada a SEFIN.
- Aprobación de la propuesta de conformación de la Mesa Técnica de Educación Prebásica por parte de la SSATP.

- Habilitación de usuarios para el SNIHP, los cuales fueron creados y la DGIP-SEFIN, ha asignado un técnico para acompañamiento en el proceso de ajuste al SNIPH y actualización en el sistema SNIPH el Presupuesto Plurianual del Proyecto.
- Elaborado el primer documento sobre la revisión del CNB del nivel de Educación Prebásica. En proceso de revisión en la DGCE.
- Remisión del POA y PAC 2021 ajustado a la Subsecretaría de Asuntos Técnico Pedagógicos para su respectiva aprobación, aprobada No Objeción por el BM y publicado en el portal de Honducompras.

Así mismo, producto de la reducción presupuestaria en los grupos de gasto 200 y 300 (mediante Nota Técnica No. 20-2021); la UCP actualizó el Plan de ejecución del Proyecto, considerando que las actividades son secuenciales por lo que se realizará traslados presupuestarios para atender dichos requerimientos. Adicionalmente, el proyecto cedió mediante Nota Técnica No. 15-2021 espacio presupuestario de Donaciones Externas (Convenio TF0B2218-HN) por un monto de L.20,430,164 tomando en consideración que, de realizarse el primer desembolso al mismo, podrá incorporarse en cumplimiento al artículo 29 de las Disposiciones Generales de Presupuesto vigentes.

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Durante el tercer trimestre se realizaron las siguientes actividades y/o acciones en apoyo a los proyectos de inversión:

- Revisión y actualización de la Proyección Mensual (agosto - diciembre) de ejecución para el Año 2021
- Apoyo en seguimiento a las solicitudes de cuotas de compromiso mensuales de Crédito Externo para su gestión ante TGR en función de las proyecciones de ejecución reportadas por las Unidades ejecutoras de Proyectos.
- Emisión y Aprobación de Dictámenes para traslados presupuestarios entre grupos 200 y 300 en SIAFI, en cumplimiento a los artículos 27 y 32 de las Normas de Ejecución Presupuestaria para el 2021 (Decreto Legislativo No. 182-2020).
- Seguimiento y monitoreo para apoyo a la diferentes Unidades Ejecutoras de SEDUC.

Conclusiones

- En el mes de febrero del año 2020, se Decretó Emergencia Nacional por la Pandemia del Coronavirus (COVID19), situación que afecta la normal ejecución de las actividades y procesos programados por las Unidades Ejecutoras de Proyectos, principalmente aquellos cuyas intervenciones se realizan en campo, como es el caso de los adscritos a la SEDUC; debido a que se prioriza la ejecución de los recursos en aras de atender y salvaguardar la salud de la población hondureña.

- Al tercer trimestre del año 2021, la SEDUC registró ejecución financiera baja del 4% (L.8.2 millones) en relación al Presupuesto Vigente asignado, principalmente reflejado por la contratación de consultorías y gastos operativos.
- El Programa PROMINE continúa la ejecución de las actividades correspondientes a la Fase IV; con respecto a la ejecución de la Fase V se reprograma el inicio considerando la disponibilidad de recursos de la Fase IV, así mismo, por indicaciones del Cooperante se debe realizar la Auditoria correspondiente a la Fase IV (período 2018 -2020).
- El Proyecto de Mejora de la Calidad de la Educación Prebásica, se encuentra en proceso de contratación del personal clave de la Unidad Ejecutora, así mismo el avance de las acciones relacionadas con la contratación de las consultorías especializadas para la actualización de currículos y metodologías que permitan el fortalecimiento institucional de la Secretaría.

Recomendaciones

- Para la gestión 2021, las unidades ejecutoras deberán realizar una programación financiera que les permita contar con todos los recursos necesarios según las actividades y procesos que estas realicen, priorizar actividades haciendo uso eficiente de los recursos.
- Se recomienda registrar la programación y ejecución física en SIAFI conforme a los planes de ejecución de los Proyectos.
- La SEDUC debe identificar alternativas viables para la gestión de la solvencia del SAR, que permita cumplir eficientemente los procesos, así como las exoneraciones relacionadas a las adquisiciones en el marco de los contratos de financiamiento externo.

ANEXO No. 04
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS
 Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE 2021
 Cifras en Lempiras

No. Proy.	Sector / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio Término	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado (Devengado Anual)				Ejecutado (Devengado III Trimestre)				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comp./Vig.)
2	Educación			3,867,578	307,797,352	311,664,930	3,867,578	199,938,108	203,805,686	642,398	7,603,125	8,245,523	4	342,176	3,279,906	3,622,082	2	669,801	10,237,353	10,907,154	5
2	0050 - Secretaría de Educación			3,867,578	307,797,352	311,664,930	3,867,578	199,938,108	203,805,686	642,398	7,603,125	8,245,523	4	342,176	3,279,906	3,622,082	2	669,801	10,237,353	10,907,154	5
1	007 - PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)	2014 67 414 (KFW) / FHIS - SE BMZ 2016 68 763	10/07/2012 31/07/2023	-	-	-	979,445	1,948,471	2,927,916	606,062	1,274,850	1,880,912	64	305,840	684,450	990,290	34	633,464	1,587,904	2,221,368	76
				3,867,578	5,619,471	9,487,049	2,888,133	-	2,888,133	36,336	-	36,336	1	36,336	-	36,336	1	36,336	-	36,336	1
	Total 007 - PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)			3,867,578	5,619,471	9,487,049	3,867,578	1,948,471	5,816,049	642,398	1,274,850	1,917,248	33	342,176	684,450	1,026,626	18	669,801	1,587,904	2,257,705	39
2	010 - MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN PREBÁSICA EN HONDURAS	6560-HN TF0B2218-HN	31/07/2020 31/07/2025	-	277,250,876	277,250,876	-	193,492,796	193,492,796	-	6,328,275	6,328,275	3	-	2,595,456	2,595,456	1	-	8,649,449	8,649,449	4
				-	24,927,005	24,927,005	-	4,496,841	4,496,841	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total 010 - MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN PREBÁSICA EN HONDURAS			-	302,177,881	302,177,881	-	197,989,637	197,989,637	-	6,328,275	6,328,275	3	-	2,595,456	2,595,456	1	-	8,649,449	8,649,449	4

Fuente: SIAFI al 30/09/2021

ANEXO No. 05
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS
 Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al III Trimestre, 2021

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2021		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Secretaría de Educación								
007 - PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)	03 - Proyectos obra de infraestructura educativa en los niveles prebásica, básica y de manera limitada en el nivel medio en los departamentos de: Ocotepeque, Lempira , Intibucá, la Paz, Santa Barbara y Copán en la zona de occidente. Francisco Morazán, valle, Choluteca, Comayagua y Gracias a Dios, supervisados.	Obra de Infraestructura	12	0		0	0	
	04 - Proyectos obra de infraestructura escolar, diseñados y formulados.	Proyecto	15	0		0	0	
	05 - Bachilleratos Técnicos Profesional (BTP) fortalecidos con material didáctico.	Centro Educativo	1	0		0	0	
	14 - Proyectos obra de infraestructura escolar, diseñados y formulados.	Proyecto	12	0		0	0	
	15 - Proyectos obra de infraestructura educativa en los niveles Prebásica y básica en los departamentos de: Ocotepeque, Lempira y Copán en la zona de occidente. Francisco Morazán, valle, Choluteca, Comayagua y Gracias a Dios, supervisados.	Obra de Infraestructura	12	0		0	0	
010 - MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN PREBÁSICA EN HONDURAS	08 - Gestion institucional de la SE fortalecida con el diseño curricular actualizado para todas las modalidades de atención del nivel de Educación Prebasica, instancias de Participación Comunitaria y escolar fortalecidas y funcionando. (DLI)	Documento	4	0		1	0	
	09 - Diseño Curricular actualizado para todas las Modalidades de Atención del nivel de Educación Prebásica y Prácticas de Enseñanza en CEPB y CCPREB mejoradas.	Documento	1	0		0	0	
	10 - Entornos Físicos de Aprendizaje ampliados y/o mejorados en Centros de Educación Prebásica Seleccionados que atienden a niños(as) en los departamentos focalizados: Gracias a Dios, Lempira, Yoro, Olancho, Copán, El Paraíso.	Estudio de Prefactibilidad	1	0		0	0	
	11 - Gestión y Evaluación del Proyecto	Informe	4	0		1	0	
	12 - Gestión institucional de la SE fortalecida con el Modelo de la Calidad en la Gestión de la Educación Prebásica (MEP), para todas las modalidades de atención del nivel e instancias de Participación Comunitaria y Escolar fortalecidas y funcionando.	Documento	1	0		0	0	
	13 - Diseño Curricular actualizado para todas las Modalidades de Atención del nivel de Educación Prebásica y Prácticas de Enseñanza en CEPB y CCPREB mejoradas (DLI)	Documento	1	0		0	0	

Fuente: SIAFI, al 30/09/2021
