

# **Informe General de la Inversión Pública**

## **Ejecución AI IV**

### **Trimestre, Año 2020**

**Honduras C.A.**

**Enero, 2021**

## Contenido

<b>INVERSIÓN PÚBLICA AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2020 .....</b>	<b>3</b>
<b>PRESENTACION .....</b>	<b>3</b>
<b>I. ANALISIS GLOBAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA AL IV TRIMESTRE 2020.....</b>	<b>4</b>
<b>1.1 Inversión Pública Global 2020.....</b>	<b>4</b>
<b>1.2 Programas y Proyectos de Inversión Pública por Estructura del Sector Público .....</b>	<b>7</b>
<b>1.3 La Inversión Pública a Nivel de Sector .....</b>	<b>8</b>
<b>1.4 Inversión Ejecutada a Nivel de Fideicomisos y Alianzas Público Privadas (APP's) .....</b>	<b>9</b>
<b>1.5 Financiamiento de la Inversión .....</b>	<b>9</b>
<b>1.6 EJECUCIÓN FÍSICA A NIVEL DE SECTORES:.....</b>	<b>10</b>
<b>a) SECTOR CARRETERAS:.....</b>	<b>10</b>
<b>b) SECTOR DE PROTECCION SOCIAL:.....</b>	<b>13</b>
<b>c) SECTOR ENERGIA: .....</b>	<b>18</b>
<b>d) SECTOR EDUCACIÓN:.....</b>	<b>19</b>
<b>e) SECTOR SALUD:.....</b>	<b>23</b>
<b>f) SECTOR PRODUCTIVO y RIEGO .....</b>	<b>27</b>
<b>g) SECTOR SEGURIDAD Y DEFENSA: .....</b>	<b>29</b>
<b>h) SECTOR RECURSOS FORESTALES Y AMBIENTE: .....</b>	<b>31</b>
<b>i) SECTOR COMUNICACIONES.....</b>	<b>35</b>
<b>1.7 Factores que Han Incidido en la Ejecución de la Inversión Pública, para el Cuarto Trimestre del Año 2020 .....</b>	<b>35</b>

## **INVERSIÓN PÚBLICA AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2020**

### **PRESENTACION**

El presente apartado, muestra el análisis del comportamiento de la ejecución física y financiera de la Inversión Pública correspondiente al Cuarto Trimestre del ejercicio fiscal 2020.

Este documento es elaborado por la Dirección General de Inversiones Públicas (DGIP) en el marco de sus competencias como ente técnico coordinador del Programa de Inversión Pública (PIP).

El monto aprobado por el Congreso Nacional para la Inversión Pública (PIP) para el ejercicio fiscal 2020 asciende a **L25,211.4 millones** que incluye la inversión bajo la modalidad de Asociación Público Privada (APP), Programa de Infraestructura Vial, por un monto de **L4,576.9 millones** y **L2,500.0 millones** respectivamente, así como el Fondo Social para la Reducción de la Pobreza (Vida Mejor) que asciende a **L4,500.0 millones** y el Fideicomiso de Inversiones y Asignaciones (FINA 2) por un monto de L1,013.0 millones. Del monto total de la Inversión Pública aprobado para la gestión 2020 los Proyectos que conforman el Programa de Inversión Pública (PIP) suman un monto de **L12,621.4 millones** y que están registrados en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIPH).

Al Cuarto Trimestre la Inversión Pública cuenta con un presupuesto vigente de **L22,498.1 millones** para la ejecución de 85 proyectos (incluidos cinco proyectos financiados a través de la modalidad Alianzas Público-Privadas (APP) y tres Fideicomisos; el Fideicomiso de Infraestructura Vial, Fondo Social para la Reducción de la Pobreza (Vida Mejor), Fideicomiso de Inversiones y Asignaciones (FINA 2) y 94 proyectos que conforman el Programa de Inversión Pública (PIP). La disminución del presupuesto vigente en cuanto al presupuesto aprobado tuvo su principal impacto en los Fondos Nacionales, debido a la implementación de una disciplina presupuestaria en materia de racionalización del gasto público que tuvo como propósito eficientar el uso de los recursos financieros, en cumplimiento al Decreto Legislativo No. 92-2020 a consecuencia de la Pandemia Mundial ocasionada por el COVID 19. Por su parte, es importante mencionar el impacto en la economía nacional ocasionado por las Tormentas Tropicales ETA e IOTA.

El presupuesto vigente de la Inversión Pública al Cuarto Trimestre refleja reservas presupuestarias a diferentes proyectos del PIP financiados con crédito Externo por el orden de **L2,075,7 millones**; esto como parte de la implementación de una disciplina presupuestaria en materia de racionalización del gasto público que tuvo como propósito eficientar el uso de los recursos financieros, en cumplimiento al Decreto Legislativo No. 92-2020. No obstante, la ejecución de los proyectos impacta directamente en la ejecución del Programa de Inversión Pública (PIP), dado que la mayoría de los proyectos están orientados a generar beneficios económicos al país.

## I. ANALISIS GLOBAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA AL IV TRIMESTRE 2020

### 1.1 Inversión Pública Global 2020

El presupuesto global de la Inversión Pública al Cuarto Trimestre del 2020 reporta un presupuesto vigente de **L22,498.13 millones** que representa el **3.8% del PIB<sup>1</sup>** para el 2020, el cual muestra un decremento global de **L2,713.2 millones** respecto al presupuesto aprobado de L. 25,211.4 millones para la ejecución de 71 proyectos de Inversión Pública (PIP) incluyendo los Proyectos financiados bajo la Modalidad de APP's, y el Fondo de Solidaridad y

**Cuadro No. 1**  
**Inversión Pública: Clasificación Sector Público al 31 de Diciembre del 2020**  
Cifras en Millones de Lempiras

Sector Público	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución (Ejecutado/Vigente)
Administración Central	11,277.9	10,039.8	6,724.5	67%
Resto del Sector Público	1,343.6	1,422.2	396.5	28%
<b>Sub-total PIP</b>	<b>12,621.5</b>	<b>11,462.0</b>	<b>7,121.0</b>	<b>62%</b>
Fondo de Solidaridad y Protección Social para la Reducción de la Pobreza Extrema	4,500.0	4,500.0	4,485.8	100%
APP's */	4,576.9	2,418.8	1,189.4	49%
Programa de Infraestructura Vial	2,500.0	3,113.0	3,113.0	100%
Fideicomiso de Inversiones y Asignaciones (FINA II)	1,013.0	1,004.3	740.8	74%
<b>Total General</b>	<b>25,211.4</b>	<b>22,498.1</b>	<b>16,650.0</b>	<b>74%</b>

Fuente: SIAFI, Circular No. CGG-009-2020 y Circular No. CGG-1143-2020 emitidas por la SCGG en cumplimiento al Decreto Ejecutivo PCM-044-2019.

Protección Social para la Reducción de la Pobreza Extrema a través de Fideicomiso.

Así mismo,, existen disminuciones en el PIP las cuales obedecen a la facilitación de espacio presupuestario, para el traslado de fondos a instituciones con estructura presupuestaria sin proyecto, específicamente para casos de fuentes externas (donaciones externas); además se reportan reducciones en el presupuesto programado para los Fideicomisos Vial y FINA 2.


En relación a las disminuciones mencionadas, se observa en comparación a lo reportado el IV Trimestre una disminución de **L318.2 millones** en los proyectos del PIP; **L 2,429.8 millones** en los proyectos financiados por APP's; **L130 millones** del Fideicomiso Vial y **L640.4 millones** del Fideicomiso de Inversiones y Asignaciones (FINA II), lo anterior en función de un presupuesto vigente al Tercer trimestre de **L26,074 millones**.

En cuanto a los decrementos de la inversión por fuente de financiamiento comparativa con el Tercer trimestre 2020, se observa una disminución de **L 1,625 millones** en Fondos Nacionales (Fuente 11 y 12); por su parte en fondos externos se aprecia una reducción de **L889.6 millones**.

Lo anterior, como parte de la implementación de una disciplina presupuestaria en materia de racionalización del gasto público que tuvo como propósito eficientar el uso de los recursos financieros, en cumplimiento al Decreto Legislativo No. 92-2020 a consecuencia de la Pandemia Mundial ocasionada por el COVID 19. Por su parte, es

importante mencionar el impacto en la economía nacional ocasionado por las Tormentas Tropicales ETA e IOTA sobre el territorio nacional, lo cual trajo consigo la suspensión parcial de muchos proyectos de Inversión Pública.

El Plan de Inversión Pública en su conjunto, muestra una ejecución financiera al 31 de Diciembre del 2020 de **L 16,650 millones** reflejando un **74%** de ejecución a nivel de devengado. Dicha ejecución incluye el Fondo Social Reducción de la pobreza (Vida Mejor) por L4,485.8 **millones** y el Programa de Infraestructura Vial con una ejecución de **L3,113 millones**. Según el Sistema de Administración Financiera (SIAFI), para la ejecución de 94 proyectos desglosados de la siguiente manera: 73 proyectos ejecutados en la Administración Central, 11 en el Resto del Sector Público, 7 de Alianzas Público Privadas, 1 para el Fondo Social para la Reducción de la Pobreza Vida Mejor y 1 del Fondo Vial, y 1 para el Fideicomiso de Inversiones y Asignaciones (FINA 2). El mayor porcentaje del PIP se concentra en los proyectos ejecutados en el Sector de Carreteras con **25%**: Protección Social con **21%**, Salud con el **17%**, Transporte y Obras Públicas con **10%**, y Energía con un **8%**; en menor proporción el resto de los sectores.

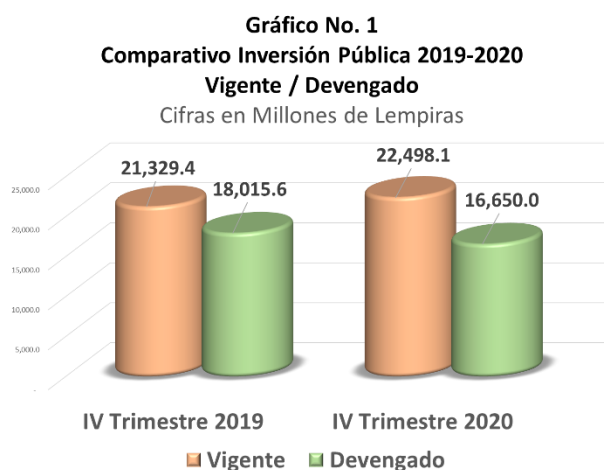

Fuente: SIAFI, Circular No. CGG-009-2020 y Circular No. CGG-1143-2020 emitidas por la SGGG en cumplimiento al Decreto Ejecutivo PCM-044-2019.\* / Cifras proyectadas, proporcionadas por la Dirección de Contingencias fiscales, superintendencia de Alianzas Público Privadas (SAPP).

El desempeño de la ejecución de la Inversión Pública al Cuarto Trimestre del 2020 a nivel de devengado muestra una reducción de 10 puntos porcentuales en comparación con el cierre del año 2019 (**84%**), lo anterior se debe a retrasos en las aprobaciones por parte del Congreso Nacional de las Normas de Ejecución presupuestaria vigentes específicamente en su artículo No 3. Afectando a las unidades ejecutoras de proyectos en realizar modificaciones y ajustar sus planes operativos anuales. Por otra parte, a partir del 16 de marzo del presente año la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno

por el COVID 19 y las medidas de contención del gasto establecidas mediante Decreto Ejecutivo Numero PCM-020-2020, obligó a las instituciones a limitar la ejecución en varios rubros, como los indicados en la circular DGP-003-2020.

A partir tercer trimestre los principales centros económicos del país, iniciaron la apertura inteligente Fase I, pero con restricciones, por lo que, la ejecución de los proyectos siempre se ve afectada a causa de la pandemia mundial ocasionada por el COVID 19, lo cual impacta directamente a la ejecución del PIP en su mayoría los proyectos orientados a generar un beneficio económico en el país; Sumado a los problemas antes descritos, debido a los efectos nocivos del Cambio Climático, en el cuarto trimestre el territorio nacional fue fuertemente golpeado por las tormentas tropicales ETA e IOTA las cuales dañaron o destruyeron la infraestructura sobre todo en la costa norte del país, lo cual ocasionó daños no previstos en varios de los proyectos y la suspensión de obras en otros.

Adicionalmente, debido a las restricciones presupuestarias adoptadas con el propósito de ejecutar fondos estrictamente para la emergencia nacional y controlar el gasto y déficit fiscal, conllevó las limitaciones en la aprobación de cuotas de compromiso, afectando en cierta manera en cuanto a honrar compromisos que no se encontraron en la proyección original de ejecución presupuestaria al 31 de diciembre del año. Para poder hacer frente a esta situación, se efectuaron traslados de estructuras presupuestarias entre proyectos e instituciones a fin de compensar espacio presupuestario para la incorporación de los recursos de crédito externo, en apoyo a las unidades ejecutoras de proyectos para poder hacer frente a sus compromisos de pago prioritarios.

Cabe señalar que la responsabilidad de ejecutar los recursos es exclusiva de la Unidad Ejecutora, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2, numeral 34, del Reglamento de las Disposiciones Generales del Presupuesto Vigente (Acuerdo Ejecutivo No. 188-2020) de fecha 17 de abril 2020, el cual literalmente expresa:

*"UNIDAD EJECUTORA: Es la unidad responsable de la ejecución, vigilancia y alcance de los objetivos y metas, con los recursos y los costos previstos. Desde el punto de vista de la administración presupuestaria constituye el área de una dependencia o entidad, con facultades para adquirir, contratar y cubrir compromisos. Esta figura orgánica y funcional se establece para efectos del ejercicio presupuestario, en su aceptación más amplia, representa el ente responsable de la administración y ejecución de los programas, sub programas y proyectos."*

Para el ejercicio fiscal 2020 en las Normas de Ejecución Presupuestarias, se incluyeron lineamientos específicos orientados a ordenar y agilizar la ejecución de proyectos, acorde a las restricciones fiscales, así como en la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, Control de las Exoneraciones y Medidas Anti evasión y la Ley de Responsabilidad Fiscal.

Para mitigar los efectos de la pandemia COVID 19, se incorporaron 4 proyectos, el Proyecto de Respuesta a Emergencias Honduras COVID-19 y el Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad, ejecutados por INVEST-H; Programa de Respuesta Inmediata de Salud para Contener y Controlar el Coronavirus (COVID- 19) y Mitigar su Efecto en la Prestación del Servicio, en Honduras ejecutado por la Secretaría de Salud y el Proyecto TELESALUD para Mitigar el Coronavirus y Mejorar el Acceso a la Salud en Honduras. Y como apoyo a los proyectos enfocados en la reactivación económica del país en el mes de octubre se incorporó el proyecto Construcción de Pavimentos de Concreto Hidráulico en Vías Urbanas en 16 Departamentos del País con el cual se realizaron acciones para la rehabilitación de accesos en zonas afectadas por las tormentas tropicales ETA e IOTA.

Cabe resaltar que en el PIP se ejecutan programas y proyectos que contribuyen al incremento de los activos no financieros de las entidades que integran el Sector Público y los bienes y servicios de dominio público, con el fin de iniciar, ampliar, mejorar, modernizar, reponer o reconstruir la capacidad productiva de bienes y la prestación de servicios nacionales, lo cual es de suma importancia para la reactivación económica del país.

Asimismo, se trasladaron a la Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H) según Decreto Ejecutivo número PCM-004-2020,


Artículo 24 del Decreto Ejecutivo los proyectos: Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven; Proyecto de Mejora de la Gestión y Calidad de los Servicios de Salud Materno-Neonatal y el Proyecto Manejo Sostenible de Bosques.

## 1.2 Programas y Proyectos de Inversión Pública por Estructura del Sector Público

El monto Total de la Inversión Pública a nivel de presupuesto vigente al Cuarto Trimestre del 2020, ascendió a **L22,498.1 millones** y se concentra en su mayor parte en los proyectos de

las instituciones de la Administración Central, con el 87.3% de participación, específicamente en los proyectos ejecutados por la Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H), la Secretaría de Salud (SESAL), la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

(SEDIS) la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y el Registro Nacional de las Personas (RNP); proyectos APP, Fondo Social Reducción de la Pobreza (Vida Mejor), Fondo Infraestructura Vial, y el Fideicomiso de Inversiones y Asignaciones (FINA 2), El resto del Sector Público alcanza apenas el **11%** de la Inversión.

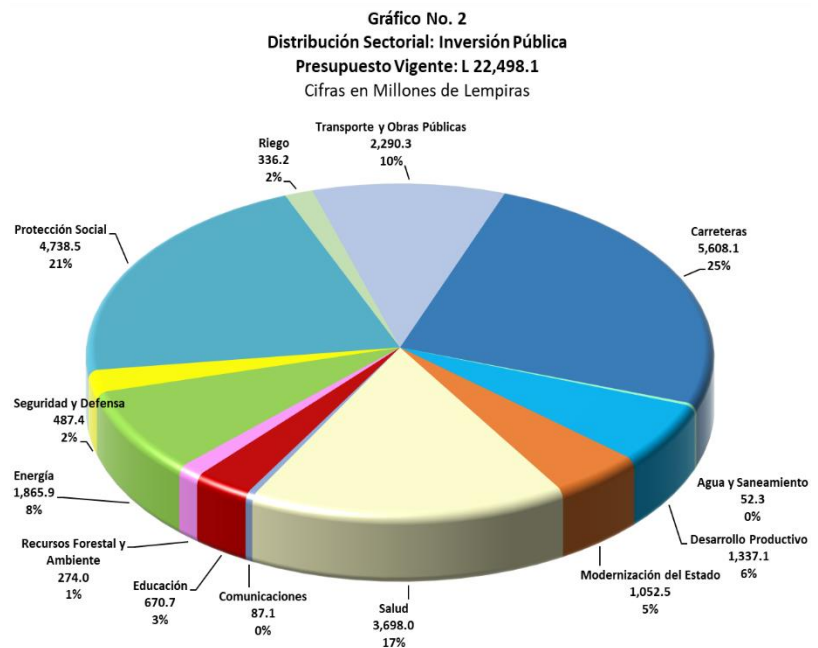

La distribución del PIP de acuerdo a la Clasificación del Sector Público se aprecia en el Gráfico No.2. Asimismo, refleja una ejecución de **L16,592.5 millones**, representando un **75%** respecto al presupuesto vigente global.

En términos financieros de la Inversión Pública, se registran mayores niveles de ejecución en el Fondo Social Reducción de la Pobreza (Vida Mejor) alcanzando una ejecución presupuestaria de **L4,485.8 millones** y el Programa de Infraestructura Vial **L3,113 millones**, sumando entre ambos **L7,598.8 millones** (45% del total de la Inversión Ejecutada). Por su parte, en su conjunto la INVEST-H (**L1,961.2 millones**); La SESAL (**L 1,393 millones**); La SEDIS (**L643,961.5 millones**); el RNP (**L573.0 millones**) y La INSEP (**L554,624.7 millones**), en su conjunto suman **L5,125.8 millones**, concentrando el 30.9% del total de la Inversión Ejecutada y el 72% del total del presupuesto ejecutado del PIP registrado en el SNIPH. Mientras que los Proyectos APP's y Fina II conjuntamente suman una ejecución de **L1,872.7 millones** (11.3% del total de la Inversión Ejecutada).



### 1.3 La Inversión Pública a Nivel de Sector

En cuanto a la inversión Sectorial, el **Sector Carretero** cuenta con el mayor porcentaje de inversión, alcanzando un monto de **L5,608.1 millones (25%)**, incluye el Programa de Infraestructura Vial; los proyectos financiados a través de Alianzas Público Privada (APP's), para la ejecución de los Corredores Lenca y Turístico; las principales instituciones que concentran la inversión de este sector son INVEST-H con una inversión de **L2,998.4 millones** ejecutando la Construcción del Corredor Logístico Villa de San Antonio-Goascorán Sección II y III, el Programa de Integración Vial Regional II, Rehabilitación y Mejoramiento del Corredor de Oriente, Carretera

Tegucigalpa-Danlí, tramo Neteapa – Danlí entre otros; e INSEP con **L869.4 millones**, para ejecutar algunos proyectos relevantes como ser la Rehabilitación Vial del Corredor de Occidente: La Entrada - Copán Ruinas - El Florido y La Entrada - Santa Rosa de Copán, Construcción y Pavimentación Carretera Catacamas-Cuevas de Talgua, Construcción y Pavimentación con Concreto Hidráulico del Tramo Carretero Valladolid-La Virtud-Mapulaca con una Longitud Aproximada de 30 Km Localizado en el Departamento De Lempira, Corredor Turístico Distrito de los Lagos Etapa 1: Rehabilitación con Concreto Hidráulico Tramos: 1-Cañaveral-Rio Lindo- Caracol Sección 1.

Seguido el **Sector Protección Social** con **L4,738.5 Millones (21%)** que incluye el fideicomiso de Fondo Social para la Reducción de la Pobreza, apoyando las iniciativas de Gobierno: Criando con amor, Vivienda Saludable, Guías de Familia, Ecofogones, Merienda Escolar, Bolsa Solidaria Adulto Mayor, entre otras; la institución que ejecuta proyectos en apoyo a este sector es La SEDIS, con una inversión de **L757.6 millones** para la ejecución de algunos proyectos como ser el Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social (Bono Vida Mejor), Programa Apoyo a la Red de Inclusión Social con Prioridad en Occidente, Proyecto de Integración de la Protección Social, y otros programas de Atención a Personas con Capacidades Especiales y Adultos Mayores en Situación de Vulnerabilidad,

Posteriormente, el **Sector de Transporte y Obras Públicas** aporta una inversión de **L2,290.3 millones (10.2%)**, incluye algunos proyectos de ejecutados bajo modalidad APP's como la construcción Aeropuerto de Palmerola, el Centro Cívico Gubernamental y las obras de construcción de la Lima; Asimismo la ejecución de proyectos como la Construcción Obras de Facilitación de Acceso al Recinto Portuario en Puerto Cortés (ENP).

Seguidamente el **Sector Energía** **L1,865.9 millones (8%)**; para la ejecución de los proyectos de Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral-Río

**Cuadro No. 2**  
**Ejecución de la Inversión Sectorial al IV Trimestre**  
Cifras en Millones de Lempiras

Sectores	Vigente	Ejecutado	% de Ejec.
Carreteras	5,608.1	4,254.5	75.9%
Agua y Saneamiento	52.3	7.3	14.0%
Desarrollo Productivo	1,337.1	1,059.6	79.2%
Modernización del Estado	1,052.5	996.3	94.7%
Salud	3,698.0	3,149.4	85.2%
Comunicaciones	87.1	20.0	23.0%
Educación	670.7	482.2	71.9%
Recursos Forestal y Ambiente	274.0	179.7	65.6%
Energía	1,865.9	774.0	41.5%
Seguridad y Defensa	487.4	176.4	36.2%
Protección Social	4,738.5	4,497.1	94.9%
Riego	336.2	115.4	34.3%
Transporte y Obras Públicas	2,290.3	938.0	41.0%
<b>Total General</b>	<b>22,498.1</b>	<b>16,649.9</b>	<b>74.0%</b>



Lindo, Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Regional (MER). Electrificación Rural en Lugares Aislados y Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica.

Con una menor inversión se observa el **Sector Salud L3,698 millones, (5%)**; para ejecutar proyectos principalmente en apoyo a la emergencia por el COVID 19, entre los principales proyectos se encuentran: Respuesta Inmediata de Salud para Contener y Controlar el Coronavirus (Covid - 19) y Mitigar su Efecto en la Prestación del Servicio, en Honduras, Programa Apoyo a La Red de Inclusión Social con Prioridad en Occidente. En menor participación el resto de los sectores.

#### 1.4 Inversión Ejecutada a Nivel de Fideicomisos y Alianzas Público Privadas (APP's)

Al cierre de la gestión 2020, la Ejecución a nivel de fideicomisos y APP's, ascendió a **L9,528.9 millones**, representando un **86.3%** del presupuesto vigente asignados a estos (**L 11,036.1 millones**). Dicha ejecución corresponde al Fondo Social Reducción de la Pobreza (Vida Mejor), por la cantidad de **L4,485.8** representando el **99.7%**, de su presupuesto vigente (**L4,500.0 millones**) según el SIAFI y el Plan de Infraestructura Vial con una ejecución de **L 3,111.9 millones** representativo de **96%** de ejecución respecto al presupuesto vigente (**L3,243.0 millones**) esta situación se explica en que gran parte de este fideicomiso fue destinado para atender la Emergencia sanitaria nacional producto de la pandemia ocasionada por el COVID-19; mientras que la superintendencia de Alianzas Público Privadas (SAPP) reporta una ejecución de **L1,189.4 millones (49.2%)** de ejecución en proyectos ejecutados bajo modalidad APP's, los cuales cuentan con un presupuesto vigente de **L2,418.8 millones**. Asimismo, el Fideicomiso de Inversiones y Asignaciones (FINA 2) cuenta con un presupuesto vigente de **L1,04.3 millones**, con una ejecución presupuestaria de **L740.8 millones (73.8%)**. **1.5 Financiamiento de la Inversión**

El 54% de la Inversión Pública Global del Presupuesto Vigente es financiado por fuentes nacionales (incluye Vida Mejor, APP's, Plan de Infraestructura Vial y Fideicomiso de Inversiones y Asignaciones (FINA 2), y el 46% por fondos

externos; de estos el 85% es financiado por crédito externo (Fuente 21) y el 15% por donaciones (Fuente 22). Principalmente con recursos provenientes del BID, BCIE, BM, Unión Europea y OFID. Ver cuadro No.2

**Cuadro No. 3**  
**Inversión Pública: Clasificación por Fuente de Financiamiento**  
Cifras en Millones de Lempiras

Fuente / Organismo	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución (Ejecutado/Vigente)
11 - Tesoro Nacional	13,742.9	12,060.4	10,116.4	83.9
21 - Crédito Externo	9,775.7	8,887.0	5,669.7	63.8
22 - Donaciones Externas	1,692.8	1,550.7	863.9	55.7
<b>Sub-total PIP</b>	<b>25,211.4</b>	<b>22,498.1</b>	<b>16,650.0</b>	<b>74.0</b>

**Fuente:** Fuente: SIAFI, Circular No. CGG-009-2020 y Circular No. CGG-1143-2020 emitidas por la SCGG en cumplimiento al Decreto Ejecutivo PCM-044-2019.

**\*/** Cifras proyectadas, proporcionadas por la Dirección de Contingencias Fiscales, Superintendencia de Alianza Público Privadas (SAPP).

instituciones que concentran el mayor porcentaje de recursos, se destacan: la INVEST-H, SESAL, ENEE, INSEP, SAG y SEDIS orientado a la construcción de carreteras, Combate al COVID 19, proyectos de energía, construcción de sistemas de riego, planes de negocio, Fondo Social Reducción de la Pobreza (Vida Mejor, Microempresas Eco fogones, techos, pisos saludables, Microempresas).

En seguimiento a las Normas de Ejecución Presupuestaria del Año 2020, en su Artículo 28, que literalmente expresa que; *“Sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 36 de la Ley Orgánica del Presupuesto, para fines de agilizar la incorporación de los recursos externos provenientes de donaciones, el Formulario (FMP-05) denominado “Documento de Modificación Presupuestaria” generado por el SIAFI, tendrá el mismo efecto de una Resolución Interna y se adicionarán en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el presente Ejercicio Fiscal, siempre que se cuente con la contraparte nacional, cuando corresponda.....*

Los avances de la ejecución física respecto al PIP y a Nivel de Sector se muestran a continuación:

## **1.6 Ejecución Física a Nivel de Sectores:**

### **a) SECTOR CARRETERAS:**

Al cierre de la gestión 2020, las distintas Instituciones del Sector registraron diferentes avances de ejecución de sus proyectos de construcción de carreteras ejecutados a través de INVESTH e INSEP entre los cuales están:

#### **Proyectos Ejecutados por La Cuenta del Desafío del Milenio-Honduras INVEST-H:**

##### **• Corredor Pacífico-Programa de Integración Vial Regional (BID\_2470/BL-HO-1 y BID\_2470BL-HO-2):**

El proyecto contó con un presupuesto Vigente de **L181.2 millones**, de los cuales alcanzó una ejecución de apenas 7.7 millones, debido que habían suspendido labores, debido a la emergencia sanitaria generada por el COVID-19. A partir del 8 de octubre de 2020 se reactivaron los trabajos de las Microempresas Asociativas de Conservación Vial (MEACV), brindando mantenimiento en una longitud de 735 km en los caminos alimentadores del Corredor Pacífico en los departamentos de Valle y Choluteca.

##### **• Programa de Integración Vial Regional II, (BID-3815/BL-HO):**

Este proyecto cerró sus obras físicas contractualmente en el mes de abril, finalizando 23 km del tramo La Barca-Pimienta. Actualmente, está en gestión la recepción final y el traspaso de las obras al Concesionario Vial para su respectivo mantenimiento.

Adicionalmente, debido a la suspensión de labores producto de la declaración de Estado de Emergencia Sanitaria en todo el territorio nacional por causa del COVID-19, el supervisor del proyecto presentó el informe de cierre hasta el mes de agosto de 2020, requiriendo realizar el ajuste correspondiente en la programación del proyecto.

##### **• Construcción del Corredor Logístico Villa de San Antonio-Goascorán Sección II y III, (BCIE 2116 y BCIE-2205):**

La obra física del Tramo “El Quebrachal - Goascorán” se encuentra finalizada, mismas que consistieron en la ampliación de 2 a 4 carriles y pavimentación con carpeta asfáltica de 46.18 km. Es importante hacer notar que debido a que, al cierre del 2018, ya se contaba con 29 km con carpeta asfáltica terminada.

• **Alianza para el Corredor Seco (Carta de Ejecución No. 7 USAID y TF017904):**

El Proyecto fue afectado por las restricciones de movilidad impuestos a causa de la pandemia COVID 19, lo cual afectó la verificación en campo de algunos entregables. El proyecto y sus implementadores hicieron el esfuerzo por lograr la meta, diseñando y aprobando las hectáreas de riego planteadas originalmente. Sin embargo, la instalación se vio afectada por los cierres totales de las ciudades y luego parciales en muchos municipios. La imposibilidad de entregar bienes e instalar sistemas de riego dio como resultado la no ejecución de un monto significativo de fondos.

Para el periodo no se programó meta debido a que el contrato del implementador finalizó en junio 2020, no obstante, como parte de la iniciativa del Gobierno para la reactivación del sector productivo en el Corredor Seco y en cumplimiento a los Decretos PCM-030-2020 y PCM-041-2020, se incorporaron L.200 millones como contraparte del proyecto, ampliando la implementación a marzo del 2021. Con estos nuevos recursos al final del año se reportaron 14,039 visitas de asistencia técnica a productores con hectáreas de riego para la producción de granos básicos, hortalizas y frutales; 300 macrotúneles instalados en áreas con agricultura protegida que benefician a 300 clientes hogares en los departamentos de La Paz, Intibucá, Lempira, Ocotepeque, Copán y Santa Bárbara y 9000 bonos para la compra de insumos agrícolas (semilla, fertilizante, entre otros) entregados para el apoyo a la producción como un incentivo a los productores que fueron afectados económicamente por la crisis COVID 19.

• **Rehabilitación y Mejoramiento del Corredor de Oriente, Carretera Tegucigalpa-Danlí, tramo Neteapa – Danlí. (BID\_2470/BL-HO-1 y BID\_2470BL-HO-2 BID-3815/BL-HO):**

El proyecto reactivó sus obras a finales de junio, al cierre del año 2020 el proyecto avanza según nueva programación, reportando un avance físico de 57.31% en el lote A (Estación 54+240 - Estación 74+240) y 88.26% en el lote B (Estación 74+240 a la 89+160), teniendo al cierre del año un total de 27.9 kilómetros pavimentados con concreto hidráulico.

• **Programa de Infraestructura Vial (Fideicomiso)**

Al cierre del año, se continuaron las labores en el Programa de Balastados a Cabeceras Municipales logrando ejecutar un total de 541.83 km (49.36 km en el cuarto trimestre). Se logró reactivar el Programa de Mantenimiento Rutinario de Limpieza de Derecho de Vías que se ejecuta a través de las Microempresas Asociativas de Conservación Vial y con ello se logró una ejecución de 1,212.27 km. Respecto a los Estudios y Diseños de Pavimentación de Accesos a Cabeceras Municipales y Zonas Turísticas, los mismos se han dividido en 12 Lotes para conectar a aproximadamente 180 cabeceras municipales que están localizados en los 18 departamentos del país y de estos se han entregado 86 tramos que totalizan una longitud de 838.54 Km entregados. El programa de Bacheo Asfáltico Emergente incluye un universo de 1,070.36 Kilómetros, de los cuales se han atendido la cantidad de 650.26 kilómetros.

Al cierre del 2020 los proyectos del Programa Infraestructura financiados con fondos externos, presentan los siguientes avances: i) se finalizó la obra física del Tramo “Las Mercedes – Desvío Villa de San Antonio” misma que consistió en la ampliación de 2 a 4 carriles y pavimentación con carpeta asfáltica sobre 4.8 km; ii) durante el año finalizaron

las obras en los últimos 4 km del Tramo “La Barca – Pimienta”, para una ampliación y pavimentación con carpeta asfáltica de un total de 23 km desde el inicio del proyecto; iii) En el Tramo “Neteapa – Danlí” se alcanzó un porcentaje de avance del 74.13% y se cuenta con 27.92 km pavimentada con concreto hidráulico; iv) Corredor Logístico Villa de San Antonio-Goascorán, Sección I, Subsección IB, el avance físico a la fecha es de 15.81%; v) Adicionalmente, la construcción del Centro Ciudad Mujer en Choluteca presenta un 68% de avance al cierre del año, esperando finalizar las obras en el primer trimestre del 2021.

#### **Proyectos Ejecutados por la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP):**

- **Construcción y Pavimentación con Concreto Hidráulico del Tramo Carretero Valladolid - La Virtud - Mapulaca con una longitud aproximada de 30 km Localizado en el Departamento de Lempira, (FN-INSEP-23245):**

Al cierre del IV trimestre del 2020, cuenta con 20 kms de pavimento con concreto hidráulico, lo que equivale a un 75% de avance del proyecto aun con los atrasos provocados por la pandemia COVID 19 y las tormentas tropicales ETA y IOTA. Se trabaja por recuperar el ritmo de ejecución por ello se están realizando actividades de reprocesamiento de la sub-base para seguir fundiendo concreto. Se terminó con la caja puente las Pozas, los estribos del puente sobre el Rio Mocal ya están en su etapa final y se procederá a fundir las vigas en el sitio y el inicio de trabajos en los estribos del puente sobre el Rio Joron.

- **Rehabilitación Vial del Corredor de Occidente: la Entrada - Copán Ruinas - el Florido y la Entrada - Santa Rosa de Copán, (BCIE-2156, BEI-FI No.84859, DCI-ALA/2015/369-566, TA2015034 HN LIF).**

El avance físico ejecutado al cuarto trimestre es de 99.43%, calculado en base al monto total de las obras del contrato (\$41,370,443.71); El avance financiero del proyecto es de \$41,025,435.38 que representan el 99.2%, calculado en base al monto total de las obras del contrato (\$41,370,443.71).

El Contratista continua con el mejoramiento de los sitios afectados por la tormenta tropical Eta e IOTA, se trabajó en los rellenos del Km 56+300, Km 56+800 y del tramo que comprenden los Km. 57+300 al 57+800, habilitando los dos carriles para el tránsito vehicular. Se reanudaron los trabajos de la limpieza de la Barrera Dinámica en el Km. 36+300; culminando con las actividades de limpieza de derrumbes en los sitios donde se obstaculizó el tránsito vehicular en el Km 37+000 y el tramo comprendido entre el Km 51+000 al Km 52+000.

- **Proyecto "Construcción y Pavimentación Carretera Catacamas-Cuevas de Talgua en el Departamento de Olancho, con una longitud aproximada de 8.93 Kilómetros"**

El Proyecto no reportó ejecución física ni financiera durante el IV trimestre de 2020 debido a que el Proyecto aún no cuenta con la respectiva aprobación por parte del Congreso Nacional a la modificación No. 4 (la cual conlleva un incremento superior al 25% del costo inicial del contrato de obra), lo cual limita a que INSEP pueda continuar con la ejecución financiera del proyecto.

A la fecha, el proyecto cuenta con un avance físico de 74%.

- **Construcción a cuatro (4) carriles del bulevar de Comayagua, etapa II: estación 2+500 - hacia desvío de Ajuterique, con una longitud aproximada de 1 km, localizado en la ciudad de Comayagua.**

Durante el IV Trimestre de 2020 se realizaron las siguientes obras:

1. Excavación Mecánica Tipo I
2. Acarreo de Material de Desperdicio
3. Relleno Compactado con Material Selecto
4. Suministro e Instalación de Tuberías, Tragante Drenaje Pluvial, Conformación y Compactación de la Sub Rasante Mejorada con Material de Relleno
5. Suministro y Colocación de Sub Base Granular

#### **b) SECTOR DE PROTECCION SOCIAL:**

Los principales rubros de inversión están destinadas a inversión en desarrollo humano en las poblaciones más vulnerables. Al Cuarto Trimestre las distintas Instituciones del Sector, registran los siguientes avances físicos:

#### **Proyectos Ejecutados por Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS):**

La inversión de la institución se concentra en ocho (8) proyectos relevantes que apoyan las transferencias a las familias de extrema pobreza así mismo fortaleciendo la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación; proyectos de los cuales tres (3) son financiados con fondos externos y el resto con fondos nacionales.

Al término del 2020, con los diferentes proyectos ejecutados por la SEDIS, se benefició a 14,715 hogares en la zona rural y 45,820 en la zona urbana

#### **• Programa de Apoyo a la Red de Protección Social III (3371/BL -HO)**

Durante el Cuarto trimestre en el **Componente II Fortalecimiento de la Oferta de Servicios de Tercer Ciclo de Educación Básica:** se continuó fortaleciendo la Unidad de Corresponsabilidad de la Secretaría de Educación a través de la contratación del personal que apoya y garantiza la operatividad técnica del Programa para la corresponsabilidad.

Dentro del **Componente V: Centros Educativos de Educación Básica con Instalaciones**, durante el cuarto trimestre, se realizaron los pagos de los procesos de ampliación de obra en los 34 CEB's ampliados específicamente con tres (3) aulas, un módulo sanitario, fosa séptica y otras obras adicionales como aceras de conexión, cunetas de evacuación de aguas lluvias, según la necesidad de cada CEB ubicados en los departamentos de Intibucá (3), Copán (10), La Paz (5), Lempira (4), Santa Bárbara (9) y Ocotepeque (3) distribuidos en dieciséis (16) lotes; así como a la empresa supervisora de dicho proceso.

También de las **Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en 24 Centros de Educación Básica (CEB)** de los Departamentos de Intibucá (1), Copán (5), La Paz (5), Lempira (6), Santa Bárbara (6) y Ocotepeque (1) distribuidos en doce (12) lotes. Además, se asignaron viáticos con el propósito de realizar inspección del sitio de **siete (7) proyectos** en el Departamento de Santa Bárbara y verificación de avance de obras de los lotes D y G para



el mejoramiento de la cobertura del Tercer Ciclo de Educación Básica, en los departamentos de Copán y Lempira.

La meta programada para el año 2020 es de **58 módulos escolares construidos en los Centros de Educación Básica (CEB's)** en los municipios priorizados con recursos del préstamo BID 3371 / BL-HO, al final del año 2020, se recibieron **treinta y nueve (39) Centros de Educación Básica** ubicados en los Departamentos: Copán (14 CEB) en los municipios de Dulce Nombre (1 CEB), Cucuyagua (1 CEB), Florida (1 CEB), La Unión (1 CEB), Nueva Arcadia (1 CEB), San José (1 CEB) San Nicolás (1 CEB), San Antonio (1 CEB), Santa Rosa de Copán (2 CEB), Concepción (3 CEB) y Santa Rita (1 CEB), Intibucá 4 CEB: municipio de Colomoncagua (2 CEB) y municipio de Intibucá (2 CEB), La Paz 5 CEB: Opatoro (1 CEB), Santa Ana (2 CEB) y Santiago de Puringla (2 CEB), Lempira: 5 CEB en los municipios de Las Flores (1 CEB), Lepaera (1 CEB), San Manuel de Colohete (2 CEB) y Santa Cruz (1 CEB), Ocotepeque (4 CEB) en los municipios de San Jorge (1 CEB), Encarnación (2 CEB) y San Marcos (1 CEB), Santa Bárbara (7 CEB) en los municipios de Atima (2 CEB), Naranjito (1 CEB), San Luis (1 CEB), San Marcos (2 CEB) y Nueva Frontera (1 CEB).

• **Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social con Prioridad en Occidente (3723/BL-HO):**

En el cuarto trimestre en el **Componente I Transferencias Monetarias Condicionadas**, se solicitó la No Objeción a la suscripción de Convenio interinstitucional entre la SSIS y el Banco Hondureño para la Producción y Vivienda (BANHPROVI), a fin de que este Organismo del Estado pueda brindar un mecanismo de TMC, acorde con los objetivos de la estrategia de protección de consumo de los hogares así como su inclusión financiera y que además permita superar circunstancias operativas de entrega del Programa actual generadas por la pandemia del COVID 19, constituyendo un primer paso en la transición del Programa hacia la digitalización y bancarización de pagos gubernamentales. Se obtuvo la No Objeción a través del CID/CHO/1264/2020 de fecha 26/11/2020 a la Suscripción de Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Subsecretaría de Integración Social (SSIS) y el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). Se firmó contrato el 18 de diciembre de 2020. En este periodo, se efectuó el traslado de fondos para el pago de TMC y la comisión bancaria por la entrega de TMC a **6,479 hogares** participantes de una primera fase teniendo previsto finalizar el 5 de febrero del 2021, con corte al 31 de diciembre del año 2020, se cuenta con un avance del 18% de los hogares programados que representan 2,409 hogares con una inversión de L16,450,080.00.

**El Componente Fortalecimiento Institucional:** entre las principales actividades realizadas se encuentra la continuidad de los servicios de quienes brindan el apoyo directo al Despacho de la SSIS.

**El Componente Administración y Auditoría del Proyecto:** Se efectuó pago por los servicios de auditoría externa independiente de los Estados Financieros del Programa Apoyo a la Red de Inclusión Social con Prioridad en Occidente, Componente 1 Transferencias Monetarias Condicionadas para los periodos terminados al 31 de diciembre de 2019 y al cierre de la operación, contra la presentación del cronograma del plan de trabajo a satisfacción de la SSIS, borrador del informe e informe final de la auditoría de acuerdo a lo establecido en la Cláusula No.7. De igual manera, se realizó la continuidad de servicios de las consultorías del personal que conforman la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) de la Sub Secretaría de Integración Social (SSIS), quienes garantizan la operatividad del

Programa.

• **Proyecto de Integración de la Protección Social (6401-HN)**

**Componente de Transferencias Monetarias Condicionadas Urbano**, se efectuó el traslado de fondos al ente pagador para el pago de Transferencias Monetarias Condicionadas y comisión bancaria a **45,820 hogares** participantes del periodo 2020 en el marco del Convenio interinstitucional entre la SSIS y el Banco Hondureño para la Producción y Vivienda (BANHPROVI), Organismo del Estado que brinda un mecanismo de TMC, acorde con los objetivos de la estrategia de protección de consumo de los hogares así como su inclusión financiera y que además permite superar circunstancias operativas de entrega del Programa actual generadas por la pandemia del COVID 19, constituyendo un primer paso en la transición del Programa hacia la digitalización y bancarización de pagos gubernamentales.

**Componente Fortalecimiento Institucional para la Integración del Sistema de Protección Social**, se efectuó el pago por la Renovación de Garantías de Equipo Críticos (Servidores, respaldo y/o equipos de comunicación, escritorio y portátiles) Proceso No. SDC-002-SSIS-BM-6401-2020. Se inició el proceso de contratación de la consultoría: Analista Programador WEB y/o móviles para el Centro Nacional de Información del Sector Social (CENISS) cuyo objetivo es garantizar el mantenimiento de la operatividad diaria, así como la satisfacción de los requerimientos de información y desarrollo de sistemas para los departamentos internos y/o entidades externas al CENISS, mediante el óptimo desarrollo de nuevas aplicaciones informáticas y la implementación oportuna de las adaptaciones que apliquen a los sistemas que opera el CENISS.

**Componente Fortalecimiento del Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas y el Sistema de Entrega**, En el periodo reportado, con el propósito de fortalecer el Sistema de Información Gerencial (SIG) se efectuó el pago de dos (2) Consultores en Seguimiento y Apoyo a los Requerimientos de Programación, Asesor Principal del SIG, Analista en Infraestructura de Servidores y Base de Datos del Sistema de Información Gerencial, Analista Programador de Monitoreo y Seguimiento del Programa del Sistema de Información Gerencial-SIG, dos (2) Programadores Senior DRA para el Mantenimiento del Sistema Informático Gerencial Bono Vida Mejor y dos (2) Analistas programadores para el mantenimiento del SIG.

Se continuó apoyando la Unidad de Comunicaciones de la Subsecretaría de Integración Social SSIS/SEDIS, con el pago de honorarios de las consultorías: Asesor en Comunicaciones y Comunicador Social de Proyectos Sociales de la SSIS.

De igual manera, se efectuó el pago por la adquisición de suministros e insumos de bioseguridad (33 bombas de fumigación y kits de mantenimiento) para la entrega al personal de campo del Programa Bono Vida Mejor, mediante Orden de Compra No.011/BM/6401-2020

**Componente Gestión del Proyecto:** Se efectuó el pago a la firma auditora por la Revisión de Cumplimiento sobre las Transferencias Monetarias Condicionadas para el Programa de Integración de la Protección Social, correspondiente al año 2019 y Enmiendas No.1 y No. 2 que asciende a la cantidad de US\$ 70,529.50, contra la presentación del Informe de Avance de la Revisión de Cumplimiento de las Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC),



por el período del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2019, previa aprobación por parte de la UCP/SSIS.

De conformidad con lo establecido en el Acuerdo de Financiamiento, se remitió a Banco Mundial mediante Oficio No. 233-2020/DM-SEDIS el día 31/12/2020, el Informe de los Auditores Independientes y Estados Financieros por el período del 11 de noviembre al 31 de diciembre de 2019.

**Proyecto Ejecutado por la Dirección Nacional Ciudad Mujer:**

• **Proyecto “Centros de Atención Integral para mejorar las Condiciones de Vida de las Mujeres Hondureñas (Ciudad Mujer)” BID 3371/BL-HO.**

**1) Centro Ciudad Mujer Kennedy:** En este Centro Ciudad Mujer ubicado en Tegucigalpa, se han atendido 194,554 mujeres, de las cuales 47,339 fueron nuevos ingresos (24%) del total y 147,215 (76%) visitas subsecuentes al Centro, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida en los diferentes módulos, atendiendo en 2020 un promedio diario de 258 visitas y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 391,562.

Durante el trimestre se han atendido a 8,025 mujeres de las cuales 2,356 fueron nuevos ingresos (29%) del total y 5,669 (71%) visitas subsecuentes y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 22,678. En este trimestre se observa un incremento de más del 86.5% en las atenciones con respecto al trimestre anterior y del 23.6% en servicios.

**2) Centro Ciudad Mujer Choloma:** Al 31 de diciembre del presente año, se han atendido 93,940 mujeres, de las cuales 26,352 fueron nuevos ingresos (28%) del total y 67,588 (72%) visitas subsecuentes al Centro, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida en los diferentes módulos, atendiendo un promedio diario de 160 visitas y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 243,356.

Durante el trimestre se han atendido a 4,940 mujeres de las cuales 1,201 fueron nuevos ingresos (24%) del total y 3,739 (76%) visitas subsecuentes y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 14,995. Se observa un incremento de más del 23% en las atenciones con respecto al mes anterior y del 38% en servicios.

**3) Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula:** Durante el trimestre se han atendido a 6,448 mujeres de las cuales 3,291 fueron nuevos ingresos (51%) del total y 3,157 (49%) visitas subsecuentes y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 20,643. Se presenta un incremento de más del 100% en las atenciones con respecto al trimestre anterior y del 41.3% en servicios.

**4) Centro Ciudad Mujer La Ceiba:** Al 31 de diciembre del presente año se han atendido 54,457 mujeres, de las cuales 31,302 fueron nuevos ingresos (57%) del total y 23,155 (43%) visitas subsecuentes al Centro, reflejando de esa forma su conformidad y

satisfacción con la atención recibida en los diferentes módulos, atendiendo un promedio diario de 180 visitas y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 129,326.

**5) Centro Ciudad Mujer Juticalpa:** Se han atendido 4,670 mujeres, de las cuales 1,660 fueron nuevos ingresos (35%) del total y 3,010 (64%) visitas subsecuentes al Centro, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida en los diferentes módulos, atendiendo un promedio diario de 58 visitas y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 16,236. observándose un incremento del 21% en las atenciones con respecto al trimestre anterior y del 8.3% en servicios.

**6) Ciudad Mujer Móvil:** Al 31 de diciembre del presente año se han atendido 14,624 mujeres, de las cuales 13,752 fueron nuevos ingresos (94%) del total y 872 (6%) visitas subsecuentes en la Móvil, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida y los servicios brindados por los diferentes módulos; los servicios prestados ascendieron a 21,841.

En el cuarto trimestre del presente año se han atendido 2,661 mujeres, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida en los diferentes módulos, atendiendo un promedio diario de 58 visitas y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 3,935.

#### **Proyecto ejecutado por La Cuenta del Desafío del Milenio-Honduras INVEST-H**

- **Proyecto “Centros de Atención Integral para mejorar las Condiciones de Vida de las Mujeres Hondureñas (Ciudad Mujer)” BID 3371/BL-HO.**

Debido a los meses de suspensión de obras por la situación de la pandemia por COVID-19 y a los eventos ETA e IOTA, este proyecto que originalmente estaba planificado a entregarse en el mes de agosto 2020 desfasó su fecha de entrega para el primer trimestre del año 2021, periodo en el que alcanzará el 100%.

#### **Proyecto ejecutado por el Fondo Hondureño de Inversión Social**

- **Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB), (BID 4518/BL-HO):**

Se muestran los avances por productos al 30 de septiembre de 2020:

#### **Proyectos Integrales de Mejoramiento de Barrios.**

Los Proyectos de integración urbana el cual incluye: Ampliación, Mejoramiento y/o Construcción de sistemas de alcantarillado sanitario, agua potable, drenaje pluvial, mejoramiento vial y obras de mitigación de riesgos, colonias 25 de enero, Australia, Nueva España, Nueva Galilea, inicio la ejecución de obras el día 20 de diciembre de 2019. La duración prevista de finalización del contrato para dichas obras es al mes de junio del año 2021 (período ampliado debido a la pandemia por el COVID-19). Al mes de diciembre de 2020 se logró la instalación de servicios básicos de agua potable,

alcantarillado sanitario, drenaje pluvial y pavimentación de calles en sectores de los barrios beneficiados; el porcentaje de avance físico de este producto es de un 59.5% y tiene un avance financiero de 65% en relación al monto contratado que es de L 128,592,322.09.

El proyecto de equipamiento social el cual incluye, Reparación de Cancha Polideportiva, Colonia Nueva Galilea, Construcción de Centro Comunal, Colonia Nueva Galilea, Ampliación de Jardín de Niños; Colonia Nueva España, Ampliación Escuela David Corea Sánchez, Colonia Australia, Construcción Centro Comunal, Colonia Australia y Construcción Centro Comunal, Colonia 25 de enero, inició el día 23 de noviembre de 2019. Al mes de diciembre de 2020 se tiene un avance físico promedio del 75% y un avance financiero del 78% en relación al monto contratado que es de L 10,967,584.51.

El Programa de Deportes y Valores. En el programa participan 1,337 niños y jóvenes en 16 secciones deportivas, sin embargo, debido a la pandemia del COVID-19 se ha comenzado a realizar clases virtuales para el entrenamiento en deportes y a estas sólo tienen acceso quienes en sus viviendas cuentan con un servicio de internet; en este sentido se ha creó un canal en YouTube, para el aprovechamiento de clases. En este producto se provee la capacitación en valores y emprendimiento, iniciaron en el mes de octubre del año 2020; la meta a alcanzar inicialmente programada era 2,000 asistencias a capacitación, sin embargo, al mes de diciembre ante la emergencia solo se obtuvo una asistencia total de 921 participantes.

#### **c) SECTOR ENERGIA:**

El Sector destina su inversión a la Construcción de Subestaciones Eléctricas y líneas de transmisión a través de los Proyectos de Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral-Río Lindo) Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional (MER), Apoyo al Desarrollo Sostenible de las Energías Renovables, Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica, Electrificación Rural en Lugares Aislados y Sistemas Fotovoltaicos de la Red. Los avances al tercer trimestre se presentan a continuación.

#### **Proyectos ejecutados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE):**

##### **• Programa de Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional, (BID 3103/BL-HO y GRT/SX-16864-HO):**

Durante el Cuarto Trimestre 2020 se continúa con la ampliación y puesta en Operación de la Subestación El Progreso ampliada de 300MVA a 450MVA y de la Subestación Toncontín Etapa I ampliada de 75MVA a 150MVA, Líneas de Transmisión las Flores-Erandique y Danlí-Chichiste, de los 211 predios, se tiene 150 predios pagados o compensados, que corresponden al 71%, 37 predios con Expediente Cerrado o en proceso de cierre por diferentes situaciones complejas legales, administrativas y financieras (ausencia física de beneficiarios por estar en EE. UU.; rechazo de valor de compensación; declaratoria de herederos; hipotecas no resueltas, etc.), y 24 predios pendientes incluidos en el plan de acción que finaliza en marzo del 2021 y se recibieron las actas de Recepción de Ofertas del Proceso “Suministro e Instalación de Modificación de Estructuras en un Tramo de Línea 69 kV del Circuito L-424 entre las Subestaciones de Danlí y Chichicaste, y un Tramo de

Línea 34.5kV del Circuito L358 ubicado en San Nicolás Copán”.

• **Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral - Río Lindo, (BID 3435/BL-HO y JICA HO-P6):**

Se ha tenido avances en la Puesta en Servicio y Servicio Post Venta de 4 Sistemas de Excitación Estática Digital para Generador Síncrono y 4 Transformadores de Excitación para la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán”, a la fecha se ha alcanzado un avance de 70%, sin contratiempos de importancia alta, en la evaluación de ofertas el proceso para la contratación de las obras “Mejoramiento Obras Civiles para el Canal Yure del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral - Río Lindo” que es de vital importancia para el proyecto y la Firma Auditora ha avanzado en su revisión documental hasta el mes de octubre de 2020; por lo tanto, solo le quedan los meses de noviembre y diciembre para concluir su revisión correspondiente al año.

• **Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica**

En el cuarto Trimestre se logró adjudicar el Contrato “Proyecto Ampliación Subestación San Buenaventura en 230 kV, Ampliación Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV 150 MVA, Construcción Línea de Transmisión San Buena Ventura - San Pedro Sula Sur en 230 kV, Doble Circuito”.

Se encuentra en etapa de evaluación el proceso para la contratación de la firma supervisora para la “Supervisión y Gestión del Proyecto Ampliación Subestación San Buenaventura en 230 kV,, Ampliación Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV a 150 MVA y la Construcción de la Línea de Transmisión San Buenaventura”; se firmó el Convenio para la Regularización de Pagos a Propietarios de Terrenos y Servidumbres con cargo al Préstamo, entre la ENEE y la UAP-IP; se realizó el primer pago del bien inmueble ubicado en Calpules donde se construirá la Subestación de Calpules en el Departamento de Cortes.

Se obtuvo el primer desembolso para la compensación por afectación de servidumbre de las líneas de transmisión de San Buenaventura y San Pedro Sula Sur.

**d) SECTOR EDUCACIÓN:**

Este sector apoya la mejora de la calidad educativa a través de la capacitación a docentes, construcción de Aulas mediante los proyectos de Infraestructura escolar y Proyecto de Mejora de la Calidad educativa (proyecto Joven).

Los avances al tercer trimestre en los proyectos son los siguientes:

### **Proyecto Ejecutado por la Secretaría de Educación**

#### **• Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar” (PROMINE KFW Fase II):**

Al IV trimestre no presenta ejecución física en ninguna de las actividades programadas en el SIAFI. Adicionalmente, las actividades programadas para la Fase V, no iniciaron su ejecución en el año 2020.

Durante el año 2020, a raíz de la Pandemia COVID-19 no se logró realizar las actividades planificadas en el PACC y POA 2020, que conllevan al logro y ejecución física y financiera del Programa PROMINE, debido a las restricciones por contención del gasto mediante las Circulares DGP-003-2020 con fecha 23 de marzo de 2020, y DGIP-003-2020 con fecha 31 de marzo de 2020. Lo anterior considerando que el Programa realiza su ejecución mediante las visitas a centros educativos y realizar la Formulación, Supervisión y Recepción de Proyectos de Infraestructura Educativa ejecutados por SEDECOAS, así mismo confirmar la implementación de la normativa de Planificación de la Infraestructura de Centros Educativos.

Al Cuarto Trimestre, no se logró la ejecución física y la ejecución financiera reportada únicamente atiente a gastos de funcionamiento del Programa (contratación de 7 consultores: Formulator y Diseñador (Arquitecto), Formulator y supervisor (Estructural), Supervisor Proyectos Eléctricos, Coordinador Seguridad Alimentaria /Cambio Climático Mosquitia, Coordinador Seguridad Alimentaria/ Cambio Climático Occidente / Corredor Seco, Asistente Administrativo y un Asesor Legal), mobiliario de oficina, viáticos, pago de impuestos sobre ventas, compra de llantas.).

De acuerdo a lo reportado por la Unidad Ejecutora, en relación a la ejecución de Fondos Externos el desfase de la ejecución física y financiera del programa PROMINE, se justifica por la tardía aprobación de la modificación presupuestaria solicitada a la Gerencia Administrativa de la SEDUC, misma que se aprobó únicamente para dar cumplimiento con compromiso adquirido en la gestión 2019 con un proveedor, y todas las otras actividades planificadas según PACC y POA 2020 no se pudieron realizar.

### **Proyecto Ejecutado por la Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H).**

#### **• Proyecto Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven:**

De acuerdo a la Unidad Ejecutora, los Logros alcanzados al cuarto trimestre se escriben a continuación:

**Componente 1:** Al finalizar el ciclo escolar de 2020, 11,507 educandos tuvieron acceso al sistema educativo en el tercer ciclo de educación básica, según estadísticas del Sistema de Administración de Centros Educativos (SACE). Esto en el marco del Convenio para la Prestación de Servicios Técnicos para la Atención del Tercer Ciclo de Educación Básica.

A través de esta modalidad flexible, el Instituto Hondureño de Educación por Radio (IHER) atendió 7,293 educandos; mientras que, el Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO), de la SEDUC, brindó el servicio educativo a 4,214 educandos.

Para apoyar el fortalecimiento de la cobertura escolar en tercer ciclo, al 31 de diciembre del 2020, se concluyó la formulación de 40 carpetas de factibilidad de proyectos de infraestructura educativa para igual número de Centros Educativos Básico (CEB), de las cuales 27 conformadas tienen No Objeción del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 06 cuentan con el visto bueno técnico de la consultora en infraestructura del BID y 07 están listas para la revisión técnica de dicha consultora. Esto permitirá la construcción de un total de 27 aulas para atender 1,042 educandos.

Por otra parte, se cuenta con la no objeción de las primeras 24 carpetas de pre factibilidad para la construcción de 3 módulos escolares en igual número de escuelas. En este contexto se inició el proceso de contratación para la empresa constructora y la firma supervisora; las cuales se espera puedan iniciar las obras en el mes de febrero de 2021. De esta manera se logrará la construcción de los módulos en 9 escuelas adicionales a las planificadas (15) para ese año. Adicionalmente, está en proceso de formulación 9 carpetas nuevas para lograr llegar a 33.

**Componente 2:** Actualmente, se encuentra en vigencia el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la SEDUC y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), mismo que se firmó en 2019, con el propósito de implementar acciones para la mejora de las capacidades docentes tanto en formación inicial, como en formación continua para gestores y/o facilitadores, docentes, directores y supervisores de centros educativos del Tercer Ciclo de Educación Básica.

#### **Proyecto Ejecutado por el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)**

##### **• Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y de su Gestión Local (PROMINE) FASE IV**

Con relación a la Fase IV, actualmente se han considerado 44 proyectos de los cuales, 27 ya cuentan con la factibilidad institucional y con sus respectivas no objeciones por parte del organismo financiador, de los cuales 15 proyectos están en ejecución con un avance físico del 50% en promedio. En general la ejecución del Programa en el año 2020, se vio afectada por la pandemia COVID-19, los huracanes ETA e IOTA, sin embargo, al finalizar el año se logró una ejecución del 93%. A continuación, véase la ejecución histórica del Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y de su Gestión Local (PROMINE) esto con la finalidad de avanzar en la ejecución.

#### **Proyecto Ejecutado por Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM):**

##### **• Construcción del Edificio Multifuncional de Talleres y Laboratorios en el Centro Regional de San Pedro Sula de la UPNFM, (FN 000057-11 UPNFM):**

Durante la gestión 2020 contó con un presupuesto Vigente de **L26.4 millones**, sin reporte de ejecución financiera De acuerdo a la Unidad Ejecutora, y al Sistema de Información Financiera Integrado (SIAFI), no se registra avances en la ejecución física al



término del 2020 y a pesar de contar con la Licencia Ambiental y de presentar en este Trimestre el 99.% de la documentación y requisitos solicitados por parte de la alcaldía de San Pedro Sula para la obtención del permiso de construcción todavía no se cuenta con la aprobación de dicho permiso, dado que la declaración de la Emergencia Sanitaria por el COVID19 se ha complicado por parte de la Alcaldía San Pedro Sula en la emisión de este permiso.

El Proyecto fue adjudicado por el Consejo Superior Universitario, desde el año 2019 a la Empresa Diseño, Construcción y Servicios Técnicos (DICONSET), El monto a pagar a la constructora DICONSET según contrato es de L 38,473,450.10. La vigencia del contrato es del

16 de octubre de 2019 al 15 de diciembre de 2020, se le pagó el anticipo por L.7.7 millones; A la fecha, solo se ha realizado el pago del anticipo al contratista (DICONSET). No hay pagos adicionales debido a que la obra no ha iniciado la orden de inicio se dará inmediatamente después de la consecución de los dos permisos antes mencionados. Para este Contrato se solicitará ampliación de tiempo del proyecto de la UPNFM ante La SEFIN; por el desfase causado primero por la problemática de la Licencia Ambiental y el Permiso de Construcción, así como la situación de la Pandemia.

Así mismo, se suscribió contrato con la Compañía Supervisora del proyecto a la Empresa INDES S. de R.L. por el Consejo Superior Universitario. El monto a pagar a la empresa supervisora INDES según contrato es de L 1.9 millones. La vigencia del contrato es del 20 de diciembre de 2019 al 31 de marzo de 2021. Para este Contrato de Supervisión se solicitará ampliación al proyecto con nuevo cronograma de ejecución, en base a la solicitud de ampliación de tiempo del proyecto de la UPNFM ante La SEFIN.

#### **Proyecto Ejecutado por la Universidad Nacional de Agricultura (UNA):**

- **Proyecto Social de Inclusión a la Educación Superior e Impulso de la Producción Sustentable (UNA/PINPROS)” (BCIE 2069):**

Los principales avances del proyecto a nivel de componentes se describen a continuación

**Construcción de la Planta Procesadora de Productos Lácteos:** La planta está construida al 100%. De los equipos complementarios se obtuvo la dispensa a finales de septiembre de 2020 y se hizo la recepción total, quedando pendiente la realización de los servicios complementarios como la finalización de la instalación, capacitación y puesta en marcha, pero debido a que el personal es extranjero, debido a las restricciones por la Pandemia de COVID.19, se está a la espera que mejoren las condiciones. Para el suministro e instalación del generador eléctrico ya se recibió el bien y las obras complementarias, tiene un avance físico del 95%.

**Construcción de Granja Avícola:** Se ha avanzado en las Obras Preliminares y las Estructuras

**Construcción de Planta Purificadora de Agua:** Se ha avanzado en las Obras Preliminares y Cimentación; asimismo se ha realizado trabajos de construcción.



Equipamiento: Se realizó el proceso de comparación de precios se invitaron a siete empresas oferentes de los cuales tres enviaron ofertas, pero en la revisión el comité de licitaciones declaró fracasado el proceso puesto que todas las empresas participantes sobrepasaron el monto máximo disponible.

#### **e) SECTOR SALUD:**

Sus intervenciones van orientadas al mejoramiento y cobertura de los servicios de salud y la red hospitalaria del País, a través de la contratación de gestores en el Primer Nivel y Segundo Nivel de atención mediante el proyecto de Mejora de la Gestión y Calidad de los servicios de salud materno-neonatal, y el Programa de Apoyo a la red de Inclusión Social con Prioridad en Occidente.

Los avances se muestran en la Secretaría de Salud y AEPAS-H

#### **Proyectos Ejecutados por Secretaría de Salud (SESAL).**

##### **• Programa Apoyo a la Red de Inclusión Social con Prioridad en Occidente, (BID 3723/BL-HO):**

Según lo reportado por la Unidad Técnica de Gestión de Proyectos (UTGP), cuentan con un 100% de avance físico al IV Trimestre, misma que corresponde a la intervención en 39 municipios en apoyo a la Iniciativa Regional de Eliminación de la Malaria, conforme al siguiente detalle:

- ✓ Gestores descentralizados de Primer nivel:
  - Se alcanzó el 100% de la meta física.
  - Contratación de Recurso Humano para el seguimiento y monitoreo de las actividades de la IREM.
  - Adquisición de Materiales Accesorios y Bombas de Rociado.
- ✓ Gestores descentralizados de Segundo nivel:
  - Fortalecidos los Servicios hospitalarios en: Planificación Familiar, Plan de Parto, Embarazos, Atención Integral en la Niñez (AIN-C); en los Hospitales Enrique Aguilar Cerrato y Leonardo Martínez.
  - Se firmó el Convenio con Gestor Fundación Manos Transformando el Puerto (FUMATREP).
- ✓ Fortalecimiento de Hospitales:
  - Instalación de equipamiento médico y funcionamiento en 100%, en los Hospitales Enrique Aguilar Cerrato, Juan Manuel Gálvez y Mario Catarino Rivas.
- ✓ Gestión del Proyecto y Auditoría:
  - Proceso adjudicado para la adquisición de los Repuestos de Microscopía. (repuestos de microscopia recibidos en 100%).
  - Realizado Proceso y Adquisición de Vehículo.

- Realizado el proceso de compra y adquisición del Equipo de Cómputo
  - Contratada la auditoría con el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
- **Proyecto Respuesta Inmediata de Salud (RISP) para Contener y Controlar El Coronavirus (COVID – 19) y Mitigar su Efecto en la Prestación del Servicio, en Honduras:**

Al IV Trimestre, la Unidad Ejecutora de Proyectos BID (GESALUD), cuenta con un 100% de avance físico que corresponde a 14 Contratos Firmados [8 de la Unidad Ejecutora, 2 para la Unidad de Gestión Descentralizada (UGD), 1 Consultor de Análisis y Tendencia de Datos, 1 Ambiental y 1 Auditoría de Aseguramiento Razonable]; así mismo se lograron avances significativos en otras actividades:

- ✓ Detección y seguimiento de los casos:
  - Equipos de respuesta Rápida (ERR) contratados en varias regiones para el control de brotes (18 regiones sanitarias beneficiadas para contratar ERR).
- ✓ Interrupción de la cadena de transmisión:
  - Se desarrollaron las Especificaciones Técnicas para el desarrollo de las actividades con el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), con el propósito de reorientar la Campaña de Vacunación para el COVID 19.
- ✓ Mejoramiento a la capacidad de provisión de servicios de salud:
  - Firmados 21 Convenios de Gestión con Gestores del Primer nivel y 26 de Segundo nivel.
  - Se realizaron desembolsos a Gestores de Primer Nivel, por un monto de L 133.8 millones y el Segundo Nivel L 304.3, millones para un total L438,1 millones
- ✓ Administración del Programa:
  - Unidad Ejecutora contratada en 100%.
  - Acuerdo para la Adquisición de Bienes e Insumos médicos y de bioseguridad (adquisición de equipo de protección personal – EPP, adquisición de equipo de laboratorio e insumos para la realización de diagnósticos, adquisición de equipo médico, no médico y ambulancias para las unidades de primer y segundo nivel equipadas para la atención de pacientes con COVID-19), suscrito el 06 de octubre de 2020, entre la Secretaría de Salud (SESAL) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
  - Contrato firmado con la Firma Auditora (Deloitte)

• **Hospital María de Especialidades Pediátricas, (ITALIA-HOS/MARIA):**

Dentro de las actividades reportadas por la unidad ejecutora se encuentran las siguientes:

- Se reporta avance en las metas físicas en un 98% para el Lote 9 y un 57% de equipo Biomédico en el Lote 3.

- Mediante Nota Técnica No. 25, la SEFIN identificó espacio presupuestario para la regularización de pagos Directos efectuados en el año 2020 por parte del Organismo financiador; mismos que corresponden al avance y recepción parcial de los lotes 3 y 9 (Equipos Biomédicos: camillas, ventiladores mecánicos, instrumental quirúrgico, entre otros) para el HMEP.
- Mediante Oficio RU U 2168193/20, de fecha 10 de diciembre de 2020 Organismo Financiero (CDP) notificó la no objeción a la ampliación de plazo de ejecución al 31 de diciembre de 2021, con el propósito de poder cumplir con los compromisos administrativos y financieros en relación a los contratos de suministros No. HN.001-2019-SS y No. HN.002-2019-SS correspondientes a los Lotes 3 y 9 respectivamente, con la Empresa Alteha S.p.A.
- A la fecha el proyecto no presenta ejecución física en SIAFI.

• **Modernización del Hospital Regional del Sur en Choluteca, (EDCF No. HND-4) Fondos de Eximbak Korea:**

La SEFIN, mediante Oficio DGCP-DEM-650/2019 de fecha 01 de Noviembre de 2019 envió Oficio al Organismo Financiero (Corea) para desobligar dichos recursos; quien mediante Oficio No. HND-4/19-4418 de fecha 18 de Diciembre de 2019 por parte del Korea Eximbank, requiere informe de cierre del Proyecto por parte de la SESAL, considerando que durante 7 años el proyecto no se pudo llevar a cabo.

En fecha 10 de enero de 2020, la SEFIN mediante Oficio DGCP-FE-20-2020, solicita a SESAL informar sobre las acciones tomadas para la finalización del contrato de consultoría en referencia a la comunicación de Corea (Oficio No. HND-4/19-4418), el cual debe estar cerrado para lograr la cancelación del préstamo.

Sin tener respuesta por parte de la SESAL, mediante Oficio DGCP-FE-1104/2020 de fecha 23 de octubre de 2020, la SEFIN solicita nuevamente informar sobre las acciones de la SESAL y se remite nueva comunicación por parte de la Empresa Contratista “MAC Architects-Consultants” (Oficio MAC-OPD-20-0915 de fecha 15 de septiembre de 2020) en referencia a comunicaciones no atendidas por SESAL desde el año 2019.

Al cierre del año 2020 por parte de la SESAL no hay pronunciamiento al respecto.

**Proyecto Ejecutado por la Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H).**

• **Mejora de la Gestión y Calidad de los Servicios de Salud Materno Neonatal:**

De acuerdo a la Unidad Ejecutora, los Logros alcanzados al IV trimestre se describen a continuación:

- ✓ Componente 1: Fortalecimiento de la gestión y calidad de los servicios obstétricos neonatales:

Para este período se garantizó la cobertura de atención a una población de 425,045 habitantes, a través de la prestación de servicios de salud con gestores descentralizados en el primer y segundo nivel de atención. Así mismo, se logró la atención por parte de gestores descentralizados en el marco de la pandemia COVID-19.

A través de los gestores descentralizados de primer nivel se brindaron entre otras las siguientes atenciones:

- 1,050 embarazadas captadas antes de las 12 semanas de gestación.
- 1,256 puérperas que recibieron por lo menos 5 atenciones prenatales por personal calificado de acuerdo a los criterios de la norma.
- 1,461 mujeres que tuvieron su parto y que recibieron una atención puerperal por personal calificado dentro de los 3 a 7 días post-parto.
- 1,468 partos institucionales atendidos.
- 43,182 visitas domiciliarias a población prioritaria o en riesgo realizadas.
- 5,330 niños que asisten a la reunión mensual de AIN-C.

A través de los gestores descentralizados de segundo nivel se brindaron entre otras las siguientes atenciones:

- 4,147 atenciones de consulta externa.
- 11,372 atenciones de emergencia.
- 4,193 atenciones por complicaciones obstétricas y 1,217 por complicaciones neonatales.
- 3,446 partos atendidos.

✓ Componente II: Mejoramiento de la Infraestructura de los Servicios de Salud:

En este componente se logró la elaboración del Estudio de Pre-inversión y Programa Médico Arquitectónico para la construcción del nuevo bloque medico infantil del Hospital Regional de Occidente.

✓ Componente III: Mejoramiento del Equipamiento de los Servicios de Salud.

Para este periodo se programó la adquisición de ultrasonidos fijos y móviles para uso de Equipos de Salud Familiar; sin embargo, esta adquisición ha sido reprogramada para el 2021, debido a la priorización de recursos para atender las emergencias en el sector salud derivada de los huracanes ETA y IOTA.

✓ Componente IV: Fortalecimiento Institucional, Innovaciones Tecnológicas y Sistema de Información.

Se cuenta con las asistencias técnicas programadas para la implementación del programa en las regiones sanitarias y para el seguimiento y monitoreo de gestores de primer y segundo nivel.

✓ Componente V: Administración y Evaluación del Programa.

Se logró la meta planificada en relación con la elaboración de informes.

## **f) SECTOR DESARROLLO PRODUCTIVO y RIEGO**

Los principales rubros de inversión están enfocados en la ejecución de Planes de Negocios, implementación de Sistemas de Riego. Al cuarto trimestre las distintas Instituciones del Sector, registran los siguientes avances físicos:

### **Proyectos Ejecutados por Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG):**

- **El Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR), (BCIE-2101):**

Al cuarto trimestre de este año, el proyecto presenta una ejecución financiera de 47.90%, correspondiente a pagos de estimaciones de los subproyectos en ejecución, además de procesos administrativos financieros vinculados al proyecto.

Las actividades físicas reportadas por la Unidad Ejecutora son:

**Sistema de Riego Sulaco:** Durante el IV Trimestre en Sitios de Presa se fundieron 80 M3 de concreto; 28 m3 en la presa de Maralito, en la presa de Siguapa no presenta avance y 52 m3 en la presa de Tascalapa, el proyecto Sulaco presenta en general un avance acumulado total de fundición de concreto en presas de 5,536.91 M3 de un total contratado de 6,599.17 M3, lo que representa un 83.90 % de avance.

Se fundieron 65.05 m3 de concreto de obra toma, distribuidos así: 18 m3 en la presa de Siguapa y 47.05 m3 en la presa de Tascalapa, en general se han fundido un total de 551.51 m3 de un total contratado de 636.60 m3 que representa un avance del 86.63%.

En general en el proyecto Sulaco se tienen instalados 128,017.21 metros lineales de un total de 129, 889.67 contratados, equivalente a un avance general de 98.56%.

**Avances en Sitios de Presa.** Durante el III Trimestre se fundieron 564 M3 de concreto, distribuidos así: 346 m3 en la presa de Maralito, 16 m3 en la presa de Siguapa y 202 m3 en la presa de Tascalapa. El proyecto Sulaco en general a la fecha presenta un avance acumulado total de fundición de concreto en presas de 5,456.91 M3 de un total contratado de 6,599.17 M3, lo que representa un 82.69% de avance.

**Sistema de Riego de Olomán:** Se continúa la espera la Emisión de la NO Objeción por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), al Diseño presentado con la alternativa del uso de un Equipo de Bombeo.

**Sistema de Riego de San Sebastián:** Se adjudicó a la Empresa Servicios para el Desarrollo de la Construcción S. de R.L. (SEDECO) bajo la modalidad de Licitación Pública Internacional No. SAG-UAP-PDABR-BCIE 2101-LPI-1-05-2016 publicado el 19 de agosto de 2016 y en fecha 04 de septiembre de 2017 se firmó el contrato No. SAG/UAP/PDABR/BCIE2101/Componente N°1/Correlativo 08 N°29, a quien se le emitió la orden de inicio de este proyecto el 06 de noviembre de 2017, por un monto de \$2,989,008.26.

**Sistema de Riego de Selguapa:** Se implementa un área a irrigar de 2,755 Has 3,939.65 mz, Beneficiando a 950 familias con la fuente de agua rio selguapa, Comayagua con un caudal a derivar 1,200 l/s (litros por segundo), fue adjudicado a la empresa Constructora SATO, C. V. de R.L, firmando el contrato el día 09 de agosto de 2019, orden de inicio el día 05 de septiembre de 2019, monto de \$ 9,848,978.22 y la empresa Supervisión Saybe y Asociados S. de R.L de C.V. por un monto de USD\$ 693,906.81

- **Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego del Valle de Jamastran Fase 1, IN- (DL98134500295569L) Fondos de Exim Bank India:**

El proyecto no presenta ejecución física ni financiera debido a que el Exim Bank India no ha otorgado visto bueno a la Adenda 2 para el reinicio de actividades y desembolsos lo que imposibilita el reinicio del proyecto, dado a la pandemia del Covid-19 no se ha podido realizar reuniones para solventar el problema financiero.

- **Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur Occidental “PROLENCA”, (FIDA-I-899-HN, FIDA-II-200000125200 y GEF-FSS-05-HN):**

Entre las actividades físicas presentadas por la Unidad Ejecutora se resaltan:

**Componente 1. Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones Rurales:** Durante el cuarto trimestre, se retomó el trabajo con las empresas que están realizando la consultoría de formulación e implementación Planes de Familias Organizadas (PFO) para la actualización de cuerpos directivos, tramites de PIN SIAFI y documentación de personerías jurídicas; es importante mencionar que se está trabajando de acuerdo a un protocolo de bioseguridad que se elaboró en coordinación con las empresas consultoras.

Formulación de 100 planes de inversión, actualmente se cuenta con la no objeción por parte del FIDA de 51 convenios elaborados de este lote, además se obtuvieron 17 Personería Jurídica.

Se ejecutaron 20 Planes de Inversión de 100 formulados.

**Componente 2. Desarrollo Productivo y de Negocios:** Se realizaron reuniones de seguimiento con los 14 técnicos que están brindando los servicios de asistencia técnica a 48 organizaciones que ya tienen sus desembolsos FIDA y GEF, se realizaron giras de monitoreo y seguimiento a las inversiones. Se supervisaron proyectos de infraestructura, cultivo de café y tiendas de consumo, además se revisaron procesos de compras y recopilación de contrapartidas.

25 nuevo Convenios suscritos de cooperación firmados de las organizaciones.

**Componente 3. Infraestructura Rural:** Durante el cuarto trimestre se avanzó en la rehabilitación de 34,9 kilómetros caminos rurales terciarios: 13,7 km en el Municipio de Gracias, 10,7 en el Municipio de Santa Elena y 10,5 en el Municipio de Yarula.

Durante el año 2020 el Proyecto ha generado un total de 524 empleos.

#### **g) SECTOR SEGURIDAD Y DEFENSA:**

Para el presente año, el Gabinete de Prevención, Seguridad y Defensa cuenta con un Presupuesto vigente por la cantidad de **L497.8 millones** para la ejecución de dos proyectos, los cuales uno (1) es ejecutado por la Secretaría de Seguridad y uno (1) por la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) representando un 40% de ejecución (**L199.5 millones**) para el cuarto trimestre de 2020. Las principales metas ejecutadas al tercer trimestre son:

##### **Proyecto Ejecutado por la Secretaría de Seguridad:**

- **Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios, crédito BID 4518/BL- HO:**

Las actividades realizadas al III trimestre que reporta la Unidad Ejecutora son las siguientes:

##### **Componente: Atención y servicio al ciudadano en materia de convivencia ciudadana en municipios.**

1. Diseño para la Construcción de 2 Unidades Metropolitanas Policiales SPS y Municipal Las Vegas, Santa Bárbara y Diseños prototipos de Jefaturas Departamentales y Municipales. **Estado:** Contrato terminado con la Firma INGENNUS-JG INGENIEROS.
2. Licitación Pública Internacional (LPI); Construcción de Jefaturas Policiales, en los municipios de Yoro y Olanchito, departamento de Yoro y Tela, departamento de Atlántida. **Estado:** Olanchito: Contrato suscrito empresa CACORA; Tela: Contrato suscrito empresa GEO-CONSTRUCCIONES.
3. Licitación Pública Internacional (LPI); Construcción de Jefaturas Policiales, en el municipio de SPS, Cortés y en el municipio de Las Vegas, Santa Bárbara, Honduras, C.A. **Estado:** Envío Solicitud de No Objeción al Informe de Evaluación y recomendación de adjudicación en BID.
4. Contratación de la Empresa de Supervisión para la Construcción de Unidad Metropolitana Policial SPS y Municipal Las Vegas, Santa Bárbara. **Estado:** Contrato suscrito empresa Taller de Arquitectura Santos Horneros (TASH).
5. Contratación de la Empresa de Supervisión para la Construcción de Jefaturas Municipales en Yoro, Yoro; Tela, Atlántida y Olanchito Yoro. **Estado:** Revisión de contrato Secretaría General empresa CAM.
6. Remodelación y Acondicionamiento del Área de recepción de denuncias, Modulo VIF en la UMEP No. 2, Belén, Comayagüela y Oficinas de la Unidad de Modernización de la PNH. **Estado:** Obra terminada (Físico: 100%; Financiero: 85.67%).
7. Licitación Pública Nacional (LPN); Adquisición de dos Generadores Eléctricos, para la Subsecretaria de Seguridad en A. Interinstitucionales y para la Unidad de



Modernización. **Estado:** Contrato suscrito empresa SEIJIRO YAZAWA IWAI.

8. Licitación Pública Nacional (LPN); Adquisición de Servidores, proyectores, baterías de portátiles y refacciones para la Subsecretaría de Asuntos Interinstitucionales y Modernización. **Estado:** Contrato en revisión en Secretaría General empresa JETSTEREO (Servidores). Contrato en ejecución empresa COMPUSER (Biométrico, Proyectores, tóners). Contrato terminado, empresa LUFERGO (Refacciones). Contrato terminado (Empresa SUMITEC (Impresora Láser)).
9. Licitación Pública Nacional (LPN); Adquisición de Mobiliario para la UMEP No. 2-Belén, Gobiernos Locales y la Dirección Modernización. **Estado:** Contrato terminado empresa IPSA. Contrato terminado empresa MILANO.
10. Remodelación de las Jefaturas Policiales para el fortalecimiento de los Servicios de atención integral para Violencia Intrafamiliar (VIF) y el Módulo de Atención Integral Especializado, (MAIE), en Nacaome, de acuerdo con el protocolo de servicios. Financiado con fondos COSUDE. **Estado:** Diseños y presupuesto elaborados.

#### **Componente: Efectividad policial**

1. Licitación Pública Nacional (LPN); Adquisición de Mobiliario para la Unidad de Tutoría y Mentoría. **Estado:** Contrato terminado empresa IPSA.
2. Adquisición de Kits de reactivos para pruebas toxicológicas para aspirantes ITP y ANAPO. **Estado:** Contrato en ejecución empresa DICOSA. Contrato en ejecución empresa INTERSEG:
3. Contratación para el Mantenimiento y actualización de tres escáneres forenses para laboratorios de investigación criminal y servicios de capacitación. **Estado:** Contrato en ejecución, suscrito empresa LEICA.
4. Contrato para el Diseño de Obras de la Academia Nacional de Policía (ANAPO). **Estado:** Contrato terminado con la Firma INGENNUS-JG INGENIEROS.
5. Contrato para el Mantenimiento del Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares (AFIS) de la DPI. **Estado:** Contrato terminado, suscrito empresa GRUPOVISIÓN.
6. Contrato para la capacitación y asistencia técnica para la Gestión de la Calidad con Normas ISO: 9001-2015; 17020-2012; 17025-2017, para Laboratorios de la DPI. **Estado:** Contrato en ejecución, empresa INLAC.
7. Adquisición de reactivos para uso en investigación y levantamiento de indicios en escenas del crimen para la DPI. **Estado:** Envío Solicitud de No Objeción al Informe de evaluación y recomendación de adjudicación en BID.
8. Contrato para compra e instalación del generador eléctrico y construcción de obras para planta de tratamiento de aguas residuales en ANAPO-TAMARA. **Estado:** Obra

e instalación entregada y en funcionamiento.

9. Adquisición de Insumos para casos de homicidios y Equipo complementario para Laboratorio Criminalística. **Estado:** Contrato terminado, empresa INTERSEG.
10. Puesta en marcha del Complejo de la Ciudadela del ITP-ANAO; financiado con fondos COSUDE. **Estado:** Diseños y presupuesto elaborados.

#### **Componente: Gestión del Programa**

1. Contrato de Auditoria externa del Programa. **Estado:** Informe de Auditoria año 2019 entregado.

#### **Proyecto ejecutado por el Fondo Hondureño de Inversión Social**

- **Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (USAID/ICS 522-0501-4):**

Monto del Convenio es de \$14,637,541.74, de los cuales, fondos de donación de USAID: \$11,710,033.39; fondos de contraparte de Gobierno de Honduras: \$2,927,508.35 (efectivo: \$2,127,508.35 y especies: \$800,000.00), al 31 de diciembre contó con un presupuesto vigente de L 139,162,129.00 y una ejecución anual del L 60,678,681.68 que representó el 44%, recursos invertidos para la rehabilitación de 6 centros escolares y 2 Unidades Departamentales de Prevención y Seguridad Comunitaria de la Policía Nacional y proyectos para fortalecer el sistema de salud, según Decreto Legislativo No. 77-2020.

Cabe mencionar que, por el estado de emergencia emitido mediante decreto, se suspendió la ejecución de proyectos, a la fecha se han priorizado proyectos de Infraestructura y Equipamiento de establecimientos de salud con el objetivo de hacer frente a los desafíos en esta etapa de emergencia que atraviesa el país

#### **h) SECTOR RECURSOS FORESTALES Y AMBIENTE:**

Contempla la Reforestación y restauración de 34,000 hectáreas en zonas afectadas por el gorgojo y la gestión de riesgo de desastres, a través del Programa Manejo Sostenible de Bosques y el Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres. Los avances al tercer trimestre se muestran a continuación:

#### **Proyectos Ejecutados por la Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H).**

- **Proyecto Manejo Sostenible de Bosques:**

De acuerdo a la Unidad Ejecutora, los Logros alcanzados al IV trimestre se describen a continuación:

- ✓ **Componente 1.** Restauración de bosques afectados por la plaga del gorgojo:

- El avance acumulado al 31 de diciembre de 2020 es la elaboración de 39 planes de restauración (PR), equivalentes a 32,531.15 hectáreas, lo que representa un 95.7% en relación a la meta del proyecto (34,000 has). De estos, se aprobaron 36 planes equivalentes a 31,146.96 hectáreas (91.6%); con convenios suscritos 34 planes, equivalentes a 30,869.44 hectáreas (90.8%) y en ejecución 30 planes, equivalentes a 29,597.69 hectáreas (87.1%).
  - Para el 2020 se comprometieron recursos por L. 291.36 millones (97% del monto presupuestado) en inversión en mano de obra en PR en ejecución, de los cuales se transfirieron a diciembre 2020 US\$ 3.7 millones de dólares.
  - Las actividades de restauración de los 30 planes en ejecución se llevan a cabo en 23 municipios de los departamentos de Francisco Morazán, Comayagua y Yoro.
  - Se continuó con la entrega del equipo para protección, seguridad y prevención de incendios y materiales e insumos para la producción de plantas, para las organizaciones beneficiarias de los planes de restauración en ejecución.
  - En afinamiento el Módulo de Monitoreo del Proyecto en la plataforma SIGMOF de ICF.
  - Se logró la contratación de la firma para el diseño del programa piloto de incentivos en bosque privado, obteniendo para el período reportado, el contrato firmado de forma electrónica con la firma consultora SUD AUSTRAL CONSULTING, S.p.A.
  - En proceso de contratación la firma para el diseño e implementación de la Estrategia de Comunicaciones, Visibilidad y Sensibilización del Proyecto.
- ✓ **Componente 2.** Fortalecimiento del sistema de sanidad forestal y mejora de la resiliencia de los bosques al Cambio Climático:
- Se elaboró el Manual de Procedimientos de Acceso a Financiamiento de las investigaciones, el cual está en proceso de revisión de la gerencia legal de la AEPAS-H, para su posterior envío a no objeción del BID.
  - Elaborados y en proceso de revisión los TDR para la realización de 7 investigaciones de salud y sanidad forestal priorizadas por el ICF.
  - En ejecución la carta acuerdo SEFIN-ICF-UNACIFOR para el diseño del Programa de Capacitación en salud y sanidad forestal; en revisión el 4to y último producto de la consultoría.
  - En ejecución contrato para el diseño del Sistema de Prevención y Alerta Temprana (SPAT); aprobados 3/6 de los entregables establecidos en el contrato.
  - En proceso de evaluación de ofertas proceso para la adquisición de equipo de infotecnología.
  - En proceso de adquisición de feromonas para el monitoreo de la plaga del gorgojo descortezador del pino solicitadas por el ICF.

- ✓ **Componente 3.** Mejora del acceso a financiamiento climático para promover el MFS
  - Se continúa con el fortalecimiento de la Oficina Presidencial de Cambio Climático Clima Plus a través de la contratación de las 2 asesorías técnicas en planificación y alianzas estratégicas, las que finalizaron en el mes de diciembre 2020.
  - Se certificaron 24 funcionarios públicos en fundamentos de Cambio Climático.
  - En ejecución contrato para el estudio de factibilidad de la conformación de fondos de agua o compensación de servicios ambientales.
- ✓ **Componente 4 y 5:** Gestión del Proyecto y Evaluaciones y Auditorías
  - En ejecución los contratos para el levantamiento de la línea base del indicador de impacto CO2 a ser coordinado por ICF con el asesoramiento de expertos en la temática.
  - En proceso de contratación, la consultoría de apoyo al monitoreo del indicador hídrico a ser coordinado por ICF con el asesoramiento de expertos en la temática.
  - En proceso la adquisición de equipo hidrometeorológico para el monitoreo del indicador hídrico.
  - En ejecución la consultoría para el Diseño de la Metodología y Protocolos para el Monitoreo de la Biodiversidad y Ecología de los Bosques de Pino afectados por la plaga del gorgojo y bajo restauración.

### **Proyecto Ejecutado por Instituto Nacional de Conservación Forestal (ICF):**

- **Proyecto de Medida Complementaria al Proyecto de Ordenamiento Territorial Comunal y Protección del Medio Ambiente en Río Plátano (MC-PROTEP):**

El Proyecto concluyó durante el IV trimestre del 2020, a pesar de las condiciones adversas por la pandemia de COVID-19 las municipalidades consolidaron el alcance del objetivo específico del componente I, tanto en la gestión del catastro municipal como en su aplicación en procesos relacionados, tales como la coordinación con la ICF en el tema del mantenimiento de CUF y la regularización de la tenencia de la tierra, entre otros aspectos de la gestión territorial.

Implementación de cambios significativos en los procedimientos y la conciencia de los técnicos y gerentes en los diferentes niveles de las municipalidades, es decir ir por un proceso de desarrollo organizacional que provocó cambios en los procesos centrales de la administración de tierras por parte de las municipalidades.

Otro logro que en el marco de la asistencia técnica a la municipalidad de Iriona sobresale la decisión de la corporación municipal de adaptar la estructura organizativa de la administración, creando la oficina de control tributario con el fin de descargar las actividades relacionadas con los tributos al departamento de catastro. En este contexto se readecuó la infraestructura constructiva y técnica municipal conforme a las necesidades de la gestión del catastro municipal.

El personal de la unidad de Seguimiento a la Tenencia de la Tierra de la RBRP del ICF, promocionó la radionovela “Tierra Mía” especialmente en los institutos de educación media,

ubicados en la Zona de Amortiguamiento de la RHBRP, con el efecto que en algunos de ellos se le consideró como parte de los contenidos de la formación de los alumnos, discutiendo sobre estos temas, analizar y calificar el aprendizaje relacionado. En el tema de género, también los mensajes entregados por el personal del ICF y por el personal municipal establecieron con claridad la obligación de incluir a las mujeres en los Contratos de Usufructo Familiar, asumiendo tanto los derechos como las obligaciones en ellos establecidas.

### **Proyecto Ejecutado por Comisión Permanente de Contingencias (COPECO):**

#### **• Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres (PGRD) (IDA 5190-HN):**

La inversión pública (COPECO) en el año 2020 contempla el siguiente proyecto:

#### **Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres (PGRD) (IDA 5190-HN):**

Al cuarto trimestre se reportan las siguientes actividades:

- Construcción de 4 medidas estructurales en los municipios y su respetiva supervisión de: i) Puerto Cortés, Cortés, ii) Choloma, Cortés, iii) Santa Rita, Yoro, Tela Atlántida la cuales fueron finalizadas al 100% al IV trimestre. Construcción de 2 medidas estructurales i) San Antonio de Cortés, Cortés, 11) El Negrito, Yoro; las cuales quedaron con una ejecución física del **85%**, estas medidas en particular fueron afectadas drásticamente por el paso de las Tormentas Tropicales ETA e IOTA en el mes de noviembre de 2020, los cuales su ejecución fueron trasladadas para la Gestión 2021 incluyendo la respectiva supervisión.
- Fortalecimiento institucional a través de la construcción de parque solar de COPECO Central. El Contrato está firmado, por un monto base de L.8,422,821, y cuya ejecución física está al **100%**.
- Fortalecimiento institucional de la construcción del edificio de CENAOS-COPECO. El Contrato está firmado por un monto de L.14,205,550, y cuya ejecución física está al **100%**.
- Fortalecimiento institucional compra de mobiliario y equipo, equipo de cómputo y repuestos, vehículos, equipo de comunicación, CENAOS-COPECO y cuya ejecución física está al **100%**.
- Evaluación final del proyecto, están contratadas las consultorías de Levantamiento de Datos para la evaluación final, especialista en Gestión de Riesgos para la evaluación final del proyecto, auditoria social, evaluador económico, evaluador de medidas de reducción de la vulnerabilidad, y cuya ejecución física está al **100%**.

#### **Avances del Componente Contingente de Respuesta a Emergencia (CCRE)**

El proyecto evaluó la adjudicación de los lotes según el Plan de Adquisiciones, “Fortalecimiento a las Oficinas Sanitarias Internacionales y Unidades de Atención Masiva en Honduras”.

Las actividades ejecutadas son:

- a) Contratación de firma consultora para el diagnóstico de necesidades para las reparaciones de las 4 Oficinas Sanitarias Internacionales y 9 Unidades de Atención Masiva y supervisión de la ejecución del contrato de construcción. Contrato adjudicado, se ejecutó el 50% para el levantamiento de necesidades quedando pendiente la supervisión.
- b) Reparaciones Menores en 4 Oficinas Sanitarias Internacionales y 9 Unidades de Atención Masiva. Los lotes quedaron evaluados por el Comité de Evaluación, su ejecución comenzaría en Noviembre de 2020, debido al impacto negativo provocado por los huracanes Eta e Iota, en ese mismo mes, se decidió no continuar con el proceso de adjudicación debido a que existía una fuerte probabilidad de que las reparaciones menores no fueran finalizadas antes de la fecha de cierre del proyecto. De estas ninguna de los procesos fue adjudicado o firmado el contrato.
- c) Contratación de firma consultora para la auditoria de los estados de uso de fondos del CCRE, el contrato fue firmado con la revisión al 31 de diciembre de 2020.

#### **i) SECTOR COMUNICACIONES**

##### **Proyecto Ejecutado por Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL):**

##### **■ El Proyecto Servicios Convergentes de Nueva Generación, (FP-HONDUTEL-22102) Fondos Propios:**

El Proyecto Servicios Convergentes de Nueva Generación, obtuvo un presupuesto aprobado por el Congreso Nacional de 87.1 millones reportando un 0% de ejecución financiera (L0.00) en lo que ha transcurrido del año. El proyecto no presenta ejecución debido a la falta de liquidez que atraviesa la Empresa.

Durante el año 2018 se realizó vía licitación la adquisición de bienes adquiridos para la Instalación de Equipos, soluciones de valor agregado y ampliación de Red IP (Internet Protocol), La Dirección Red IP es un número que identifica, de manera lógica y jerárquica, a una Interfaz en red (elemento de comunicación/conexión de un dispositivo (computadora, tableta, portátil, etc.). Además, continúa en la preparación de documentos y bases legales para el proceso de licitación, para la construcción, iluminación e instalación de rutas de conectividad.

De conformidad a la Nota de Prioridad emitida para el Proyecto, el mismo finalizó en el ejercicio 2020.

#### **1.7 Factores que Han Incidido en la Ejecución de la Inversión Pública, para el Tercer Trimestre del Año 2020**

Durante la ejecución de programas y proyectos, se presenta una serie de obstáculos que limitan la normal ejecución de los mismos, en términos físicos y financieros, sin cumplir el objetivo esperado, y por ende la ausencia de impacto en la población meta. Entre los problemas relevantes sobresalen:

Área	Problemas	Acciones
Técnica	La declaratoria de emergencia nacional por COVID-19, según decreto ejecutivo No. 005-2020, de febrero del presente año, en el cual se determinó establecer toque de queda absoluto en el territorio nacional a partir de marzo de 2020, ocasionó la paralización de las obras ejecutadas por los proyectos. Así como las actividades programadas en sus Planes Operativos Anuales.	Las unidades ejecutoras deberán de realizar las modificaciones a sus planes operativos y planes de ejecución de sus proyectos, a fin de dar continuidad a las obras pendientes, ampliar fechas de extensión de contratos, o suspensión de contratos.
	Debilidad en el ciclo de pre inversión, lo que se traduce en la modificación o reformulación de los proyectos, incrementando el costo de los mismos, teniendo que ser cubiertos por el Gobierno.	Se debe dar mayor importancia a la elaboración de los diseños y estudios de proyectos, pasando por todos los niveles de pre inversión: idea, perfil, pre factibilidad y factibilidad; y de acuerdo a la Guía metodológica de Formulación de proyectos de Inversión de la DGIP.
	La inadecuada planificación por parte de las unidades ejecutoras de proyectos, ocasiona reprogramación de metas, lo que implica solicitar al Organismo Financiador su No Objeción (en caso de los préstamos), ocasionando retrasos en la ejecución  Lentos procesos de adquisiciones y contrataciones, desfasando la ejecución oportuna de los proyectos.	Brindar por parte de la DGIP, asistencia técnica a las instituciones gubernamentales en la identificación, formulación y evaluación de proyectos.  Realizar una revisión de los posibles puntos débiles en los procesos de adquisiciones, prever tiempos para cada proceso y tomar en cuenta los tiempos que estipulan los organismos de financiamiento.
Administrativa - Financiera	Retrasos en las aprobaciones por parte del Congreso Nacional de las Normas de Ejecución presupuestaria específicamente en su artículo No 3. Afectando a las unidades ejecutoras de proyectos en realizar modificaciones y ajustar sus planes operativos anuales.	Revisar los artículos de las Normas de ejecución Presupuestaria, específicamente aquellos que afectan la ejecución de los proyectos.
	Desfase de la ejecución, considerando la tardía presentación de estimaciones de avance por parte de los proveedores.	Identificar mecanismos de control para establecer tiempos de entrega en los informes de estimaciones, tratando de programar los pagos de acuerdo al tiempo que corresponde.



Área	Problemas	Acciones
Legal	Retrasos en la formalización de contratos de construcción y supervisión, derivados del pago de derecho de vía y paso de servidumbre en el caso de líneas de transmisión.	Establecer e implementar una adecuada estrategia legal de negociación para liberar el derecho de vía de los tramos en construcción. Aplicación de la Ley Especial para la Simplificación de los Procedimientos.

ANEXO No. 1  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública  
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE 2020

Cifras en Lempiras

No.	Gabinete / Institución / Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Devengado Anual			
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./ Vig.)
2	Entes que no Forman Parte del Poder Ejecutivo		-	75,712,929	75,712,929	-	648,724,557	648,724,557	-	610,672,809	610,672,809	0.94
1	0010 - Poder Judicial		-	75,712,929	75,712,929	-	75,712,929	75,712,929	-	37,661,181	37,661,181	50%
1	005 - PROMOVRIENDO UNA JUSTICIA RAPIDA Y ACCESIBLE EN HONDURAS (EUROJUSTICIA)	DCI-ALA/2013/023-720	-	75,712,929	75,712,929	-	75,712,929	75,712,929	-	37,661,181	37,661,181	50%
1	0180 - Registro Nacional de las Personas		-	-	-	-	573,011,628	573,011,628	-	573,011,628	573,011,628	100%
1	001 - PROYECTO DE MODERNIZACION DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACION EN HONDURAS "Identificate"	2235-TRAMO A 2235-TRAMO B	-	-	-	-	232,073,971 340,937,657	232,073,971 340,937,657	-	229,879,125 343,132,503	229,879,125 343,132,503	99% 101%
	<b>Total 001 - PROYECTO DE MODERNIZACION DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACION EN HONDURAS "Identificate"</b>		-	-	-	-	573,011,628	573,011,628	-	573,011,628	573,011,628	100%
44	Gabinete de Infraestructura, Servicios y Empresas Públicas		811,482,975	4,782,432,154	5,593,915,129	853,130,676	5,176,356,179	6,029,486,855	507,915,600	2,790,800,324	3,298,715,923	55%
6	0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social		35,042,089	469,117,482	504,159,571	22,980,263	460,154,139	483,134,402	14,531,153	288,766,225	303,297,378	63%
1	008 - PROGRAMA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SU GESTION LOCAL	2014 67 414 (KFW) / FHIS - SE BMZ 2016 68 763 SE/FHIS VIII No.2008-66-178	2,824,000 -	9,995,100 -	12,819,100 -	1,109,007 1,082,000	117,469,594 9,995,100	118,578,601 11,077,100	22,875 -	98,430,109 -	98,452,984 -	83% 0%
	<b>Total 008 - PROGRAMA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SU GESTION LOCAL</b>		1,298,432	121,790,245	123,088,677	461,917	24,310,851	24,772,768	457,785	24,310,848	24,768,633	100%
	<b>Total 008 - PROGRAMA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SU GESTION LOCAL</b>		4,122,432	131,785,345	135,907,777	488,924	131,785,345	132,274,269	480,660	122,740,956	123,221,616	93%
2	011 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA	522-0501-4	28,651,501	116,670,790	145,322,291	22,491,339	116,670,790	139,162,129	14,050,493	46,628,188	60,678,682	44%
3	012 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS	ATN/OC-17135-HO BID/4518/BL-HO	-	4,889,760 129,981,491	4,889,760 129,981,491	-	4,889,760 100,412,690	4,889,760 100,412,690	-	1,338,850 69,862,532	1,338,850 69,862,532	27% 70%
	<b>Total 012 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS</b>		-	134,871,251	134,871,251	-	105,302,450	105,302,450	-	71,201,382	71,201,382	68%
4	014 - PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS	BMZ Nr. 2016 65348 KFW-CONVIVIR	- 2,268,156	- 20,207,000	- 22,475,156	- 2,268,156	4,000,000 31,812,458	1,731,844 34,080,614	- -	- 30,674,408	- 30,674,408	0% 90%
	<b>Total 014 - PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS</b>		2,268,156	20,207,000	22,475,156	-	35,812,458	35,812,458	-	30,674,408	30,674,408	86%
5	047 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)	BCIE-1736	-	-	-	-	5,000,000	5,000,000	-	4,184,495	4,184,495	84%
6	060 - ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS	522-0502 Cd E No.9	-	65,583,096	65,583,096	-	65,583,096	65,583,096	-	13,336,794	13,336,794	20%
15	0031 - Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)		4,721,718	2,897,532,984	2,902,254,702	5,292,534	2,993,132,261	2,998,424,795	2,931,676	1,958,236,629	1,961,168,305	65%
1	001 - Proyecto de Respuesta a Emergencias Honduras COVID-19	IDA 6626-HN	-	-	-	-	345,130,165	345,130,165	-	168,127,484	168,127,484	49%
2	004 - ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO (USAID-GAFSP)	Carta de Ejecución No. 7 USAID TF017904	-	111,649,170 213,218,663	111,649,170 213,218,663	-	129,649,170 214,146,414	129,649,170 214,146,414	-	98,568,633 131,395,387	98,568,633 131,395,387	76% 61%
	<b>Total 004 - ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO (USAID-GAFSP)</b>		-	324,867,833	324,867,833	-	343,795,584	343,795,584	-	229,964,020	229,964,020	67%
3	009 - Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II)	IDA-6448-HN	-	-	-	-	39,503,020	39,503,020	-	39,503,020	39,503,020	100%
4	010 - PROGRAMA VIAL DE INTEGRACION VIAL REGIONAL II	BID-3815/BL-HO	-	255,969,868	255,969,868	-	238,575,766	238,575,766	-	186,221,199	186,221,199	78%
5	011 - CORREDOR PACÍFICO-PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL REGIONAL	BID_2470/BL-HO-1 BID_2470BL-HO-2	- -	7,967,525 129,333,159	7,967,525 129,333,159	- -	45,761,714 135,437,908	45,761,714 135,437,908	- -	21,626,007 30,627,524	21,626,007 30,627,524	47% 23%
	<b>Total 011 - CORREDOR PACÍFICO-PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL REGIONAL</b>		-	137,300,684	137,300,684	-	181,199,622	181,199,622	-	52,253,531	52,253,531	29%
6	012 - CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES HONDUREÑAS (CIUDAD MUJER)	BID-3771/BL-HO	-	87,106,119	87,106,119	-	95,526,819	95,526,819	-	50,987,452	50,987,452	53%
7	013 - REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE ORIENTE, CARRETERA TEGUCIGALPA-DANLÍ, FASE I: TRAMO NETEAPA-DANLÍ	BID_2470/BL-HO-1 BID_2470BL-HO-2 BID-3815/BL-HO	- - -	34,957,831 319,720,700 328,868,653	34,957,831 319,720,700 328,868,653	- - -	166,207,831 208,383,643 135,232,315	166,207,831 208,383,643 135,232,315	- - -	163,539,824 146,503,451 82,217,306	163,539,824 146,503,451 82,217,306	98% 70% 61%

ANEXO No. 1  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública  
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE 2020

Cifras en Lempiras

No.	Gabinete / Institución / Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Devengado Anual			
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./ Vig.)
	<b>Total 013 - REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE ORIENTE, CARRETERA TEGUCIGALPA-DANLÍ, FASE I: TRAMO NETEAPA-DANLÍ</b>		-	683,547,184	683,547,184	-	509,823,789	509,823,789	-	392,260,581	392,260,581	77%
8	014 - PROGRAMA PILOTO DE RESILIENCIA CLIMÁTICA (PPCR)	PPCR-TF0A4893	-	8,504,085	8,504,085	-	7,576,334	7,576,334	-	7,378,989	7,378,989	97%
	015 - Libramiento Anillo Periférico CA-5 Sur	BCIE 2221	-	159,822,927	159,822,927	-	10,120,768	10,120,768	-	-	-	0%
9	016 - PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - CAMASCA	BCIE-2162	-	151,199,340	151,199,340	-	1,005,969	1,005,969	-	1,005,969	1,005,969	100%
10	017 - FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA RED DE ATENCIÓN DE TRAUMAS Y URGENCIAS DE TEGUCIGALPA	6021583003 CHINA-TAIWAN BID No. 4713/BL-HO	-	-	-	-	172,749,781	172,749,781	-	-	-	0%
			-	-	-	-	7,000,000	7,000,000	-	-	-	0%
	<b>Total 017 - FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA RED DE ATENCIÓN DE TRAUMAS Y URGENCIAS DE TEGUCIGALPA</b>		-	-	-	-	179,749,781	179,749,781	-	-	-	0%
11	018 - PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD	4940/BL-HO	-	-	-	-	5,710,802	5,710,802	-	-	-	0%
12	019 - PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS, (COMRURAL)	BM-6046-HN	-	143,752,023	143,752,023	-	141,324,615	141,324,615	-	77,981,586	77,981,586	55%
13	020 - CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III	BCIE 2116 BCIE-2205	-	5,283,308	5,283,308	570,816	7,623,308	8,194,124	570,816	4,666,496	5,237,312	64%
			-	-	-	-	404,486,306	404,486,306	-	376,670,519	376,670,519	93%
	<b>Total 020 - CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III</b>		-	5,283,308	5,283,308	570,816	412,109,614	412,680,430	570,816	381,337,015	381,907,831	93%
14	021 - Ampliación y Mejoramiento de Carretera CA-5 Norte Segmentos I y II (Sección 2A), Tramo Las Mercedes-Empalme Villa de San Antonio	BCIE - 2098	4,721,718	313,592,133	318,313,851	4,721,718	317,042,133	321,763,851	2,360,860	312,378,078	314,738,938	98%
15	022 - PROYECTO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN, SECCION I	BCIE 2177	-	626,587,480	626,587,480	-	164,937,480	164,937,480	-	58,837,705	58,837,705	36%
12	<b>0120 - Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos</b>		<b>579,827,394</b>	<b>-</b>	<b>579,827,394</b>	<b>540,336,986</b>	<b>329,026,846</b>	<b>869,363,832</b>	<b>365,825,861</b>	<b>188,798,831</b>	<b>554,624,692</b>	<b>64%</b>
1	001 - Rehabilitación de Carreteras a nivel de Sub Base en los Departamentos de Comayagua, El Paraíso, Olancho, Lempira, Yoro, Atlántida, Colón, Santa Barbara, Copan, Intibucá, La Paz y Choluteca.	FN-INSEP-23511-1	-	-	-	10,200,717	-	10,200,717	10,192,217	-	10,192,217	100%
2	015 - Obra de Mitigación de Riesgos Estructurales en las Riberas de los Ríos en los Departamentos de Copan, Ocotepeque, Intibucá, Colón, Cortes, Francisco Morazán, Lempira, Valle y Olancho.	FN-INSEP-23423-1	30,000,000	-	30,000,000	30,000,000	-	30,000,000	14,766,109	-	14,766,109	49%
3	017 - Construcción y/o Rehabilitación de Obras de Drenaje en los Departamentos de Lempira, Olancho y Copan.	FN-23780-1	-	-	-	2,970,000	-	2,970,000	2,945,390	-	2,945,390	99%
4	025 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN ÁREAS DEPORTIVAS Y DE CONVIVENCIA SOCIAL EN COLÓN, INTIBUCÁ, YORO, COPÁN, OCOTEPEQUE, ATLÁNTIDA Y COMAYAGUA	FN-INSEP-23370	15,000,000	-	15,000,000	750,000	-	750,000	-	-	-	0%
5	026 - CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE 11,040 METROS LINEALES DE CALLES EN LOS DEPARTAMENTOS FRANCISCO MORAZÁN, EL PARAÍSO, CHOLUTECA, VALLE, CORTÉS, COMAYAGUA, COPÁN, ATLÁNTIDA, COLÓN, INTIBUCÁ, LEMPIRA, OC	FN-INSEP-23717-1	101,199,951	-	101,199,951	80,852,695	-	80,852,695	60,882,214	-	60,882,214	75%
6	029 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VÍAS URBANAS EN 16 DEPARTAMENTOS DEL PAÍS ( EL PARAÍSO, CORTES, OLANCHO, COPAN, LA PAZ, FRANCISCO MORAZÁN, YORO, SANTA BARBARA	FN-23762-1 FONDOS NACIONALES	-	-	-	35,112,000	-	35,112,000	23,712,522	-	23,712,522	68%
7	116 - CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS-CUEVAS DE TALGUA	0000003-13	28,183,065	-	28,183,065	27,468,321	-	27,468,321	-	-	-	0%
	<b>Total 116 - CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS-CUEVAS DE TALGUA</b>		<b>28,183,065</b>	<b>-</b>	<b>28,183,065</b>	<b>27,468,321</b>	<b>-</b>	<b>27,468,321</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
8	121 - REHABILITACION VIAL DEL CORREDOR DE OCCIDENTE: LA ENTRADA - COPAN RUINAS - EL FLORIDO Y LA ENTRADA-SANTA ROSA DE COPAN	BCIE-2156 BEI-FI No.84859	-	-	-	-	116,602,604	116,602,604	-	76,716,730	76,716,730	66%
			-	-	-	17,630,943	108,070,938	125,701,881	11,073,094	11,170,914	22,244,008	18%

ANEXO No. 1  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública  
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE 2020

Cifras en Lempiras

No.	Gabinete / Institución / Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Devengado Anual			
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./ Vig.)
		DCI-ALA/2015/369-566	-	-	-	-	104,353,304	104,353,304	-	100,911,188	100,911,188	97%
	<b>Total 121 - REHABILITACION VIAL DEL CORREDOR DE OCCIDENTE: LA ENTRADA - COPAN RUINAS - EL FLORIDO Y LA ENTRADA-SANTA ROSA DE COPAN</b>		-	-	-	17,630,943	329,026,846	346,657,789	11,073,094	188,798,831	199,871,925	58%
9	144 - CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL TRAMO CARRETERO VALLADOLID - LA VIRTUD 2 MAPULACA, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 30 KM, LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.	FN-INSEP-23245	253,229,220	-	253,229,220	201,214,220	-	201,214,220	173,591,332	-	173,591,332	86%
10	145 - DISEÑO, CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CON DOBLE TRATAMIENTO DEL TRAMO CARRETERO OROCUINA (RIO CHIQUITO) - APACILAGUA, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 3 KM, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.	FN-INSEP-23469-1	-	-	-	21,772,570	-	21,772,570	21,000,904	-	21,000,904	96%
11	146 - CONSTRUCCION A CUATRO (4) CARRILES DEL BULEVAR DE COMAYAGUA, ETAPA II: ESTACION 2+500 - HACIA DESVIO DE AJUTERIQUE, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 1 KM, LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEPARTAME	FN-INSEP-23441-1	-	-	-	19,500,000	-	19,500,000	19,018,308	-	19,018,308	98%
12	147 - CORREDOR TURISTICO DISTRITO DE LOS LAGOS ETAPA 1: REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO TRAMOS: 1-CAÑAVERAL-RIO LINDO- CARACOL SECCIÓN 1 CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 7.00 KM, 2- CAÑAVERAL-RÍO LINDO-	FN-INSEP-23450-1	152,215,158	-	152,215,158	92,865,520	-	92,865,520	28,643,770	-	28,643,770	31%
1	<b>0144 - Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible</b>		14,026,400	135,234,760	149,261,160	13,890,539	135,234,760	149,125,299	13,801,678	50,305,040	64,106,718	43%
1	010 - PROYECTO DE ENERGÍA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PRO-ENERGÍA RURAL	EDCF No. HND-5	14,026,400	135,234,760	149,261,160	13,890,539	135,234,760	149,125,299	13,801,678	50,305,040	64,106,718	43%
6	<b>0801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica</b>		90,728,943	1,139,346,928	1,230,075,871	90,728,943	1,095,322,474	1,186,051,417	2,879,918	259,465,251	262,345,168	22%
1	012 - APOYO AL PLAN ESTRATÉGICO DE ACCESO UNIVERSAL A ELECTRICIDAD	ATN/OC-16427-HO-BID	-	4,605,573	4,605,573	-	5,995,563	5,995,563	-	86,236	86,236	1%
2	018 - PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO	ATN/JF-17247-HO ATN-OC-14905-HO BID 3435/BL-HO JICA HO-P6	- - 78,000,000 -	- - 226,543,009 540,100,000	- - 304,543,009 540,100,000	- - 78,000,000 -	5,003,000 - 217,561,886 491,541,000	5,003,000 - 295,561,886 491,541,000	- - 2,782,269 -	- - 75,742,550 16,829,650	- - 78,524,819 16,829,650	0% #iDIV/0! 27% 3%
	<b>Total 018 - PROYECTO DE REHABILITACION Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO</b>		78,000,000	766,643,009	844,643,009	78,000,000	714,105,886	792,105,886	2,782,269	92,572,200	95,354,469	12%
3	020 - APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)	BID 3103/BL-HO GRT/SX-16864-HO	- -	4,158,884 131,364,749	4,158,884 131,364,749	- -	1,383,757 132,796,295	1,383,757 132,796,295	- -	664,698 108,647,676	664,698 108,647,676	48% 82%
	<b>Total 020 - APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)</b>		-	135,523,633	135,523,633	-	134,180,052	134,180,052	-	109,312,374	109,312,374	81%
4	021 - APOYO AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES	ATN/SX-16689-HO	-	4,288,332	4,288,332	-	2,748,342	2,748,342	-	920,067	920,067	33%
5	022 - ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LUGARES AISLADOS	BID-GRT/SX-17123-HO	-	36,627,790	36,627,790	-	34,877,790	34,877,790	-	2,447,667	2,447,667	7%
6	023 - APOYO AL PROGRAMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	BID-4598/BL-HO BID-4599/SX-HO	12,728,943 -	167,064,691 24,593,900	179,793,634 24,593,900	12,728,943 -	13,220,941 190,193,900	25,949,884 190,193,900	97,649 -	3,431,486 50,695,220	3,529,135 50,695,220	14% 27%
	<b>Total 023 - APOYO AL PROGRAMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>		12,728,943	191,658,591	204,387,534	12,728,943	203,414,841	216,143,784	97,649	54,126,706	54,224,355	25%
1	<b>0803 - Empresa Nacional Portuaria</b>		-	-	-	92,764,980	-	92,764,980	87,945,314	-	87,945,314	95%
1	390 - CONSTRUCCIÓN OBRAS DE FACILITACIÓN DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES	FP-23771	-	-	-	92,764,980	-	92,764,980	87,945,314	-	87,945,314	95%
1	<b>0804 - Empresa Hondureña de Telecomunicaciones</b>		87,136,431	-	87,136,431	87,136,431	-	87,136,431	20,000,000	-	20,000,000	23%
1	001 - Proyecto Servicios Convergentes de Nueva Generación	FP-HONDUTEL-22102	87,136,431	-	87,136,431	87,136,431	-	87,136,431	20,000,000	-	20,000,000	23%
2	<b>1801 - Alcaldía Municipal del Distrito Central</b>		-	141,200,000	141,200,000	-	163,485,699	163,485,699	-	45,228,347	45,228,347	28%
1	001 - PROYECTO DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TEGUCIGALPA - COMAYAGUELA)	BID-2465/BL-HO	-	141,200,000	141,200,000	-	141,035,699	141,035,699	-	39,840,367	39,840,367	28%
2	001 - Proyecto para Fortalecer la Prestación de Agua Potable de Tegucigalpa	IDA 6460	-	-	-	-	22,450,000	22,450,000	-	5,387,981	5,387,981	24%

ANEXO No. 1  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública  
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE 2020

Cifras en Lempiras

No.	Gabinete / Institución / Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Devengado Anual			
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./ Vig.)
15	<b>Gabinete Económico</b>		145,780,932	1,170,306,745	1,316,087,677	39,353,508	977,413,015	1,016,766,523	7,495,778	624,453,861	631,949,638	62%
1	<b>0028 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal</b>		3,270,927	48,275,143	51,546,070	2,829,283	48,275,143	51,104,426	2,309,613	45,060,372	47,369,986	93%
1	001 - MEDIDA COMPLEMENTARIA AL PROYECTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL COMUNAL Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN RÍO PLÁTANO (MC-PROTEP)	PN 2016 70 124	3,270,927	48,275,143	51,546,070	2,829,283	48,275,143	51,104,426	2,309,613	45,060,372	47,369,986	93%
1	<b>0037 - Servicio de Administración de Rentas</b>		-	94,165,765	94,165,765	-	77,708,874	77,708,874	-	23,967,404	23,967,404	31%
1	001 - Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Tributaria	BID-3541/BL-HO	-	94,165,765	94,165,765	-	77,708,874	77,708,874	-	23,967,404	23,967,404	31%
1	<b>0051 - Centro Nacional de Educación para el Trabajo</b>		-	2,047,624	2,047,624	-	2,047,624	2,047,624	-	1,084,091	1,084,091	53%
1	001 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA LA FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES EMPRESARIALES INNOVADORES, UBICADO EN LOS MUNICIPIOS DE COMAYAGUA, JESUS DE OTORO Y YAMARANGUILA IXCHEL.	TDR-CENET-23352-1	-	2,047,624	2,047,624	-	2,047,624	2,047,624	-	1,084,091	1,084,091	53%
4	<b>0100 - Secretaría de Finanzas</b>		100,000,000	195,913,977	295,913,977	599,070	35,471,394	36,070,464	599,070	34,897,207	35,496,277	98%
1	001 - Modernización Integral de la Gestión de las Finanzas Públicas	FN 23753-1	100,000,000	-	100,000,000	599,070	-	599,070	599,070	-	599,070	100%
2	052 - MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES	BID3878/BL-HO	-	194,218,327	194,218,327	-	24,472,303	24,472,303	-	24,472,293	24,472,293	100%
3	053 - APOYO A LA ESTRATEGIA DE INVERSION PUBLICA DE MEDIANO PLAZO	BID ATN/OC-15878-HO	-	1,695,650	1,695,650	-	2,133,420	2,133,420	-	2,121,092	2,121,092	99%
4	054 - APOYO A LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE LA ALIANZA PARA LA PROSPERIDAD DEL TRIANGULO NORTE	ATN/OC-15961-HO	-	-	-	-	8,865,671	8,865,671	-	8,303,822	8,303,822	94%
1	<b>0130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social</b>		4,967,720	136,997,339	141,965,059	2,977,197	133,411,336	136,388,533	2,943,903	76,503,070	79,446,973	58%
1	001 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JÓVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR)	DCI-ALA/2014/026-851	4,967,720	136,997,339	141,965,059	2,977,197	133,411,336	136,388,533	2,943,903	76,503,070	79,446,973	58%
6	<b>0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería</b>		37,542,285	692,906,897	730,449,182	32,947,958	676,727,997	709,675,955	1,643,192	439,793,525	441,436,716	62%
1	003 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PARA LA REGION SUR (EMPREDESUR)	FIDA 816-HN	-	-	-	-	21,476,669	21,476,669	-	20,639,243	20,639,243	96%
2	005 - PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL PRO-LENCA	FIDA-I-899-HN FIDA-II-200000125200 GEF-FSS-05-HN	- - -	119,090,162 56,000,000 18,228,068	119,090,162 56,000,000 18,228,068	- - -	90,767,933 47,660,596 34,615,468	90,767,933 47,660,596 34,615,468	- - -	63,221,154 24,134,311 29,833,761	63,221,154 24,134,311 29,833,761	70% 51% 86%
	<b>Total 005 - PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL PRO-LENCA</b>		-	193,318,230	193,318,230	-	173,043,997	173,043,997	-	117,189,226	117,189,226	68%
3	007 - PROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)	BCIE-2101 IN-	37,542,285	399,129,059	436,671,344	32,947,958	203,330,607	236,278,565	1,643,192	113,743,274	115,386,466	49%
4	010 - PROYECTO DE DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO DEL VALLE DE JAMAISTRAN FASE 1	DL98134500295569L	-	97,363,072	97,363,072	-	79,959,190	79,959,190	-	-	-	0%
5	011 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP), DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA (SAG) EN HONDURAS.	DN-No.2000001838-FIDA-SAG	-	3,096,536	3,096,536	-	3,096,536	3,096,536	-	29,412	29,412	1%
6	012 - PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN EN REGADÍO EN LA RIBERA DEL AGUAN	ING-BANK-CREDITO-S/N	-	-	-	-	195,820,998	195,820,998	-	188,192,370	188,192,370	96%
1	<b>0515 - Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación</b>		-	-	-	-	3,770,647	3,770,647	-	3,148,191	3,148,191	83%
1	001 - Apoyo al Fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Honduras.	ATN/OC-16177-HO	-	-	-	-	3,770,647	3,770,647	-	3,148,191	3,148,191	83%
2	<b>Gabinete de Prevención, Seguridad y Defensa</b>		-	521,108,339	521,108,339	-	497,810,160	497,810,160	-	199,482,220	199,482,220	40%
1	<b>0041 - Comisión Permanente de Contingencias</b>		-	108,300,000	108,300,000	-	151,551,225	151,551,225	-	124,909,839	124,909,839	82%
1	001 - PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	IDA 5190-HN	-	108,300,000	108,300,000	-	151,551,225	151,551,225	-	124,909,839	124,909,839	82%
1	<b>0070 - Secretaría de Seguridad</b>		-	412,808,339	412,808,339	-	346,258,935	346,258,935	-	74,572,381	74,572,381	22%
1	004 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS	BID/4518/BL-HO	-	412,808,339	412,808,339	-	346,258,935	346,258,935	-	74,572,381	74,572,381	22%
28	<b>Gabinete Social</b>		195,719,861	1,948,916,969	2,144,636,830	131,843,381	2,896,194,738	3,028,038,119	71,936,486	2,308,203,484	2,380,139,970	79%
3	<b>0050 - Secretaría de Educación</b>		2,497,156	450,407,904	452,905,060	2,497,156	192,857,768	195,354,924	430,664	27,186,171	27,616,835	14%
1	007 - PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)	2014 67 414 (KFW) / FHIS - SE	2,497,156	7,090,712	9,587,868	2,497,156	7,090,712	9,587,868	430,664	644,928	1,075,592	11%

ANEXO No. 1  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública  
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE 2020

Cifras en Lempiras

No.	Gabinete / Institución / Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Devengado Anual			
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./ Vig.)
2	009 - Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven	4449/BL-HO	-	443,317,192	443,317,192	-	181,738,506	181,738,506	-	26,541,243	26,541,243	15%
3	011 - MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN PREBÁSICA EN HONDURAS	6560-HN	-	-	-	-	4,028,550	4,028,550	-	-	-	0%
8	<b>0060 - Secretaría de Salud</b>		<b>1,633,532</b>	<b>995,551,302</b>	<b>997,184,834</b>	<b>-</b>	<b>1,563,681,863</b>	<b>1,563,681,863</b>	<b>-</b>	<b>1,392,992,418</b>	<b>1,392,992,418</b>	<b>89%</b>
1	015 - CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DEL HOSPITAL REGIONAL DEL SUR EN CHOLUTeca	EDCF No. HND-4	1,633,532	258,940,398	260,573,930	-	-	-	-	-	-	#iDIV/0!
2	019 - REEQUIPAMIENTO BIOMEDICO HOSPITAL MARIA ESPECIALIDADES PEDIATRICAS (HMEP)	ITALIA-HOS/MARIA	-	13,972,976	13,972,976	-	37,972,976	37,972,976	-	35,498,732	35,498,732	93%
3	023 - PROYECTO DE MEJORA DE LA GESTION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO-NEONATAL	BID 4619/BL-HO	-	652,420,977	652,420,977	-	330,121,808	330,121,808	-	234,352,237	234,352,237	71%
4	024 - RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PARA CONTENIR Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID - 19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, EN HONDURAS	BID 3815/BL-HO-2 BID 4449/BL-HO-2 BID 4518/BL-HO-3	- - -	- - -	- - -	- - -	356,930,908 228,961,724 166,627,365	356,930,908 228,961,724 166,627,365	- - -	349,488,524 207,408,037 150,412,421	349,488,524 207,408,037 150,412,421	98% 91% 90%
	<b>Total 024 - RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PARA CONTENIR Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID - 19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, EN HONDURAS</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>752,519,997</b>	<b>752,519,997</b>	<b>-</b>	<b>707,308,982</b>	<b>707,308,982</b>	<b>94%</b>
5	025 - PROGRAMA APOYO A LA RED DE INCLUSION SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE	BID 3723/BL-HO	-	68,306,340	68,306,340	-	44,734,606	44,734,606	-	38,561,161	38,561,161	86%
6	025 - PROYECTO DE AYUDA DE EMERGENCIA SANITARIA EN HONDURAS POR COVID-19	BCIE 2162 (III Modificación)	-	-	-	-	372,547,565	372,547,565	-	372,547,565	372,547,565	100%
7	026 - HONDURAS SALUD MESOAMERICA 2015 (HO-G1003) FASE II	GRT/HE-14661-HO GRT/HE-16838-HO	- -	1,910,611 -	1,910,611 -	- -	- 5,958,411	- 5,958,411	- -	- 2,792,563	- 2,792,563	#iDIV/0! 47%
	<b>Total 026 - HONDURAS SALUD MESOAMERICA 2015 (HO-G1003) FASE II</b>		<b>-</b>	<b>1,910,611</b>	<b>1,910,611</b>	<b>-</b>	<b>5,958,411</b>	<b>5,958,411</b>	<b>-</b>	<b>2,792,563</b>	<b>2,792,563</b>	<b>47%</b>
8	027 - PROYECTO HONDURAS - INICIATIVA REGIONAL DE ELIMINACIÓN DE LA MALARIA (IREM EN MESOAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA	GRT/MM-17339-40-HO	-	-	-	-	19,826,500	19,826,500	-	1,931,179	1,931,179	10%
1	<b>0145 - Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>917,792</b>	<b>917,792</b>	<b>-</b>	<b>477,655</b>	<b>477,655</b>	<b>52%</b>
1	001 - CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LABORATORIOS VETERINARIOS REGIONALES DE SENASA EN LAS CIUDADES DE TOCOA, SAN PEDRO SULA, DANLÍ, Y CHOLUTeca	Donación Taiwán 09/11/2017	-	-	-	-	917,792	917,792	-	477,655	477,655	52%
8	<b>0240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social</b>		<b>165,181,186</b>	<b>494,456,677</b>	<b>659,637,863</b>	<b>102,938,238</b>	<b>654,681,916</b>	<b>757,620,154</b>	<b>71,505,822</b>	<b>572,455,645</b>	<b>643,961,467</b>	<b>85%</b>
1	006 - BOLSON ESCOLAR Y EQUIPO DE UTILES	FN-BOLSON ESCOLAR-14-08	7,000,000	-	7,000,000	-	-	-	-	-	-	#iDIV/0!
2	015 - ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL	FN-0000015-14	29,856,800	-	29,856,800	14,068,580	-	14,068,580	14,068,576	-	14,068,576	100%
3	016 - OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR	FN-0000016-14	34,924,902	-	34,924,902	31,432,410	-	31,432,410	-	-	-	0%
4	017 - CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	FN-0000017-14	72,858,500	-	72,858,500	47,437,248	-	47,437,248	47,437,246	-	47,437,246	100%
5	018 - PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO VIDA MEJOR) BID 3371/BL-HO	BID 3371/BL-HO	20,540,984	143,184,778	163,725,762	10,000,000	146,738,824	156,738,824	10,000,000	110,779,143	120,779,143	77%
6	020 - PROGRAMA APOYO A LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE	BID 3723/BL-HO	-	70,210,470	70,210,470	-	137,153,826	137,153,826	-	123,179,255	123,179,255	90%
7	021 - PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL / 6401-HN	6401-HN	-	281,061,429	281,061,429	-	169,557,151	169,557,151	-	142,923,978	142,923,978	84%
8	022 - APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 5008/BL-HO	5008/BL-HO	-	-	-	-	201,232,115	201,232,115	-	195,573,269	195,573,269	97%
2	<b>0244 - Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer</b>		<b>-</b>	<b>8,501,086</b>	<b>8,501,086</b>	<b>-</b>	<b>8,716,586</b>	<b>8,716,586</b>	<b>-</b>	<b>4,713,808</b>	<b>4,713,808</b>	<b>54%</b>
1	001 - Centros de Atención Integral para mejorar las condiciones de vida de las mujeres hondureñas (Ciudad Mujer)	BID-3771/BL-HO	-	8,501,086	8,501,086	-	8,501,086	8,501,086	-	4,713,808	4,713,808	55%
2	003 - SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y UN ENTORNO FAVORABLE PARA LAS EMPRESARIAS DE HONDURAS	ATN/WE-17867-HO	-	-	-	-	215,500	215,500	-	-	-	0%



ANEXO No. 1  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública  
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE 2020

Cifras en Lempiras

No.	Gabinete / Institución / Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Devengado Anual			
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./ Vig.)
4	<b>0402 - Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras</b>		-	-	-	-	449,229,813	449,229,813	-	287,285,952	287,285,952	64%
1	001 - MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES	BID3878/BL-HO	-	-	-	-	127,405,691	127,405,691	-	97,830,267	97,830,267	77%
2	001 - TELESALUD PARA MITIGAR EL CORONAVIRUS Y MEJORAR EL ACCESO A LA SALUD EN HONDURAS	ATN / ME-17959-HO	-	-	-	-	1,105,116	1,105,116	-	-	-	0%
3	002 - Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven	4449/BL-HO	-	-	-	-	79,535,104	79,535,104	-	70,542,432	70,542,432	89%
4	003 - PROYECTO DE MEJORA DE LA GESTION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO-NEONATAL	BID 4619/BL-HO	-	-	-	-	241,183,902	241,183,902	-	118,913,253	118,913,253	49%
1	<b>0702 - Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán</b>		26,407,987	-	26,407,987	26,407,987	-	26,407,987	-	-	-	0%
1	003 - Construcción de Edificio Multifuncional de Talleres y Laboratorios en el Centro Universitario Regional de San Pedro Sula de la UPNFM	FN 0000057-11 UPNFM	26,407,987	-	26,407,987	26,407,987	-	26,407,987	-	-	-	0%
1	<b>0703 - Universidad Nacional de Agricultura</b>		-	-	-	-	26,109,000	26,109,000	-	23,091,836	23,091,836	88%
1	005 - INCLUSION SOCIAL A LA EDUCACIÓN SUPERIOR E IMPULSO DE LA PRODUCCIÓN SUSTENTABLE (UNA/PINPROS)	BCIE 2069	-	-	-	-	26,109,000	26,109,000	-	23,091,836	23,091,836	88%
91	<b>Total PIP</b>		1,152,983,768	8,357,277,136	9,651,460,904	1,024,327,565	10,196,498,649	11,220,826,214	587,347,863	6,533,612,698	7,120,960,561	63%
1	Fondos Social Reducción de la Pobreza (Vida Mejor)	FN	4,500,000,000		4,500,000,000	4,500,000,000		4,500,000,000	4,485,818,423		4,485,818,423	100%
5	Proyectos APP'S	FN	4,576,900,000		4,576,900,000	2,418,800,000		2,418,800,000	1,131,866,604		1,131,866,604	47%
1	Programa de Infraestructura Vial	FN	2,500,000,000		2,500,000,000	3,113,000,000		3,113,000,000	3,112,985,869		3,112,985,869	100%
1	Fideicomiso de Inversiones y Asignaciones (FINA II)	FN	1,013,000,000		1,013,000,000	1,004,300,000		1,004,300,000	740,830,000		740,830,000	74%
1	Reserva Presupuestaria (449)	FN		2,970,000,000	2,970,000,000		241,200,000	241,200,000	-		-	0%
100	<b>Total General</b>		13,742,883,768	11,327,277,136	25,211,360,904	12,060,427,565	10,437,698,649	22,498,126,214	10,058,848,758	6,533,612,698	16,592,461,456	73.8%
