



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

Informe de Avance Físico y Financiero

Secretaría de Educación (SEDUC)

Al IV Trimestre, 2021

Tegucigalpa M. D. C.

Honduras, C.A.

Enero, 2022

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Secretaría de Educación (SEDUC) encargada de la formulación, coordinación, ejecución y evaluación de las políticas relacionadas con todos los niveles del Sistema Educativo Formal; Al Cuarto Trimestre del año 2021 cuenta con 2 proyectos de inversión adscritos en el Programa de Inversión Pública, mismos que en su totalidad representan el 29.8% del Presupuesto Vigente en el Sector Educación. En el cuadro No. 1 se presenta el Presupuesto de Inversión y ejecución financiera al término del trimestre en evaluación.

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del 2021
Cifras en Lempiras


Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	311,664,930
Presupuesto Vigente	165,026,481
Devengado IV Trimestre-2021	4,232,224
% Ejecución (Devengado IV Trim-2021/ Vigente)	3%
Devengado Anual	12,477,747
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	8%

Fuente: SIAFI, 31/12/2021
Cifras preliminares

Al cierre del año 2021, la SEDUC reportó ejecución presupuestaria de L12.5 millones (8%) a nivel de devengado; orientados al apoyo en el diseño y formulación en conjunto con SEDECOAS/FHIS para obras de infraestructura escolar, así como la participación en la supervisión de centros educativos beneficiarios; así como, la mejora de la capacidad institucional de la Secretaría para la gestión del Nivel Pre básica mediante el fortalecimiento de las prácticas de enseñanza de docentes y educadoras a nivel nacional; y los entornos de aprendizaje físico.

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

GRÁFICO NO. 01
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN:
FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN POR FUENTE
(CIFRAS EN LEMPIRAS)

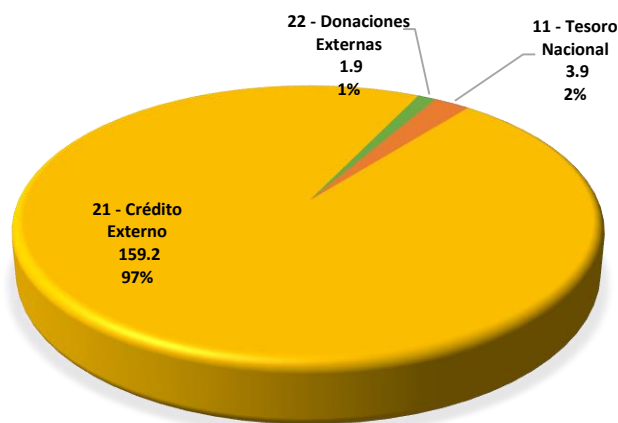

El Programa de Inversión vigente de la SEDUC, es financiado con recursos de Crédito Externo (97%) proveniente del Banco Mundial (BM), Donaciones Externas (1%) por parte del Gobierno Alemán (KFW) y Banco Mundial (BM); el restante 2% con Recursos Nacionales como contraparte a la contribución del KFW.

Al Cuarto Trimestre del 2021, se contó con un Presupuesto Vigente de L165.0 millones ejecutando en el período un acumulado de L12.5 millones (8%) a nivel de devengado de los recursos asignados en relación a dicho Presupuesto. El financiamiento de la inversión para la Secretaría de Educación se refleja en el gráfico No. 1.

SECRETARÍA DE FINANZAS

La ejecución refleja principalmente la inadecuada planificación de las Unidades Ejecutoras en relación a los requerimientos de recursos solicitados para dicho ejercicio fiscal; la ejecución imputada se basa en el pago de honorarios por consultorías contratadas por la Unidad Ejecutora (BM), así como gastos administrativos y viáticos en el PROMINE.

Ver Detalle de Proyectos, Ejecución Financiera en Anexo No. 4.

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

A continuación, se detalla la ejecución financiera trimestral y acumulada de la vida de los proyectos adscritos a la Secretaría de Educación:

Programa: “Mejora de la Infraestructura Escolar (PROMINE/KFW, FASE IV)” (Componente SEDUC):

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
Programa: “Mejora de la Infraestructura Escolar (PROMINE/KFW, FASE IV)” (Componente SEDUC)	2014 67 414 (KFW) / FHIS - SE	Lempiras	59,554,506	03/12/2015 30/11/2022
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
IV Trimestre 2021	9,487,049	5,816,049	1,268,190	22%
Acumulado 2021	9,487,049	5,816,049	3,185,438	55%
Acumulado Vida del Proyecto *	59,554,506	59,554,506	33,786,224	57%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 31/12/2021 (BCH): L24.2015 por US\$1.00

Cifras Preliminares

El Programa se enfoca en dotar de una infraestructura educativa adecuada, que permita una educación en condiciones pedagógicas modernas, considerando también el uso de los espacios exteriores, promoviendo una educación por valores. Además, está la incorporación del rol de las escuelas en la prevención de la violencia y los espacios escolares seguros, con locales adecuados a las diversas condiciones climáticas y culturales de Honduras.

Para el año 2021, se programó en el Plan Operativo Anual (POA-Presupuesto SIAFI) las siguientes actividades:

- Diseño y formulación de 15 proyectos de Obra de Infraestructura Escolar.
- Supervisión de 24 Centros Educativos con proyectos de Obra de Infraestructura Educativa en los niveles Pre básica y Básica en los Departamentos: Ocotepeque, Lempira, Copán, Francisco Morazán, Valle, Choluteca, Comayagua y Gracias a Dios.
- Diseño y formulación de 12 proyectos de Obra de Infraestructura Escolar.
- Fortalecer con material didáctico, 200 Centros Educativos a nivel de Bachilleratos Técnicos Profesional (BTP).

Cabe señalar que no se evidencia ejecución física del POA en SIAFI, al IV Trimestre del 2021.

Ejecución al IV Trimestre 2021; Secretaría de Educación

SECRETARIA DE FINANZAS

De acuerdo a lo reportado por la Unidad Ejecutora, en el marco del PROMINE/KFW en relación a las actividades realizadas desde el ámbito de la Supervisión de Infraestructura, Seguridad Alimentaria y Temas Administrativos se detallan las siguientes:

- ✓ Desarrollo de 8 consultorías en el fortalecimiento a la ejecución del PROMINE (Fase IV):
 - Formador y Diseñador (Arquitecto) para la supervisión y seguimiento de proyectos en La Paz e Intibucá.
 - Formador y Diseñador (Estructural) para la supervisión y seguimiento de proyectos en Ocotepeque, Copán y Santa Bárbara.
 - Supervisor de Proyectos Eléctricos (supervisión y seguimiento de proyectos en La Paz, Intibucá, Lempira Ocotepeque, Copán, Santa Bárbara y Gracias a Dios).
 - Desarrollador de Sistema de Planificación de Infraestructura Educativa (SIPLIE) (Consultoría en Francisco Morazán).
 - Coordinador de Seguridad Alimentaria Cambio Climático Occidente / Corredor Seco para la supervisión y seguimiento de proyectos en La Paz, Intibucá, Lempira Ocotepeque, Copán y Santa Bárbara.
 - Asistente Administrativo (supervisión y seguimiento de proyectos en Francisco Morazán).
 - Asesor legal (seguimiento de procesos legales y titulación de tierra de centros educativos) para La Paz, Intibucá, Lempira Ocotepeque, Copán, Santa Bárbara, Choluteca, valle, Comayagua y Gracias a Dios.
 - Asesoramiento en procesamiento agroalimentario PROMINE de la Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles (DIGECEBI), para la supervisión, asesoramiento y seguimiento de proyectos Bachillerato Técnico Profesional (BTP) Procesamiento Agroalimentario en La Paz y Lempira.

- ✓ Visitas realizadas por los Supervisores Departamentales para la supervisión y seguimiento de proyectos en ejecución: en las cuales se verifica la pre factibilidad técnica y social de proyectos; revisión de expedientes de proyectos; visitas de supervisión, verificación de calidad de materiales, verificación de protocolos de bioseguridad, verificación de actividades de proyectos, construcción de huertos educativos y productivos, generación de recomendaciones, y la recepción y seguimiento de expedientes de Legalización correspondientes a Centros Educativos del Programa PROMINE.

En cuanto a la baja ejecución reportada la DIGECEBI indica que se generó retrasos con la validación de planillas para pago de honorarios profesionales en SIREP (contratos con consultores), adicionalmente, el proceso adjudicado para la adquisición de botes de tinta para impresora de flujo el proveedor no cumplió con la entrega del producto.

En relación con la ejecución del proyecto en la Fase V; la unidad ejecutora ha indicado que se reprogramará su inicio considerando la disponibilidad de recursos de la Fase IV, así mismo, por indicaciones del Cooperante se dará inicio hasta que haya finalizado la Auditoria correspondiente a la Fase IV (período 2018 -2020).

SECRETARIA DE FINANZAS

Proyecto: “Mejoramiento de la Calidad de la Educación Pre básica en Honduras” (IDA 6560-HN):

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$		
Mejoramiento de la Calidad en la Educación Prebásica en Honduras	6560-HN TF0B2218-HN	US\$	39,500,000	31/07/2020
		Lempiras	955,959,250	31/07/2025
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
IV Trimestre 2021	302,177,881	159,210,432	2,964,034	2%
Acumulado 2021	302,177,881	159,210,432	9,292,309	6%
Acumulado Vida del Proyecto *	955,959,250	955,959,250	9,292,309	1%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 31/12/2021 (BCH): L24.2015 por US\$1.00

Cifras Preliminares

En fecha 16 de junio de 2020, el Gobierno de Honduras suscribe con la Asociación Internacional del Fomento (Banco Mundial) y la Alianza Mundial para la Educación (AME), Acuerdo de Financiamiento (No. 6560-HN) y Acuerdo de Subvención (No. TF0B2218-HN) respectivamente para el financiamiento por un monto total de US\$39.5 millones. El proyecto consiste en la mejora de la capacidad institucional de Secretaría de Educación (SEDUC) para la gestión de este nivel educativo; las prácticas de enseñanza de docentes y educadoras a nivel nacional; y los entornos de aprendizaje físico en centros de Pre básica que atienden educandos vulnerables de regiones seleccionadas.

Para el año 2021, se programó en el Plan Operativo Anual (POA-Presupuesto SIAFI) las siguientes actividades:

- Fortalecer la gestión institucional de la SEDUC mediante la actualización del Diseño Curricular para todas las modalidades de Atención del Nivel de Educación Pre básica (Elaboración de 3 documentos).
- Mejora del Diseño Curricular actualizado para todas las Modalidades de Atención del nivel de Educación Pre básica y Prácticas de Enseñanza en Centros de Educación pre básica (CEPB) y Centros Comunitarios de Educación pre básica (CCEPREB) (Elaboración de 2 documentos).
- Un Estudio de factibilidad para entornos físicos de aprendizaje ampliados y/o mejorados en Centros de Educación Pre básica Seleccionados que atienden a niños(as) en los departamentos focalizados: Gracias a Dios, Lempira, Yoro, Olancho, Copán, El Paraíso
- 4 Informes de gestión y evaluación del Proyecto.
- Fortalecida y funcionando la gestión institucional de la SEDUC con el Modelo de la Calidad en la Gestión de la Educación Pre básica (MEP), para todas las modalidades de atención del nivel e instancias de Participación Comunitaria y Escolar fortalecidas y funcionando (Elaboración de 1 documento).

SECRETARÍA DE FINANZAS

De acuerdo a lo reportado por la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP), se encuentran en ejecución 11 contratos de consultorías: coordinación general, coordinación de adquisiciones, coordinación administrativa y financiera, (especialistas ambientales y sociales en proceso de contratación), técnico en formación permanente, especialista en monitoreo y evaluación, especialista en adquisiciones y contrataciones de infraestructura, oficial técnico en construcciones escolares, oficial técnico en educación pre básica, asesor legal para la Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles (DIGECEBI), oficial de adquisiciones para la UCP y la Consultoría individual para el Diseño del Programa de Fortalecimiento de los Consejos Municipales de Desarrollo Educativo (COMDE).

Al cuarto trimestre de acuerdo a las principales actividades realizadas por la UCP, se reporta lo siguiente:

- Habilitado el usuario en la Plataforma PAMEH de la Dirección de Franquicias Aduaneras, para el proceso de aprobación de órdenes de compra exoneradas del impuesto sobre ventas del Proyecto.
- Aprobación de los cinco Módulos e instructivo para el facilitador de la Consultoría de Diseño del Programa de Fortalecimiento a los Consejos Municipales Desarrollo Educativo (COMDE).
- Socializado a los Subdirectores Departamentales Administrativo y Financiero, Subdirectores Departamentales de Currículo y Evaluación y a las Coordinadoras de Educación Prebásica el Instructivo para el pago de educadores CCEPREB y docentes CEPB que regularice las funciones, roles y procedimientos en el nivel central, departamental y municipal.
- Aprobación por parte del Banco Mundial a la exención que permite presentar el primer informe de auditoría del proyecto para el periodo 11 de noviembre 2020 al 31 de diciembre del año 2022, con fecha de vencimiento de dicho informe de auditoría al 30 de junio del año 2023.
- Procesos adjudicados de las consultorías siguientes:
 - Oficial Financiero para el desembolso del Proyecto
 - Oficial Contable para el desembolso del Proyecto
 - Especialista de Control y Monitoreo de Proyectos para DIGECEBI
- Aprobación del III desembolso de fondos para el proyecto por parte del BM.
- Aprobación del documento técnico del CNB y Propuesta de actualización del documento Marco Normativo del CNB en relación con el nivel de Educación Prebásica.
- Elaboración y Remisión del POA 2022 y el Plan Plurianual 2021-2025 a la Subsecretaría de Asuntos Técnico Pedagógicos para su respectiva aprobación.

La Ejecución al cierre del IV trimestre para el Proyecto Mejoramiento en la Calidad de la Educación Prebásica, como lo refleja el porcentaje 2% es insatisfactorio, por las razones siguientes que se replantean a continuación:

- Demora en los trámites de procesos y procedimientos internos dentro de la SEDUC.
- Demora en la entrega de términos de referencia y especificaciones técnicas que presentan las Unidades de línea involucradas en el proyecto para la ejecución de actividades.
- Demora en las firmas de contratos.

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Durante el cuarto trimestre se realizaron las siguientes actividades y/o acciones en apoyo a los proyectos de inversión:

- Revisión y actualización de la Proyección Mensual (octubre - diciembre) de ejecución para el Año 2021
- Apoyo en seguimiento a las solicitudes de cuotas de compromiso mensuales de Crédito Externo para su gestión ante TGR en función de las proyecciones de ejecución reportadas por las Unidades ejecutoras de Proyectos.
- Emisión y Aprobación de Dictámenes para traslados presupuestarios entre grupos 200 y 300 en SIAFI, en cumplimiento a los artículos 27 y 32 de las Normas de Ejecución Presupuestaria para el 2021 (Decreto Legislativo No. 182-2020).
- Seguimiento y monitoreo para apoyo a la diferentes Unidades Ejecutoras de SEDUC.

Conclusiones

- Al cierre del año 2021, la SEDUC registró ejecución financiera del 8% ejecución insatisfactoria (L.12.5 millones) en relación al Presupuesto Vigente asignado, que refleja principalmente la inadecuada planificación de las Unidades Ejecutoras en relación a los requerimientos de recursos solicitados para dicho ejercicio fiscal; la ejecución imputada se basa en el pago de honorarios por consultorías contratadas por la Unidad Ejecutora (BM), así como gastos administrativos y viáticos en el PROMINE.
- El Programa PROMINE continúa la ejecución de las actividades correspondientes a la Fase IV; con respecto a la ejecución de la Fase V se reprograma el inicio considerando la disponibilidad de recursos de la Fase IV, así mismo, por indicaciones del Cooperante se debe realizar la Auditoria correspondiente a la Fase IV (período 2018 -2020).
- El Proyecto de Mejora de la Calidad de la Educación Prebásica, reportó limitaciones en la ejecución relacionadas a retrasos en las contrataciones del diseño del Sistema de Gestión de la Calidad de la Educación Prebásica (MEP) e impresión y distribución del mismo; retrasos en la adquisición de la compra de equipo de oficina, infotecnología y transporte para la SDGEPB, DIGECEBI y la UCP; retrasos en la definición del alcance de los TdRs para la revisión funcional de la UPEG y la Unidad del Sistema Nacional de Información Educativa de Honduras (USINIEH), entre otros.

Recomendaciones

- Para la gestión 2021, las unidades ejecutoras deberán realizar una programación financiera que les permita contar con todos los recursos necesarios según las actividades y procesos que estas realicen, priorizar actividades haciendo uso eficiente de los recursos.
- Se recomienda registrar la programación y ejecución física en SIAFI conforme a los planes de ejecución de los Proyectos.

SECRETARIA DE FINANZAS

- Se recomienda a las Unidades Ejecutoras realizar una planificación acorde a la realizada, tomando en consideración acciones de involucramiento de las diferentes dependencias y los tiempos de respuesta internos.

ANEXO No. 04
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE 2021
 Cifras en Lempiras

No.	Gabinete / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado (Devengado IV Trimestre)				Ejecutado (Devengado Anual)			
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)
2	EDUCACION			3,867,578.00	307,797,352.00	311,664,930.00	3,867,578.00	161,158,903.00	165,026,481.00	664,592.44	3,567,631.41	4,232,223.85	0.03	1,306,990.61	11,170,756.41	12,477,747.02	0.08
2	0050 - Secretaría de Educación			3,867,578.00	307,797,352.00	311,664,930.00	3,867,578.00	161,158,903.00	165,026,481.00	664,592.44	3,567,631.41	4,232,223.85	3%	1,306,990.61	11,170,756.41	12,477,747.02	8%
1	007 - PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)	2014 67 414 (KFW) / FHIS - SE	10/07/2012 31/07/2023	-	-	-	979,445.00	1,948,471.00	2,927,916.00	217,144.57	603,597.78		0%	823,206.44	1,878,447.78	2,701,654.22	92%
		BMZ 2016 68 763		3,867,578.00	5,619,471.00	9,487,049.00	2,888,133.00	-	2,888,133.00	447,447.87			0%	483,784.17	-	483,784.17	17%
Total 007 - PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PRO				3,867,578.00	5,619,471.00	9,487,049.00	3,867,578.00	1,948,471.00	5,816,049.00	664,592.44	603,597.78	1,268,190.22	22%	1,306,990.61	1,878,447.78	3,185,438.39	55%
2	010 - MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN PREBÁSICA EN HONDURAS	6560-HN	31/07/2020 31/07/2025		277,250,876.00	277,250,876.00		159,210,432.00	159,210,432.00		2,964,033.63	2,964,033.63	0%		9,292,308.63	9,292,308.63	6%
		TFOB2218-HN			24,927,005.00	24,927,005.00		-	-						-	-	
Total 010 - MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN PREBÁSICA EN HONDURAS				302,177,881.00	302,177,881.00	302,177,881.00	159,210,432.00	159,210,432.00	159,210,432.00	2,964,033.63	2,964,033.63	2%	9,292,308.63	9,292,308.63	9,292,308.63	6%	

Fuente: SIAFI al 31/12/2021

ANEXO No. 05
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS
 Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al IV Trimestre, 2021

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			IV Trimestre 2021		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Secretaría de Educación								
007 - PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)	03 - Proyectos obra de infraestructura educativa en los niveles prebásica, básica y de manera limitada en el nivel medio en los departamentos de: Ocotepeque, Lempira , Intibucá, la Paz, Santa Barbara y Copán en la zona de occidente. Francisco Morazán, valle, Choluteca, Comayagua y Gracias a Dios, supervisados.	Obra de Infraestructura	12	0	0%	12	0	0%
	04 - Proyectos obra de infraestructura escolar, diseñados y formulados.	Proyecto	15	0	0%	15	0	0%
	05 - Bachilleratos Técnicos Profesional (BTP) fortalecidos con material didáctico.	Centro Educativo	1	0	0%	1	0	0%
	14 - Proyectos obra de infraestructura escolar, diseñados y formulados.	Proyecto	12	0	0%	12	0	0%
	15 - Proyectos obra de infraestructura educativa en los niveles Prebásica y básica en los departamentos de: Ocotepeque, Lempira y Copán en la zona de occidente. Francisco Morazán, valle, Choluteca, Comayagua y Gracias a Dios, supervisados.	Obra de Infraestructura	12	0	0%	12	0	0%
010 - MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN PREBÁSICA EN HONDURAS	08 - Gestión institucional de la SE fortalecida con el diseño curricular actualizado para todas las modalidades de atención del nivel de Educación Prebasica, instancias de Participación Comunitaria y escolar fortalecidas y funcionando. (DLI)	Documento	4	0	0%	1	0	0%
	09 - Diseño Curricular actualizado para todas las Modalidades de Atención del nivel de Educación Prebásica y Prácticas de Enseñanza en CEPB y CCPREB mejoradas.	Documento	1	0	0%	1	0	0%
	10 - Entornos Físicos de Aprendizaje ampliados y/o mejorados en Centros de Educación Prebásica Seleccionados que atienden a niños(as) en los departamentos focalizados: Gracias a Dios, Lempira, Yoro, Olancha, Copán, El Paraíso.	Estudio de Prefactibilidad	1	0	0%	1	0	0%
	11 - Gestión y Evaluación del Proyecto	Informe	4	0	0%	1	0	0%
	12 - Gestión institucional de la SE fortalecida con el Modelo de la Calidad en la Gestión de la Educación Prebásica (MEP), para todas las modalidades de atención del nivel e instancias de Participación Comunitaria y Escolar fortalecidas y funcionando.	Documento	1	0	0%	1	0	0%
	13 - Diseño Curricular actualizado para todas las Modalidades de Atención del nivel de Educación Prebásica y Prácticas de Enseñanza en CEPB y CCPREB mejoradas (DLI)	Documento	1	0	0%	1	0	0%

Fuente: SIAFI, al 31/12/2021
