

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e
Inversión Pública



Informe de Avance Físico y Financiero

AL I TRIMESTRE 2022

**Secretaría de Desarrollo Comunitario
Agua y Saneamiento
(SEDECOAS/FHIS)**

Tegucigalpa, Honduras

Abril, 2022

www.sefin.gob.hn

IV. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

4.1 EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

La Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS) - Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) cuya finalidad es la de promover el mejoramiento de las condiciones de vida de los grupos sociales marginados en el área rural y urbana, mediante el otorgamiento de financiamientos para

Cuadro No. 05

Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del 2022


Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	1,743,849,872
Presupuesto Vigente	1,743,849,872
Devengado I Trimestre-2022	4,967,502
% Ejecución (Devengado I Trim-2022/ Vigente)	0.3%
Devengado Anual	4,967,502
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	0.3%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	4,976,002
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	0.3%

Fuente: SIAFI, 31/03/2022

programas y proyectos de desarrollo social o económico, con el propósito de aumentar su productividad, sus niveles de empleo y de ingresos y de contribuir a la satisfacción de sus necesidades básicas.

Gráfico No. 6
Presupuesto Vigente
Financiamiento por Organismo
Cifras en Millones de Lempiras

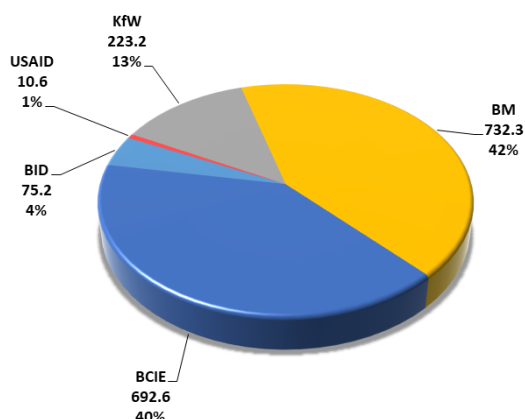

Al primer trimestre del año 2022 la institución contó con un presupuesto vigente de **L1,743.8 millones** y la ejecución presupuestaria del trimestre asciende a un monto de **L4.9 millones** lo que representa el (0.3%) con relación al presupuesto vigente, tal como se detalla en el Cuadro No. 5.

Dicha ejecución se llevó a cabo a través de (7) siete proyectos enfocados en Agua y Saneamiento, Electrificación Rural y Caminos Rurales, Infraestructura Social,

Infraestructura Escolar, Fortalecimiento de Capacidades para Jóvenes, Recuperación de Espacios Públicos y Mejora de la Infraestructura Básica. Ver Detalle de Ejecución Financiera en Anexo No. 4.



Del total del financiamiento, el 88.4% corresponde a fondos provenientes de crédito externo expresado en términos monetarios con un monto de **L1,541.2 millones**, el 11.1% a recursos de donaciones externas con un monto de **L192.8 millones**; y la contraparte nacional corresponde a gastos operativos con un monto vigente de **L9.8 millones** equivalente a 0.6%.

Con relación al presupuesto vigente con recursos externos para la ejecución de los proyectos ésta se distribuye por; Banco Mundial con 42%, BCIE con el 40%, KfW Banco Alemán con 13%, USAID con el 4% y Banco Interamericano de Desarrollo con el 1%.

4.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión en el primer trimestre del año 2022 se concentró en los siguientes proyectos:

- 1 Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y su Gestión Local (PROMINE).
- 2 Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB).
- 3 Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras (MIFE).
- 4 Proyecto Convivencia y Espacios Seguros para los Jóvenes en Honduras (CONVIVIR).
- 5 Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras (PRE).
- 6 Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (ICS).
- 7 Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Ciudad de Gracias, Departamento de Lempira.

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros de los principales proyectos de acuerdo a su presupuesto vigente:

Programa Modernización de la Infraestructura Educativa (PROMINE)

PROMINE tiene por objetivo general fortalecer la rectoría Sectorial en Infraestructura Educativa de la Secretaría de Educación y la gestión local participativa, así como mejorar el acceso de los alumnos y alumnas de las comunidades pobres al Centro Educativo de calidad que operan de manera sostenible. De esa manera se pretende contribuir al aumento de la eficiencia y de la calidad del sistema educativo (pre-básico y básico).

Con relación a la Fase IV, actualmente se han considerado 44 proyectos de los cuales, 34 se encuentran formulados (de estos 29 están contratados y por iniciar su ejecución y el resto en proceso de contratación), 7 en formulación, 2 no factibles y 1 pendiente de formulación, alcanzando 66% de ejecución física.

Los principales avances físicos al 31 de marzo de 2022, son los siguientes:

- Se ha realizado la visita a los proyectos en el departamento de Gracias a Dios para determinar los montos reconocidos, hacer las liquidaciones y las nuevas formulaciones.
- Se finalizó un proyecto que representa 298 beneficiados y según el sistema estos proyectos han generado 32 empleos.

A continuación, véase la ejecución histórica del Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y de su Gestión Local (PROMINE), primer trimestre 2022:

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto*/	Inicio-Fin	
Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y de su Gestión Local (PROMINE)	SE/FHIS VIII No.2008-66-178 2014 67 414 (KFW) / FHIS - SE Fondos de Donación	1,608,626,596	10/07/2012 - 31/07/2023	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	
I Trimestre 2022	188,312,919	188,312,919	653,786	0.3
Acumulado 2022	188,312,919	188,312,919	653,786	0.3
Acumulado Vida del Proyecto*/	1,608,626,596	1,608,626,596	1,158,377,331	72.0

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB)

Consisten en contribuir a mejorar la convivencia ciudadana en Honduras a través de la mejora en la calidad de vida en barrios vulnerables y la reducción de la incidencia de delitos violentos. Los objetivos específicos son: (I) mejorar el hábitat de barrios urbanos vulnerables, aumentando el acceso a infraestructura de servicios básicos y de prevención para disminuir delitos de robos y violaciones sexuales; (II) reducir los niveles de incidencia de homicidios y violencia intrafamiliar (VIF) en los municipios intervenidos mejorando los servicios de prevención y atención a víctimas de la violencia; y (III) mejorar la efectividad policial en investigación criminal, a través del incremento de la proporción de casos de homicidio con agresor identificado e informe de investigación aceptado por el Ministerio Público.

Los principales avances físicos al 31 de marzo de 2022, son los siguientes:



- Se adjudicó en el mes de enero de 2022 el Proyecto de Integración Urbana en colonias Montes de los Olivos, Nueva Jerusalén No. 2, Brisas del Mogote Altos de la Quezada, La Huerta, Villas San Miguel, Brisas del Roble, y Altos del Mirador para un total de 3,035, predios; debido a que este proyecto sobrepasa el período de gobierno, se está gestionando su aprobación en el Congreso Nacional acorde al artículo 114 de las disposiciones generales del presupuesto del año 2022.
- Se impartieron seis (6) disciplinas olímpicas: taekwondo, levantamiento de Pesas, tenis de Mesa, atletismo, balonmano y lucha olímpica.
- En el primer trimestre se inició la capacitación de 29 mujeres en emprendimiento de negocios de alimentos; se espera finalizar la capacitación en el mes de mayo.

A continuación, véase la ejecución histórica del Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB), primer trimestre 2022:

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto*/	Inicio-Fin	
Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB)	BID/4518/BL-HO ATN/OC-17135-HO	369,377,190	01/10/2018 - 01/10/2023	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
I Trimestre 2022	75,224,516	75,224,516	2,929,021	4
Acumulado 2022	75,224,516	75,224,516	2,929,021	4
Acumulado Vida del Proyecto*/	369,377,190	369,377,190	277,043,977	75

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras (MIFE)

Este Programa tiene como objetivo fortalecer la educación en Honduras para que los educandos tengan un acceso eficiente, con la permanencia necesaria en los Centros de Educación Media y sean promovidos con la calidad requerida. El programa estará localizado en los departamentos de: Atlántida, Choluteca, Colón, Comayagua, Copán, Cortés, El Paraíso, Francisco Morazán, Gracias a Dios, Intibucá, Islas de la Bahía, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Santa Bárbara, Valle, Yoro.

El Programa beneficiará 480 niños de Educación prebásica, 40,759 niños de Educación Básica y 43,801 jóvenes de Educación Media, haciendo un total de 85,040 educandos de los tres niveles del sistema educativo, así mismo 3,821 docentes de Educación Prebásica, 3,821 docentes de Educación Básica, 15,285 docentes de educación media, haciendo un total de 22,923 docentes. La duración del programa es de 4 años desde el



2020 hasta el 2023 donde habrá un desarrollo gradual de la infraestructura y la dotación de equipo, así como la formación permanente y la plataforma virtual para emprendimiento.

Los principales avances físicos al 31 de marzo de 2022, son los siguientes:

- Con personal de SEDECOAS/FHIS se visitaron 131 proyectos, teniendo la formulación de 74 proyectos. A la fecha no hay ningún proyecto licitado debido a cambios de priorización de la SEDUC se solicitó excepción para hacer procesos de comparación de precios, en proceso de reformulación de proyectos se espera lanzar a licitación 37 escuelas.

A continuación, véase la ejecución histórica del Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras (MIFE), primer trimestre 2022:

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto*/	Inicio-Fin	
Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras (MIFE)	BCIE - 2239	1,971,360,000	30/09/2020 - 30/09/2023	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
I Trimestre 2022	499,467,419	499,467,419	-	-
Acumulado 2022	499,467,419	499,467,419	-	-
Acumulado Vida del Proyecto*/	1,971,360,000	1,971,360,000	114,393,414	6

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Proyecto Convivencia y Espacios Seguros para los Jóvenes en Honduras (CONVIVIR)

El programa abarca la construcción, el mejoramiento y el equipamiento de infraestructura social para jóvenes y espacios públicos, financiamiento y/o cofinanciamiento del trabajo con jóvenes y la capacitación de jóvenes, la capacitación de personal de las instituciones involucradas, las municipalidades seleccionadas, las comunidades de barrio y servicios de consultoría.

Los principales avances físicos al 31 de marzo de 2022, son los siguientes:

- Reuniones con las Autoridades Municipales, Equipo Técnico de las alcaldías y Representantes de patronatos, con el fin de dar a conocer el trabajo y la necesidad de información que se va a requerir de cada uno de ellos para cumplir con los objetivos de la Línea Base. Hay procesos de licitación para conformar la unidad ejecutora son 5 concursos 1 LPN y 4 concursos privados.

A continuación, véase la ejecución histórica del Proyecto Convivencia y Espacios Seguros para los Jóvenes en Honduras (CONVIVIR), primer trimestre 2022:

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto*/	Inicio-Fin	
Proyecto Convivencia y Espacios Seguros para los Jóvenes en Honduras (CONVIVIR)	BMZ Nr. 2016 65348	170,029,800	17/07/2021 - 31/12/2023	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
I Trimestre 2022	44,718,737	44,718,737	-	-
Acumulado 2022	44,718,737	44,718,737	-	-
Acumulado Vida del Proyecto*/	170,029,800	170,029,800	7,554,733	4

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras (PRE)

Tiene como objetivo Coordinar, impulsar y fortalecer capacidades para el conocimiento del riesgo, reducción del mismo y manejo de desastre, como una estrategia para mejorar la eficiencia en la preparación para la respuesta y la recuperación post desastre naturales.

Su propósito es la atención de la infraestructura dañada por el Huracán y Tormenta Tropical Eta: rehabilitación de pasos y caminos terciarios, reparación y construcción de cajas puentes rehabilitación y construcción de sistemas de drenaje, puentes (Bailey), construcción de calles terciarias, obras de mitigación entre otras.

Los principales avances físicos al 31 de marzo de 2022, son los siguientes:

- La Unidad Ejecutora del Proyecto a través de su personal técnico y con el apoyo de la Dirección de Proyectos de la SEDECOAS/FHIS ha realizado revisiones a la formulación de los subproyectos priorizados, para verificar que estos estén cumpliendo con los lineamientos técnicos, ambientales, sociales, y otros relevantes que son parte de los compromisos adquiridos con el Banco Mundial.
- Ajustes a los borradores finales de los Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) para los 27 Centros educativos próximos a ejecutarse que deben enviarse para aprobación al Banco Mundial.

A continuación, véase la ejecución histórica del Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras (PRE), primer trimestre 2022:

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto*/	Inicio-Fin	
Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras (PRE)	6822-HN	1,960,432,000	25/05/2021 - 31/12/2026	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
I Trimestre 2022	732,341,690	732,341,690	1,384,696	0.2
Acumulado 2022	732,341,690	732,341,690	1,384,696	0.2
Acumulado Vida del Proyecto*/	1,960,432,000	1,960,432,000	2,501,684	0.1

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (ICS/USAID)

Tiene como objetivo general incrementar la resiliencia de las comunidades y los individuos a la violencia y al crimen a través de mejoras en la infraestructura pública de pequeña escala. Esto incluye el mejoramiento en las estructuras comunitarias que mitiguen el crimen eliminando o disminuyendo el riesgo de oportunidad, creando espacios comunitarios más seguros, aumento en los servicios de calidad que protejan contra la violencia, mejoramiento en la participación de los sistemas de seguridad y rendimiento de justicia nacional y municipal, mejoramiento en la participación ciudadana con los sectores de justicia y seguridad.

Los principales avances físicos al 31 de marzo de 2022, son los siguientes:

- Se realizaron capacitaciones a los comités y personal de mano de obra en temas de Bioseguridad, también se ha fortalecido a la comunidad en temas de Género, cumpliendo los indicadores del Plan de monitoreo y Plan de Género del programa.

A continuación, véase la ejecución histórica del Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (ICS/USAID), primer trimestre 2022:

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto*/	Inicio-Fin	
Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (USAID/ICS)	522-0501-4 Donación Externa	226,129,167	19/10/2017 - 30/09/2022	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	
I Trimestre 2022	10,612,131	10,612,131	-	-
Acumulado 2022	10,612,131	10,612,131	-	-
Acumulado Vida del Proyecto*/	226,129,167	313,680,219	185,993,525	59

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto



Proyecto Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Ciudad de Gracias, Departamento de Lempira

El proyecto tiene como objetivo mejorar el acceso a los servicios de agua potable para la población del municipio de Gracias, Departamento de Lempira, aumentando la cantidad y la calidad del agua suministrada, a través de la ampliación del sistema de abastecimiento, mediante el desarrollo de la infraestructura hidráulica.

Los principales avances físicos al 31 de marzo de 2022, son los siguientes:

- En etapa de Pre-Inversión a Nivel de Factibilidad.

4.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Mediante Oficio No. SE-SEDECOAS-FHIS-016/2022 de fecha 19 de enero la SEDECOAS/FHIS solicita a la SEFIN identificación de fondos de contraparte nacional de los Proyectos Actividad Piloto de la Infraestructura en el Occidente de Honduras y del Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana de acuerdo a los compromisos adquiridos por el Gobierno de Honduras por un monto de L21.7 millones que fueron asumidos por la institución.
- De fecha 25 de febrero de 2022 la SEDECOAS/FHIS solicita al Secretaría de Finanzas (SEFIN) mediante al Oficio No. SE-SEDECOAS-FHIS-005/2022, con el propósito de actualizar las firmas autorizadas de los Programas/Proyectos a las nuevas autoridades entrantes.
- La SEFIN autoriza modificación presupuestaria entre objetos del gasto del Proyecto de Emergencia a Causa de los Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras (PRE), financiado del Convenio de Crédito Externo AIF 6822-HN del Banco Mundial por un monto de L5.6 millones a solicitud del Oficio No. DSM-118-2022 de fecha 31 de marzo de 2022.

Conclusiones

- La ejecución presupuestaria acumulada al I trimestre del año 2022 experimentó una ejecución presupuestaria de tan solo el 0.3%, relativo a L4,967,502.00 con respecto al presupuesto vigente de L1,743,849,872.00, esta baja ejecución responde principalmente al cambio de autoridades del nuevo Gobierno, actualización de firmas y reformulación del presupuesto de los proyectos.



- Para este trimestre se realizaron modificaciones presupuestarias entre proyectos y entre objetos de gasto con el fin de ir cubriendo las metas establecidas por el ajuste de la programación, POA's y compromisos de acuerdo a cada uno de los proyectos.

Recomendaciones

- Agilizar los procesos de formulación de los nuevos proyectos con el objetivo de entregar oportunamente los beneficios a la población objetivo, básicamente aquellas personas que han sufrido por emergencias naturales y de salud.
- Coordinar gestiones para acelerar la ejecución física y financiera de los proyectos, tomar acciones correctivas, ceder espacio presupuestario a otros proyectos en vista de lo reprogramado con el objetivo de alcanzar las metas establecidas en los Planes Operativos Anuales institucionales.

ANEXO I
 Secretaría de Finanzas
 Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE, 2022
 Cifras en Lempiras

No. Proy.	Sector / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha Inicio - Fecha Fin	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado (Devengado Anual)			
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)
7	0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social			9,818,396	1,734,031,476	1,743,849,872	9,818,396	1,734,031,476	1,743,849,872	-	4,967,502	4,967,502	0.3%
1	001 - Ampliación Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Ciudad De Gracias, Departamento De Lempira	BCIE-2261	03/01/2022 - 03/02/2026	-	193,172,460	193,172,460	-	193,172,460	193,172,460	-	-	-	0.0%
	<i>Total 001 - Ampliación Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Ciudad De Gracias</i>			-	193,172,460	193,172,460	-	193,172,460	193,172,460	-	-	-	0.0%
2	008 - PROGRAMA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SU GESTION LOCAL	2014 67 414 (KFW) / FHIS - SE BMZ 2016 68 763	30/09/2020 - 30/09/2023	-	54,429,621	54,429,621	-	54,429,621	54,429,621	-	653,786	653,786	1.2%
	<i>Total 008 - PROGRAMA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SU GESTION LOCAL</i>			6,107,220	127,776,078	133,883,298	6,107,220	127,776,078	133,883,298	-	-	-	0.0%
	<i>Total 008 - PROGRAMA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SU GESTION LOCAL</i>			6,107,220	182,205,699	188,312,919	6,107,220	182,205,699	188,312,919	-	653,786	653,786	0.3%
3	011 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA	522-0501-4	19/10/2017 - 30/06/2024	-	10,612,131	10,612,131	-	10,612,131	10,612,131	-	-	-	0.0%
	<i>Total 011 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA</i>			-	10,612,131	10,612,131	-	10,612,131	10,612,131	-	-	-	0.0%
4	013 - PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y FORMACION EDUCATIVA EN HONDURAS	BCIE - 2239	30/09/2020 - 30/09/2023	-	499,467,419	499,467,419	-	499,467,419	499,467,419	-	-	-	0.0%
	<i>Total 013 - PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y FORMACION EDUCATIVA EN HONDURAS</i>			-	499,467,419	499,467,419	-	499,467,419	499,467,419	-	-	-	0.0%
5	012 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS	BID/4518/BL-HO	01/10/2018 - 01/10/2023	-	75,224,516	75,224,516	-	75,224,516	75,224,516	-	2,929,021	2,929,021	3.9%
	<i>Total 012 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS</i>			-	75,224,516	75,224,516	-	75,224,516	75,224,516	-	2,929,021	2,929,021	3.9%
6	014 - PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS	BMZ Nr. 2016 65348	06/12/2013 - 31/12/2023	3,711,176	41,007,561	44,718,737	3,711,176	41,007,561	44,718,737	-	-	-	0.0%
	<i>Total 014 - PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS</i>			3,711,176	41,007,561	44,718,737	3,711,176	41,007,561	44,718,737	-	-	-	0.0%
7	001 - Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras.	6822-HN	25/05/2021 - 31/12/2026	-	732,341,690	732,341,690	-	732,341,690	732,341,690	-	1,384,696	1,384,696	0.2%
	<i>Total 001 - Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras.</i>			-	732,341,690	732,341,690	-	732,341,690	732,341,690	-	1,384,696	1,384,696	0.2%
7	Total general			9,818,396	1,734,031,476	1,743,849,872	9,818,396	1,734,031,476	1,743,849,872	-	4,967,502	4,967,502	0.3%

Fuente: SIAFI, 31/03/2022

Anexo II

Programación y Ejecución Física al I Trimestre, 2022

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Metas			Ubicación y Observaciones
			Programación 2022	Ejecución Física al I Trimestre 2022		
			Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad	
PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS	Proyectos Integrales de Mejoramiento de Barrios	OBRA	1	0	0%	Productos programados para el III y IV trimestre 2022, ubicados en Colonias priorizadas del Distrito central
	Construcción de vías pavimentadas	KILOMETRO	2	0	0%	
	Construcción de conexiones de sistemas de agua potable	CONEXIÓN	297	0	0%	
	Construcción de conexiones de sistemas de saneamiento	CONEXIÓN	297	0	0%	
	Talleres de Valores y/o emprendimiento para jóvenes	TALLERES	6	0	0%	
PROYECTO RECUPERACIÓN DE EMERGENCIA A CAUSA DE CICLONES TROPICALES ETA E IOTA EN HONDURAS	Centros Educativos Rehabilitados y/o Reconstruidos	CENTRO EDUCATIVO	27	0	0%	Productos programados para el III y IV trimestre 2022 en área afectada por los ciclones Eta e Iota.
	Adjudicación de Sistemas de Agua Rehabilitados y/o Reconstruidos	LICITACION	10	0	0%	
	Adjudicación de Sistemas de Saneamiento y/o Reconstruidos	LICITACION	2	0	0%	
	Formulación de Expedientes de Infraestructura en Centros de Salud	EXPEDIENTES	2	0	0%	
	Formulación de Expedientes de Infraestructura Comunitaria Rehabilitada y/o Reconstruidas	EXPEDIENTES	2	0	0%	
	Formulación de Expedientes de Infraestructura Pública y Comunitaria	EXPEDIENTES	2	0	0%	

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Metas			Ubicación y Observaciones
			Programación 2022	Ejecución Física al I Trimestre 2022		
			Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad	
	Adjudicación de Infraestructura Vial Rehabilitada y/o Reconstruida	LICITACION	5	0	0%	
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y FORMACION EDUCATIVA EN HONDURAS	Centros Educativos Rehabilitados y/o Reconstruidos	CENTRO EDUCATIVO	3	0	0%	Producto programado para el III y IV Trimestre 2022
PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE IV y V)	Centros Educativos Rehabilitados y/o Reconstruidos	CENTRO EDUCATIVO	13	1	8%	Ubicado en el Municipio de Jesus de Otoro, Departamento de Intibucá.
PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS	Espacios públicos recuperados para la seguridad ciudadana.	OBRA	1	0	0%	Producto programado para el IV Trimestre 2022
	Capacitaciones en habilidades sociales y laborales a jóvenes de ambos sexos entre las edades de 12-30 años	CAPACITACION	180	0	0%	Producto programados para el II Trimestre 2022
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA	Espacios públicos recuperados para la seguridad ciudadana.	OBRA	10	0	0%	Producto programados para el II Trimestre 2022
	Centro educativos construidos, reparados y/o ampliados	CENTRO EDUCATIVO	7	3	43%	1) Escuela Ramon Montoya Fase II, Municipio de La Ceiba, Departamento de Atlántida 2) Inst. Triunfo La Cruz Fase III, Municipio de Tela, Departamento de Atlántida 3) Rep. CDA Jardín de Niños Col Estados Unidos, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Metas			Ubicación y Observaciones
			Programación 2022	Ejecución Física al I Trimestre 2022		
			Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad	
	Obras complementarias reparados y/o ampliados en los servicios de salud	OBRA	2	0	0%	Producto programados para el II Trimestre 2022

Fuente: Unidad Ejecutora, al 31 de marzo de 2022.
