

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e
Inversión Pública



Informe de Avance Físico y Financiero

AL I TRIMESTRE 2022


*Empres Nacional de Energía Eléctrica
(ENEE)*

Tegucigalpa, Honduras
Abril, 2022

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El Programa de Inversión Pública de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) representa el 100% del Sector Energía (L.2,210.6 millones); Al Primer Trimestre del 2022 el Presupuesto vigente de la institución asciende a L.2,210.6 millones. Dicho presupuesto corresponde a 6 proyectos, de los cuales 4 son financiados con Donaciones y 2 con Crédito Externo, quienes en su conjunto lograron ejecutar L.3.12 millones representativos del 0% del presupuesto vigente al Primer Trimestre, tal y como se muestra en el cuadro No. 1.

El 85% del presupuesto de la institución corresponde a Crédito Externo, 6% a recursos de donaciones y el 9% a recursos propios. En la siguiente gráfica se observa el presupuesto vigente desglosado por Fuente Financiamiento.

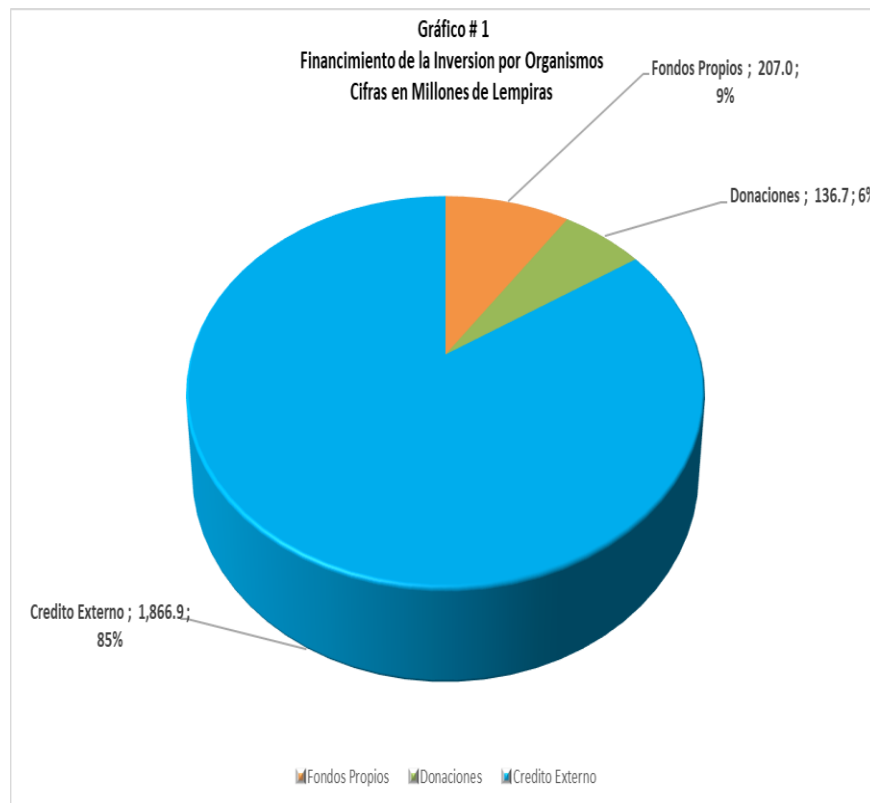

La inversión de la ENEE está destinada a la construcción, operación y mantenimiento de las centrales hidroeléctricas, inversión en obras relacionadas con la integración de Honduras al SIEPAC, electrificación de viviendas y transmisión eléctrica el cual tiene como propósito mejorar y ampliar la cobertura del servicio eléctrico para contribuir al crecimiento y desarrollo económico y social del país, actualmente la ENEE cuenta con una Comisión Interventora que revisa los aspectos técnicos, legales y financieros de la Institución, incluyendo la ejecución de los proyectos de Inversión.

Cuadro No. 01

Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del 2022 Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	2,210,588,310
Presupuesto Vigente	2,210,588,310
Devengado I Trimestre-2022	3,124,847
% Ejecución (Devengado I Trim-2022/ Vigente)	0%
Devengado Anual	3,124,847
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	0%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	411,800,330
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	19%

Fuente: SIAFI, 31/03/2022

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión del año 2022 se concentra en los siguientes proyectos:

Programa de Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional (MER)- BID

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total HNL ¹		Inicio - Fin
020 - APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)	BID 3103/BL-HO	"724,350,895.00"		14/05/2014
	BID GRT/SX-16864-HO	554,940,395.00		14/03/2023
		169,410,500.00		
Financiera				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
I Trimestre 2022	3,595,000.00	3,595,000.00	58,339.26	2%
Acumulado 2022	3,595,000.00	3,595,000.00	58,339.26	2%
Acumulado Vida del Proyecto*/	724,350,895.00	724,350,895.01	645,813,469.60	89.16%
Observaciones: Durante el I Trimestre está pendiente el informe final de cierre de los Pasivos Ambientales y Sociales, LT de Las Flores-Erandique y Danlí-Chichicaste, para solicitar desembolso al BID y realizar los pagos pendientes del Convenio ya que se tiene Avance Financiero del 89% y Físico 87%.				

Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto Presupuesto Vigente = Costo Anual del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Anual del Proyecto

Proyecto de Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaverál-Río Lindo

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total HNL ¹		Inicio - Fin
018 - PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO	ATN-OC-14905-HO	"4,049,540,189.00"		26/03/2015-
	BID 3435/BL-HO	10,890,675.00		26/12/2017
	JICA HO-P6	556,635,500.00		28/05/2015-
	ATN/JF-17247-HO	3,276,011,846.00		28/11/20
		10,890,675.00		26/03/2015-
Financiera				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
I Trimestre 2022	771,522,196.00	771,522,196.00	726,851.12	0%
Acumulado 2022	771,522,196.00	771,522,196.00	726,851.12	0%
Acumulado Vida del Proyecto*/	4,049,540,189.00	4,049,540,189.00	640,627,495.46	16%
Observaciones: Durante este I trimestre del 2022 se ha logrado un avance físico del 92% en las Obras para el "Mejoramiento y Rehabilitación de Obras Civiles para el Canal de Yure del Complejo Hidroeléctrico Cañaverál-Río Lindo, el Contrato para Suministro, Instalación, Pruebas, Puesta en Servicio y Servicio Post Venta (4) Sistemas de Excitación Estática Digital para Generador Síncrono y (4) Transformadores de Excitación para la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán a la fecha se lleva un avance de 90%, pendiente únicamente del montaje e instalación del Sistema de Excitación en la Unidad 4 (U4) y se tenido atrasos en la Resolución de Exoneración de Impuestos sobre venta vencida. Solicitud ISV E2022000239.				

Ejecución al I Trimestre 2022: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

SECRETARÍA DE FINANZAS

Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto Presupuesto Vigente = Costo Anual del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Anual del Proyecto

Proyecto de Apoyo al Plan Estratégico de Acceso Universal a Electricidad

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total HNL ¹		Inicio - Fin
012 - APOYO AL PLAN ESTRATÉGICO DE ACCESO UNIVERSAL A ELECTRICIDAD	ATN/OC-16427-HO.	"10,890,675.00" 10,890,675.00		16/03/2018 28/12/2022
	Financiera			
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
I Trimestre 2022	3,665,000.00	3,665,000.00	-	0%
Acumulado 2022	3,665,000.00	3,665,000.00	-	0%
Acumulado Vida del Proyecto*/	10,890,675.00	10,890,675.00	10,633,986.92	98%
Observaciones: Se realizó en la Evaluación de Medio Término de esta ATN mediante el Contrato No. 113-2021, se realizó la Auditoria Financiera Final, pendiente de entrega únicamente del informe, se emitió la Orden de Compra No. 07/2021 Empresa ABS INGENIEROS S.A.C. Adquisición de Software para Diseño de Redes de Distribución y Capacitación - DIREC -CAD y se ha avanzado en un 98% de ejecución Financiera y 82% de ejecución Física.				

Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto Presupuesto Vigente = Costo Anual del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Anual del Proyecto

Apoyo al Desarrollo Sostenible de las Energías Renovables

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total HNL ¹		Inicio - Fin
021 - APOYO AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES	ATN/SX-16689-HO	"20,014,640.50" 20,014,640.50		20/09/2018 20/09/2022
	Financiera			
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
I Trimestre 2022	-	-	-	-
Acumulado 2022	-	-	-	-
Acumulado Vida del Proyecto*/	20,014,640.50	20,014,640.50	9,017,285.20	45%
Observaciones: Los Cambios en el alcance de los términos de referencia y presupuesto para la Comunicación, Publicidad y Marketing de la Política Energética Nacional y la incorporación presupuestaria porque no se tiene presupuesto asignado para ejercicio fiscal 2022 debido esto se está atrasado la ejecución financiera del proyecto.				

Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto Presupuesto Vigente = Costo Anual del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Anual del Proyecto

Ejecución al I Trimestre 2022: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Electrificación Rural en Lugares Aislados

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total HNL ¹		Inicio - Fin
022 -ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LUGARES AISLADOS	BID-GRT/SX-17123-HO	"155,373,630.00" 155,373,630.00		28/12/2018- 28/12/2022
	Financiera			
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
I Trimestre 2022	121,677,000.00	121,677,000.00	63,040.28	0%
Acumulado 2022	121,677,000.00	121,677,000.00	63,040.28	0%
Acumulado Vida del Proyecto*/	155,373,630.00	155,373,630.00	74,419,834.22	48%
Observaciones: En el I Trimestre se firmó el Contrato No. 115/2021 SOLARTIA "Diseño y construcción de Equipo, Instalación y Pruebas para Sistemas de Generación con Energía Renovable (Fotovoltaica), en Brus Laguna (LPI), también firmado el Contrato No. 116/2021 TECNOSOL Sistemas fotovoltaicos domiciliarios en El Corpus y Concepción de María, se suscribió el Contrato No. 98/2021 Johann Hernández "Director y Supervisor de Obras Electromecánicas del Proyecto "Suministro de Bienes y Servicios Conexos para Sistemas de Generación con Energías Renovables Mediante Micro Redes en Brus Laguna y existe atraso en la contratación del proceso PERLA-49-S.D-CF- y ADSERH-29-S.D-CF- "Asistencia Técnica para la Implementación de Modelos de Sostenibilidad Financiera del Sistema de Generación Eléctrica Mediante Microred en Brus Laguna y los Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios en El Corpus y Concepción de María"				

Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto Presupuesto Vigente = Costo Anual del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Anual del Proyecto

APOYO AL PROGRAMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total HNL ¹		Inicio - Fin
023- APOYO AL PROGRAMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	4598/BL-HO	"3,751,232,500.00"		29/12/2018- 29/12/2023
	4599/SX-HO	3,630,225,000.00 121,007,500.00		
	Financiera			
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
I Trimestre 2022	1,310,129,114.00	1,310,129,114.00	2,276,616.27	0%
Acumulado 2022	1,310,129,114.00	1,310,129,114.00	2,276,616.27	0%
Acumulado Vida del Proyecto*/	3,751,232,500.00	3,751,232,500.00	372,874,391.84	10%
Observaciones: Al primer trimestre, se reporta un avance Físico de 23% y Financiero 57% del Contrato No. 039/2021 suscrito con el Consorcio CHINT-Energía PD para la obra "Construcción y Pruebas de Ampliación de Subestaciones San Buenaventura y San Pedro Sula Sur 230/138 kV y Línea de Transmisión Doble Terna 230 kV", se hizo la publicación del proceso de Servicios de Consultoría para la actualización del Plan de Acción de Género (PAG) que apoye su implementación ejecución y desarrollo de campaña de Comunicación de Género de la ENEE, esperando recibir hojas de vida en los primeros días de enero, en etapa de recepción de Ofertas el Proceso ENEE-100-LPI-O "Construcción de las nuevas Subestaciones: Calpules, La Victoria y El Sitio; Construcción de Ampliación de las Subestaciones: San Pedro Sula Sur, Santa Marta, Progreso, Bermejo, Choloma, La Puerta, Circunvalación, Comayagua, Villanueva y Zamorano; y Construcción de Línea de Transmisión 138 kV: San Pedro Sula Sur-Progreso" y en ejecución el Contrato No. 064/2021 "Consultoría Individual de Alto Nivel para la Elaboración de Términos de Referencia y Presupuestos de Consultorías Especializadas para Fortalecer la Capacidad de Transmisión de Energía Eléctrica en Honduras".				

Ejecución al I Trimestre 2022: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto Presupuesto Vigente = Costo Anual del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Anual del Proyecto

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Reuniones virtuales con la Unidad Coordinadora de Proyectos de la ENEE y la DGIP para Monitorear la Ejecución de cada uno de los proyectos con las diferentes fuentes de financiamiento.
- Se les solicito las Proyecciones Financiera de marzo-diciembre 2022 de los proyectos de la Unidad Coordinadora de Proyectos BID-JICA-ENEE.
- Incorporaciones Presupuestarias solicitadas a la DGP.
- Seguimiento y Monitoreo de los contratos que prolongan sus efectos al siguiente período de Gobierno de la República.

CONCLUSIONES

- En cumplimiento de la Ley General de la Industria Eléctrica, la Comisión de Regulación de Energía Eléctrica (CREE) es la encargada de reconocer y autorizar los diferentes procesos de la ENEE; los tiempos de respuesta de dichos procesos son muy lentos.
- La Gerencia de la ENEE solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) que emita Dictamen Legal urgente si los 31 contratos que prologar sus efectos a nuevo periodo gobierno tiene que ser aprobados por el congreso nacional.
- Mantener supervisión permanente y ejecución de acciones necesarias con las áreas involucradas a fin de que los financiamientos cierren en tiempo y forma, con principal énfasis en los proyectos que tienen las fechas de ultimo desembolso (3435/BL-HO: 28/11/2022, GRT/SX-16864-HO: 06/07/2022, ATN/SX: 16689-HO: 19/09/2022)

RECOMENDACIONES

- Se recomienda mayor rapidez en los tiempos de respuestas por parte de la ENEE
- Seguimiento y Monitoreo a las Solicitud de contratos que Trascienden el Período de Gobierno con la Presidencia de la República para reactivar la ejecución de los proyectos.
- La Unidad Gestión de Proyectos BID-JICA-ENEE deberá dar seguimiento permanente a los procesos y a los cronogramas de trabajo para los contratos previstos, en proceso y por adjudicar.
- Realizar reuniones periódicas ENEE-SEFIN para buscar soluciones a los problemas que se presentan en la ejecución del proyecto y poder lograr un mejor desempeño en las actividades programadas y cierre del Convenio.

ANEXO I
 Secretaría de Finanzas
 Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE, 2022
 Cifras en Lempiras

No. Proy.	Sector / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Término	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado (Devengado Anual)				Ejecutado (Devengado I Trimestre)			
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)
5	ENERGÍA			207,000,000	2,003,588,310	2,210,588,310	207,000,000	2,003,588,310	2,210,588,310	1,146,061	1,978,786	3,124,847	0	1,146,061	1,978,786	3,124,847	0
5	0801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica			207,000,000	2,003,588,310	2,210,588,310	207,000,000	2,003,588,310	2,210,588,310	1,146,061	1,978,786	3,124,847	0	1,146,061	1,978,786	3,124,847	0
1	012 - APOYO AL PLAN ESTRATÉGICO DE ACCESO UNIVERSAL A ELECTRICIDAD	ATN/OC-16427-HO-BID	16/03/2018-28/12/2022	-	3,665,000	3,665,000	-	3,665,000	3,665,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Total 012 - APOYO AL PLAN ESTRATÉGICO DE ACCESO UNIVERSAL A ELECTRICIDAD</i>			-	3,665,000	3,665,000	-	3,665,000	3,665,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2	018 - PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO	ATN/JF-17247-HO BID 3435/BL-HO		-	7,745,000	7,745,000	-	7,745,000	7,745,000	-	-	-	-	-	-	-	-
		JICA HO-P6	28/05/2015-26/03/2024	190,500,000	-	190,500,000	190,500,000	-	190,500,000	726,851	-	726,851	0	726,851	-	726,851	0
	<i>Total 018 - PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO</i>			190,500,000	581,022,196	771,522,196	190,500,000	581,022,196	771,522,196	726,851	-	726,851	0	726,851	-	726,851	0
3	020 - APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)	GRT/SX-16864-HO	31/05/2019-	-	3,595,000	3,595,000	-	3,595,000	3,595,000	-	58,339	58,339	2	-	58,339	58,339	2
	<i>Total 020 - APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)</i>			-	3,595,000	3,595,000	-	3,595,000	3,595,000	-	58,339	58,339	2	-	58,339	58,339	2
4	022 - ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LUGARES AISLADOS	BID-GRT/SX-17123-HO	28/12/2018-28/12/202	-	121,677,000	121,677,000	-	121,677,000	121,677,000	-	63,040	63,040	0	-	63,040	63,040	0
	<i>Total 022 - ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LUGARES AISLADOS</i>			-	121,677,000	121,677,000	-	121,677,000	121,677,000	-	63,040	63,040	0	-	63,040	63,040	0
5	023 - APOYO AL PROGRAMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	BID-4598/BL-HO BID-4599/SX-HO	20/11/2019-29/12/2023	16,500,000	1,246,332,254	1,262,832,254	16,500,000	1,246,332,254	1,262,832,254	419,210	1,857,406	2,276,616	0	419,210	1,857,406	2,276,616	0
	<i>Total 023 - APOYO AL PROGRAMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA</i>			16,500,000	1,293,629,114	1,310,129,114	16,500,000	1,293,629,114	1,310,129,114	419,210	1,857,406	2,276,616	0	419,210	1,857,406	2,276,616	0

Fuente: SIAFI, 31/03/2022
