

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e
Inversión Pública



Informe de Avance Físico y Financiero

AL II TRIMESTRE 2022

**Secretaría de Desarrollo Comunitario
Agua y Saneamiento
(SEDECOAS/FHIS)**

Tegucigalpa, Honduras

Julio, 2022

www.sefin.gob.hn

IV. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

4.1 EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

La Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS) - Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) cuya finalidad es la de promover el mejoramiento de las condiciones de vida de los grupos sociales marginados en el área rural y urbana, mediante el otorgamiento de financiamientos para programas y proyectos de desarrollo social

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del 2022
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	1,743,849,872
Presupuesto Vigente	1,292,864,413
Devengado II Trimestre-2022	43,667,770
% Ejecución (Devengado II Trim-2022/ Vigente)	3%
Devengado Anual	48,635,271
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	4%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	85,559,419
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	7%

Fuente: SIAFI, 30/06/2022


o económico, con el propósito de aumentar su productividad, sus niveles de empleo y de ingresos y de contribuir a la satisfacción de sus necesidades básicas.

El actual Gobierno ha considerado dentro de sus prioridades atender proyectos enfocados a programas sociales y apuntar a los siguientes objetivos; En materia de Educación lo siguiente: un Sistema capaz de brindar educación gratuita y universal, reinstaurando la Matrícula Gratis y una merienda idónea, rehabilitar y repotenciar al menos el 50% de la infraestructura escolar durante el primer año de gobierno, llegando al 100% en el tercer año de gobierno, mediante mecanismos de participación comunitaria apoyada desde el municipio y el gobierno central entre otros.

En materia de Protección Social se ampliará y fortalecerá programas de asistencia como las transferencias en efectivo que se focalizarán mejor a fin de que realmente lleguen a sectores de la población en extrema pobreza, sin corrupción ni manipulación.

Entre otras, elaborar una estrategia contra la pobreza rural y por la soberanía alimentaria, enfocada en las zonas de mayor pobreza, distribuyendo tierras ejidales, nacionales y fiscales para la producción agrícola y pecuaria para la subsistencia y el mercado local a costos más competitivos.

Gráfico No. 6
Presupuesto Vigente
SEDECOAS: Financiamiento por Organismo
Cifras en Millones de Lempiras

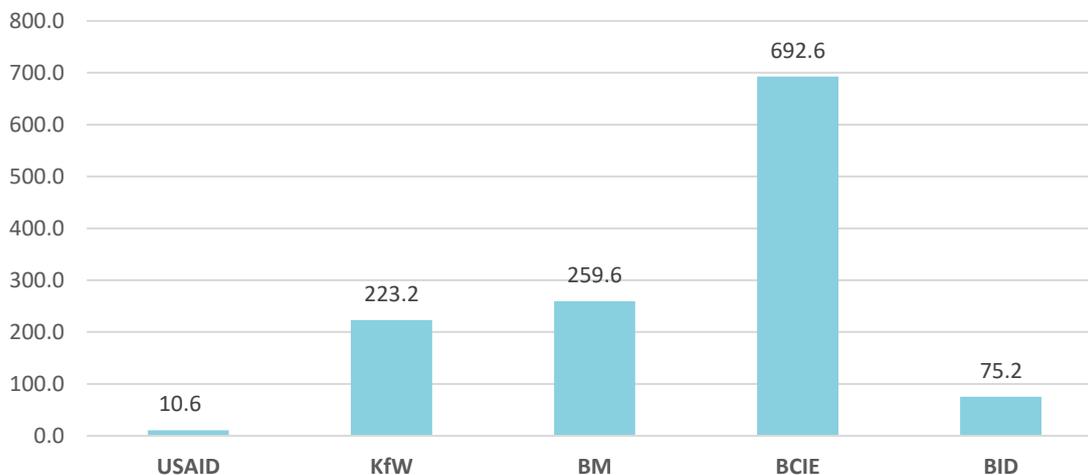

Al segundo trimestre del año 2022 la institución contó con un presupuesto vigente de inversión pública de **L1,292.9 millones** y la ejecución presupuestaria del trimestre asciende a un monto de **L43.6 millones** lo que representa el (3%) con relación al presupuesto vigente, tal como se detalla en el Cuadro No. 1.


Dicha ejecución se llevó a cabo a través de (8) ocho proyectos enfocados en Agua y Saneamiento, Electrificación Rural y Caminos Rurales, Infraestructura Social, Infraestructura Escolar, Fortalecimiento de Capacidades para Jóvenes, Recuperación de Espacios Públicos y Mejora de la Infraestructura Básica. Ver Detalle de Ejecución Financiera en Anexo No. 4.

Del total del financiamiento, el 82.6% corresponde a fondos provenientes de crédito externo expresado en términos monetarios con un monto de **L1,068.5 millones**, el 14.9% a recursos de donaciones externas con un monto de **L192.8 millones**; y la contraparte nacional corresponde a gastos operativos con un monto vigente de **L31.6 millones** equivalente a 2.4%.

Con relación al presupuesto vigente con recursos provenientes de fuentes externas para la ejecución de los proyectos se distribuye por; BCIE con el 55%, Banco Mundial con 20%, KfW Banco Alemán con 18%, BID con el 6% y USAID con el 1%

4.2 COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN AL II TRIMESTRE (2018-2022):

En el período comprendido de los años 2018 al 2022, el Programa de Inversión Pública de la SEDECOAS/FHIS ha considerado la ejecución de al menos 12 Proyectos de Inversión, de los cuales se han financiado en 68% con recursos de crédito externo, 28% recursos de donación externa y el 4% restante con recursos del Tesoro Nacional como contraparte de dichos Proyectos.

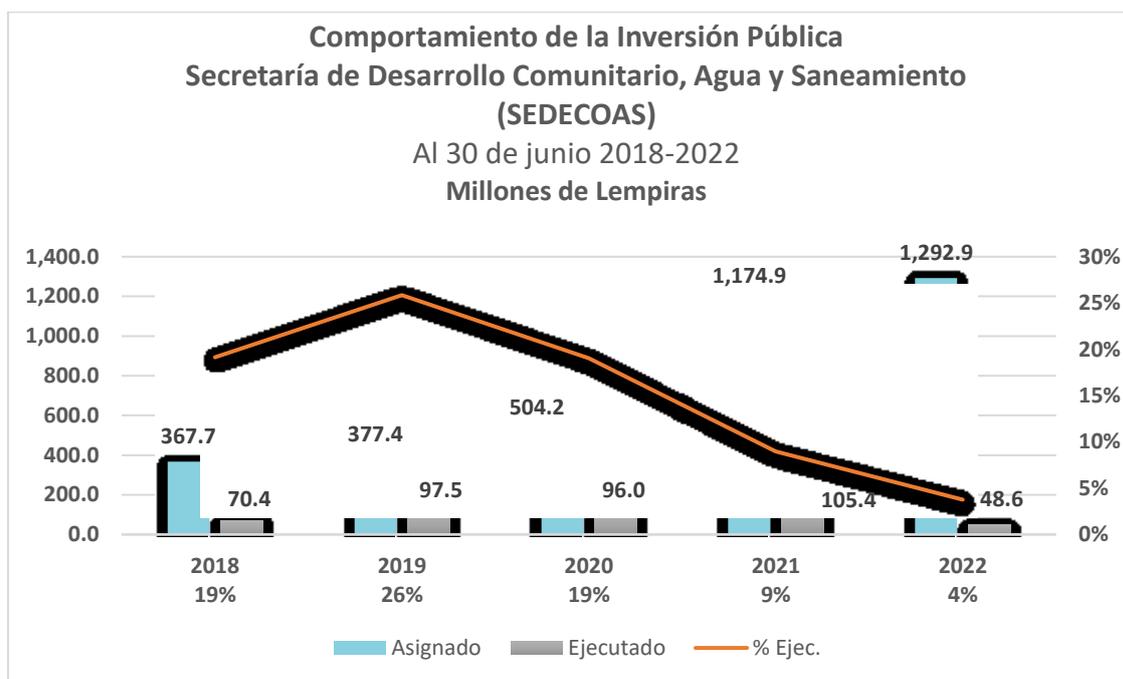

La gráfica anterior muestra la ejecución porcentual comparativa de los últimos años al 30 de junio, el pico más alto se registró en el año 2019. Para el año 2021 se incorporaron al presupuesto nuevos programas para atender la reparación y rehabilitación de escuelas y para proyectos de infraestructura en las zonas afectadas por Eta e Iota, sin embargo, pese a tener suficientes recursos la ejecución para los años 2021 y 2022 se vio mermaba por la crisis ocasionada post pandemia del COVID-19. Cabe mencionar que la baja ejecución en el 2022 se debe en parte a procesos engorrosos de los organismos financiadores, contratos pendientes de ratificar por el Congreso Nacional, así como la falta de personal esencial en las unidades ejecutoras.

4.3 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión en el segundo trimestre del año 2022 se concentró en los siguientes proyectos:

- 1 Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y su Gestión Local (PROMINE).

- 2 Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB).
- 3 Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras (MIFE).
- 4 Proyecto Convivencia y Espacios Seguros para los Jóvenes en Honduras (CONVIVIR).
- 5 Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras (PRE).
- 6 Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (ICS).
- 7 Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras (PIOH).
- 8 Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Ciudad de Gracias, Departamento de Lempira.

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros de los principales proyectos de acuerdo a su presupuesto vigente:

Programa Modernización de la Infraestructura Educativa (PROMINE)

PROMINE tiene por objetivo general fortalecer la rectoría Sectorial en Infraestructura Educativa de la Secretaría de Educación y la gestión local participativa, así como mejorar el acceso de los alumnos y alumnas de las comunidades pobres al Centro Educativo de calidad que operan de manera sostenible. De esa manera se pretende contribuir al aumento de la eficiencia y de la calidad del sistema educativo (pre-básico y básico).

Con relación a la Fase IV, actualmente se han considerado 44 proyectos de los cuales, 33 se encuentran formulados (de estos 30 están contratados y por iniciar su ejecución y el resto en proceso de contratación), 3 en formulación y 1 pendiente de formulación, alcanzando 66% de ejecución física, se prevé que se inicie ejecución en el tercer trimestre 2022.

Los principales avances físicos al 30 de junio de 2022, son los siguientes:

- Se ha revisado las obras ejecutadas y procesos administrativos para los 5 proyectos en Gracias a Dios y se ha definido los montos a recuperar para 3 proyectos y en proceso los 2 restantes, es decir los 5 proyectos se encuentran en el proceso de recuperación ya que se rescindieron los contratos.
- Se finalizó un proyecto que representa 298 beneficiados y según el sistema estos proyectos han generado 32 empleos.

A continuación, véase la ejecución histórica del Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y de su Gestión Local (PROMINE), segundo trimestre 2022:

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto*/	Inicio-Fin	
Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y de su Gestión Local (PROMINE)	SE/FHIS VIII No.2008-66-178 2014 67 414 (KFW) / FHIS - SE Fondos de Donación	1,608,626,596	10/07/2012 - 31/07/2023	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	
II Trimestre 2022	188,312,919	188,312,919	3,406,103	1.8
Acumulado 2022	188,312,919	188,312,919	4,059,888	2.2
Acumulado Vida del Proyecto*/	1,608,626,596	1,608,626,596	1,161,783,433	72.2

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB)

Consisten en contribuir a mejorar la convivencia ciudadana en Honduras a través de la mejora en la calidad de vida en barrios vulnerables y la reducción de la incidencia de delitos violentos. Los objetivos específicos son: (I) mejorar el hábitat de barrios urbanos vulnerables, aumentando el acceso a infraestructura de servicios básicos y de prevención para disminuir delitos de robos y violaciones sexuales; (II) reducir los niveles de incidencia de homicidios y violencia intrafamiliar (VIF) en los municipios intervenidos mejorando los servicios de prevención y atención a víctimas de la violencia; y (III) mejorar la efectividad policial en investigación criminal, a través del incremento de la proporción de casos de homicidio con agresor identificado e informe de investigación aceptado por el Ministerio Público.

Los principales avances físicos al 30 de junio de 2022, son los siguientes:

- El día 20 de junio de 2022 inició la ejecución de obras del Proyecto de Integración Urbana en colonias: Altos de la Quezada, La Huerta, Villas San Miguel, Brisas del Roble, y Altos del Mirador para un total de 525, predios; el monto del contrato es de L. 55,100,000.000 se tiene un avance físico del 5% que corresponde a la construcción de pozos e instalación de tuberías del sistema de alcantarillado sanitario y un avance financiero del 30%.
- Se ha brindado capacitación en mantenimiento de obras de infraestructura casa a casa; al mes de junio se tienen una visita de 773 viviendas.
- Se capacitaron 29 mujeres en emprendimiento de negocios de alimentos.
- Al mes de junio de 2022 inició el curso de panadería a través de la fundación CADERH, donde participan 20 jóvenes.
- Al mes de junio de 2022 inició el curso de diseño gráfico a través de la fundación CADERH, donde participan 20 jóvenes.

A continuación, véase la ejecución histórica del **Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB)**, segundo trimestre 2022:

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto*/	Inicio-Fin	
Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB)	BID/4518/BL-HO ATN/OC-17135-HO	369,377,190	01/10/2018 - 01/10/2023	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
II Trimestre 2022	75,224,516	75,224,516	24,295,252	32
Acumulado 2022	75,224,516	75,224,516	27,224,273	36
Acumulado Vida del Proyecto*/	369,377,190	369,377,190	301,339,229	82

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras (MIFE)

Este Programa tiene como objetivo fortalecer la educación en Honduras para que los educandos tengan un acceso eficiente, con la permanencia necesaria en los Centros de Educación Media y sean promovidos con la calidad requerida. El programa estará localizado en los departamentos de: Atlántida, Choluteca, Colón, Comayagua, Copán, Cortés, El Paraíso, Francisco Morazán, Gracias a Dios, Intibucá, Islas de la Bahía, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Santa Bárbara, Valle, Yoro.

El Programa beneficiará 480 niños de Educación prebásica, 40,759 niños de Educación Básica y 43,801 jóvenes de Educación Media, haciendo un total de 85,040 educandos de los tres niveles del sistema educativo, así mismo 3,821 docentes de Educación Prebásica, 3,821 docentes de Educación Básica, 15,285 docentes de educación media, haciendo un total de 22,923 docentes. La duración del programa es de 4 años desde el 2020 hasta el 2023 donde habrá un desarrollo gradual de la infraestructura y la dotación de equipo, así como la formación permanente y la plataforma virtual para emprendimiento.

Los principales avances físicos al 30 de junio de 2022, son los siguientes:

- Por parte de SEDECOAS/FHIS se visitaron 131 proyectos de los cuales, en visita de campo 23 no calificaron, 74 se encuentran formulados y el resto en proceso de formulación, se prevé que se inicie ejecución en el tercer trimestre 2022.
- Se han aprobado 16 proyectos por un monto de L48, 875,158.54 lo cuales han iniciado el proceso de contratación de la inversión y la supervisión.

- Se cuenta con 57 proyectos de rehabilitación y reposición en revisión por la SEDUC para su visto bueno a la formulación.

A continuación, véase la ejecución histórica del Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras (MIFE), segundo trimestre 2022:

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto*/	Inicio-Fin	
Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras (MIFE)	BCIE - 2239	1,971,360,000	30/09/2020 - 30/09/2023	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
II Trimestre 2022	499,467,419	499,467,419	-	-
Acumulado 2022	499,467,419	499,467,419	-	-
Acumulado Vida del Proyecto*/	1,971,360,000	1,971,360,000	114,393,414	6

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Proyecto Convivencia y Espacios Seguros para los Jóvenes en Honduras (CONVIVIR)

El programa abarca la construcción, el mejoramiento y el equipamiento de infraestructura social para jóvenes y espacios públicos, financiamiento y/o cofinanciamiento del trabajo con jóvenes y la capacitación de jóvenes, la capacitación de personal de las instituciones involucradas, las municipalidades seleccionadas, las comunidades de barrio y servicios de consultoría.

Los principales avances físicos al 30 de junio de 2022, son los siguientes:

- De los ocho (8) proyectos de infraestructura considerados inicialmente en cada municipio se estima que solamente será posible ejecutar entre 4 y 5 proyectos, considerando los fondos disponibles para el Componente 1 “*Construcción y/o Mejoramiento de Infraestructura*”.
- Reuniones con las Autoridades Municipales, Equipo Técnico de las alcaldías y Representantes de patronatos, con el fin de dar a conocer el trabajo y la necesidad de información que se va a requerir de cada uno de ellos para cumplir con los objetivos de la Línea Base.

A continuación, véase la ejecución histórica del Proyecto Convivencia y Espacios Seguros para los Jóvenes en Honduras (CONVIVIR), segundo trimestre 2022:

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto*/	Inicio-Fin	
Proyecto Convivencia y Espacios Seguros para los Jóvenes en Honduras (CONVIVIR)	BMZ Nr. 2016 65348	170,029,800	17/07/2021 - 31/12/2023	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
II Trimestre 2022	44,718,737	44,718,737	3,855,016	9
Acumulado 2022	44,718,737	44,718,737	3,855,016	9
Acumulado Vida del Proyecto*/	170,029,800	170,029,800	11,409,749	7

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras (PRE)

Tiene como objetivo Coordinar, impulsar y fortalecer capacidades para el conocimiento del riesgo, reducción del mismo y manejo de desastre, como una estrategia para mejorar la eficiencia en la preparación para la respuesta y la recuperación post desastre naturales.

Su propósito es la atención de la infraestructura dañada por el Huracán y Tormenta Tropical Eta: rehabilitación de pasos y caminos terciarios, reparación y construcción de cajas puentes rehabilitación y construcción de sistemas de drenaje, puentes (Bailey), construcción de calles terciarias, obras de mitigación entre otras.

Los principales avances físicos al 30 de junio de 2022, son los siguientes:

- En proceso de adjudicación para la adjudicación de contrato: Especialista en Comunicación de la UEP y Asistente Administrativo de la Unidad Ejecutora.
- En proceso de evaluación de las consultorías: 1) Formador de Proyectos de Infraestructura en Agua y Saneamiento, 2) Formador de Proyectos de Infraestructura, 3) Ingeniero Estructuralista, 4) Inspector de Proyectos de Infraestructura, 5) Oficial de Adquisiciones de la UEP, 6) Oficial de Fuente Enlace UEP-Dirección de Finanzas de la SEDECOAS-FHIS, 7) Operador de Terminal de Contrataciones UEP, 8) Enlace Contable de la Unidad UEP, 9) Ambiental en Apoyo a la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) de la SEDECOAS-FHIS.
- En proceso de evaluación para la “Supervisión de Escuelas paquete No. 2 ubicadas en los departamentos de Comayagua, El Paraíso, Francisco Morazán, Intibucá, La Paz y Lempira”.
- En proceso de evaluación de la adquisición de bienes: 1) Adquisición de 12 Vehículos Tipo Pick-Up de doble tracción (lote 1) y 1 Vehículo Tipo Microbús (lote

2). 2) Adquisición de Equipo Informático, Video y Sonido para uso de la UEP y SEDECOAS y 3) Adquisición de Mobiliario de Oficina.

- En proceso de licitación pública nacional para 11 reparaciones y/o reposiciones de centros educativos.
- En proceso de evaluación de cotizaciones de obra de 15 reparaciones y/o reposiciones de escuelas.

A continuación, véase la ejecución histórica del Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras (PRE), segundo trimestre 2022:

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto*/	Inicio-Fin	
Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras (PRE)	6822-HN	1,960,432,000	25/05/2021 - 31/12/2026	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
I Trimestre 2022	732,341,690	259,608,231	2,507,938	1.0
Acumulado 2022	732,341,690	259,608,231	3,892,633	1.5
Acumulado Vida del Proyecto*/	1,960,432,000	1,960,432,000	2,501,684	0.1

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (ICS/USAID)

Tiene como objetivo general incrementar la resiliencia de las comunidades y los individuos a la violencia y al crimen a través de mejoras en la infraestructura pública de pequeña escala. Esto incluye el mejoramiento en las estructuras comunitarias que mitiguen el crimen eliminando o disminuyendo el riesgo de oportunidad, creando espacios comunitarios más seguros, aumento en los servicios de calidad que protejan contra la violencia, mejoramiento en la participación de los sistemas de seguridad y rendimiento de justicia nacional y municipal, mejoramiento en la participación ciudadana con los sectores de justicia y seguridad.

Los principales avances físicos al 30 de junio de 2022, son los siguientes:

- Actualmente se encuentran 4 proyectos en ejecución tres en San Pedro sula y uno en el Distrito Central, dos de ellos son proyectos relacionados a COVID-19, un centro educativo y un centro de alcance.
- Se llevaron a cabo capacitaciones a los comités y personal de mano de obra en diversos temas, organización comunitaria, bioseguridad, compras y contrataciones, bioseguridad, contraloría y con especial énfasis en temas de

Género, cumpliendo a satisfacción los indicadores del Plan de monitoreo y Plan de Género del programa.

A continuación, véase la ejecución histórica del Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (ICS/USAID), segundo trimestre 2022:

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto*/	Inicio-Fin	
Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (USAID/ICS)	522-0501-4 Donación Externa	348,006,068	19/10/2017 - 30/06/2024	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	
II Trimestre 2022	10,612,131	20,678,381	9,603,461	46
Acumulado 2022	10,612,131	20,678,381	9,603,461	46
Acumulado Vida del Proyecto*/	348,006,068	348,006,068	195,596,986	56

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Programa Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras (USAID/PIOH)

El propósito de esta Actividad es mejorar las pobres condiciones sociales y económicas son especialmente pronunciadas en el Occidente de Honduras. Extrema pobreza, desnutrición, vulnerabilidad al cambio climático. Bajos niveles educativos, migración, falta de acceso a los servicios básicos y otros retos socioeconómicos son endémicos. La provisión de servicios básicos de educación y nutrición son escasos en la zona de Occidente y es difícil el acceso a los ya existentes, así mismo la gestión de servicios de educación, nutrición y agua y saneamiento son deficientes por lo que los ciudadanos cuentan además con pocos espacios de participación para mejorar sus vidas a nivel de hogar y sus vidas productivas, lo que genera una gran brecha de pobreza.

Los principales avances físicos al 30 de junio de 2022, son los siguientes:

- A la fecha se han finalizado 15 proyectos, 8 bajo la Metodología PEC del sector educativo y 7 proyectos por contratista para el sector salud, entre abril a junio de 2022.
- Los proyectos que se encuentran en ejecución actualmente son 5 centros educativos en los departamentos de Santa Bárbara, Intibucá y La Paz.

A continuación, véase la ejecución histórica del Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (ICS/USAID), segundo trimestre 2022:

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto*/	Inicio-Fin	
Programa Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras (USAID/PIOH)	522-0502 Cd E No.9 Donación Externa	210,053,250	01/11/2018 - 30/06/2024	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	
II Trimestre 2022	-	11,681,750	-	-
Acumulado 2022	-	11,681,750	-	-
Acumulado Vida del Proyecto*/	210,053,250	210,053,250	66,498,635	32

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Proyecto Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Ciudad de Gracias, Departamento de Lempira

El proyecto tiene como objetivo mejorar el acceso a los servicios de agua potable para la población del municipio de Gracias, Departamento de Lempira, aumentando la cantidad y la calidad del agua suministrada, a través de la ampliación del sistema de abastecimiento, mediante el desarrollo de la infraestructura hidráulica.

Los principales avances físicos al 30 de junio de 2022, son los siguientes:

- En revisión de diseño del proyecto final.

4.4 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- El 01 de abril mediante Oficio No. DSM-136-2022 la SEDECOAS/FHIS solicitó a la SEFIN modificación presupuestaria de tipo traslado de fondos nacionales como donaciones externas del Programa Modernización de la Infraestructura Educativa (PROMINE) por un monto de L1,256,248.00 con el fin de reprogramar actividades operativas de la Fase IV del Programa.
- La SEDECOAS/FHIS mediante Oficio No. DSM-139-2022 de fecha 04 de abril solicitó nuevamente a la SEFIN solicitud de traslado entre actividades obra del Proyecto Convivencia y Espacios Seguros para los Jóvenes en Honduras (CONVIVIR) con el propósito de asignar presupuesto a estructuras a afectarse por un monto de L1,169,040.00.
- Por otro lado, el 05 de mayo mediante Oficio No. DSM-224-2022 se solicitó a la SEFIN solicitud de traslado entre objetos del gasto del Programa CONVIVIR con el fin de alimentar a los objetos de mantenimiento y reparación de vehículos, repuestos y accesorios por un monto de L 477,000.00.
- Mediante Oficio No. 238-2022 de fecha 12 de mayo el Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en

Honduras (PRE) solicitó a la SEFIN modificación presupuestaria tipo traslado entre actividad obra y objetos de gasto del mismo Programa con el fin de incluir actividades relaciones a la instalación de las Oficinas de la UEP y adquisición de equipo de oficina y campo, necesario para la evaluación y formulación de los subproyectos por un monto de L2,026,900.00.

- El 28 de junio se solicitó a la SEFIN mediante Oficio Mo. 381-2022 traslado de entre actividades y objetos de gasto del Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB), con el objetivo de cubrir costos de publicación en el Diario Oficial la Gaceta donde se aprueba la contratación de la empresa JF Construcciones para continuar la ejecución de las obras de infraestructuras por un monto de L330,000.00.

Conclusiones

- La ejecución presupuestaria acumulada al II trimestre del año 2022 experimentó una ejecución presupuestaria de 4% ejecución insatisfactoria, relativo a L48,635,271.00 con respecto al presupuesto vigente de L1,292,864,413.00, esta baja ejecución responde principalmente a la ratificación de los contratos que traspasaron periodo de gobierno que aún no han sido revalidados por el soberano Congreso Nacional, actualización de firmas y reformulación del presupuesto de los proyectos.
- Para este trimestre se realizaron modificaciones presupuestarias entre proyectos y entre objetos de gasto con el fin de ir cubriendo las metas establecidas por el ajuste de la programación, POA's y compromisos de acuerdo a cada uno de los proyecto y otras actividades relativas al funcionamiento de las Unidades Ejecutoras.
- En cuanto a la ejecución porcentual comparativa se observó una disminución del porcentaje de ejecución en el presente año en 5 puntos porcentuales con respecto al año 2021.

Recomendaciones

- Agilizar los procesos de formulación de los nuevos proyectos con el objetivo de entregar oportunamente los beneficios a la población objetivo, básicamente aquellas personas que han sufrido por emergencias naturales y de salud.
- Coordinar gestiones para acelerar la ejecución física y financiera de los proyectos, tomar acciones correctivas, ceder espacio presupuestario a otros proyectos en vista de lo reprogramado con el objetivo de alcanzar las metas establecidas en los Planes Operativos Anuales institucionales.

ANEXO I
 Secretaría de Finanzas
 Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE, 2022
 Cifras en Lempiras

Sector / Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado			% Ejecución (Dev./Vig.)
		Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	
AGUA Y SANEAMIENTO		-	193,172,460	193,172,460	-	193,172,460	193,172,460	-	-	-	0%
001 - Ampliación Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Ciudad De Gracias, Departamento De Lempira	BCIE-2261	-	193,172,460	193,172,460	-	193,172,460	193,172,460	-	-	-	0%
EDUCACIÓN		6,107,220	182,205,699	188,312,919	6,107,220	182,205,699	188,312,919	35,100	4,024,788	4,059,888	2%
008 - PROGRAMA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SU GESTION LOCAL	2014 67 414 (KFW) / FHIS - SE	-	54,429,621	54,429,621	-	55,426,399	55,426,399	-	2,609,305	2,609,305	5%
	BMZ 2016 68 763	6,107,220	127,776,078	133,883,298	6,107,220	126,779,300	132,886,520	35,100	1,415,483	1,450,583	1%
PROTECCIÓN SOCIAL		-	510,079,550	510,079,550	21,748,000	510,079,550	531,827,550	3,420,000	6,183,461	9,603,461	2%
011 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA	522-0501-4	-	10,612,131	10,612,131	10,066,250	10,612,131	20,678,381	3,420,000	6,183,461	9,603,461	46%
013 - PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y FORMACION EDUCATIVA EN HONDURAS	BCIE - 2239	-	499,467,419	499,467,419	-	499,467,419	499,467,419	-	-	-	0%
060 - ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS	522-0502 Cd E No.9	-	-	-	11,681,750	-	11,681,750	-	-	-	0%
SEGURIDAD Y DEFENSA		3,711,176	116,232,077	119,943,253	3,711,176	116,232,077	119,943,253	571,125	30,508,164	31,079,289	26%
012 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS	BID/4518/BL-HO	-	75,224,516	75,224,516	-	75,224,516	75,224,516	-	27,224,273	27,224,273	36%
014 - PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS	BMZ Nr. 2016 65348	3,711,176	41,007,561	44,718,737	3,711,176	41,007,561	44,718,737	571,125	3,283,891	3,855,016	9%
TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS		-	732,341,690	732,341,690	-	259,608,231	259,608,231	-	3,892,633	3,892,633	1%
001 - Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras.	6822-HN	-	732,341,690	732,341,690	-	259,608,231	259,608,231	-	3,892,633	3,892,633	1%
Total general		9,818,396	1,734,031,476	1,743,849,872	31,566,396	1,261,298,017	1,292,864,413	4,026,225	44,609,046	48,635,271	4%

Fuente: SIAFI, 30/06/2022

SECRETARÍA DE FINANZAS

ANEXO II
 Secretaría de Finanzas
 Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL II TRIMESTRE, 2022

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre 2022		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
001 - Ampliación Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Ciudad De Gracias, Departamento De Lempira	01 - Sistema eléctrico y Sistema fotovoltaico instalados. AGUA POTABLE	82 - SISTEMA	1	0	0%	0	0	0%
	08 - Consultoría de estudio de la planta de tratamiento de agua potable y de las redes de distribución. AGUA POTABLE	369 - CONSULTORÍA	1	0	0%	0	0	0%
	09 - Consultoría de estudio ambiental realizada .AGUA POTABLE	369 - CONSULTORÍA	1	0	0%	0	0	0%
	10 - Construcción de conexiones de sistemas de agua potable en la ciudad de Gracias, Lempira. AGUA POTABLE.	564 - CONEXIÓN	1,244	0	0%	0	0	0%
	11 - Capacitaciones impartidas a los actores involucrados por parte de las instancias responsables y reguladoras de sistemas de agua potable en Honduras. AGUA POTABLE	1009 - CAPACITACIÓN	5	0	0%	0	0	0%
	12 - Infraestructura del sistema de agua potable supervisada. AGUA POTABLE	129 - SUPERVISION	1	0	0%	0	0	0%
	13 - Informe con enfoque de genero elaborados. AGUA POTABLE	149 - INFORME	4	0	0%	1	0	0%
001 - Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras.	03 - Expedientes de subproyectos formulados. PRE	395 - EXPEDIENTE	64	0	0%	0	0	0%
	04 - Supervisión de subproyectos. PRE	129 - SUPERVISION	44	0	0%	0	0	0%
	05 - Solicitudes de reembolso de gastos revisadas. PRE	500 - SOLICITUD	2	0	0%	1	0	0%
	06 - Actas de reembolso aprobadas. PRE	991 - ACTA	1	0	0%	0	0	0%
	07 - Acciones de fortalecimiento institucional. PRE	131 - ACTIVIDAD	1	0	0%	1	0	0%
	08 - Participación comunitaria en la planificación y ejecución de los subproyectos. PRE	131 - ACTIVIDAD	1	0	0%	0	0	0%
008 - PROGRAMA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SU GESTION LOCAL	09 - Informe con enfoque de género. PRE	149 - INFORME	4	0	0%	1	0	0%
	01 - Capacitación a los miembros de comité ejecutores de proyectos (CEP'S) FASE V PROMINE	1009 - CAPACITACIÓN	1	0	0%	0	0	0%
	02 - Capacitación a los miembros de comité ejecutores de proyectos (CEP'S) FASE IV PROMINE	1009 - CAPACITACIÓN	12	0	0%	2	0	0%
	03 - Informe con enfoque de genero PROMINE	149 - INFORME	4	0	0%	1	0	0%
	04 - Asistencia técnica para la ejecución del proyecto FASE V PROMINE	992 - ASISTENCIA TÉCNICA	1	0	0%	0	0	0%
	05 - Acciones para el fortalecimiento institucional del Fondo Hondureño de Inversión Social FASE V. PROMINE	131 - ACTIVIDAD	1	0	0%	0	0	0%
06 - Acciones para el fortalecimiento institucional del Fondo Hondureño de Inversión Social FASE IV. PROMINE	131 - ACTIVIDAD	1	0	0%	0	0	0%	

SECRETARÍA DE FINANZAS

ANEXO II

Secretaría de Finanzas

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL II TRIMESTRE, 2022

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre 2022		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
011 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA	03 - Supervisión de Proyectos para seguridad ciudadana. ICS	129 - SUPERVISION	19	0	0%	16	0	0%
	04 - Diseño y formulación de proyectos para seguridad ciudadana ICS	291 - DISEÑO	19	0	0%	0	0	0%
	05 - Informe con enfoque de género. ICS	149 - INFORME	2	0	0%	1	0	0%
012 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS	02 - Actividades Deportivas del Programa Deportivo y Formación de Valores. PCCMB	312 - ACTIVIDADE DEPORTIVA	9	0	0%	0	0	0%
	03 - Supervisión de sistemas de agua potable en barrios intervenidos. PCCMB	129 - SUPERVISION	6	0	0%	0	0	0%
	03 - Supervisión de sistemas de saneamiento en barrios intervenidos. PCCMB	129 - SUPERVISION	6	0	0%	0	0	0%
	03 - Supervisión de vías pavimentadas en barrios. PCCMB	129 - SUPERVISION	6	0	0%	0	0	0%
	04 - Asistencia Técnica Equipo de Promoción Social ETEC. PCCMB	992 - ASISTENCIA TÉCNICA	16	0	0%	0	0	0%
	05 - Informe con enfoque de genero. PCCMB	149 - INFORME	4	0	0%	1	0	0%
013 - PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y FORMACION EDUCATIVA EN HONDURAS	01 - Capacitaciones impartidas para la formación en metodologías basadas en normas y evaluación por competencia a Docente. MIFE	1009 - CAPACITACIÓN	1	0	0%	0	0	0%
	02 - Capacitaciones impartidas para la formación en emprendimiento a docentes y alumnos. MIFE	1009 - CAPACITACIÓN	1	0	0%	0	0	0%
	10 - Proyectos contratados para la mejora de la Infraestructura de los centros educativos. MIFE	305 - PROYECTO	3	0	0%	0	0	0%
	11 - Informe con enfoque de genero MIFE	149 - INFORME	1	0	0%	0	0	0%
	12 - Supervisiones contratadas para verificación de intervenciones en los centros educativos. MIFE	129 - SUPERVISION	1	0	0%	0	0	0%
014 - PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS	04 - Capacitación para la formación al fortalecimiento institucional y equipamiento a funcionarios coejecutores del programa (INJ, Alcaldías, FHIS). CONVIVIR Fase II	1009 - CAPACITACIÓN	4	0	0%	4	0	0%
	05 - Talleres para la formación de habilidades sociales y laborales para jóvenes en los lugares de incidencia del programa. CONVIVIR FASE II	156 - TALLER	4	0	0%	0	0	0%
	07 - Supervisión de Infraestructura de recuperación de espacios públicos. CONVIVIR FASE II	129 - SUPERVISION	1	0	0%	0	0	0%
	08 - Asistencia técnica de la Consultoría Internacional para la ejecución de proyectos de infraestructura y social. CONVIVIR FASE II	992 - ASISTENCIA TÉCNICA	4	0	0%	1	0	0%
	09 - Equipo entregado para las obras de infraestructura del programa. CONVIVIR FASE II	392 - EQUIPO	1	0	0%	0	0	0%
	10 - Informe con enfoque de genero. CONVIVIR FASE II	149 - INFORME	4	0	0%	1	0	0%
060 - ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS	15 - Acta de recepción de proyectos entregados PIOH	991 - ACTA	7	0	0%	4	0	0%
	16 - Informe con enfoque de genero. PIOH	149 - INFORME	3	0	0%	1	0	0%

Ejecución al II Trimestre 2022

Secretaría de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento (SEDECOAS/FHIS)
