

Secretaría de Finanzas

Subsecretaría de Crédito e  
Inversión Pública



# Informe de Avance Físico y Financiero

AL II TRIMESTRE 2022

***Secretaría de Infraestructura y  
Transporte  
(SIT)***

Tegucigalpa, Honduras

julio, 2022

[www.sefin.gob.hn](http://www.sefin.gob.hn)



### 3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

Al cierre del segundo trimestre de 2022, la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), reporta un Presupuesto de Inversión Vigente de **L776.2 millones**, de los cuales L408.7 millones corresponden al Sector Carreteras, representando el 50.8% de la inversión de dicho Sector (L804.9 millones); y L 367.5 millones del Sector de Transporte y Obras Públicas que representan el 33.4% de la inversión (L627.1 millones).

Al 30 de junio de 2022 la INSEP no presenta ejecución presupuestaria, esto debido a la publicación del PCM 005-2022, donde la INSEP queda suprimida y se crea la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), quien será el nuevo ejecutor de los proyectos de inversión pública vigentes de la INSEP. Para ello, se requiere efectuar enmienda a las notas de prioridad y convenios de préstamo ante los organismos financieros, así como los ajustes correspondientes a nivel de sistemas.


Para el año 2022, la INSEP cuenta con una cartera de 5 proyectos, financiados en un 80% (L621.14 millones) con Fondos Nacionales; y el 20% (L155.1 millones) con Crédito Externo, a través de aportes del Banco Europeo de Inversiones (BEI) tal como se muestra en el gráfico No. 1:

Cuadro No. 01  
Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del 2022  
Cifras en Lempiras

| Descripción  | Monto       |
|--|-------------|
| Presupuesto Aprobado                                     | 776,260,530 |
| Presupuesto Vigente                                      | 776,260,530 |
| Devengado II Trimestre-2022                              | 0           |
| <b>% Ejecución (Devengado II Trim-2022/ Vigente)</b>     | <b>0%</b>   |
| Devengado Anual  | 0           |
| <b>% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)</b>           | <b>0</b>    |
| Comprometido (Devengado + Compromiso)                    | 0           |
| <b>% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)</b> | <b>0%</b>   |


Fuente: SIAFI, 30/06/2022

Gráfico No. 1  
Financiamiento de la Inversión por Fuente  
Cifras en Millones de Lempiras

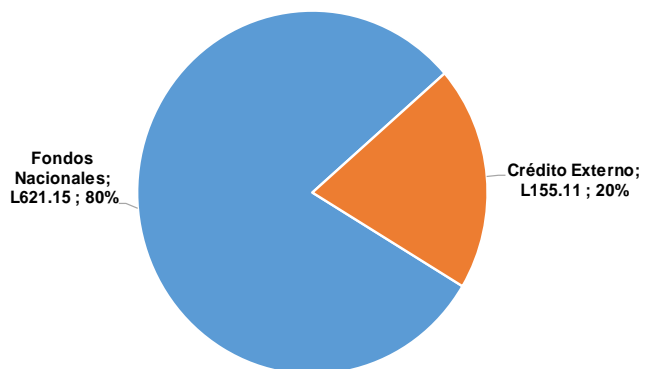

#### 3.1.1 EJECUCIÓN HISTÓRICA 2018-2022

La Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP) en el período comprendido del año 2018 al 2022 ha ejecutado cuarenta y nueve (49) proyectos de inversión pública los cuales han sido financiados con recursos otorgados por el BCIE, BEI, CEE y el Gobierno de Honduras (por medio de fondos nacionales).

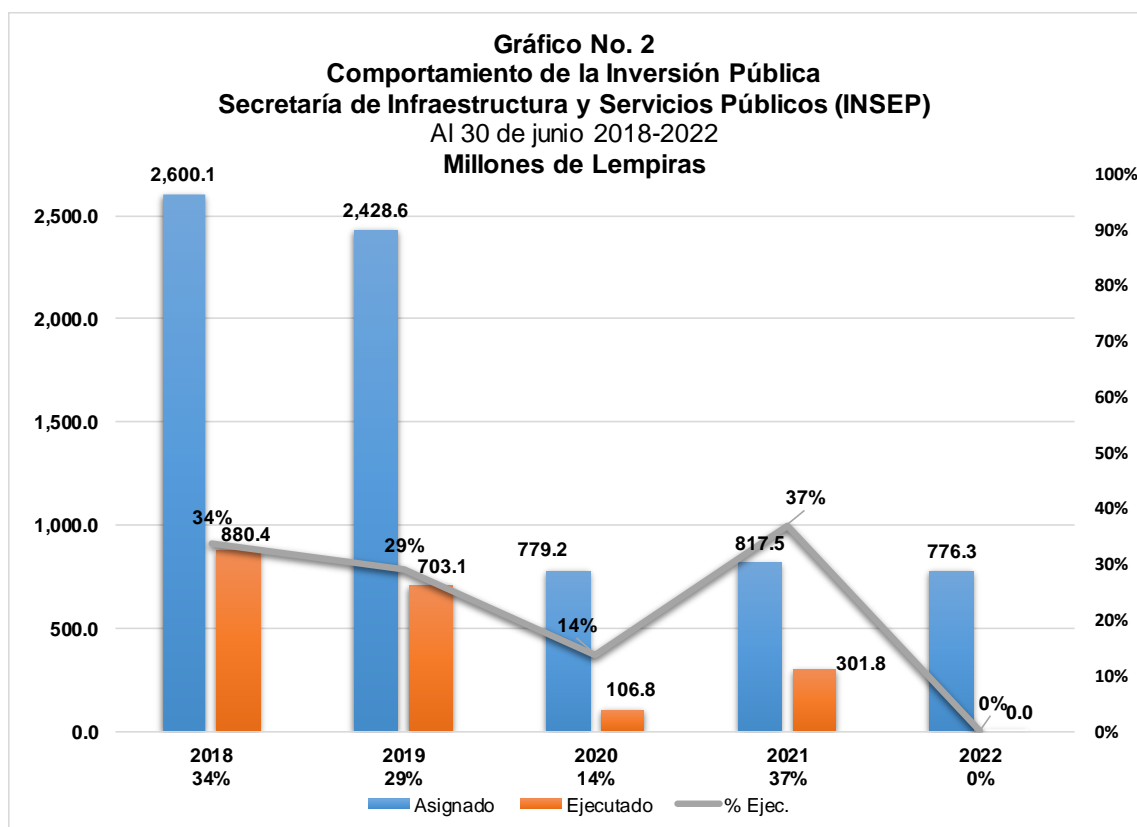

Durante el periodo comprendido del año 2018 al 2022, la INSEP ha realizado grandes obras a través de los proyectos de inversión pública que ha administrado. Entre estos proyectos se encuentran los siguientes: Proyectos de construcción, rehabilitación, restauración y reparación de carreteras a nivel nacional; Construcción y pavimentación de bulevares a cuatro carriles en las ciudades de Comayagua (etapa I y II), Choluteca e Intibucá, Construcción y pavimentación de tramo carretero Valladolid – La Virtud – Mapulaca, en el departamento de Lempira.

### 3.2 PRINCIPALES PROYECTOS GESTION 2022

Del total de la cartera de proyectos vigentes de la INSEP se resaltan los siguientes:

- **Proyectos con financiamiento de Fondos Nacionales:**

1. Construcción del edificio anexo del Tribunal Superior de Cuenta, ubicado en la ciudad de Comayagüela, Municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán.
2. Construcción de obras de mitigación de riesgos contra inundaciones erosión, sedimentos y drenajes menores en los Departamentos de Islas de la Bahía, Atlántida, Copan, Francisco Morazán y Comayagua.
3. Oras de pavimentación con estructura de concreto hidráulico en los departamentos de; Valle, Comayagua, Intibucá, El Paraíso, Lempira, Copán, Ocotepeque, Atlántida, Colón, La Paz, Yoro, Francisco Morazán.
4. Construcción de Pavimentos de Concreto Hidráulico en Vías Urbanas en los Departamentos del Paraíso, Cortes, Olancho, Copan, La Paz, Francisco Morazán, Santa Bárbara, Intibucá, Valle, Atlántida, Ocotepeque.

- **Proyectos con financiamiento de Fondos Externos:**

1. Rehabilitación Vial del Corredor de Occidente: La Entrada - Copan Ruinas - El Florido y La Entrada - Santa Rosa de Copan.

A continuación, se detallan los avances de los principales proyectos de la INSEP:

| Proyecto   | Convenio                          | Costo Estimado<br>Total HNL <sup>1</sup> |                  | Inicio – Fin            |
|--|-----------------------------------|--|------------------|-------------------------|
| <b>Construcción del edificio anexo del Tribunal Superior de Cuenta, ubicado en la ciudad de Comayagüela, Municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán</b>   | <b>Total</b><br>Fondos Nacionales | 107,133,718.00                           |                  | 15/03/2021 - 15/12/2022 |
|  | <b>Financiera</b>                 |  |                  |                         |
|  | <b>Presupuesto Aprobado</b>       | <b>Presupuesto Vigente</b>               | <b>Devengado</b> | <b>% Ejec.</b>          |
| II Trimestre 2022  | 82,133,718.00                     | 82,133,718.00                            | 0.00             | 0%                      |
| Acumulado Vida del Proyecto*/  | 107,133,718.00                    | 107,133,718.00                           | 20,474,128.48    | 19%                     |
| Avance Físico:   |                                   |  |                  |                         |
| En el presente trimestre, el proyecto no reporta ejecución física ni financiera; los contratos de Obra y supervisión requieren de la aprobación por parte del Congreso Nacional, según lo establecido en los artículos 114 de las Disposiciones Generales de Presupuesto Vigentes (DGP) y 146 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. |                                   |  |                  |                         |
| Según el PCM 005-2022, este proyecto debe ser trasladado a la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), donde se requerirá enmienda a la Nota de Prioridad No. 23959-1, previo reanudar su ejecución física y financiera.  |                                   |  |                  |                         |
| El proyecto presenta una ejecución física acumulada del 41%  |                                   |  |                  |                         |

| Proyecto  | Convenio   | Costo Estimado<br>Total HNL <sup>1</sup>  |                  | Inicio – Fin            |
|---|--|---|------------------|-------------------------|
| <b>Proyecto de Rehabilitación Vial del Corredor de Occidente</b>  | <b>Total</b><br>Fondos Nacional<br>BEI-FI<br>No.84859<br>BCIE-2156 | <b>4,536,275,857.30</b><br>365,309,059.20<br>3,345,234,179.98<br>417,347,320.82 |                  | 11/06/2015 - 10/06/2022 |
|   | <b>Financiera</b>  |   |                  |                         |
|   | <b>Presupuesto Aprobado</b>  | <b>Presupuesto Vigente</b>  | <b>Devengado</b> | <b>% Ejec.</b>          |
| II Trimestre 2022   | 408,726,812.00   | 408,726,812.00  | 0.00             | 0%                      |
| Acumulado Vida del Proyecto*/   | 4,536,275,857.3  | 4,536,275,857.3   | 4,198,988,554.80 | 92%                     |
| Avance Físico:  |  |   |                  |                         |
| El proyecto ha ejecutado el 99.9 % de su meta física en los tramos La Entrada – Santa Rosa; La Entrada – Los Ranchos; y Los Ranchos – El Florido; con una longitud de 119 kilómetros en total. Esta carretera fue finalizada en el año 2019, la cual fue recepcionada por la INSEP en el mes de enero de 2020.  |  |   |                  |                         |
| Para el año 2022 se contempla la Rehabilitación de 25 sitios dañados por el paso de las tormentas tropicales ETA e IOTA con un costo estimado de \$15.89 millones; de los cuales el 50% será financiado con recursos de contraparte nacional y el otro 50% con fondos del Convenio de Préstamo BEI-FI NO.84859 (Presupuesto contemplado en el monto priorizado por INSEP para la gestión 2022). |  |   |                  |                         |

Según el PCM 005-2022, este proyecto sería trasladado a la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), donde se requerirá enmienda a la Nota de Prioridad y al convenio suscrito con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), previo a su traslado y reanudar su ejecución física y financiera.

Durante el mes de mayo, la SIT solicitó por medio de oficio SIT-SE-018-2022, una ampliación de plazo a la fecha de último desembolso hasta el mes de diciembre de 2023, específicamente del Convenio de Préstamo FI N°84859. Tras análisis de la solicitud, la DGIP a través de oficio DGIP-PROGSEG-0041-2022 recomendando dar cumplimiento a los PCM 005-2022 y 011-2022, previo a gestionar una nueva ampliación de plazo se debe realizar el cambio de organismo ejecutor para que la SIT pueda gestionar ampliaciones de plazo, cambios entre categorías de inversión, enmiendas a alcance del proyecto y otras gestiones según la normativa legal vigente.

Debido a que la fecha de último desembolso era el 10 de junio de 2022, la INSEP deberá gestionar oportunamente el pago de compromisos pendientes de pago a contratistas y efectuar el cierre del Proyecto en la INSEP.

### 3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Tras la publicación de los PCM 005-2022 y 011-2022 donde se crea la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) y se suprime la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), se realizaron reuniones con la SIT referente al estatus de los proyectos en cierre, los que serán trasladados a la SIT y los nuevos en formulación para la gestión 2022 y 2023.
- A inicio de cada mes se solicitó a INSEP las proyecciones actualizadas de ejecución presupuestaria para cada uno de los proyectos que ejecutan.
- Se sostuvo reunión con el liquidador asignado a la INSEP donde se abordó el estatus de los proyectos de arrastre que no cuentan con presupuesto vigente en la gestión actual, los cuales tienen estimaciones por avance de obra pendientes de pago.

### Conclusiones

- Al cierre del segundo trimestre del 2022, la INSEP no presenta ejecución presupuestaria, lo que genera alertivos en las inversiones actuales en ejecución debido a los compromisos con pagos pendientes y proyectos en cierre.
- La SIT como nuevo ejecutor de los proyectos que administraba la INSEP, deberá gestionar oportunamente el cambio de organismo ejecutor de los proyectos que serán trasladados a la nueva Institución.

### Recomendaciones

- La SIT deberá revisar la programación física y financiera con el propósito de asegurar el cumplimiento de los pagos o estimaciones presentadas por las empresas constructoras y supervisoras de los proyectos en ejecución y de este modo asegurar el pago de compromisos adquiridos.
- Las Unidades Ejecutoras deben incrementar su grado de responsabilidad e involucramiento ante las gestiones técnico-operativo, de manera que su ejecución mejore año con año, dada la aplicación de buenas prácticas y

sistematización de procesos.

- Se deberán revisar los contratos de obra y supervisión de los proyectos cumpliendo con el marco legal establecido tanto de la Ley de contratación del estado, Ley Orgánica de Presupuesto, así como las Disposiciones Generales de Presupuesto.

ANEXO II  
 Secretaría de Finanzas  
 Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública  
**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL II TRIMESTRE, 2022**

| Institución   | Proyecto  | Resultado  | Unidad de Medida                               | Anual          |           |             | II Trimestre 2022 |           |             |
|---|---|--|--|----------------|-----------|-------------|-------------------|-----------|-------------|
|   |   |  |  | Programación   | Ejecución | % Ejecución | Programación      | Ejecución | % Ejecución |
| Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras  | 001 - MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES  | 02 - Hectáreas con actividades de restauración implementadas   | 44 - HECTÁREA                                  | 1              | 0         | 0%          | 1                 | 0         | 0%          |
|   |   | 03 - Cartas acuerdo para el desarrollo de investigaciones en salud y sanidad forestal implementadas      | 1001 - CARTA DE ENTENDIMIENTO                  | 3              | 0         | 0%          | 1                 | 0         | 0%          |
|   |   | 04 - Consultorías para mejora en el acceso al financiamiento climático contratadas                       | 369 - CONSULTORÍA                              | 2              | 0         | 0%          | 2                 | 0         | 0%          |
|   |   | 05 - Consultorías para el fortalecimiento Institucional contratadas                                      | 369 - CONSULTORÍA                              | 3              | 0         | 0%          | 3                 | 0         | 0%          |
|   |   | 06 - Evaluaciones y Auditorías Anuales Realizadas  | 149 - INFORME                                  | 1              | 0         | 0%          | 1                 | 0         | 0%          |
|   |   | 001 - TELESALUD PARA MITIGAR EL CORONAVIRUS Y MEJORAR EL ACCESO A LA SALUD EN HONDURAS                   | 02 - Soluciones de telesalud en funcionamiento | 140 - CANTIDAD | 1         | 0           | 0%                | 0         | 0           |
|   | 03 - Puntos de Atención con estrategia de innovación abierta  |  | 140 - CANTIDAD                                 | 1              | 0         | 0%          | 1                 | 0         | 0%          |
|   | 05 - Start Up que logran financiamiento   |  | 140 - CANTIDAD                                 | 4              | 0         | 0%          | 2                 | 0         | 0%          |
|   | 06 - Informe de la línea base elaborado   |  | 149 - INFORME                                  | 1              | 0         | 0%          | 1                 | 0         | 0%          |
|   | 002 - Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven | 02 - Educando atendidos bajo convenios de prestación de servicios educativos en modalidades alternativas | 1016 - EDUCANDO                                | 1              | 0         | 0%          | 1                 | 0         | 0%          |
|   |   | 03 - Docentes certificados en pedagogías de aprendizaje activo   | 31 - DOCENTE                                   | 1              | 0         | 0%          | 1                 | 0         | 0%          |
|   |   | 04 - Implementación de herramienta tecnológica para fortalecer los sistemas de la SEDUC.                 | 75 - PORCENTAJE                                | 1              | 0         | 0%          | 1                 | 0         | 0%          |
|   |   | 05 - Evaluación anual de cumplimiento técnico y financiera del proyecto joven.                           | 149 - INFORME                                  | 1              | 0         | 0%          | 1                 | 0         | 0%          |
|   |   | 02 - Convenios de Gestión del II nivel de atención firmados  | 26 - CONVENIO                                  | 3              | 0         | 0%          | 3                 | 0         | 0%          |
|   | 003 - PROYECTO DE MEJORA DE LA GESTION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO-NEONATAL           | 03 - Unidades de Cuidados Intensivos (UCIN), y Salas de Neonatología de obras hospitalarias construidas. | 538 - OBRA                                     | 1              | 0         | 0%          | 0                 | 0         | 0%          |
|   |   | 04 - Unidades de cuidados intensivos UCIN para el cuidado neonatal y áreas de Obstetricia equipadas      | 1082 - LOTE DE EQUIPO                          | 1              | 0         | 0%          | 0                 | 0         | 0%          |
|   |   | 05 - Consultorías para el fortalecimiento de la Secretaría de Salud (SESAL) contratadas                  | 155 - CONTRATO                                 | 12             | 0         | 0%          | 12                | 0         | 0%          |
|   |   | 06 - Informes de Auditoría del Proyecto elaborados   | 149 - INFORME                                  | 1              | 0         | 0%          | 1                 | 0         | 0%          |
|   | 004 - FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA RED DE ATENCIÓN DE TRAUMAS Y URGENCIAS DE TEGUCIGALPA            | 02 - Firma para elaborar el diseño del Hospital de Trauma contratada                                     | 155 - CONTRATO                                 | 1              | 0         | 0%          | 0                 | 0         | 0%          |
|   |   | 03 - Equipo para el hospital de trauma adquirido   | 1082 - LOTE DE EQUIPO                          | 1              | 0         | 0%          | 0                 | 0         | 0%          |
| 04 - Consultoría para el diseño de un sistema de Comunicación y Monitoreo entre la central de emergencia 911, las ambulancias y las emergencias de los Hospitales y Cliper contratada |   | 369 - CONSULTORÍA  | 1  | 0              | 0%        | 0           | 0                 | 0%        |             |
| 05 - Consultorías para realizar la Auditoría del Proyecto contratada  |   | 369 - CONSULTORÍA  | 1  | 0              | 0%        | 0           | 0                 | 0%        |             |





ANEXO II  
Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública  
**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL II TRIMESTRE, 2022**

| Institución | Proyecto  | Resultado   | Unidad de Medida            | Anual        |           |             | II Trimestre 2022 |           |             |
|-------------|---|---|-----------------------------|--------------|-----------|-------------|-------------------|-----------|-------------|
|             |   |   |                             | Programación | Ejecución | % Ejecución | Programación      | Ejecución | % Ejecución |
|             |   | 05 - Orden de Inicio para los Contratos del Equipo Principal y Obras de Instalación, emitida  | 1081 - INFORME TÉCNICO      | 1            | 0         | 0%          | 0                 | 0         | 0%          |
|             |   | 06 - Orden de Inicio para los Contratos del Equipo Auxiliar y Obras Civiles para la repotenciación del Complejo Hidroeléctrico, emitida   | 1081 - INFORME TÉCNICO      | 1            | 0         | 0%          | 0                 | 0         | 0%          |
|             |   | 08 - Consultorias para Estudios Tecnicos del Balance Hidrico Dinamico y BatimetConsultorias para Estudios Tecnicos del Balance Hidrico Dinamico y Batimetria en el Lago de Yojoa, realizadasria en el Lago de Yojoa, realizadas | 1081 - INFORME TÉCNICO      | 5            | 0         | 0%          | 0                 | 0         | 0%          |
|             |   | 09 - Plan Estratégico de Sensibilización y Extensión Comunitaria, elaborado   | 32 - DOCUMENTO              | 1            | 0         | 0%          | 0                 | 0         | 0%          |
|             |   | 10 - Consultoria para Evaluación de la Brecha de Conocimiento UMC, realizada  | 1081 - INFORME TÉCNICO      | 1            | 0         | 0%          | 0                 | 0         | 0%          |
|             |   | 11 - Auditoria financiera, realizada  | 1081 - INFORME TÉCNICO      | 1            | 0         | 0%          | 0                 | 0         | 0%          |
|             |   | 16 - Rehabilitación de Obras para el Canal de Yure , realizada  | 1081 - INFORME TÉCNICO      | 1            | 0         | 0%          | 0                 | 0         | 0%          |
|             |   | 17 - Sistemas de Excitación para las Unidades Principales de generación de la CHFM, instalado   | 392 - EQUIPO                | 1            | 0         | 0%          | 0                 | 0         | 0%          |
|             |   | 18 - Auditoria externa del proyecto realizada   | 1081 - INFORME TÉCNICO      | 1            | 0         | 0%          | 0                 | 0         | 0%          |
|             | 020 - APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER) | 02 - Medidores del Sistema de Medición Comercial de Transmisión suministrados   | 1081 - INFORME TÉCNICO      | 0            | 0         | #¡DIV/0!    | 0                 | 0         | 0%          |
|             |   | 03 - Auditoría Externa anual del proyecto elaborada   | 1068 - INFORME DE AUDITORIA | 1            | 0         | 0%          | 0                 | 0         | 0%          |
|             |   | 10 - Medidores del Sistema de Medición Comercial de Transmisión suministrados   | 149 - INFORME               | 1            | 0         | 0%          | 0                 | 0         | 0%          |
|             | 021 - APOYO AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES       | 02 - Política Energetica, comunicada y publicitada  | 32 - DOCUMENTO              | 1            | 0         | 0%          | 0                 | 0         | 0%          |
|             |   | 04 - Construcción de un Proyecto Piloto de Generacion Termosolar a partir de Energía Renovble No Convencional realizado   | 538 - OBRA                  | 1            | 0         | 0%          | 0                 | 0         | 0%          |
|             |   | 05 - Auditoria Externa realizada  | 1081 - INFORME TÉCNICO      | 1            | 0         | 0%          | 0                 | 0         | 0%          |
|             | 022 - ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LUGARES AISLADOS                       | 13 - Consultoria para el diseño de la estrategia de participación femenina en proyectos de sistemas de generación eléctrica (fotovoltaico) en lugares aislados realizada  | 1081 - INFORME TÉCNICO      | 1            | 0         | 0%          | 0                 | 0         | 0%          |
|             |   | 14 - Supervisión externa de los proyectos realizada   | 1081 - INFORME TÉCNICO      | 1            | 0         | 0%          | 0                 | 0         | 0%          |
|             |   | 15 - Sistemas fotovoltaicos domiciliarios en los municipios de El Corpus y Concepción de María, instalados y operando   | 1081 - INFORME TÉCNICO      | 2            | 0         | 0%          | 0                 | 0         | 0%          |
|             | 023 - APOYO AL PROGRAMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA  | 05 - Obras para la Construcción y Pruebas de Subestaciones y Líneas iniciadas   | 1084 - CONTRATO DE OBRA     | 6            | 0         | 0%          | 0                 | 0         | 0%          |
|             |   | 06 - Términos de Referencia y Presupuestos de las Consultorías especializadas elaborados  | 1081 - INFORME TÉCNICO      | 1            | 0         | 0%          | 0                 | 0         | 0%          |

ANEXO II  
 Secretaría de Finanzas  
 Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública  
**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL II TRIMESTRE, 2022**

| Institución                         | Proyecto  | Resultado  | Unidad de Medida            | Anual        |           |             | II Trimestre 2022 |           |             |
|-------------------------------------|---|--|-----------------------------|--------------|-----------|-------------|-------------------|-----------|-------------|
|                                     |   |  |                             | Programación | Ejecución | % Ejecución | Programación      | Ejecución | % Ejecución |
|                                     |   | 07 - Auditoría Externa del Proyecto de Apoyo a la Transmisión de Energía Eléctrica, elaborada  | 1068 - INFORME DE AUDITORIA | 1            | 0         | 0%          | 0                 | 0         | 0%          |
|                                     |   | 08 - Supervisión, Gestión y Administración ENEE para la Construcción de las Subestaciones y Líneas de Transmisión realizada  | 155 - CONTRATO              | 1            | 0         | 0%          | 0                 | 0         | 0%          |
| Fondo Hondureño de Inversión Social | 001 - Ampliación Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Ciudad De Gracias, Departamento De Lempira | 01 - Sistema eléctrico y Sistema fotovoltaico instalados. AGUA POTABLE   | 82 - SISTEMA                | 1            | 0         | 0%          | 0                 | 0         | 0%          |
|                                     |   | 08 - Consultoría de estudio de la planta de tratamiento de agua potable y de las redes de distribución. AGUA POTABLE   | 369 - CONSULTORÍA           | 1            | 0         | 0%          | 0                 | 0         | 0%          |
|                                     |   | 09 - Consultoría de estudio ambiental realizada .AGUA POTABLE  | 369 - CONSULTORÍA           | 1            | 0         | 0%          | 0                 | 0         | 0%          |
|                                     |   | 10 - Construcción de conexiones de sistemas de agua potable en la ciudad de Gracias, Lempira. AGUA POTABLE.  | 564 - CONEXIÓN              | 1,244        | 0         | 0%          | 0                 | 0         | 0%          |
|                                     |   | 11 - Capacitaciones impartidas a los actores involucrados por parte de las instancias responsables y reguladoras de sistemas de agua potable en Honduras. AGUA POTABLE | 1009 - CAPACITACIÓN         | 5            | 0         | 0%          | 0                 | 0         | 0%          |
|                                     |   | 12 - Infraestructura del sistema de agua potable supervisada. AGUA POTABLE   | 129 - SUPERVISION           | 1            | 0         | 0%          | 0                 | 0         | 0%          |
|                                     |   | 13 - Informe con enfoque de genero elaborados. AGUA POTABLE  | 149 - INFORME               | 4            | 0         | 0%          | 1                 | 0         | 0%          |
|                                     | 001 - Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras.                | 03 - Expedientes de subproyectos formulados. PRE   | 395 - EXPEDIENTE            | 64           | 0         | 0%          | 0                 | 0         | 0%          |
|                                     |   | 04 - Supervisión de subproyectos. PRE  | 129 - SUPERVISION           | 44           | 0         | 0%          | 0                 | 0         | 0%          |
|                                     |   | 05 - Solicitudes de reembolso de gastos revisadas. PRE   | 500 - SOLICITUD             | 2            | 0         | 0%          | 1                 | 0         | 0%          |
|                                     |   | 06 - Actas de reembolso aprobadas. PRE   | 991 - ACTA                  | 1            | 0         | 0%          | 0                 | 0         | 0%          |
|                                     |   | 07 - Acciones de fortalecimiento institucional. PRE  | 131 - ACTIVIDAD             | 1            | 0         | 0%          | 1                 | 0         | 0%          |
|                                     |   | 08 - Participación comunitaria en la planificación y ejecución de los subproyectos. PRE  | 131 - ACTIVIDAD             | 1            | 0         | 0%          | 0                 | 0         | 0%          |
|                                     |   | 09 - Informe con enfoque de género. PRE  | 149 - INFORME               | 4            | 0         | 0%          | 1                 | 0         | 0%          |
|                                     | 008 - PROGRAMA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SU GESTION LOCAL                                 | 01 - Capacitación a los miembros de comité ejecutores de proyectos (CEP'S) FASE V PROMINE  | 1009 - CAPACITACIÓN         | 1            | 0         | 0%          | 0                 | 0         | 0%          |
|                                     |   | 02 - Capacitación a los miembros de comité ejecutores de proyectos (CEP'S) FASE IV PROMINE   | 1009 - CAPACITACIÓN         | 12           | 0         | 0%          | 2                 | 0         | 0%          |
|                                     |   | 03 - Informe con enfoque de genero PROMINE   | 149 - INFORME               | 4            | 0         | 0%          | 1                 | 0         | 0%          |
|                                     |   | 04 - Asistencia técnica para la ejecución del proyecto FASE V PROMINE  | 992 - ASISTENCIA TÉCNICA    | 1            | 0         | 0%          | 0                 | 0         | 0%          |
|                                     |   | 05 - Acciones para el fortalecimiento institucional del Fondo Hondureño de Inversión Social FASE V. PROMINE  | 131 - ACTIVIDAD             | 1            | 0         | 0%          | 0                 | 0         | 0%          |

ANEXO II  
 Secretaría de Finanzas  
 Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública  
**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL II TRIMESTRE, 2022**

| Institución | Proyecto  | Resultado   | Unidad de Medida           | Anual        |           |             | II Trimestre 2022 |           |             |
|-------------|---|---|----------------------------|--------------|-----------|-------------|-------------------|-----------|-------------|
|             |   |   |                            | Programación | Ejecución | % Ejecución | Programación      | Ejecución | % Ejecución |
|             |   | 06 - Acciones para el fortalecimiento institucional del Fondo Hondureño de Inversión Social FASE IV. PROMINE  | 131 - ACTIVIDAD            | 1            | 0         | 0%          | 0                 | 0         | 0%          |
|             | 011 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA                                   | 03 - Supervisión de Proyectos para seguridad ciudadana. ICS   | 129 - SUPERVISION          | 19           | 0         | 0%          | 16                | 0         | 0%          |
|             |   | 04 - Diseño y formulación de proyectos para seguridad ciudadana ICS   | 291 - DISEÑO               | 19           | 0         | 0%          | 0                 | 0         | 0%          |
|             |   | 05 - Informe con enfoque de género. ICS   | 149 - INFORME              | 2            | 0         | 0%          | 1                 | 0         | 0%          |
|             | 012 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS                               | 02 - Actividades Deportivas del Programa Deportivo y Formación de Valores. PCCMB  | 312 - ACTIVIDADE DEPORTIVA | 9            | 0         | 0%          | 0                 | 0         | 0%          |
|             |   | 03 - Supervisión de sistemas de agua potable en barrios intervenidos. PCCMB   | 129 - SUPERVISION          | 6            | 0         | 0%          | 0                 | 0         | 0%          |
|             |   | 03 - Supervisión de sistemas de saneamiento en barrios intervenidos. PCCMB  | 129 - SUPERVISION          | 6            | 0         | 0%          | 0                 | 0         | 0%          |
|             |   | 03 - Supervisión de vías pavimentadas en barrios. PCCMB   | 129 - SUPERVISION          | 6            | 0         | 0%          | 0                 | 0         | 0%          |
|             |   | 04 - Asistencia Técnica Equipo de Promoción Social ETEC. PCCMB  | 992 - ASISTENCIA TÉCNICA   | 16           | 0         | 0%          | 0                 | 0         | 0%          |
|             |   | 05 - Informe con enfoque de genero. PCCMB   | 149 - INFORME              | 4            | 0         | 0%          | 1                 | 0         | 0%          |
|             | 013 - PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y FORMACION EDUCATIVA EN HONDURAS | 01 - Capacitaciones impartidas para la formación en metodologías basadas en normas y evaluación por competencia a Docente. MIFE                                       | 1009 - CAPACITACIÓN        | 1            | 0         | 0%          | 0                 | 0         | 0%          |
|             |   | 02 - Capacitaciones impartidas para la formación en emprendimiento a docentes y alumnos. MIFE   | 1009 - CAPACITACIÓN        | 1            | 0         | 0%          | 0                 | 0         | 0%          |
|             |   | 10 - Proyectos contratados para la mejora de la Infraestructura de los centros educativos. MIFE   | 305 - PROYECTO             | 3            | 0         | 0%          | 0                 | 0         | 0%          |
|             |   | 11 - Informe con enfoque de genero MIFE   | 149 - INFORME              | 1            | 0         | 0%          | 0                 | 0         | 0%          |
|             |   | 12 - Supervisiones contratadas para verificación de intervenciones en los centros educativos. MIFE  | 129 - SUPERVISION          | 1            | 0         | 0%          | 0                 | 0         | 0%          |
|             | 014 - PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS                      | 04 - Capacitación para la formación al fortalecimiento institucional y equipamiento a funcionarios coejecutores del programa (INJ, Alcaldías, FHIS). CONVIVIR Fase II | 1009 - CAPACITACIÓN        | 4            | 0         | 0%          | 4                 | 0         | 0%          |
|             |   | 05 - Talleres para la formación de habilidades sociales y laborales para jóvenes en los lugares de incidencia del programa. CONVIVIR FASE II                          | 156 - TALLER               | 4            | 0         | 0%          | 0                 | 0         | 0%          |
|             |   | 07 - Supervisión de Infraestructura de recuperación de espacios públicos. CONVIVIR FASE II  | 129 - SUPERVISION          | 1            | 0         | 0%          | 0                 | 0         | 0%          |
|             |   | 08 - Asistencia técnica de la Consultoría Internacional para la ejecución de proyectos de infraestructura y social. CONVIVIR FASE II                                  | 992 - ASISTENCIA TÉCNICA   | 4            | 0         | 0%          | 1                 | 0         | 0%          |
|             |   | 09 - Equipo entregado para las obras de infraestructura del programa. CONVIVIR FASE II  | 392 - EQUIPO               | 1            | 0         | 0%          | 0                 | 0         | 0%          |
|             |   | 10 - Informe con enfoque de genero. CONVIVIR FASE II  | 149 - INFORME              | 4            | 0         | 0%          | 1                 | 0         | 0%          |

ANEXO II  
 Secretaría de Finanzas  
 Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública  
**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL II TRIMESTRE, 2022**

| Institución  | Proyecto   | Resultado   | Unidad de Medida           | Anual        |           |             | II Trimestre 2022 |           |             |
|--|--|---|----------------------------|--------------|-----------|-------------|-------------------|-----------|-------------|
|  |  |   |                            | Programación | Ejecución | % Ejecución | Programación      | Ejecución | % Ejecución |
|  | 060 - ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS                        | 15 - Acta de recepción de proyectos entregados PIOH   | 991 - ACTA                 | 7            | 0         | 0%          | 4                 | 0         | 0%          |
|  |  | 16 - Informe con enfoque de genero. PIOH  | 149 - INFORME              | 3            | 0         | 0%          | 1                 | 0         | 0%          |
| Instituto Hondureño de Antropología e Historia   | 001 - Proyecto de Clasificación y Digitalización de Fondos Documentales                      | 02 - Numero de documentos descritos y actualizados  | 32 - DOCUMENTO             | 11           | 0         | 0%          | 3                 | 0         | 0%          |
|  |  | 04 - Documentos alojados a la página del CDIHH  | 32 - DOCUMENTO             | 11           | 0         | 0%          | 3                 | 0         | 0%          |
| Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal   | 001 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS DE HONDURAS- SINAPH (LIFEWEB) | 09 - Planes Operativos Anuales en Áreas Protegidas implementados.   | 469 - PLAN OPERATIVO ANUAL | 15           | 0         | 0%          | 0                 | 0         | 0%          |
|  |  | 10 - Actores vinculados a la administración de las áreas protegidas fortalecidos para la gestión efectiva del territorio.   | 74 - PERSONA               | 100          | 0         | 0%          | 0                 | 0         | 0%          |
|  |  | 11 - Áreas protegidas con inversiones en medidas de conservación implementadas, que contribuyen a mejorar la efectividad de manejo de las áreas protegidas.               | 604 - AREA                 | 15           | 0         | 0%          | 0                 | 0         | 0%          |
|  | 001 - PROYECTO MANEJO INTEGRADO DE LA BIOSFERA DEL RIO PLATANO                               | 11 - Plan para la Protección y la Reducción de la Deforestación socializado y aprobado.   | 264 - PLAN                 | 1            | 0         | 0%          | 1                 | 0         | 0%          |
|  |  | 12 - Reuniones comunitarias para el levantamiento de información realizadas, para la formulación y diseño del Plan para la Protección y la Reducción de la Deforestación. | 154 - REUNION              | 5            | 0         | 0%          | 3                 | 0         | 0%          |
|  |  | 13 - Manuales de educación financiera actualizados, para abordar la temática de los mecanismos inclusivos para el clima.  | 32 - DOCUMENTO             | 2            | 0         | 0%          | 1                 | 0         | 0%          |
|  |  | 14 - Organizaciones locales identificadas y evaluadas para acceder a mecanismos financieros.  | 38 - EVALUACION            | 1            | 0         | 0%          | 1                 | 0         | 0%          |
| 15 - Modulo de alertas de deforestación en el Sistema de Información para la Gestión y Monitoreo Forestal (SIGMOF), funcionando.   | 1081 - INFORME TÉCNICO   | 2   | 0                          | 0%           | 1         | 0           | 0%                |           |             |
| 16 - Capacitación realizada en uso, manejo y mantenimiento de vehículos aéreos no tripulados, procesamiento de datos de sensores remotos utilizando plataformas no tripuladas. | 1009 - CAPACITACIÓN  | 1   | 0                          | 0%           | 0         | 0           | 0%                |           |             |
| Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)  | 004 - ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO (USAID-GAFSP)  | 07 - Sub-proyectos de higiene en el hogar, Clúster 1  | 305 - PROYECTO             | 1,000        | 0         | 0%          | 1,000             | 0         | 0%          |
|  |  | 08 - Sub-proyectos de higiene en el hogar, Clúster 2  | 305 - PROYECTO             | 1,000        | 0         | 0%          | 1,000             | 0         | 0%          |
|  |  | 09 - Atención de niños menores de 2 años por el proyecto ACS, Clúster 1   | 456 - NIÑO                 | 1,500        | 0         | 0%          | 1,500             | 0         | 0%          |
|  |  | 10 - Atención de niños menores de 2 años por el proyecto ACS, Clúster 2   | 456 - NIÑO                 | 1,500        | 0         | 0%          | 1,500             | 0         | 0%          |

ANEXO II  
 Secretaría de Finanzas  
 Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública  
**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL II TRIMESTRE, 2022**

| Institución                           | Proyecto   | Resultado   | Unidad de Medida         | Anual        |           |             | II Trimestre 2022 |           |             |
|---------------------------------------|--|---|--------------------------|--------------|-----------|-------------|-------------------|-----------|-------------|
|                                       |  |   |                          | Programación | Ejecución | % Ejecución | Programación      | Ejecución | % Ejecución |
|                                       |  | 11 - Visitas de asistencia técnica y capacitación para mejorar la productividad, Clúster 1  | 127 - VISITA             | 500          | 0         | 0%          | 500               | 0         | 0%          |
|                                       |  | 12 - Visitas de asistencia técnica y capacitación para mejorar la productividad Cluster 2   | 127 - VISITA             | 500          | 0         | 0%          | 500               | 0         | 0%          |
|                                       |  | 13 - Sub-proyectos de planes de negocio, Clúster 1  | 305 - PROYECTO           | 45           | 0         | 0%          | 45                | 0         | 0%          |
|                                       |  | 14 - Sub-proyectos de planes de negocio, Clúster 2  | 305 - PROYECTO           | 85           | 0         | 0%          | 85                | 0         | 0%          |
|                                       | 009 - Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II)<br>Tipo de proyecto: Inversión Pública | 02 - Perfiles de planes de negocios aprobados   | 302 - PERFIL             | 60           | 0         | 0%          | 20                | 0         | 0%          |
|                                       |  | 03 - Fortalecimiento Institucional de ARSA y SENASA   | 991 - ACTA               | 2            | 0         | 0%          | 0                 | 0         | 0%          |
|                                       | 011 - CORREDOR PACÍFICO-PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL REGIONAL  | 03 - Cierre financiero de obra del Tramo II, lote A: Jícaro Galán-Santa Elena realizado   | 1007 - NUMERO DE UNIDAD  | 1            | 0         | 0%          | 0                 | 0         | 0%          |
|                                       |  | 04 - Cierre financiero de la supervisión del Tramo II, lote A Jícaro Galán-Santa Elena realizado  | 1007 - NUMERO DE UNIDAD  | 1            | 0         | 0%          | 0                 | 0         | 0%          |
|                                       | 015 - Libramiento Anillo Periférico CA-5 Sur   | 06 - Proceso para la contratación de las obras del tramo Libramiento Sur iniciado   | 425 - LICITACION         | 1            | 0         | 0%          | 0                 | 0         | 0%          |
|                                       |  | 07 - Proceso para la contratación de la supervisión del tramo Libramiento Sur iniciado  | 364 - CONCURSO           | 1            | 0         | 0%          | 0                 | 0         | 0%          |
|                                       |  | 08 - Porcentaje del derecho de vía del tramo licitado del "Libramiento Sur" liberado  | 75 - PORCENTAJE          | 70           | 0         | 0%          | 0                 | 0         | 0%          |
|                                       | 018 - PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD  | 03 - Productores agropecuarios con planes para la adopción de tecnologías CI, atención técnica en producción, mercado y/o nutrición con el apoyo de la intervención (PIDRyP) beneficiados | 304 - PRODUCTOR          | 4,000        | 0         | 0%          | 0                 | 0         | 0%          |
|                                       |  | 04 - Acceso a Financiamiento para los productores rurales con el apoyo de la intervención (PIDRyP) otorgados  | 304 - PRODUCTOR          | 1,933        | 0         | 0%          | 0                 | 0         | 0%          |
|                                       | 022 - PROYECTO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN, SECCION I   | 10 - Cierre financiero contrato de supervisión Villa de San Antonio -Goascorán Sección I, realizado   | 1007 - NUMERO DE UNIDAD  | 1            | 0         | 0%          | 0                 | 0         | 0%          |
|                                       | 023 - PROYECTO DE SEGURIDAD HIDRICA EN EL CORREDOR SECO DE HONDURAS  | 02 - Asistencia técnica para la prestación de apoyo para la Gobernanza del Agua a nivel nacional, contratada  | 155 - CONTRATO           | 1            | 0         | 0%          | 0                 | 0         | 0%          |
|                                       |  | 03 - Diseño para la construcción de obras de la represa JCV (Compuertas), contratada  | 155 - CONTRATO           | 1            | 0         | 0%          | 0                 | 0         | 0%          |
|                                       | 024 - Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana  | 05 - Supervisión de obra para la rehabilitación de los sistemas de agua, contratada   | 155 - CONTRATO           | 1            | 0         | 0%          | 0                 | 0         | 0%          |
|                                       |  | 06 - Asistencia técnica para el fortalecimiento de los prestadores del servicio de agua potable (ERSAPS), contratada  | 155 - CONTRATO           | 1            | 0         | 0%          | 0                 | 0         | 0%          |
| Secretaría de Agricultura y Ganadería | 005 - PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL PROLENCA         | 03 - Planes de inversión aprobados por el comité de aprobación de inversiones y organismos financiador.   | 1089 - PLAN DE INVERSIÓN | 65           | 0         | 0%          | 65                | 0         | 0%          |
|                                       |  | 04 - Planes de fortalecimiento organizacional aprobados por las organizaciones beneficiadas   | 264 - PLAN               | 65           | 0         | 0%          | 0                 | 0         | 0%          |

ANEXO II  
Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública  
**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL II TRIMESTRE, 2022**

| Institución | Proyecto  | Resultado  | Unidad de Medida         | Anual        |           |             | II Trimestre 2022 |           |             |
|-------------|---|--|--------------------------|--------------|-----------|-------------|-------------------|-----------|-------------|
|             |   |  |                          | Programación | Ejecución | % Ejecución | Programación      | Ejecución | % Ejecución |
|             |   | 05 - Convenio suscritos con las organizaciones ( hombres, mujeres, jóvenes y etnias) beneficiadas para el financiamiento de sus planes de inversión.   | 26 - CONVENIO            | 25           | 0         | 0%          | 20                | 0         | 0%          |
|             |   | 06 - Asistencia técnica a Productores y productoras rurales de las organizaciones beneficiarias, aplicando medidas de bioseguridad.  | 992 - ASISTENCIA TÉCNICA | 65           | 0         | 0%          | 0                 | 0         | 0%          |
|             |   | 07 - Rehabilitación de líneas de conducción tuberías para sistemas de riego instalado en parcelas de tierra agrícola.  | 53 - KILÓMETRO           | 1            | 0         | 0%          | 0                 | 0         | 0%          |
|             |   | 08 - Convenio suscritos con las organizaciones ( hombres, mujeres, jóvenes y etnias) beneficiadas para el financiamiento de sus planes de inversión. (FIDA II)   | 26 - CONVENIO            | 40           | 0         | 0%          | 0                 | 0         | 0%          |
|             |   | 09 - Rehabilitación de líneas de conducción tuberías para sistemas de riego instalado en parcelas de tierra agrícola (FIDA II)   | 53 - KILÓMETRO           | 19           | 0         | 0%          | 0                 | 0         | 0%          |
|             |   | 10 - Rehabilitadas hectáreas de tierra agrícolas con acceso a riego (FIDA II).   | 44 - HECTÁREA            | 50           | 0         | 0%          | 0                 | 0         | 0%          |
|             | 007 - PROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)  | 01 - Capacitación impartidas en prácticas amigables con el medio ambiente y medidas de protección a las microcuencas, aplicando medidas de bioseguridad.   | 1009 - CAPACITACIÓN      | 50           | 0         | 0%          | 29                | 0         | 0%          |
|             |   | 02 - Capacitaciones brindadas a Productores y productoras de asociaciones de regantes (Organización, administración, producción, asistencia técnica y normas parlamentarias), aplicando medidas de bioseguridad. | 1009 - CAPACITACIÓN      | 2            | 0         | 0%          | 1                 | 0         | 0%          |
|             |   | 02 - Capacitaciones impartidas en diversificación agrícola (administración financiera, organización, canon de agua, desarrollo agroempresarial), aplicando medidas de bioseguridad.                              | 1009 - CAPACITACIÓN      | 16           | 0         | 0%          | 4                 | 0         | 0%          |
|             |   | 03 - Contratos suscritos de comercialización y financiamiento.   | 155 - CONTRATO           | 20           | 0         | 0%          | 7                 | 0         | 0%          |
|             |   | 06 - Líneas de tubería Instaladas (Conducción, Distribución y Terciarias).   | 53 - KILÓMETRO           | 13           | 0         | 0%          | 3                 | 0         | 0%          |
|             | 010 - PROYECTO DE DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO DEL VALLE DE JAMAISTRAN FASE 1   | 02 - Proceso de construcción de los módulos de riego.  | 75 - PORCENTAJE          | 100          | 0         | 0%          | 33                | 0         | 0%          |
|             | 013 - Proyecto de inclusión económica y social de pequeños productores rurales en la región noreste de Honduras (PROINORTE) | 04 - Diagnósticos Territoriales elaborados.  | 29 - DIAGNOSTICO         | 17           | 0         | 0%          | 5                 | 0         | 0%          |
|             |   | 05 - Cadenas de valor productivas priorizadas.   | 149 - INFORME            | 3            | 0         | 0%          | 0                 | 0         | 0%          |
|             |   | 06 - Diseño de campaña de concientización implementada.  | 149 - INFORME            | 1            | 0         | 0%          | 0                 | 0         | 0%          |
|             |   | 07 - Planes productivos de Inversión Formulados.   | 1089 - PLAN DE INVERSIÓN | 1            | 0         | 0%          | 0                 | 0         | 0%          |

ANEXO II  
 Secretaría de Finanzas  
 Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública  
**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL II TRIMESTRE, 2022**

| Institución                                 | Proyecto  | Resultado   | Unidad de Medida         | Anual        |           |             | II Trimestre 2022 |           |             |
|---|---|---|--------------------------|--------------|-----------|-------------|-------------------|-----------|-------------|
|   |   |   |                          | Programación | Ejecución | % Ejecución | Programación      | Ejecución | % Ejecución |
|   |   | 08 - Inversiones productivas aprobadas por el comité de inversiones.  | 1089 - PLAN DE INVERSIÓN | 1            | 0         | 0%          | 0                 | 0         | 0%          |
|   |   | 09 - Capacitaciones brindadas a los administradores de las estaciones agroclimáticas.   | 1009 - CAPACITACIÓN      | 1            | 0         | 0%          | 0                 | 0         | 0%          |
|   |   | 10 - Estudio de microcuencas (alta vulnerabilidad y riesgo) elaborados.   | 547 - ESTUDIO            | 1            | 0         | 0%          | 0                 | 0         | 0%          |
|   |   | 11 - Kits de herramientas entregados a las Unidades Municipales Ambientales (UMA) entregados.   | 1112 - KIT               | 2            | 0         | 0%          | 0                 | 0         | 0%          |
| Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | 021 - PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL / 6401-HN               | 02 - Informe de implementación del modelo de gestión homologado del Programa Bono Vida Mejor  | 149 - INFORME            | 4            | 0         | 0%          | 1                 | 0         | 0%          |
|   |   | 03 - Informes de Fortalecimiento del Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) y el Sistema de entrega  | 149 - INFORME            | 4            | 0         | 0%          | 1                 | 0         | 0%          |
|   |   | 04 - Informes de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno a través del gabinete social y al Centro Nacional de Información del Sector Social (CENISS) para la Integración del Sistema de Protección Social                            | 149 - INFORME            | 4            | 0         | 0%          | 1                 | 0         | 0%          |
|   |   | 09 - Análisis priorizados y/o por demanda para la entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas a hogares participantes del Programa Bono Vida Mejor Dominio Urbano (6401-HN)  | 1030 - BONO VIDA MEJOR   | 45,820       | 0         | 0%          | 45,820            | 0         | 0%          |
|   | 022 - APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 5008/BL-HO               | 05 - Informe del fortalecimiento de las Direcciones de la Sub Secretaría de Integración Social a través de la contratación y capacitación de recurso humano y contratación de la plataforma operativa en campo del Programa financiada con recursos del Préstamo BID 5008/BL-HO | 149 - INFORME            | 4            | 0         | 0%          | 1                 | 0         | 0%          |
|   |   | 06 - Informe del fortalecimiento de los servicios educativos, priorizando el tercer ciclo de educación.   | 149 - INFORME            | 4            | 0         | 0%          | 1                 | 0         | 0%          |
|   |   | 07 - Informe del Fortalecimiento del Ordenamiento del Piso de Protección Social   | 149 - INFORME            | 4            | 0         | 0%          | 1                 | 0         | 0%          |
|   |   | 10 - Análisis priorizados y/o por demanda para la entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas a hogares participantes del Programa Bono Vida Mejor Dominio Rural (6402-HN)   | 1030 - BONO VIDA MEJOR   | 53,653       | 0         | 0%          | 53,653            | 0         | 0%          |
| Secretaría de Educación                     | 007 - PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II) | 03 - Proyectos obra de infraestructura escolar diseñados y formulados   | 305 - PROYECTO           | 3            | 0         | 0%          | 2                 | 0         | 0%          |

ANEXO II  
 Secretaría de Finanzas  
 Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública  
**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL II TRIMESTRE, 2022**

| Institución            | Proyecto   | Resultado  | Unidad de Medida               | Anual        |           |             | II Trimestre 2022 |           |             |
|------------------------|--|--|--------------------------------|--------------|-----------|-------------|-------------------|-----------|-------------|
|                        |  |  |                                | Programación | Ejecución | % Ejecución | Programación      | Ejecución | % Ejecución |
|                        |  | 04 - Proyectos obra de infraestructura educativa, en los niveles Prebásica, Básica y de manera limitada en el nivel Medio, de los departamentos de: Ocotepeque, Lempira, Intibucá, La Paz, Santa Bárbara y Copán en la zona de occidente. Francisco Morazán, valle, Choluteca, Comayagua y Gracias a Dios, supervisados. | 579 - OBRA DE INFRAESTRUCTURA  | 24           | 0         | 0%          | 12                | 0         | 0%          |
|                        |  | 05 - Proyectos de obra de infraestructura escolar diseñados y formulados   | 305 - PROYECTO                 | 9            | 0         | 0%          | 4                 | 0         | 0%          |
|                        |  | 06 - Educandos de educación media, dotados con herramientas pedagógicas.   | 1016 - EDUCANDO                | 33,000       | 0         | 0%          | 0                 | 0         | 0%          |
|                        |  | 07 - Proyectos obra de infraestructura educativa, en los niveles prebásica, básica y de manera limitada en el nivel medio, de los departamentos de: Ocotepeque, Lempira, Intibucá, La Paz, Santa Bárbara y Copán en la zona de occidente. Francisco Morazán, valle, Choluteca, Comavagua y Gracias a Dios supervisados   | 579 - OBRA DE INFRAESTRUCTURA  | 12           | 0         | 0%          | 6                 | 0         | 0%          |
|                        | 010 - MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN PREBÁSICA EN HONDURAS | 11 - Modelo de la Calidad en la Gestión de la Educación Prebásica (MEP) diseñado, para todas las modalidades de atención del nivel de Educación Prebásica .  | 32 - DOCUMENTO                 | 1            | 0         | 0%          | 0                 | 0         | 0%          |
|                        |  | 12 - Instancias de participación comunitaria y escolar (COMDE/CODDE) capacitadas.  | 300 - ORGANIZACION             | 88           | 0         | 0%          | 55                | 0         | 0%          |
|                        |  | 13 - Centros de Educación Prebásica con herramientas curriculares actualizadas para todas las Modalidades de Atención del nivel de Educación Prebásica en CEPB y CCPREB  | 32 - DOCUMENTO                 | 1            | 0         | 0%          | 0                 | 0         | 0%          |
|                        |  | 14 - Estudios de factibilidad realizados en centros de educación prebásica, de los departamentos focalizados: Gracias a Dios, Lempira, Yoro, Olancho, Copán, El Paraíso.   | 1091 - ESTUDIO DE FACTIBILIDAD | 115          | 0         | 0%          | 0                 | 0         | 0%          |
|                        |  | 15 - Informes de ejecución de actividades del Proyecto "Mejoramiento de la Calidad en la Educación Prebásica en Honduras" elaborados por la Unidad Coordinadora .  | 149 - INFORME                  | 6            | 0         | 0%          | 1                 | 0         | 0%          |
|                        |  | 16 - Diseño Curricular actualizado para todas las Modalidades de Atención del nivel de Educación Prebásica y Prácticas de Enseñanza en CEPB y CCPREB mejoradas (CUI)   | 32 - DOCUMENTO                 | 1            | 0         | 0%          | 0                 | 0         | 0%          |
| Secretaría de Finanzas | 001 - Modernización Integral de la Gestión de las Finanzas Públicas    | 05 - Contratos derivados de los diferentes procesos de Licitación y Compra menor programadas en el Plan de Compra y Contrataciones del Estado.   | 32 - DOCUMENTO                 | 14           | 0         | 0%          | 5                 | 0         | 0%          |
|                        |  | 06 - Modernización de los Sistemas de la SEFIN.  | 32 - DOCUMENTO                 | 1            | 0         | 0%          | 0                 | 0         | 0%          |



ANEXO II  
 Secretaría de Finanzas  
 Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública  
**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL II TRIMESTRE, 2022**

| Institución  | Proyecto  | Resultado   | Unidad de Medida     | Anual        |           |             | II Trimestre 2022 |           |             |
|--|---|---|----------------------|--------------|-----------|-------------|-------------------|-----------|-------------|
|  |   |   |                      | Programación | Ejecución | % Ejecución | Programación      | Ejecución | % Ejecución |
|  |   | 07 - Formulación Presupuestaria de la Gestión de las Finanzas.  | 32 - DOCUMENTO       | 1            | 0         | 0%          | 0                 | 0         | 0%          |
| Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | 006 - CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ANEXO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA, UBICADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGÜELA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN                                   | 03 - Construcción de Edificio Anexo del TSC.  | 983 - METRO CUADRADO | 6,374        | 0         | 0%          | 2,125             | 0         | 0%          |
|  |   | 04 - Supervisión de Construcción de Edificio Anexo del TSC.   | 149 - INFORME        | 10           | 0         | 0%          | 3                 | 0         | 0%          |
|  | 017 - Construcción de obras de mitigación de riesgos contra inundaciones erosión, sedimentos y drenajes menores en los Departamentos de Islas de la Bahía, Atlántida, Copan, Francisco Morazan y Comayagua.     | 03 - Mediante medidas de mitigación contra inundaciones sistemas de drenaje de agua pluvial y construcción de cajas y drenaje tipo cuneta.                  | 65 - METRO CUBICO    | 1,452        | 0         | 0%          | 726               | 0         | 0%          |
|  |   | 04 - Supervisión de medidas de mitigación contra inundaciones sistemas de drenaje de agua pluvial y construcción de cajas y drenaje tipo cuneta.            | 149 - INFORME        | 25           | 0         | 0%          | 10                | 0         | 0%          |
|  | 029 - OBRAS DE PAVIMENTACIÓN CON ESTRUCTURA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LOS DEPARTAMENTOS DE; VALLE, COMAYAGUA, INTIBUCA, EL PARAISO, LEMPIRA, COPÁN, OCOTEPEQUE, ATLANTIDA, COLÓN, LA PAZ, YORO, FRANCISCO MORA  | 06 - Pavimentación de Calles  | 982 - METRO LINEAL   | 8,500        | 0         | 0%          | 5,950             | 0         | 0%          |
|  |   | 07 - Supervisión de Pavimentación de Calles   | 149 - INFORME        | 75           | 0         | 0%          | 53                | 0         | 0%          |
|  | 030 - Construcción de Pavimentos de Concreto Hidráulico en Vías Urbanas en los Departamentos del Paraíso, Cortes, Olancho, Copan, La Paz, Francisco Morazán, Santa Barbara, Intibucá, Valle, Atlántida, Ocotepe | 04 - Construcción de Pavimentos con con concreto hidráulico en vías urbanas en 16 departamentos.  | 982 - METRO LINEAL   | 22,320       | 0         | 0%          | 7,812             | 0         | 0%          |
|  |   | 05 - Supervisión de la Construcción de Pavimentos con con concreto hidráulico en vías urbanas en 16 departamentos.  | 982 - METRO LINEAL   | 22,320       | 0         | 0%          | 7,812             | 0         | 0%          |
|  | 121 - REHABILITACIÓN VIAL DEL CORREDOR DE OCCIDENTE: LA ENTRADA - COPAN RUINAS - EL FLORIDO Y LA ENTRADA-SANTA ROSA DE COPAN  | 04 - Construcción Rehabilitación Vial del Corredor de Occidente "La Entrada Copán Ruinas-El Florido y La Entrada-Santa Rosa de Copán"                       | 982 - METRO LINEAL   | 1,400        | 0         | 0%          | 525               | 0         | 0%          |
|  |   | 05 - Supervisión Rehabilitación Vial del Corredor de Occidente "La Entrada Copán Ruinas-El Florido y La Entrada-Santa Rosa de Copán"                        | 982 - METRO LINEAL   | 1,400        | 0         | 0%          | 525               | 0         | 0%          |
|  |   | 06 - Fortalecimiento Institucional para rehabilitación vial del corredor de occidente: La Entrada-Copán Ruinas-El Florido y La Entrada-Santa Rosa de Copán. | 149 - INFORME        | 3            | 0         | 0%          | 1                 | 0         | 0%          |
|  |   | 07 - Reasentamientos para rehabilitación vial del corredor de occidente: La Entrada-Copán Ruinas-El Florido y La Entrada-Santa Rosa de Copán.               | 149 - INFORME        | 6            | 0         | 0%          | 2                 | 0         | 0%          |

ANEXO II  
 Secretaría de Finanzas  
 Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública  
**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL II TRIMESTRE, 2022**

| Institución         | Proyecto  | Resultado   | Unidad de Medida  | Anual         |           |             | II Trimestre 2022 |           |             |
|---------------------|---|---|---|---------------|-----------|-------------|-------------------|-----------|-------------|
|                     |   |   |   | Programación  | Ejecución | % Ejecución | Programación      | Ejecución | % Ejecución |
| Secretaría de Salud | 019 - REEQUIPAMIENTO BIOMEDICO HOSPITAL MARIA ESPECIALIDADES PEDIATRICAS (HMEP)   | 05 - Equipadas las salas de quirófano, otorrinolaringología, cirugía , cuidados intensivos , sala de imagenología, entre otras con equipo biomédico especializado en el HMEP  | 1082 - LOTE DE EQUIPO   | 2             | 0         | 0%          | 0                 | 0         | 0%          |
|                     | 024 - RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID - 19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, EN HONDURAS   | 08 - Fortalecida en un 70% la capacidad de respuesta de las 20 Regiones Sanitarias (4518)   | 149 - INFORME   | 56            | 0         | 0%          | 33                | 0         | 0%          |
|                     |   | 09 - Fortalecida la capacidad de los servicios de salud del sistema público, para atender los pacientes con COVID19 (4518)  | 149 - INFORME   | 7             | 0         | 0%          | 3                 | 0         | 0%          |
|                     |   | 10 - Realizada la auditoria del Proyecto  | 149 - INFORME   | 19            | 0         | 0%          | 13                | 0         | 0%          |
|                     |   | 17 - Fortalecida la Red de diagnostico notificacion, seguimiento y respuesta laboratorial en las 20 Regiones Sanitarias (4518)  | 149 - INFORME   | 4             | 0         | 0%          | 3                 | 0         | 0%          |
|                     |   | 18 - Realizada la Implementacion de la Estrategia de comunicaci3n a traves del dise1o de materiales infograficos para la promosi3n de conductas y habitos saludables en la poblaci3n, que garantice la accesibilidad de la informaci3n a la poblaci3n diversa y capacitaci3n de normas y lineamientos al personal de salud. | 149 - INFORME   | 4             | 0         | 0%          | 3                 | 0         | 0%          |
|                     |   | 19 - Fortalecida en un 70% de la red de diagn3stico, notifi3n, seguimiento y respuesta laboratorial en las 20 Regiones Sanitarias (3815)  | 149 - INFORME   | 1             | 0         | 0%          | 1                 | 0         | 0%          |
|                     |   | 026 - HONDURAS SALUD MESOAMERICA GRT/HE-16838-HO  | 12 - Realizadas las Atenci3nes en preconcepci3n en embarazos, partos , puerperios , tamizaje c1ncer cervicouterino y planifi3n familiar | 149 - INFORME | 6         | 0           | 0%                | 6         | 0           |
|                     | 13 - Impresos y reproducidos los materiales para las reuniones t3cnicas, talleres y realizado el acompa1amiento t3cnico en el seguimiento, monitoreo y evaluaci3n a los gestores del primer y segundo nivel de atenci3n . |   | 149 - INFORME   | 3             | 0         | 0%          | 3                 | 0         | 0%          |
|                     | 14 - Realizadas las gestiones administrativas y proceso de cierre del proyecto  |   | 149 - INFORME   | 8             | 0         | 0%          | 6                 | 0         | 0%          |
|                     | 027 - PROYECTO HONDURAS - INICIATIVA REGIONAL DE ELIMINACI3N DE LA MALARIA (IREM EN MESOAM3RICA Y REPUBLICA DOMINICANA  | 06 - Continuidad de Consultorías de personal esencial de laboratorio y capacitados el personal de la red de unidades de an1lisis en diagn3stico de malaria.   | 149 - INFORME   | 66            | 0         | 0%          | 18                | 0         | 0%          |
|                     |   | 07 - Continuidad de consultorías de Personal m3dico y asistencial en las regiones y Capacitados en el manejo de casos de malaria.   | 149 - INFORME   | 13            | 0         | 0%          | 4                 | 0         | 0%          |
|                     |   | 08 - Fortalecida la conducci3n t3cnica y financiera del proyecto en el tema de la eliminaci3n de malaria en Honduras  | 149 - INFORME   | 28            | 0         | 0%          | 15                | 0         | 0%          |

ANEXO II  
 Secretaría de Finanzas  
 Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública  
**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL II TRIMESTRE, 2022**

| Institución | Proyecto   | Resultado   | Unidad de Medida | Anual        |           |             | II Trimestre 2022 |           |             |
|-------------|--|---|------------------|--------------|-----------|-------------|-------------------|-----------|-------------|
|             |  |   |                  | Programación | Ejecución | % Ejecución | Programación      | Ejecución | % Ejecución |
|             | 028 - APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 5008/BL-HO  | 09 - Mejorada la cobertura con servicios de Salud del Primer Nivel de atención a la población materno infantil  | 149 - INFORME    | 132          | 0         | 0%          | 41                | 0         | 0%          |
|             | 029 - APOYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE INTRODUCCIÓN DE LA VACUNA CONTRA LA COVID-19 EN HONDURAS   | 09 - Adquiridas 130368 dosis de vacunas y aplicadas a la población priorizada según el plan de Introducción de la vacuna contra la COVID 19   | 88 - VACUNA      | 130,368      | 0         | 0%          | 0                 | 0         | 0%          |
|             |  | 10 - Administración y Ejecución del Proyecto  | 149 - INFORME    | 4            | 0         | 0%          | 1                 | 0         | 0%          |
|             |  | 11 - Supervisión externa y Auditoría  | 9 - AUDITORIA    | 2            | 0         | 0%          | 1                 | 0         | 0%          |
|             | 030 - MEJORA DE LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE LA INFORMÁTICA EN SALUD EN HONDURAS   | 06 - Capacitado el personal de los Hospitales Gabriela Alvarado y Puerto Cortes en Gestión Hospitalaria   | 149 - INFORME    | 2            | 0         | 0%          | 1                 | 0         | 0%          |
|             |  | 07 - Adquirido , instalado y funcionando Equipo Infotecnologico en los hospitales seleccionados   | 392 - EQUIPO     | 8            | 0         | 0%          | 2                 | 0         | 0%          |
|             |  | 08 - Ejecutados los fondos de la gestión administrativa   | 149 - INFORME    | 12           | 0         | 0%          | 3                 | 0         | 0%          |
|             | 031 - PROYECTO DE RESPUESTA A EMERGENCIA HONDURAS COVID-19   | 13 - Realizados los Gastos Operativos la Supervisión y Seguimiento de actividades del Programa.   | 149 - INFORME    | 9            | 0         | 0%          | 3                 | 0         | 0%          |
|             |  | 14 - Adquirido equipo y mobiliario médico para los Hospitales , Regiones Sanitarias priorizadas y Laboratorio Nacional  | 425 - LICITACION | 15           | 0         | 0%          | 9                 | 0         | 0%          |
|             |  | 15 - Adquiridas vacunas para la población objetivo de acuerdo al Plan Nacional de Introducción de la vacuna contra la COVID-19 y Adquisición de equipo para cadena de frio  | 155 - CONTRATO   | 2            | 0         | 0%          | 1                 | 0         | 0%          |
|             | 032 - RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID-19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN HONDURAS (RISP-HO-2) | 12 - Fortalecer en un 70% la capacidad de respuesta de las 20 Regiones Sanitarias al año 2023   | 149 - INFORME    | 12           | 0         | 0%          | 6                 | 0         | 0%          |
|             |  | 13 - Fortalecido en un 70% la red de diagnóstico, notificación, seguimiento y respuesta laboratorial en las 20 Regiones Sanitarias y 26 hospitales del país, al año 2023.   | 149 - INFORME    | 1            | 0         | 0%          | 0                 | 0         | 0%          |
|             |  | 14 - Implementada las estrategias de comunicación multicanal a través del diseño de materiales infográficos y videos, para la promoción de conductas y hábitos saludables en la población, que garanticen la accesibilidad de la información para poblaciones diversas y la capacitación de normas y lineamientos al personal de salud en al menos un 90% para el año 2023. | 155 - CONTRATO   | 5            | 0         | 0%          | 2                 | 0         | 0%          |
|             |  | 15 - Fortalecer la capacidad de los servicios de salud del sistema público, para atender los pacientes con COVID -19 en al menos un 90% en las 20 Regiones Sanitarias y 26 hospitales para el 2023.   | 26 - CONVENIO    | 1            | 0         | 0%          | 0                 | 0         | 0%          |

ANEXO II  
 Secretaría de Finanzas  
 Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública  
**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL II TRIMESTRE, 2022**

| Institución                              | Proyecto  | Resultado  | Unidad de Medida            | Anual        |           |             | II Trimestre 2022 |           |             |
|--|---|--|-----------------------------|--------------|-----------|-------------|-------------------|-----------|-------------|
|  |   |  |                             | Programación | Ejecución | % Ejecución | Programación      | Ejecución | % Ejecución |
|  |   | 16 - Realizadas las gestiones Administrativas y Auditados en un 100% los fondos del credito al año 2023                              | 149 - INFORME               | 188          | 0         | 0%          | 78                | 0         | 0%          |
| Secretaría de Trabajo y Seguridad Social | 001 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JÓVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR) | 03 - Monitoreo y asistencias técnicas  | 32 - DOCUMENTO              | 1            | 0         | 0%          | 1                 | 0         | 0%          |
|  |   | 06 - Fortalecimiento para integración e interconexión de sistemas de información en temas de empleo, producción y seguridad social . | 32 - DOCUMENTO              | 1            | 0         | 0%          | 1                 | 0         | 0%          |
|  |   | 07 - Fortalecimiento para la reinserción de jóvenes en el valle de Comayagua   | 32 - DOCUMENTO              | 1            | 0         | 0%          | 1                 | 0         | 0%          |
| Servicio de Administración de Rentas     | 001 - Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Tributaria                                       | 02 - Modernización de los sistemas y de la infraestructura tecnológica   | 1078 - INFORME DE EJECUCIÓN | 4            | 0         | 0%          | 1                 | 0         | 0%          |

**Fuente:** SIAFI, 30/06/2022

ANEXO 4  
 Secretaría de Finanzas  
 Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública  
**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE, 2022**  
 Cifras en Lempiras

| No. Proy. | Sector / Institución / Proyecto  | Convenio        | Fecha de Inicio - Término | Presupuesto Aprobado |                 |               | Presupuesto Vigente |                 |              | Ejecutado (Devengado Anual) |                 |            |                         | Ejecutado (Devengado II Trimestre) |                 |           |                         |
|-----------|--|-----------------|---------------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|-----------------|------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------|
|           |  |                 |                           | Fondos Nacionales    | Fondos Externos | Total         | Fondos Nacionales   | Fondos Externos | Total        | Fondos Nacionales           | Fondos Externos | Total      | % Ejecución (Dev./Vig.) | Fondos Nacionales                  | Fondos Externos | Total     | % Ejecución (Dev./Vig.) |
| 4         | <b>CARRETERAS</b>  |                 |                           | 253,613,945          | 462,790,484     | 716,404,429   | 253,613,945         | 551,302,497     | 804,916,442  | -                           | 20,273,988      | 20,273,988 | 3%                      | -                                  | -               | -         | 0%                      |
| 1         | <b>0120 - Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos</b>   |                 |                           | 253,613,945          | 155,112,867     | 408,726,812   | 253,613,945.00      | 155,112,867.00  | 408726812.00 | -                           | -               | -          | 0%                      | -                                  | -               | -         | 0%                      |
| 1         | 121 - REHABILITACIÓN VIAL DEL CORREDOR DE OCCIDENTE: LA ENTRADA - COPAN RUINAS - EL FLORIDO Y LA ENTRADA-SANTA ROSA DE COPAN   | BEI-FI No.84859 | 11/06/2015 - 10/06/2022   | 253,613,945          | 155,112,867     | 408,726,812   | 253,613,945.00      | 155,112,867.00  | 408726812.00 | -                           | -               | -          | 0%                      | -                                  | -               | -         | 0%                      |
|           | <i>Total 121 - REHABILITACIÓN VIAL DEL CORREDOR DE OCCIDENTE: LA ENTRADA - COPAN RUINAS</i>  |                 |                           | 253,613,945          | 155,112,867     | 408,726,812   | 253,613,945.00      | 155,112,867.00  | 408726812.00 | -                           | -               | -          | 0%                      | -                                  | -               | -         | 0%                      |
| 5         | <b>TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS</b>   |                 |                           | 367,533,718          | 732,341,690     | 1,099,875,408 | 367,533,718         | 259,608,231     | 627,141,949  | -                           | 3,892,633       | 3,892,633  | 1%                      | -                                  | 2,507,938       | 2,507,938 | 0%                      |
| 4         | <b>0120 - Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos</b>   |                 |                           | 367,533,718          | -               | 367,533,718   | 367,533,718         | -               | 367,533,718  | -                           | -               | -          | 0%                      | -                                  | -               | -         | 0%                      |
| 1         | 006 - CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ANEXO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA, UBICADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGÜELA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN  | FN-23959-1      | 15/03/2021 - 15/12/2022   | 82,133,718           | -               | 82,133,718    | 82,133,718          | -               | 82,133,718   | -                           | -               | -          | 0%                      | -                                  | -               | -         | 0%                      |
|           | <i>Total 006 - CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ANEXO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA, UBICADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGÜELA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN</i>                                   |                 |                           | 82,133,718           | -               | 82,133,718    | 82,133,718          | -               | 82,133,718   | -                           | -               | -          | 0%                      | -                                  | -               | -         | 0%                      |
| 2         | 017 - Construcción de obras de mitigación de riesgos contra inundaciones erosión, sedimentos y drenajes menores en los Departamentos de Islas de la Bahía, Atlántida, Copan, Francisco Morazan y Comayagua.                  | FN-24431        | 01/03/2022 - 30/04/2022   | 15,000,000           | -               | 15,000,000    | 15,000,000          | -               | 15,000,000   | -                           | -               | -          | 0%                      | -                                  | -               | -         | 0%                      |
|           | <i>Total 017 - Construcción de obras de mitigación de riesgos contra inundaciones erosión, sedimentos y drenajes menores en los Departamentos de Islas de la Bahía, Atlántida, Copan, Francisco Morazan y Comayagua.</i>     |                 |                           | 15,000,000           | -               | 15,000,000    | 15,000,000          | -               | 15,000,000   | -                           | -               | -          | 0%                      | -                                  | -               | -         | 0%                      |
| 3         | 029 - OBRAS DE PAVIMENTACIÓN CON ESTRUCTURA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LOS DEPARTAMENTOS DE; VALLE, COMAYAGUA, INTIBUCA, EL PARAISO, LEMPIRA, COPÁN, OCOTEPEQUE, ATLANTIDA, COLÓN, LA PAZ, YORO, FRANCISCO MORA               | FN-24351        | 01/04/2022 - 31/10/2022   | 80,000,000           | -               | 80,000,000    | 80,000,000          | -               | 80,000,000   | -                           | -               | -          | 0%                      | -                                  | -               | -         | 0%                      |
|           | <i>Total 029 - OBRAS DE PAVIMENTACIÓN CON ESTRUCTURA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LOS DEPARTAMENTOS DE; VALLE, COMAYAGUA, INTIBUCA, EL PARAISO, LEMPIRA, COPÁN, OCOTEPEQUE, ATLANTIDA, COLÓN, LA PAZ, YORO, FRANCISCO MORA</i>  |                 |                           | 80,000,000           | -               | 80,000,000    | 80,000,000          | -               | 80,000,000   | -                           | -               | -          | 0%                      | -                                  | -               | -         | 0%                      |
| 4         | 030 - Construcción de Pavimentos de Concreto Hidráulico en Vías Urbanas en los Departamentos del Paraíso, Cortes, Olancho, Copan, La Paz, Francisco Morazán, Santa Barbara, Intibucá, Valle, Atlántida, Ocotepe              | FN-24468        | 01/05/2022 - 31/12/2022   | 190,400,000          | -               | 190,400,000   | 190,400,000         | -               | 190,400,000  | -                           | -               | -          | 0%                      | -                                  | -               | -         | 0%                      |
|           | <i>Total 030 - Construcción de Pavimentos de Concreto Hidráulico en Vías Urbanas en los Departamentos del Paraíso, Cortes, Olancho, Copan, La Paz, Francisco Morazán, Santa Barbara, Intibucá, Valle, Atlántida, Ocotepe</i> |                 |                           | 190,400,000          | -               | 190,400,000   | 190,400,000         | -               | 190,400,000  | -                           | -               | -          | 0%                      | -                                  | -               | -         | 0%                      |
