

INFORME GENERAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA



AL III TRIMESTRE 2022

www.sefin.gob.hn



DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

ÍNDICE

INVERSIÓN PÚBLICA AL TERCER TRIMESTRE DEL 2022	1
PRESENTACIÓN	1
1. ANÁLISIS GLOBAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA AL TERCER TRIMESTRE 2022 ..	2
1.1. Programa de Inversión Pública 2022.....	2
1.2. Inversión Pública por Institución 2022	3
1.3. Inversión Pública por Estructura del Sector Público	7
1.4. La Inversión Pública a Nivel de Sector de Inversión	8
1.5. Financiamiento del Programa de Inversión Pública	9
1.6. Ejecución histórica período 2018 - 2022	10
1.7. Ejecución Física a Nivel de Sectores	10
1.7.1. Sector Carreteras.....	11
1.7.2. Sector de Protección Social	12
1.7.3. Sector Energía	13
1.7.4. Sector Educación.....	15
1.7.5. Sector Salud.....	17
1.7.6. Sector Desarrollo Productivo y Riego	20
1.7.7. Sector Seguridad y Defensa.....	23
1.7.8. Sector Recursos Forestales y Ambiente	23
1.7.9. Sector Modernización del Estado.....	24
1.7.10. Sector de Transporte y Obras Públicas.....	26
1.8. Factores que han Incidido en la Ejecución de la Inversión Pública, durante el tercer trimestre del Año 2022.....	28

INVERSIÓN PÚBLICA AL TERCER TRIMESTRE DEL 2022

PRESENTACIÓN

El presente informe, muestra el análisis del comportamiento de la ejecución física y financiera de la Inversión Pública correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2022 (enero a septiembre). Este documento es elaborado por la Dirección General de Inversiones Públicas (DGIP) en el marco de sus competencias como ente técnico coordinador del Programa de Inversión Pública (PIP).

Durante el año 2022, se asumió la investidura de un nuevo Gobierno con el Plan de la Refundación de la Patria y la Construcción del Estado Socialista y Democrático 2022-2026, el cual define que el Programa de Inversión Pública tiene como objetivo principal apoyar el crecimiento económico, a través de inversiones estratégicas en infraestructura, en beneficio de los sectores productivos, su principal énfasis estará en la provisión de servicios, rehabilitación de carreteras, caminos en zonas postergadas y de energía, telecomunicaciones a las viviendas y plantas productivas.

Asimismo, se propuso garantizar el financiamiento de un Sistema Educativo renovado de clase mundial, en todos sus niveles y modalidades. Mediante la asignación necesaria para ofrecer educación pública de la mejor calidad, y pertinente con las realidades de nuestro pueblo, garantizando el acceso universal. Entre las metas propuestas del Plan de Refundación están; rehabilitar y repotenciar al menos el 50% de la infraestructura escolar durante el primer año de gobierno, llegando al 100% en el tercer año de gobierno, invertir en la construcción de nuevas aulas y escuelas en las zonas priorizadas.

Reorientar los programas asistenciales a fin de que verdaderamente lleguen a las familias de menores ingresos, y en forma transparente y garantizar un acceso integral a los servicios de salud, dado que no hay una cobertura aceptable de la seguridad y previsión social.

El Programa de Inversión Pública (PIP) aprobado para el año 2022 asciende a **L11,204.6 millones** y a la fecha cuenta con un presupuesto vigente de **L10,855.9 millones** para la ejecución de **L1,764.7 millones** que representa el 16.3% como porcentaje de ejecución, en 67 proyectos en los diferentes sectores prioritarios, incluyendo los coejecutados por las diferentes instituciones. El Programa de inversiones representa el 1.4% del Producto Interno Bruto (PIB)¹ y el 3.2% del Presupuesto General de República².

¹ Proyección Producto Interno Bruto (PIB) estimado para el año 2022 es de L771,074.8 millones, según cifras proporcionadas por la DPMF/SEFIN.

² Presupuesto General Vigente L338,722.5 millones al 30 de septiembre de 2022.

Como parte de las acciones del nuevo gobierno, se revisó el Presupuesto General de la República, que a su vez incluye el Programa de Inversión Pública, a fin de alinearlos conforme a las prioridades del nuevo Plan de Gobierno para la Refundación de la Patria, por lo que se publicó en el Diario Oficial La Gaceta una reforma a dicho presupuesto por medio del Decreto 30-2022 de fecha 8 de abril de 2022. Cabe resaltar que en dicha reforma fueron derogados los artículos que instruían registrar en el SNIPH los proyectos de APP y fideicomisos.

En base al Decreto 30-2022 publicado en la Gaceta en fecha 8 de abril del 2022, que constituyó una modificación del Presupuesto General de la República, se financiará a través de un préstamo del Banco Central de Honduras (BCH) hasta un monto de **US\$1,000 millones**, con el objetivo de financiar proyectos de inversión pública; los cuales serán incorporados al Presupuesto del Programa de Inversión Pública, y deberían ser registrados en el Sistema Nacional de Inversión Pública de Honduras (SNIPH), una vez estos cumplan con la pre-inversión de acuerdo con la normativa legal vigente.

1. ANÁLISIS GLOBAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA AL TERCER TRIMESTRE 2022

1.1. Programa de Inversión Pública 2022

El Programa de Inversión Pública (PIP) es el instrumento a través del cual se concretan las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo, haciendo compatible la planeación con el presupuesto, orientando la inversión hacia la generación de beneficios sociales y propiciando la gestión por resultados.

Al tercer trimestre del 2022 el Programa de Inversión Pública contó con un presupuesto vigente de **L10,855.9 millones** lo que representa **1.4%** del PIB para el año 2022 y el **3.2%** del Presupuesto General de República, el cual muestra una disminución global de **L12,528.6 millones**, respecto al presupuesto aprobado por el Congreso Nacional de la gestión anterior, lo que representa una reducción del 53.6% al presupuesto de Inversión Pública, esto debido a la derogación de fideicomisos (vida mejor, infraestructura vial, FINA II, etc.) ligados a corrupción e impunidad, cierre y liquidación de instituciones con duplicidad de funciones.

En cuanto al desempeño al 30 de septiembre de 2022, el Programa de Inversión Pública muestra una ejecución de **L1,764.7 millones** a nivel de devengado lo que representa el **16.3%** del total vigente, considerando únicamente los programas y proyectos incorporados en el Sistema Nacional de Inversión Pública de Honduras (SNIPH).

1.2. Inversión Pública por Institución 2022

La inversión a nivel institucional para el año 2022 de acuerdo con el presupuesto vigente representa **L10,214.7 millones** para la Administración Centralizada y **L641.2 millones** para el Resto del Sector Público (RSP).

En la Administración Central las instituciones que concentran el mayor presupuesto son: INVEST-HONDURAS³ con L1,603.9 millones, el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) con L1,561.9 millones, la Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPASH)⁴ con L1,224.0 millones, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica con L1,866.9 millones y la Secretaría de Salud con L908.1 millones, las cinco instituciones en conjunto representan el 70.1% del presupuesto vigente de la Administración Centralizada. En cuanto al Resto del Sector Público (RSP), la Suplidora Nacional de Productos Básicos (BANASUPRO) cuenta con un presupuesto vigente de L197.6 millones y representa el 30.8% del presupuesto vigente del Resto del Sector Público (RSP).

Por otro lado, de acuerdo con el Decreto 30-2022 de fecha 8 de abril de 2022 a través del préstamo del Banco Central de Honduras (BCH) hasta un monto de US\$1,000 millones la Dirección General de Inversiones Públicas ha emitido 18 Notas de Prioridad de proyectos con financiamiento BCH y presentan programación de ejecutar hasta un monto de L3,703.07 millones, tal como se describe en el siguiente cuadro:

Cuadro No. 01
Inversión Pública Financiamiento BCH al mes de septiembre de 2022
Cifras en Millones de Lempiras

No.	Institución	No. de Nota de Prioridad	Nombre del Proyecto por Institución	Monto Total Proyectos
1	Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM)	24618-1-06-22	Fortalecimiento Tecnológico del Programa de Vinculación Social y Extensión del Centro Universitario Regional de San Pedro Sula de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán	10.00
2	Heroico y Benemérito Cuerpo de Bomberos de Honduras (HBCBH)	24672-1-07-22	Equipamiento logístico de las 44 Estaciones Locales del Cuerpo de Bomberos de Honduras	45.70
3	Instituto Nacional Penitenciario (INP)	24752-1-07-22	Ampliación y mejoramiento de los centros penitenciarios de Honduras	778.60
4	Instituto Nacional de Estadística (INE)	24681-1-07-22	Levantamiento de cinco Encuestas para la Toma de Decisiones de interés Gubernamental a Nivel Nacional e Internacional	14.74
5	Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR)	24789-1-8-22	Diseño, Construcción y Remodelación de Espacios físicos para Actividades Recreativas y Deportivas a Nivel Nacional	492.70

³ Institución en proceso de liquidación según artículo No. 21 del PCM 005-2022.

⁴ Los proyectos bajo la responsabilidad de AEPAS-H serán ejecutados a través de la Red Solidaria según Artículo 12 del PCM 005-2022.

Dirección General de Inversiones Públicas (DGIP)

Cuadro No. 01
Inversión Pública Financiamiento BCH al mes de septiembre de 2022
 Cifras en Millones de Lempiras

No.	Institución	No. de Nota de Prioridad	Nombre del Proyecto por Institución	Monto Total Proyectos
6	Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL)	24725-1-07-22	Ampliación en las Redes de Conectividad y en Accesos a Clientes Corporativos y Residenciales (HONDUTEL)	36.40
7	Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)	24798-1-08-22	Mejoramiento de la Infraestructura de Desarrollo Social y Comunitario en Varios Departamentos de Honduras	499.70
8	Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (AHAC)	24734-1-07-22	Desarrollo del Sistema de Saneamiento de la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil	1.71
9	Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR)	24761-1-07-22	Fortalecimiento del servicio postal hondureño en varias oficinas postales del país	6.80
10	Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)	24832-1-08-22	Fortalecimiento de la Reserva estratégica de Granos Básicos, a través de la Comercialización y Rehabilitación de Bodegas y Silos en Tegucigalpa, San Pedro Sula y Danlí	98.80
11	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA)	24814-1-08-22	Programa de Reforestación Nacional y Protección de Cuencas Hidrográficas "Padre Andrés Tamayo"	725.00
12	Suplidora Nacional de Productos Básicos (BANASUPRO)	24912 -1-08-22	Abastecimiento de Centros de Venta de Honduras y Fortalecimiento al BANASUPRO	197.60
13	Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)	24896-1-08-22	Equipamiento de Talleres en las Cinco Regionales del INFOP y Capacitación de Instructores	99.70
14	Universidad Nacional de Ciencias Forestales (UNACIFOR)	24663-1-08-22	Remodelación de obras de Infraestructura y equipamiento para el Campus Central de UNACIFOR e Instalación de Fibra Óptica en el Centro de Investigación Jardín Botánico de Lancetilla y UNACIFOR	30.00
15	Secretaría de Educación	24841-1-09-22	Programa de Reconstrucción, Ampliación y Rehabilitación de Infraestructura Educativa e Implementación de Huertos Escolares Productivos en Centros Educativos de Honduras, Fase I	441.60
16	Hospital Escuela Universitario (HEU)	24985-1-9-22	Fortalecimiento de infraestructura y equipamiento tecnológico en el Hospital Escuela ubicado en la ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazán	214.02
17	Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación (IHCIETI)	24967-1-09-22	Espacios Comunitarios de la Ciencia, Tecnología e Innovación ubicados en Juan Francisco Bulnes (Gracias a Dios), Iriona (Colón), La Esperanza (Intibucá) y Tegucigalpa (Francisco Morazán)	4.77
18	Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación (IHCIETI)	24976-1-09-22	Instalación de Parque Tecnológico para la producción de insumos de bioseguridad y transferencia de conocimiento a jóvenes estudiantes de bajos recursos, ubicado en Aldea Flores, Villa de San Antonio, Comayagua.	5.23
Total General (Fuente 11-BCH)				3,703.07

Fuente: Unidad de Preinversión DGIP/SEFIN

De forma global la mayor asignación del presupuesto vigente se concentra en cinco (5) instituciones del sector público, con un monto asignado de L7,508.5 millones que en términos porcentuales representa cerca del 70% del presupuesto vigente del Programa de Inversión Pública para el año 2022, véase el resumen institucional del Programa de Inversión Pública a continuación:


Cuadro No. 2
Inversión Pública por Institución al mes de septiembre de 2022
Cifras en Millones de Lempiras

INSTITUCIÓN	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado Devengado	% Ejec. (Dev./Vig.)
Administración Central	10,856.1	10,214.7	1,631.6	16%
0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social	1,743.8	1,561.9	92.1	6%
0028 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal	76.6	59.2	6.0	10%
0031 - Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)	1,464.9	1,603.9	113.3	7%
0037 - Servicio de Administración de Rentas	146.3	153.8	61.8	40%
0050 - Secretaría de Educación	401.4	153.4	7.9	5%
0060 - Secretaría de Salud	113.9	908.1	289.0	32%
0070 - Secretaría de Seguridad	178.5	253.0	125.5	50%
0100 - Secretaría de Finanzas	162.0	162.0	2.1	1%
0120 - Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	776.3	776.3	0.0	0%
0130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social	1.7	8.4	8.4	100%
0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería	639.1	633.1	161.6	26%
0144 - Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible	0.0	0.0	0.0	0%
0240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social	433.4	433.4	28.1	6%
0244 - Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer	25.7	25.7	12.3	48%
0402 - Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras	1,339.9	1,224.0	161.5	13%
0413 - Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación	0.0	155.1	0.0	0%
0801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica	1,866.9	1,866.9	533.0	29%
1801 - Alcaldía Municipal del Distrito Central	481.0	236.4	28.8	12%
0449 - Reserva Presupuestaria para Proyectos	1,004.7	0.0	0.0	0.0%
Resto del Sector Público	348.5	641.2	133.1	21%
0505 - Instituto Hondureño de Antropología e Historia	1.1	1.1	0.4	35%
0801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica	343.7	343.7	43.5	13%
0806 - Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola	0.0	98.8	0.0	0%
0807 - Suplidora Nacional de Productos Básicos	0.0	197.6	89.2	45%
0449 - Reserva Presupuestaria para Proyectos	3.7	0.0	0.0	0%
TOTAL PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA⁵	11,204.6	10,855.9	1,764.7	16.3%

Nota. SIAFI, al 30 de septiembre de 2022

⁵ INVEST-H, INSEP y AEPAS-H se encuentran en proceso de transición según PCM 005-2022 de fecha 06 de abril de 2022.

Gráfica No. 1
Comparativo Inversión Pública 2021-2022
Relación Vigente/Ejecutado al III Trimestre
Cifras en millones de Lempiras

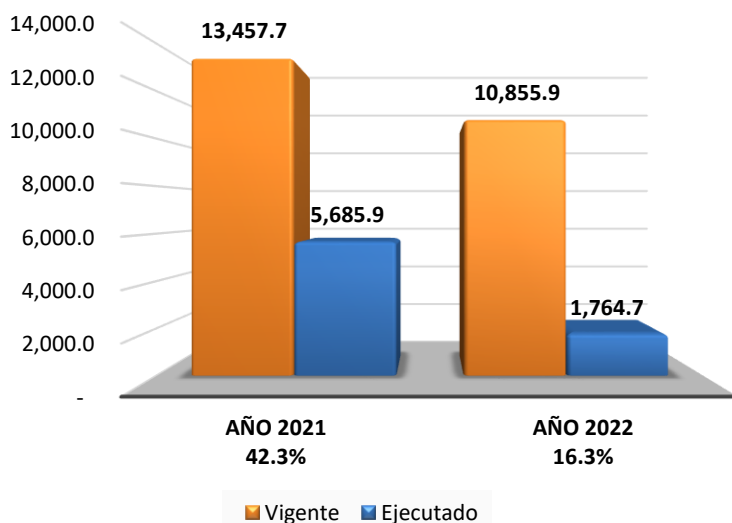

El desempeño de ejecución al tercer trimestre de 2022 a nivel de ejecutado devengado (16.3%) muestra una reducción de 26 puntos porcentuales (26%) en comparación con el tercer trimestre del año 2021 (42.3%), lo anterior se debe a los cambios estructurales derivados de los Acuerdos Ejecutivos (PCM) 005-2022, 009-2022 y 011-2022 en los cuales se han eliminado instituciones y se han creado otras, rotación de personal, así como la rescisión y liquidación de los contratos y/o convenios de fideicomisos suscritos.


Los retrasos en las ejecuciones por parte de las unidades ejecutoras se han generado en su mayoría por el proceso de transición del nuevo Gobierno, situación que ha ocasionado lentos procesos de adquisiciones, pagos a proveedores, falta de ratificación de contratos (obras, bienes y servicios) que trascendieron el periodo de Gobierno, retrasos en la ejecución de obras por la temporada ciclónica, así como el resto de actividades programadas en sus planes operativos anuales (POA) y planes de adquisiciones y contrataciones (PAC).

En el Plan de Inversión Pública se ejecutan programas y proyectos que contribuyen al incremento de los activos no financieros de las entidades que integran el Sector Público y los bienes y servicios de dominio público, con el fin de iniciar, ampliar, mejorar, modernizar, reponer o reconstruir la capacidad productiva de bienes y la prestación de servicios nacionales.

Cabe señalar, que la responsabilidad de ejecutar los recursos es exclusiva de la Unidad Ejecutora, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2, numeral 34, del Reglamento de las Disposiciones Generales del Presupuesto Vigente (Acuerdo Ejecutivo No. 349-2022), Artículo 2, numeral 34 el cual literalmente dice: "UNIDAD EJECUTORA: Es la unidad responsable de la ejecución, vigilancia y alcance de los objetivos y metas, con los recursos y los costos previstos. Desde el punto de vista de la administración presupuestaria constituye el área de una dependencia o entidad, con facultades para adquirir, contratar y cubrir compromisos. Esta figura orgánica y funcional se establece para efectos del ejercicio presupuestario, en su

aceptación más amplia, representa el ente responsable de la administración y ejecución de los programas, subprogramas y proyectos."

1.3. Inversión Pública por Estructura del Sector Público

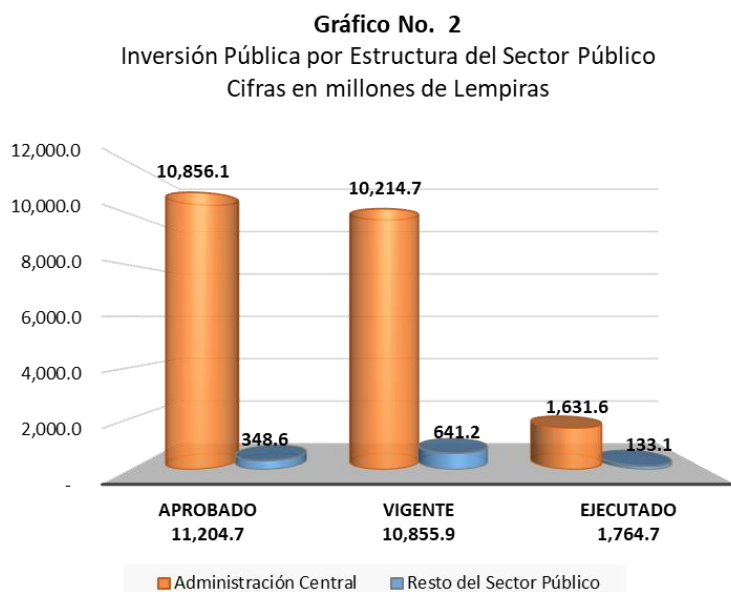


De acuerdo con lo anterior, el Programa de Inversión Pública cuenta con un presupuesto vigente al tercer trimestre de 2022 de **L10,855.9 millones** y la mayoría de ese presupuesto se concentra en proyectos ejecutados por instituciones de la Administración Centralizada, con 94.1%, tal como se mencionó anteriormente las instituciones que más cuentan con presupuesto son: INVEST-H, FHIS, AEPAS-H, Secretaría de Salud y la ENEE por Resto

del Sector Público (RSP), que alcanza 5.9%, cabe señalar que en este nivel se incorporaron proyectos del IHMA y BANASUPRO financiados con fondos de préstamo del Banco Central de Honduras (BCH).

La distribución del PIP para el año 2022 de acuerdo con la Clasificación del Sector Público, de acuerdo con el Presupuesto Aprobado fue de L11,204.7 millones; detallado para la Administración Centralizada (AC) L10,856.1 millones y el Resto del Sector Público (RSP) L348.6 millones; sin embargo, el presupuesto vigente es de L10,855.9 millones de los cuales L10,214.7 millones corresponden a la Administración Centralizada y L641.2 millones del Resto del Sector Público (RSP), mientras que a nivel de ejecución refleja L1,764.7 millones de los cuales L1,631.6 millones corresponden a la AC y L133.1 millones al RSP, tal como se muestra en la Gráfica 3.

Gráfico No. 3
Presupuesto Ejecutado
Clasificación de la Inversión Pública por estructura del Sector Público
Cifras en millones de Lempiras

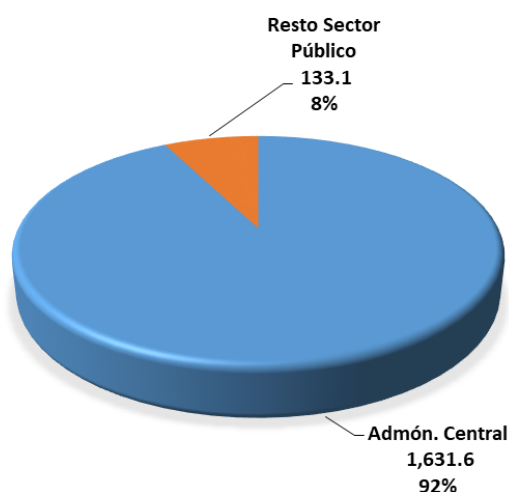

A continuación, véase la Inversión Pública por estructura del Sector Público al 30 de septiembre de 2022.


Cuadro No. 3
Inversión Pública: Clasificación Sector Público al 30 de septiembre de 2022
Cifras en millones de Lempiras

Sector Público	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Devengado Ejecutado			
	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejec. (Dev./Vig.)
Administración Central	944.8	9,911.2	10,856.0	1,424.2	8,790.5	10,214.7	21.9	1,609.6	1,631.6	16.0%
Resto del Sector Público	211.9	136.0	348.6	504.5	136.7	641.2	92.7	40.4	133.1	20.8%
Total General Inversión Pública	1,156.7	10,047.2	11,204.6	1,928.7	8,927.2	10,855.9	114.7	1,650.0	1,764.7	16.3%

Fuente: SIAFI al 30 de septiembre de 2022

1.4. La Inversión Pública a Nivel de Sector de Inversión

Gráfico No. 4
Inversión Pública: Distribución Sectorial
Presupuesto Vigente L10,855.9 millones
Cifras en millones de Lempiras

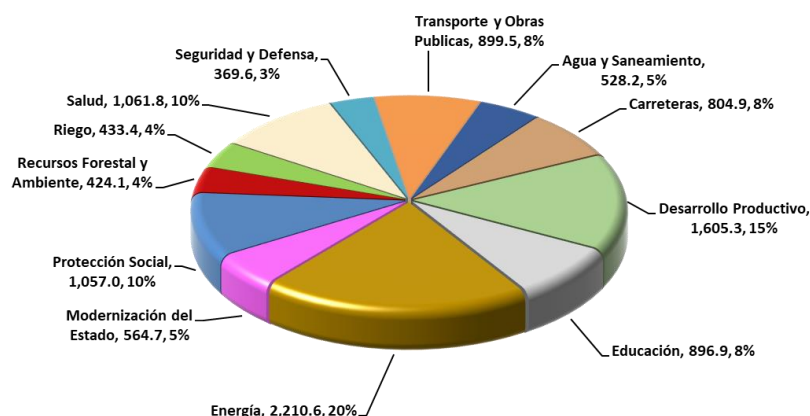

En cuanto a la inversión Sectorial, el **Sector Energía** cuenta con el mayor porcentaje de inversión con L2,210.6 Millones (20%) el cual incluye proyectos en ejecución por la ENEE para la ejecución de los proyectos de: Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral-Río Lindo, Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Regional

(MER). Electrificación Rural en Lugares Aislados y Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica.

Seguido del **Sector de Desarrollo Productivo** con L1,605.3 millones (15%) en apoyo a la población más vulnerable de la zona del corredor seco, con el proyecto Alianza para El Corredor Seco (USAID-GAFSP), proyecto Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II), beneficiando a los agricultores mediante la cadena agrícola, Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad, Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur Occidental Pro-Lenca.

El **Sector Salud** con una inversión L1,061.8 millones (10%), incluye Proyectos orientados al Plan de Vacunación contra el COVID-19 y mejora al sistema de los servicios

de Salud a través de proyectos de Inversión como ser el Proyecto para Apoyo al Sistema Integral de Protección Social, Mejora de la Gestión y Calidad de los servicios de Salud Materno-Neonatal, Proyecto Respuesta Inmediata e Salud RISP para contener y controlar el coronavirus COVID-19 y Mitigar su efecto en la prestación de servicio en Honduras.

El **Sector Protección Social** con una inversión de L1,057.0 millones (10%), contempla la ejecución de ocho (8) proyectos que serán ejecutados por la Red Solidaria como ser el Proyecto de los centros de atención integral para mejorar las condiciones de vida de las mujeres hondureñas, proyectos de apoyo al sistema de protección social (TMC) financiados por el Banco Mundial (BM), el proyecto de desarrollo empresarial financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otros.

Seguido el **Sector Educación** con una inversión de L823.6 millones (8%); ejecutando el Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y su Gestión Local (PROMINE), Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo (Proyecto Joven) y en menor porcentaje.

Finalmente, el **Sector Carretero** con una inversión de L804.9 millones (7%); constituye uno de los sectores de inversión pública más relevante, siendo un motor fundamental del desarrollo económico y social del país ya que genera oportunidades para los pobres y mejora la competitividad de la economía, en este sector se está ejecutando proyectos como el Corredor Pacífico, Corredor Occidente, Libramiento Anillo Periférico y Villa de San Antonio Goascorán.

El resto de los sectores: Transporte y Obras Públicas (9%), Modernización del Estado (5%), Agua y Saneamiento (5%), Riego (4%), Recursos Forestal y Ambiente (4%) y Seguridad y Defensa con (3%).

1.5. Financiamiento del Programa de Inversión Pública

El **18%** de la Inversión Pública Global del Presupuesto Vigente es financiado por fuente nacional (Fuentes 11 y 12); el **75%** es financiado por crédito externo (Fuente 21) y el **7%** por donaciones externas (Fuente 22).

Principalmente con recursos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Banco Mundial (BM), Unión Europea (UE) y Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID), Véase Cuadro 4.


FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado Devengado	% Ejecución (Dev./ Vig.)
Nacionales	1,152.97	1,928.71	114.66	5.9%
Crédito Externo	8,832.65	8,195.49	1,536.46	18.7%
Donaciones Externas	1,218.97	731.70	113.54	15.5%
Total Plan de Inversión	11,204.59	10,855.90	1,764.67	16.3%

Fuente: SIAFI, al 30 de septiembre de 2022

1.6. Ejecución histórica período 2018 - 2022

La ejecución total acumulada al mes de septiembre de 2022 registra una baja ejecución en comparación a los años anteriores, esto se debió principalmente a la reestructuración del nuevo gobierno, la reformulación del Presupuesto en abril y la falta de ratificación de contratos de proyectos que traspasaron periodo de gobierno.

Gráfico No. 5
Comportamiento de la Inversión Pública Histórica
Ejecución al 30 de septiembre 2018-2022
Cifras en millones de Lempiras

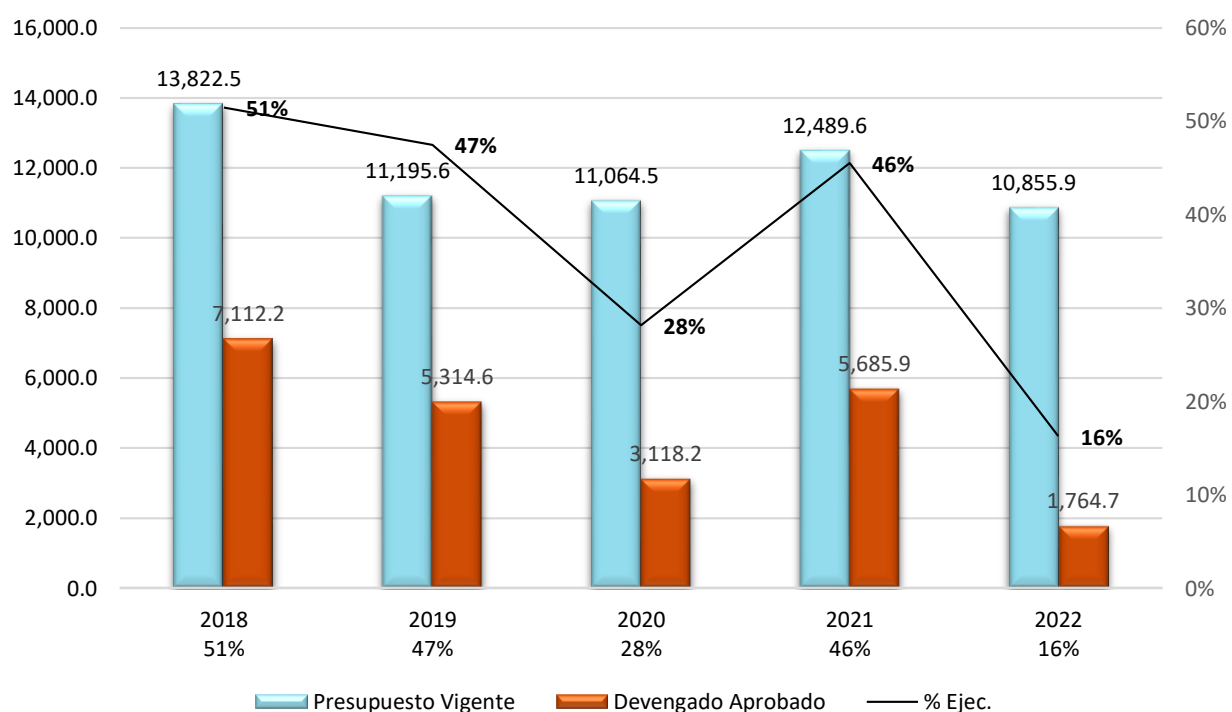

1.7. Ejecución Física a Nivel de Sectores

Los avances al tercer trimestre de la ejecución física respecto al PIP y a Nivel de Sector se muestran a continuación:

1.7.1. Sector Carreteras

Al tercer trimestre, las distintas Instituciones del Sector registraron diferentes avances de ejecución de sus proyectos de construcción de carreteras ejecutados a través de INSEP entre los cuales están:

Proyectos ejecutados por la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP)

1. Proyecto de Rehabilitación Vial del Corredor de Occidente: El proyecto ha ejecutado el 99.9 % de su meta física en los tramos La Entrada – Santa Rosa; La Entrada – Los Ranchos; y Los Ranchos – El Florido; con una longitud de 119 kilómetros en total. Esta carretera fue finalizada en el año 2019, la cual fue recepcionada por la INSEP en el mes de enero de 2020.

Para el presente año se contempló la Rehabilitación de 25 sitios dañados por el paso de las tormentas tropicales ETA e IOTA con un costo estimado de \$15.89 millones; de los cuales el 50% será financiado con recursos de contraparte nacional y el otro 50% con fondos del Convenio de Préstamo BEI-FI NO.84859 (Presupuesto contemplado en el monto priorizado por INSEP para la gestión 2022).

Según el PCM- 005-2022, este proyecto fue trasladado a la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), a través de la tercera enmienda a la Nota de Prioridad según Oficio DGIP-PRE-112-2022 para que la SIT pueda continuar con la ejecución del proyecto deberá gestionar ante el organismo financiador ampliación de plazo.

Debido a que la fecha de último desembolso era el 10 de junio de 2022, la SIT deberá gestionar oportunamente la ampliación de plazo correspondiente para efectuar el pago de compromisos pendientes de pago a contratistas.

Entre otros proyectos, a la fecha se han otorgado 5 Notas de prioridad con un monto de inversión L3,700 millones que intervendrán tramos carreteros como ser:

- Obras de Mitigación para control de riesgos geotécnicos y geológicos, por deslizamientos y desprendimientos de roca de taludes de corte en la carretera CA-5 sur, tramo "La Moramulca", departamento de Francisco Morazán, fase I
- Construcción y pavimentación con concreto hidráulico del Tramo Carretero: LA ENA - SAN JOSE DE RIO TINTO - DULCE NOMBRE DE CULMI, subtramo: "Puente Rio El Pataste - Dulce Nombre de Culmi" Ruta N° 83
- Construcción y Rehabilitación Vial con Concreto Hidráulico del Corredor de Occidente, Tramo Carretero: "Naco - La Entrada" (79.1 Km), Localizado en los Departamentos de Santa Bárbara y Copán.
- Construcción y pavimentación con concreto Hidráulico del tramo carretero: "Portillo del Lobo - Reitoca - Curaren"
- "Construcción y Pavimentación con Concreto Hidráulico del Corredor de Oriente, Tramo Carretero: "Las Lomas – Terrero Blanco" Ruta N-53, 60.6 Km

y Elaboración del Estudio y Diseño del Tramo Carretero: Ruta 119, "Terrero Blanco - Patuca - Palestina" 30 km

1.7.2. Sector de Protección Social

Los principales rubros de inversión están destinadas a inversión en desarrollo humano en las poblaciones más vulnerables. Al tercer trimestre las distintas Instituciones del Sector, registran los siguientes avances físicos:

Proyectos ejecutados por Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)

1. Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras (MIFE): Se han aprobado 18 proyectos en comité de inversiones por un monto de L99,973,412.28 lo cuales se iniciará el proceso de contratación en el último trimestre del año.
2. Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (ICS/USAID): Se han ejecutado actividades de capacitación en 4 proyectos implementados bajo la metodología PEC. Se encuentran en ejecución 10 proyectos, de los cuales 7 son centros educativos y 3 con enfoque COVID-19.
3. Programa Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras (USAID/PIOH): A la fecha se han finalizado 15 proyectos, 8 bajo la Metodología PEC del sector educativo y 7 proyectos por contratista para el sector salud, entre julio a septiembre de 2022. Los proyectos que se encuentran en ejecución actualmente son 5 centros educativos en los departamentos de Santa Bárbara, Intibucá y La Paz.

Proyectos ejecutados por la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS)

1. Proyecto de Apoyo al Sistema Integral de Protección Social (5008/BL-HO): Se efectuó el pago de los honorarios de Gestores Sociales, y personal de la Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas, asesoría legal de la SEDIS y personal técnico administrativo en Género y Diversidad; y otros pagos de Servicios a nivel central, sin embargo, no se han entregado Transferencias Monetarias Condicionadas debido al proceso de transición a la Red solidaria. Se realizó los pagos correspondientes al personal hasta el mes de septiembre que conformaba la Unidad de corresponsabilidad de la Secretaría de Educación. Se realizó el pago de la Implementación de Segunda Fase de Modelo de Focalización, a la firma PROSPERIA.
Se continuó con los servicios de la UCP del programa.
2. Proyecto de Integración de la Protección Social (6401-HN): No se prevé realizar entrega de TMC con recursos de esta operación debido a que a la fecha la plataforma de pago del ente pagador no está lista, no ha concluido el levantamiento del padrón de beneficiarios y el préstamo debe trasladarse al Programa de la Red Solidaria a finales del mes de octubre por lo que el tiempo no permitiría realizar los procesos administrativos de cierre dentro de la SEDIS.

se realizó el pago de honorarios profesionales de las consultorías que apoyan el Sistema de Información Gerencial (SIG), brindan el soporte, mantenimiento e información del Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas.

Proyecto Ejecutado por la Dirección Nacional Ciudad Mujer (DNCM)

1. Centros de Atención Integral para Mejorar las Condiciones de Vida de las Mujeres Hondureñas (Ciudad Mujer): a continuación, se detalla los avances de cada centro de ciudad mujer en todo el país.
 - **Centro Ciudad Mujer Tegucigalpa:** Del 1ro de julio al 30 de septiembre 2022, se atendieron un total de 17,200 usuarias (2,319 nuevas y 14,881 subsecuentes) y se brindaron 52,831 servicios.
 - **Centro Ciudad Mujer Choloma:** Del 1ro de julio al 30 de septiembre 2022, se atendieron 9,439 usuarias (3,287 nuevas y 6,152 subsecuentes), y se brindaron 37,577 servicios en todo el Centro.
 - **Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula:** Del 1ro de julio al 30 de septiembre del 2022, se atendieron 12,440 usuarias (2,541 nuevas y 9,899 subsecuentes), y se brindaron 41,093 servicios en todos los módulos del Centro.
 - **Centro Ciudad Mujer La Ceiba:** Del 1 de julio al 30 de septiembre 2022, se atendieron 6,867 usuarias (2,267 nuevas y 4,600 subsecuentes), y se brindaron 26,372 servicios en todo el centro.
 - **Centro Ciudad Mujer Juticalpa:** Del 1ro de abril al 30 de septiembre del 2022, se atendieron 6,309 usuarias (1,735 nuevas y 4,574 subsecuentes), en los diferentes módulos, brindándoles 24,320 servicios.
 - **Centro Cuidad Mujer Choluteca:** Del 1ro de julio al 30 de septiembre del 2022, se atendieron un total de 13,041 usuarias (3,922 nuevas y 9,119 subsecuentes), y se brindaron 45,468 servicios, con el objetivo de contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres atendidas, cumpliendo con el principio de Igualdad y No Discriminación.
 - **Centro Ciudad Mujer Móvil:** Al 30 de septiembre del 2022, se han atendido 28,277 mujeres, de las cuales 26,691 fueron nuevos ingresos (94%) del total y 1,586 (6%) visitas subsecuentes en la Móvil, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida y los servicios brindados por los diferentes módulos; los servicios prestados ascendieron a 60,461 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2 o 3 módulos a la vez.

1.7.3. Sector Energía

El Sector destina su inversión a la construcción, operación y mantenimiento de las centrales hidroeléctricas, inversión en obras relacionadas con la integración de Honduras al Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC), electrificación de viviendas y transmisión eléctrica teniendo como propósito mejorar y

ampliar la cobertura del servicio eléctrico para contribuir al crecimiento y desarrollo económico y social del país, mediante los Proyectos de Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral-Río Lindo, Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional (MER), Apoyo al Desarrollo Sostenible de las Energías Renovables, Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica, Electrificación Rural en Lugares Aislados y Sistemas Fotovoltaicos de la Red.

Los avances al tercer trimestre se presentan a continuación:

Proyectos ejecutados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)

1. Proyecto Apoyo a la Integración De Honduras en el Mercado Regional (MER): En el tercer trimestre se realizaron procesos de evaluación de ofertas de la adquisición de transformadores con fondos nacionales y remanente del convenio de US\$640,000.00 de la subestación del Progreso, esto debido a la necesidad que es la segunda subestación más importante de la zona norte del País y evitar los racionamientos de energía.
2. Proyecto de Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral-Río Lindo: Al tercer trimestre se quedó pendiente la presentación de las garantías de anticipo y cumplimiento la empresa japonesa Hitachi, porque tiene que ser con un banco japonés que tenga corresponsal acá en Honduras y el contratista solicito también cambios al formato de la garantía, se hizo lo ajuste a lo solicitado por la empresa contado con la no objeción del organismo y dictamen legal de la ENEE. Se hizo reuniones con los representantes de la empresa y tienen dos semanas para presentar las garantías y se tiene previsto el pago de US\$16,000,000 para el 15 noviembre 2022. Con la Empresa Toshiba ya se pagó el 15% del anticipo que equivale a US\$3,700,000 y la aprobación de los contratos que prologan sus efectos un nuevo periodo de gobierno que tiene que ser aprobados por el congreso nacional.
3. Proyecto Apoyo al Plan Estratégico de Acceso Universal a Electricidad: Proyecto entró en su fase de cierre definitivo la cual se tiene previsto el cierre para el 28 de diciembre 2022.
4. Proyecto Apoyo al Desarrollo Sostenible de las Energías Renovables: Al cierre del tercer trimestre se quedó pendiente el proceso de no objeción del organismo financiador la ampliación del último desembolso y cierre del proyecto debido que venció el 19 de septiembre del 2022 y se le está haciendo ajustes para tener un nuevo marco de la política energética y poderla publicar.
5. Proyecto de Electrificación Rural en Lugares Aislados: Al tercer trimestre se presentaron atrasos en Brus Laguna en la Licencia ambiental, cambios diseños y construcción sistemas de generación con energía renovable (Fotovoltaica) de parte fondo social de desarrollo eléctrico Fondo Social de Desarrollo Eléctrico (FOSODE), en cuanto a las Dispensas de Exoneraciones, se había tenido atrasos en la Dirección General de Control de Franquicias Aduaneras (DGCFA) pero se

logró resolver la problemática y los contratos que pasan de un periodo de gobierno a otro que no han sido ratificados por el Congreso Nacional, enmiendas a los contratos Brus Laguna y Guanaja del sistemas de generación con energía renovable en el plazo y se cambió el alcance en Concepción de María y el Corpus para dotar 15 escuelas de equipos Fotovoltaicos.

6. Proyecto de Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica: Al tercer trimestre se remitió al organismo el informe de licitación para no objeción solo faltaría la aprobación de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) a los documentos licitación para el reconocimiento en las tarifas, la adjudicación y presentación de las garantías del paquete No.3, la ventaja que las empresas que participaron en el proceso licitación operan en el país, el monto pago de anticipo es US\$6,000,000, se tiene que definir si se continua con el convenio para el saneamiento de la servidumbre si se va hacer un nuevo convenio con las nuevas autoridades del Instituto de la Propiedad o PCM de imposición de servidumbre e importante el monitoreo de los procesos de licitaciones, así mismo la aprobación de los contratos que prologuen sus efectos a nuevo periodo gobierno que tiene que ser rectificadas por el Congreso Nacional.

1.7.4. Sector Educación

Este sector apoya a la mejora de la calidad educativa a través de la capacitación a docentes, construcción de Aulas mediante los proyectos de Infraestructura escolar y Proyecto de Mejora de la Calidad Educativa (proyecto Joven) y el Proyecto: “Mejoramiento de la Calidad de la Educación Prebásica en Honduras. Los avances al tercer trimestre en los proyectos son los siguientes:

Proyecto Ejecutado por la Secretaría de Educación (SEDUC)

1. Proyecto Mejoramiento de la Calidad de la Educación Prebásica en Honduras (IDA 6560-HN): Al tercer trimestre de acuerdo con las principales actividades realizadas por la UCP, se reporta lo siguiente:
 - El personal de la UCP fue despedido por lo que está a la espera del nuevo proceso de contratación.
 - Está pendiente del replanteamiento de apoyo a la propuesta de respuesta a la emergencia “Te queremos estudiando en casa”.
 - Diseño de una Estrategia articulada de Formación Permanente para Centros Mentores y Satélites con el Modelo de Redes Educativas, se han llevado a cabo rondas de reuniones de trabajo entre la Dirección General de Desarrollo Profesional, (DGDP), Subdirección General de Educación Básica, Unidad Coordinadora de Redes Educativas y la Dirección General de Currículo y Evaluación (DGCE).
 - Se remitió los TDR's para aprobación del secretario de educación y proceder con la solicitud de No Objeción al Banco Mundial para publicar el proceso.
 - Revisión del actual Manual de planificación de centros educativos de la Secretaría de Educación en comparación con el código de construcción vigente, que contempla:

- ✓ Propuestas arquitectónicas para modelos de referencia para cuatro (4) tipologías de Centro de Educación Prebásica, con sus respectivos juegos de planos finales.
 - ✓ Mantenimiento de Centros Educativos.
 - ✓ Informe final: el cual debe de incluir todas actividades generales y específicas realizadas durante el desarrollo de la consultoría.
2. Programa Modernización de la Infraestructura Educativa (PROMINE Fase IV): Los principales avances físicos al 30 de septiembre de 2022 de acuerdo con lo reportado por la Unidad Ejecutora, en el marco del programa en relación con las actividades realizadas desde el ámbito de la Supervisión de Infraestructura, seguridad alimentaria y temas administrativos se detallan las siguientes:
- Desarrollo de 9 consultorías en el fortalecimiento a la ejecución del PROMINE (Fase IV)
 - Formulador y Diseñador para la supervisión y seguimiento de proyectos en la zona de intervención del PROMINE.
 - Supervisor Proyectos Eléctricos para la supervisión y seguimiento de proyectos en La Paz, Intibucá, Lempira Ocotepeque, Copan, Santa Bárbara y Gracias a Dios.
 - Formulador y Diseñador para la supervisión y seguimiento de proyectos en la zona de intervención del PROMINE.
 - Desarrollador Sistema de Planificación de Infraestructura Educativa (SIPLIE) con sede en Francisco Morazán.
 - Coordinador de Seguridad Alimentaria Cambio Climático Occidente / Corredor Seco para la supervisión y seguimiento de proyectos en la zona de intervención del PROMINE.
 - Especialista en Procesamiento Agroalimentario para el asesoramiento en ejecución de plantas de Procesamiento Agroindustrial en Institutos de Media, en la zona de intervención del PROMINE.

Proyecto Ejecutado por la Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H)

1. Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven: A la fecha, la Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H) ha suscrito dos (02) Convenios interinstitucionales con la Secretaría de Educación (SEDUC) y el Instituto Hondureño de Educación por Radio (IHER), modalidad flexible presencial y a distancia, bajo dicho convenio se beneficiará un máximo de 11,343 educandos.

En cuanto a la ampliación de cobertura educativa del tercer ciclo de Educación Básica en el occidente del país, se avanzó en los procesos de contratación para la construcción de 3 aulas y facilidades para la atención de tercer ciclo de Educación Básica en 15 de 50 Centros Educativos Básica, para lo cual, se contrató una firma consultora de supervisión y cuatro empresas contratistas de obra civil. Por otra parte, se ha realizado la publicación del proceso para la contratación de 35 Centros de Educación Básica la (CEB) para su adjudicación

en el último trimestre del año y para la Rehabilitación de 09 (CEB's) productos de las afectaciones de las tormentas ETA & IOTA.

En el marco del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Secretaría de Educación y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) se ha iniciado con la implementación del Programa de Formación Docente para la Innovación en el Tercer Ciclo de la Educación Básica dirigido a 2,708 docentes, directores, supervisores, gestores educativos, tutores y facilitadores que laboran en el Tercer Ciclo de la Educación Básica del área de influencia del Proyecto. Actualmente están en proceso de formación 625 docentes en los siguientes Departamentos.

Se llevó a cabo la entrega 9,100 tabletas y 1,024 computadoras portátiles a estudiantes y docentes del tercer ciclo en varios departamentos del país. Ya se realizó el pago al proveedor y se llevó a cabo la inspección por parte de la Dirección Nacional de Bienes del Estado (DNBE) para hacer el descargo de los bienes a la SEDUC. Se adjudicaron los servicios y adquisición de equipos de conectividad. Está pendiente la firma de contratos y entrega de los bienes y servicios. Según el PCM-005-2022, este proyecto debe ser trasladado a la Red Solidaria, donde se requerirá enmienda a la Nota de Prioridad No 23227-1, previo reanudar su ejecución física y financiera.

Proyecto Ejecutado por el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)

1. Programa Modernización de la Infraestructura Educativa (PROMINE Fase IV): Los principales avances físicos al 30 de septiembre de 2022 son los siguientes:
 - Se ha revisado las obras ejecutadas y procesos administrativos para los 5 proyectos en Gracias a Dios y se ha definido los montos a recuperar para 3 proyectos y en proceso los 2 restantes, es decir los 5 proyectos se encuentran el proceso de recuperación ya que se rescindieron los contratos.
 - Se finalizó un proyecto que representa 298 beneficiados y según el sistema estos proyectos han generado 32 empleos.

1.7.5. Sector Salud

Sus intervenciones van orientadas al mejoramiento y cobertura de los servicios de salud y la red hospitalaria del País, a través de la contratación de gestores en el Primer Nivel y Segundo Nivel de atención mediante el proyecto de Mejora de la Gestión y Calidad de los servicios de salud materno-neonatal, Proyecto Respuesta Inmediata de Salud (RISP) para Contener y Controlar El Coronavirus (COVID-19) y Mitigar su Efecto en la Prestación del Servicio, en Honduras. Los avances al tercer trimestre de la Secretaría de Salud y AEPAS-H son los siguientes:

Proyectos Ejecutados por Secretaría de Salud (SESAL)

1. Proyecto Respuesta Inmediata de Salud (RISP-HO) para Contener y Controlar el Coronavirus (COVID-19) y Mitigar su Efecto en la Prestación del Servicio, en Honduras: Al tercer trimestre, la Unidad Ejecutora de Proyectos BID (GESALUD), reportó los siguientes avances por componentes:

- Conducción de la respuesta a nivel del país: Las actividades en el fortalecimiento de la conducción de país; se realizaron los pagos de honorarios profesionales de las consultorías siguientes: un consultor senior (por Producto), un consultor junior (2 Productos), tres desarrolladores, 12 digitadores (meses de enero a abril) para la estrategia de soluciones digitales en el marco del plan nacional para la respuesta en el cual se desea implementar el expediente clínico electrónico, sistema de referencia y respuesta y 1 Consultoría Nacional como Asistencia de soporte Técnico 2 (del 11 de enero al 10 de febrero).
 - Detección y seguimiento de los casos: En apoyo técnico a las organizaciones sin fines de lucro que apoyan en la gestión administrativa de servicios de salud en hospitales y regiones mediante convenios de gestión firmados con la SESAL, se realizó el pago de honorarios de una consultoría de monitoreo (UGD).
 - Interrupción de la cadena de transmisión: Pago de Servicio de Impresión de Materiales, 100 Banner Promocional de Vacunación Pediátrica, Impreso en Lona vinílica, Full Color, Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).
 - Mejoramiento a la capacidad de provisión de servicios de salud: Primer pago del anticipo del 20%, sobre monto del contrato, construcción de Casetas para Depósito de Desechos Hospitalarios en 12 Hospitales Priorizados.
 - Gestión del Programa y Auditoría: Pagos del Servicio de Energía Eléctrica, pagos de honorarios profesionales de las consultorías y pago de anticipo de viáticos.
2. Proyecto Apoyo para la Implementación del Plan Nacional de Introducción de la Vacuna contra la COVID-19 en Honduras (BCIE 2271): Al tercer trimestre, la Unidad Ejecutora, reportó los siguientes avances:
- Adquisición de 130,368 dosis de vacunas y aplicadas a la población priorizada según el Plan de Introducción de la Vacuna contra la COVID-19.
 - Elaborar 4 informes de administración y ejecución del Proyecto.
 - Contratar la Auditoría y supervisión externa del Proyecto.
- Al tercer trimestre, por disposiciones de las Autoridades de la SESAL se determinó cancelar los fondos no desembolsados del Contrato de Préstamo BCIE-2271, por un monto estimado de US\$4.3 millones; sin embargo, la SESAL solicitará una enmienda para disminuir el costo del proyecto y formulará una iniciativa de proyecto orientada a la compra de ambulancia.
3. Proyecto de Respuesta a Emergencia Honduras COVID-19 (IDA 6626-HN / IDA 6868-HN): Durante el tercer trimestre del 2022; se realizaron acciones conjuntas SESAL-PROSALH y SEFIN, para la identificación de espacio presupuestario para la ejecución; mismo que fue identificado mediante Notas Técnicas No.001-2022 y 004-2022 para el traslado de espacio presupuestario parcial por un monto de L293.2 millones para honrar pagos que no pudieron ser efectuados durante el año 2021, debido al desfase relacionado al proceso de traslado de INVESTH a SESAL,

en cumplimiento al PCM-030-2021; actividad que también impactó en no poder formular dicho proyecto para el año 2022.

De acuerdo con los reportes de la Unidad Administradora de Proyectos Protección de la Salud Honduras (UAP-PROSALH), las principales actividades realizadas se resumen a continuación: Al cierre del tercer trimestre se encuentra en proceso de contratación de recurso humano (783 personas) para el despliegue y aplicación de la vacuna en 230 municipios a través de 79 equipos que considera 711 personas en brigadas y 72 coordinadores.

En cuanto a los procesos de adquisición en ejecución se listan a continuación:

Convenio IDA-6626-HN: Kit para exámenes de laboratorio, reparación de 2 tomógrafos (Hospital Mario Catarino Rivas e Instituto Cardiopulmonar Tórax, adquisición de 4 máquinas de anestesia y 300 oxímetros de pulso, adquisición de 3 ultra sonógrafos, adquisición de camas hospitalarias y 71 monitores de signos vitales, adquisición de equipo de cómputo para diferentes unidades de la SESAL

Convenio IDA-6868-HN: Adquisición de cadena de frío, compra de algodón para el despliegue y aplicación de la vacuna, adquisición de equipo de protección personal (EPP), adquisición de destructores de agudas, adquisición de gestión ambiental y social, adquisición de indumentaria para la identificación de personal, firma de contrato el sistema de información para captura de información.

4. Programa Respuesta Inmediata de Salud para Contener y Controlar El Coronavirus (COVID-19) y Mitigar su Efecto en la Prestación del Servicio, en Honduras (RISP-HO-2): Al tercer trimestre, la Unidad Ejecutora de Proyectos BID (GESALUD), reporta una ejecución física del 19% y financiero del 50% (en relación con el monto contratado de US\$53.82 millones) los avances por componentes se describen a continuación:

- Componente 1: Conducción de la respuesta a nivel del país: Pagó de los honorarios profesionales de tres consultorías UGD de apoyo técnico a las organizaciones sin fines de lucro que apoyan en la gestión administrativa de servicios de salud en hospitales y regiones mediante convenios de gestión firmados con la SESAL.
- Componente 3: Interrupción de la cadena de transmisión: En este componente se realizó el pago de la vacuna contra COVID-19 mediante mecanismo de compra bilateral con laboratorios fabricante de vacuna mediante extensión de contrato formalizando una segunda enmienda para el mismo el cual recibió no objeción de BID. Con base a la disponibilidad presupuestaria asignada por SEFIN y solicitud de pago por parte de la Gerencia Administrativa Central.

Al término del III trimestre de 2022, se han recibido 1,788,930 dosis de vacunas.

- Componente 4: Mejoramiento a la capacidad de provisión de servicios: En proceso de definir las actividades que se realizarán con los fondos remanentes de los Gestores de I y II Nivel de atención, en proceso la definición de los

términos de referencia para la ampliación de dos salas COVID-19 en los Hospitales de Tela y Manuel de Jesús Subirana.

- Componente 5: Administración del programa: Se realizaron los pagos correspondientes a servicio de energía, telefonía fija (lo pendiente del año 2021 y pagos del 2022), pago parcial de servicio de alquiler de oficinas Unidad Ejecutora de Proyectos GESALUD y la Unidad de Gestión Descentralizada (UGD), del año 2022, anticipo y reembolso de viáticos y los honorarios profesionales consultorías de la UE proyectos GESALUD.

Proyecto Ejecutado por la Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H)

1. **Proyecto de Mejora de la Gestión y Calidad de los Servicios de Salud Materno Neonatal:** De acuerdo con la Unidad Ejecutora, los avances físicos alcanzados al tercer trimestre se describen a continuación:
 - Priorización de los municipios más pobres; la cobertura de atención a una población de 425,045 habitantes, a través de la prestación de servicios de salud con gestores descentralizados en el primer y segundo nivel de atención.
 - En revisión Convenios de Gestión Hospitales y comités de apoyo a Hospitales (II nivel de atención-UGD):
 - En ejecución Asistencia Técnica para Fortalecimiento del Modelo de Gestión Hospitalaria.
 - En Ejecución Contratación de una Firma Consultora para el “Diseño y Supervisión de las Obras en el Hospital Regional de Occidente; Hospital Roberto Suazo Córdova; Hospital San Francisco; Hospital Santa Teresa y Hospital Escuela”: se coordinó el inicio del proceso infraestructura, a la firma consultora TASH (Firma Española-Nacionalizada Honduras). A solicitud de las autoridades de salud se ha solicitado una ENMIENDA a los Términos de Referencia para el Diseño y Supervisión del Hospital de Roatán, dicha enmienda dispone reducción de tiempo en la supervisión.
 - Establecido el proceso de “Adquisición y distribución de Ultrasonidos Móviles y Fijos para los Equipos de Salud Familiar (ESFAM) y Gestores de Salud. Pendiente de pago, concomitantemente a este proceso está pendiente revisión TDR Ultrasonografía por SESAL.

1.7.6. Sector Desarrollo Productivo y Riego

Los principales rubros de inversión están enfocados en la ejecución de Planes de Negocios, implementación de Sistemas de Riego, incremento los ingresos de las poblaciones rurales en el Corredor Seco a fin de prepararse para los efectos del cambio climático y abordar la inseguridad alimentaria.

Al tercer trimestre del año 2022 las distintas Instituciones del Sector, registran los siguientes avances físicos:

Proyectos Ejecutados por Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)

1. **Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur Occidental PRO-LENCA:** El proyecto cuenta con un avance físico del 70% y una ejecución financiera del 78%. Durante el tercer trimestre para el Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones Rurales las intervenciones del proyecto se encuentran en la implementación en campo 50 planes de inversión; las inversiones están orientadas en los rubros de hortalizas, avicultura, granos básicos, café, papa, MiPymes, otros. En donde las empresas contratadas para la elaboración e implementación de los planes de fortalecimiento iniciaron labores en campo, como parte del proceso se han hecho diagnósticos, y durante el próximo trimestre se recibirá el primer borrador del plan de fortalecimiento a implementarse en las organizaciones.

En cuanto a los convenios suscritos con las organizaciones (hombres, mujeres, jóvenes y etnias) beneficiadas para el financiamiento de sus planes de inversión, se firmaron 25 convenios por parte de la organización beneficiaria y la señora ministra de la SAG.

Para el Desarrollo Productivo y de Negocios se han generado procesos de 50 desembolsos para 25 organizaciones, así como el seguimiento en campo de las organizaciones que están en proceso de ejecución de su plan de inversión y en proceso de cierre técnico.

Por otra parte, se ha realizado el Establecimiento de sistemas agroforestales iniciando el proceso de adquisiciones el cual se encuentra en proceso de evaluación de ofertas, asimismo, se realizaron acercamientos con ICF con el que actualmente se trabaja un borrador de acuerdo de cooperación con el objetivo de realizar reforestaciones con árboles maderables en la zona de La Paz.

2. **Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR):** a la fecha el proyecto cuenta con un avance físico del 42.4% y una ejecución financiera del 67%. Para el período del tercer trimestre 2022, se ha iniciado con las pruebas de las tuberías en los subproyectos de Tascalapa y Siguapa, no así en Maralito donde aún no se concluye con la represa. Para el proyecto de “Construcción y Rehabilitación del Sistema de Riego de San Sebastián, Comayagua”. El avance ha sido mínimo considerando la demora que tomó la firma de la Adenda No. 3 del contratista, pues sin esta no podía adquirir los compromisos para la adquisición del equipo de riego del proyecto de Joya de Ramos, sin el cual no se puede obtener el permiso para continuar con la instalación de la tubería de la línea de conducción del proyecto de San Sebastián. Actualmente se cuenta con un avance del 55% en donde Durante este período se ha trabajado principalmente, en: Bocatoma (resanes, muro de mampostería; muro de gaviones; concreto ciclópeo); y se suministró e instaló tubería de 500 mm en la línea de conducción.

Para el Proyecto “Construcción, Rehabilitación y Modernización Sistema de Riego Selguapa, Comayagua”. se realizaron reuniones con la constructora y supervisora del proyecto, sin que se llegara todavía a un arreglo para el pago de la Estimación

de cierre No. 29, a pesar de ello el Acta de Recepción Final, ya fue discutida y aprobada por todas las partes involucradas en el proyecto, por lo que actualmente está en proceso de firma. En cuanto el sub-Proyecto de Oloman el mismo cuenta con el 100% de avance físico para los diseños.

3. Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego del Valle de JAMASTRAN FASE 1: Se ha realizado la ejecución de financiera del 33% la cual corresponde a la entrega del anticipo y a la facturación correspondiente a la compra de equipo para perforación y adquisición de tubería. En cuanto a la ejecución Física acumulada se han realizados los estudios topográficos para obtener los datos precisos de un área de 3,060 hectáreas. Por otra parte, se han ejecutado los estudios hidrológicos.
A septiembre 2022 se programaron 20 nuevas estaciones de bombeo y equipamiento instalado en los módulos de riego, que beneficiarían a 68 familias. Esto representaría un avance de 50% de la obra para el año 2022. Sin embargo, no se pudo realizar ya que estaba en proceso de revisión la cuarta adenda en tiempo para continuar con la ejecución.
4. Proyecto de inclusión económica y social de pequeños productores rurales en la región noreste de Honduras (PROINORTE): Al término del tercer trimestre aún no se ha iniciado la ejecución del proyecto debido a que aún se encuentra en el cumplimiento de las condiciones previas al primer desembolso por lo que no se ha realizado el proceso de contratación de la empresa encargada de realizar la contratación del personal.

Proyectos ejecutados por Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

1. Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II) IDA-6448-HN: Se ha realizado la formulación de los términos de referencia para luego ser sometidos a No objeción por parte del Banco Mundial e iniciar el proceso correspondiente para la contratación de dos firmas implementadoras. Por otra parte, se ha avanzado en la identificación de 143 potenciales organizaciones que agrupan 2,895 pequeños productores. En cuanto a la Ventana 2; se ha mantenido el ritmo de ejecución de los 32 planes de negocio aprobados y ratificados en 8 cadenas de valor, que benefician a casi 4 mil familias y generan casi 8,000 empleos, mismos que representan, según los montos planificados, una inversión pública de U\$8.6 millones. Para la Ventana 3 se han identificado tres intervenciones piloto que beneficiarán alrededor de 2,500 familias.

Para el Apoyo a la Modernización del Entorno Propicio para los Agronegocios de Honduras cinco de las instituciones han enviado su plan de inversión, quedando pendiente solamente la SAG. El presupuesto del componente es de U\$8.7 millones y las propuestas recibidas suman un total de U\$13.5 millones; por lo que, será necesario un análisis pormenorizado y la priorización de las inversiones propuestas de realizar. Se prevé que los servicios mejorados estén operativos para junio 2023.

2. Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad 4940/BL-HO (HO-L1211) y 4936/BL-HO (HO-L1201): Al Tercer trimestre se ha avanzado en las negociaciones con la firma consultora Sub-Implementadora para la ejecución del Componente 1. Se espera que en el mes de noviembre se firme el contrato. Por otra parte, se continúan las gestiones con BANHPROVI para las adecuaciones requeridas derivadas del cambio de organismo ejecutor y el tema del fideicomiso (eliminados por el Gobierno según decreto PCM 066-22); se ha avanzado en la identificación de un “fondo de administración” de los recursos, que de igual forma permitirá a productores beneficiarios acceder a financiamiento de activo fijo y capital de trabajo y un fondo de garantías que permita apalancar recursos del sector financiero local.

1.7.7. Sector Seguridad y Defensa

Para el presente año ejecuta proyectos, a fin de contribuir a mejorar la convivencia ciudadana en Honduras a través de la mejora en la calidad de vida en barrios vulnerables y la reducción de la incidencia de delitos violentos. Las principales metas ejecutadas al tercer trimestre son:

Proyecto Ejecutado por Secretaría de Seguridad (SDS)

1. Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB): Los principales avances físicos al 30 de septiembre de 2022 son los siguientes:

Infraestructura en Jefaturas Policiales:

- Construcción de 4 jefaturas policiales en Tela en Atlántida, Las Vegas en Santa Barbara, La puerta en San Pedro Sula y en Olanchito, Yoro.
- Dos licitaciones internacionales para la adquisición de mobiliario y equipo informático.
- Compra de radios de comunicación para el fortalecimiento del modelo de Patrullaje de la Dirección de operaciones de la Policía Nacional.

Efectividad Policial:

- Adquisición de Kits de reactivos para pruebas toxicológicas para aspirantes ITP y ANAPO. Estado: Contrato en ejecución empresa DICOSA, Avance físico: 100.00%; Avance Financiero: 100.00%.
- Contratación para el Mantenimiento y actualización de tres escáneres forenses para laboratorios de investigación criminal y servicios de capacitación. Estado: Contrato en ejecución, suscrito empresa LEICA (Fabricante), Avance físico: 90%; Avance Financiero: 100%.

1.7.8. Sector Recursos Forestales y Ambiente

Contempla la Reforestación y restauración de 34,000 hectáreas en zonas afectadas por el gorgojo a través del Programa Manejo Sostenible de Bosques y la Implementación de las Medidas de Conservación y Manejo de los Recursos Naturales en las Áreas Protegidas mediante el proyecto de Fortalecimiento del Sistema Nacional de áreas Protegidas de Honduras - SINAPH (LIFEWEB).

Los avances al tercer trimestre se muestran a continuación:

Proyectos Ejecutados por la Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H)

1. Proyecto Manejo Sostenible de Bosques: Los principales avances físicos alcanzados al tercer trimestre se describen a continuación:
 - 38 planes de restauración (PR) en bosque público aprobados, se han ejecutado 18.98 millones de lempiras, equivalentes a la generación de 118,621 días jornal (1,825 empleos). En forma acumulada se cuenta con una generación de 16,243 empleos, de los cuales 5,685 empleos corresponden a mujeres.
 - Las actividades de restauración de los 36 planes en ejecución se llevan a cabo en 26 municipios de los departamentos de Francisco Morazán, Comayagua y Yoro.
 - En proceso de evaluación, la Adquisición de Equipo Complementario de Infotecnología para el Sistema de Alerta Temprana.
 - En proceso de adquisición del equipo para el fortalecimiento del Banco de Germoplasma.

Instituto de Conservación Forestal (ICF)

Proyecto Fortalecimiento del Sistema Nacional de áreas Protegidas de Honduras - SINAPH (LIFEWEB): En el tercer trimestre se realizaron las actividades correspondientes al Taller de capacitación y formulación de planes específicos de protección y cambio climático con participación de comanejadores de las áreas protegidas de la Bahía de Tela y del Departamento de Áreas Protegidas a nivel central. Así mismo se brindó asesoría técnica puntual para la elaboración del componente presupuestario en el marco de la elaboración del Plan de Manejo Islas de la Bahía (PMIB). Se desarrolló una jornada de seguimiento a los compromisos establecidos para el avance en la implementación del proyecto. A lo interno del ICF se sigue trabajando en la consolidación de la Oficina Coordinadora de Proyectos principalmente para el abordaje de la segunda fase y se ha manifestado al KFW la necesidad de apoyo para la contratación de un coordinador de proyecto a fin de fortalecer la implementación en directa vinculación al Departamento de Áreas Protegidas. Por otra parte, se realizó acto público de firma de convenios de comanejo para el RVS Cuyamel y PN Omoa. Como parte de los procesos para el establecimiento de convenio de comanejo para el Parque Nacional Nombre de Dios.

1.7.9. Sector Modernización del Estado

Se refiere a proyectos integrales que promuevan la eficiencia y la eficacia de las instituciones a través de cambios e innovaciones de simplificación y tecnológicos, los avances al tercer trimestre se muestran a continuación:

Proyectos Ejecutados por Servicio de Administración de Rentas (SAR)

1. Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Tributaria: En cuanto a la ejecución física al 30 de septiembre del año 2022, el Proyecto Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Tributaria, presenta un porcentaje de avance físico del 73% a nivel de Estructura Desarrollo de Trabajo (EDT) en el

Plan de Ejecución del Proyecto (PEP) en donde el Componente I. Reingeniería de los Procesos de la Administración Tributaria fue concluido en el año 2019, presentando una ejecución total de US\$2.05 millones y física de un 100%.

En cuanto al Componente II. Modernización de Sistemas e Infraestructura Tecnológica y Física SAR se tiene un presupuesto total de US\$ 21.10 millones de los cuales se han comprometido US\$20.48 millones de los cuales se ha ejecutado US\$9.15 en donde para el tercer Trimestre se realizó el Pago del Hito No. 2 por un monto de US\$1, 062,159.30 correspondiente a las etapas 4, 5 y 6 del Contrato No. SAR-BID-3541-B-002-2021, suscrito con la empresa Gestión Tributaria Territorial S.A. (GTT) “Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas (SIISAR)”, contra entrega y aprobación productos tales como el Análisis de los requerimientos funcionales y no funcionales y casos de uso - Fase 1.1, Diseño del Sistema Informático - Arquitectura y Elaboración del prototipo del Sistema informático.

En cuanto a la Infraestructura Tecnológica de Software y Física del SAR reforzada para la adquisición del equipamiento, se cuenta con un monto contratado es de US\$1.37 millones, en donde se realizan las actividades correspondientes al Fortalecimiento de la Plataforma de Contact Center y Solución Unificada de telefonía, Licencias cliente de base de datos y a la Controladora de ancho de banda.

Es importante indicar que el proyecto también cuenta con un tercer componente orientado al Fortalecimiento del Talento Humano del SAR en donde actualmente se encuentra en el desarrollo de las Especificaciones Técnicas para el Lanzamiento de Proceso licitatorio para el último trimestre de este año.

Proyectos Ejecutados por la Secretaría de Finanzas (SEFIN)

1. **Modernización Integral de la Gestión de las Finanzas Públicas (FN 23753-1):** Al tercer trimestre el proyecto presenta baja ejecución financiera, solamente el 1% del presupuesto vigente, esto debido al cambio de autoridades en la Secretaría de Finanzas para la toma de decisiones del Proyecto, el Proyecto no cuenta con el personal técnico, en vista que el personal no se le renovó contrato a partir de marzo, los procesos de licitación se realizan a través de la Gerencia Administrativa Central y no se cuenta con personal exclusivo del proyecto, En general, la baja ejecución viene de años anteriores y en el 2022 debido a la falta de contratación de personal para la UCP así como atrasos en los lentos procesos de licitación, se está trabajando en los siguientes procesos de licitación:
 - Contratación de Servicios Especializados para el Diseño de Arquitectura Empresarial, Contratación de Servicios de Capacitación para la Construcción del Núcleo Financiero de los Sistemas para la Gestión de las Finanzas Públicas Etapa 2, Contratación de Servicios Especializados para la Implementación del Gobierno de Datos y Reconstrucción del Dataware House, entre otros.

Proyectos Ejecutados por la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS)

1. El Programa “Fortalecimiento Institucional de Empleo Decente y Oportunidad de Empleo para Jóvenes en Honduras” (EURO+LABOR): El programa cerró su ejecución física y financiera, para lo cual UCP-SETRASS ha realizado las siguientes actividades:
 - Se atendió los requerimientos de la empresa auditora que realizó la auditoría final del Programa.
 - Se atendió los requerimientos de la empresa auditora prueba y error residual de la UE, que revisa a nivel mundial los proyectos.
 - Se digitalizó los documentos del programa para la entrega a la Secretaría General de la SETRASS en versión impresa y digital, y a la Unión Europea en versión digital.

Proyectos Ejecutados por el Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH)

1. Proyecto de Clasificación y Digitalización de Fondos Documentales (FN 24388-1): Se cuenta con 5,951 documentos clasificados y organizados, correspondientes a la serie documental Correspondencia pertenecientes al Departamento de Antropología e Historia (DAH), Departamento de Investigaciones Científicas (DIC), y el Departamento de Investigaciones Históricas (DIH) y Departamento de Investigaciones Antropológicas (DIA).

1,103 documentos clasificados, correspondientes a la serie documental Correspondencia pertenecientes al Departamento de Antropología e Historia (DAH), Departamento de Investigaciones Científicas (DIC), y el Departamento de Investigaciones Históricas (DIH) y Departamento de Investigaciones Antropológicas (DIA).

1769, documentos con las series documentales, como informes, actas, inventario, etc., de los Departamento de Antropología e Historia (DAH), Departamento de Investigaciones Científicas (DIC), Departamento de Investigaciones Antropológicas (DIA) y el Departamento de Investigaciones Históricas (DIH) y 478 documentos digitalizados, 340 actualizaciones de Inventario y 340 descripciones y 590 documentos alojados a la página del CDIHH y 111 documentos del fondo principal, subidos a la página del CDIHH.

1.7.10. Sector de Transporte y Obras Públicas

Este sector tiene como finalidad contribuir al desarrollo del País a través de la formulación de programas y proyectos promovida y administrados por el gobierno para la construcción de infraestructuras hasta edificaciones públicas. Los avances al tercer trimestre se muestran a continuación:

Proyectos ejecutados por Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)

1. Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras (PRE): Los principales avances físicos al 30 de septiembre de 2022 son los siguientes:

- La Unidad Ejecutora del Proyecto a través de su personal técnico y con el apoyo de la Dirección de Proyectos del FHIS-SEDECOAS ha realizado revisiones a la formulación de los subproyectos priorizados, para verificar que estos estén cumpliendo con los lineamientos técnicos, ambientales, sociales, y otros relevantes que son parte de los compromisos adquiridos con el Banco Mundial.
- En proceso de Evaluación de los siguientes procesos de adquisición de bienes: Adquisición de Equipo Informático, Video y Sonido para uso de la UEP y SEDECOAS/FHIS.
- Contratado y en acondicionamiento el local para el funcionamiento de las oficinas de la UEP.

Proyectos ejecutados por la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP)

1. Construcción del edificio anexo del Tribunal Superior de Cuenta, ubicado en la ciudad de Comayagüela, Municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán: En el presente trimestre, el proyecto no reporta ejecución física ni financiera; los contratos de Obra y supervisión requieren de la aprobación por parte del Congreso Nacional, según lo establecido en los artículos 114 de las Disposiciones Generales de Presupuesto Vigentes (DGP) y 146 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado.

Según el PCM 005-2022, este proyecto debe ser trasladado a la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), donde se requerirá enmienda a la Nota de Prioridad No. 23959-1, previo reanudar su ejecución física y financiera.

La SIT por medio de Oficio SIT-SE-0501-2022 solicitó el cambio de organismo ejecutor del proyecto, la cual la DGIP por medio de Oficio DGIP-PRE-090-2022 otorgo enmienda a la nota de prioridad para que la SIT sea el nuevo ejecutor y pueda continuar su ejecución física y financiera. El proyecto presenta una ejecución física acumulada del 41%.

1.8. Factores que han Incidido en la Ejecución de la Inversión Pública, durante el tercer trimestre del Año 2022

Durante la ejecución de programas y proyectos, se presenta una serie de obstáculos que limitan la normal ejecución de estos, en términos físicos y financieros, sin cumplir el objetivo esperado, y por ende la ausencia de impacto en la población meta. Entre los problemas relevantes sobresalen:

Área	Problemas	Acciones
Técnica	Debido a la situación de cierre de INVEST-H y el tardío nombramiento del Liquidador de la institución, atrasará la liquidación y cierre de proyectos de inversión, así como su traslado a las nuevas instituciones ejecutoras de los proyectos que continuaran su ejecución.	Definir una fecha de corte para realizar un análisis de los saldos pendientes de pago de los proyectos a ser trasladados a otras instituciones, así como los que cerraran en la INVEST-H.
	A la falta de una adecuada planificación por parte de las unidades ejecutoras de proyectos ocasiona reprogramación de metas, lo que implica solicitar al Organismo Financiador su No Objeción (en caso de los préstamos), ocasionando retrasos en la ejecución.	Brindar por parte de la DGIP, asistencia técnica a las instituciones gubernamentales en la identificación, formulación y evaluación de proyectos.
	Lentos procesos de adquisiciones y contrataciones, y la rotación de nuevo personal en la UCP, ha desfasado la ejecución oportuna de los proyectos.	Realizar una revisión de los posibles puntos débiles en los procesos de adquisiciones, prever tiempos para cada proceso y tomar en cuenta los tiempos que estipulan los organismos de financiamiento.
Administrativa-Financiera	Desfase de la ejecución, considerando la tardía presentación de estimaciones de avance por parte de los proveedores.	Reglamentar la presentación de estimaciones, reembolsos y demás cuentas por pagar de los proveedores para evitar desfases en la ejecución presupuestaria de los proyectos.
	El proceso de cumplimiento de condiciones previas para que declaren vigente el préstamo los organismos financiadores y el cumplimiento de condiciones previas al segundo desembolso es lento.	La Unidad Ejecutora responsable y la SEFIN a través de la DGCP y la DGIP deben dar un seguimiento puntual para mejorar dichos procesos.
	Falta de un mecanismo para acelerar las exoneraciones de impuestos que están sujetos los proyectos de inversión.	Implementar acciones con la Dirección General de Franquicias Aduaneras, para mejorar la atención a las gestiones de proyectos y otorgar una respuesta oportuna a las unidades ejecutoras.

Área	Problemas	Acciones
Legal	Lento proceso por parte de la Secretaría de la Presidencia en remitir al Congreso Nacional para su ratificación, los Contratos de Obras, Bienes y Servicios que trascendieron el periodo de gobierno, ocasionando retraso en la ejecución de los proyectos.	Las unidades ejecutoras deben solicitar apoyo al más alto nivel para la pronta ratificación por parte del Congreso Nacional, para la reactivación de dichos contratos.
	El cambio de Autoridades por el nuevo Gobierno genera lentos procesos como ser: delegación de firmas, solicitudes de desembolsos, pagos a Proveedores, y falta de aprobaciones de Cuotas de Compromiso para efectuar pagos.	Las unidades ejecutoras de proyectos tendrán que revisar su programación de pagos, así como la revisión de sus planes de adquisiciones y presupuestos.

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE, 2022
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado (Devengado Anual)				Ejecutado (Devengado III Trimestre)				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
		Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)
10	0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social	9,818,396	1,734,031,476	1,743,849,872	300,566,396	1,261,298,017	1,561,864,413	15,207,720	76,911,334	92,119,054	6%	11,181,495	32,302,287	43,483,782	3%	15,207,720	100,098,426	115,306,146	7%
1	Ampliación Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Ciudad De Gracias, Departamento De Lempira		193,172,460	193,172,460		193,172,460	193,172,460		-	-	0%		-	-	0%		-	-	0%
2	Programa de Mejoramiento de la Infraestructura de Desarrollo Social y Comunitario en varios departamentos de Honduras	-		-	269,000,000		269,000,000	-		-	0%	-		-	0%	-		-	0%
3	Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras.		732,341,690	732,341,690		259,608,231	259,608,231		8,369,974	8,369,974	3%		4,477,340	4,477,340	2%		13,425,983	13,425,983	5%
4	PROGRAMA DE EMERGENCIA EN RESPUESTA A LA TORMENTA TROPICAL ETA		-	-		3,375,000	3,375,000		-	-	0%		-	-	0%		-	-	0%
5	PROGRAMA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SU GESTION LOCAL	6,107,220	182,205,699	188,312,919	6,107,220	160,575,325	166,682,545	809,752	4,205,841	5,015,593	3%	774,652	181,053	955,705	1%	809,752	4,205,841	5,015,593	3%
6	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA	-	10,612,131	10,612,131	10,066,250	10,612,131	20,678,381	8,571,206	8,574,436	17,145,642	83%	5,151,206	2,390,974	7,542,181	36%	8,571,206	8,574,436	17,145,642	83%
7	PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS		75,224,516	75,224,516		71,849,516	71,849,516		41,761,520	41,761,520	58%		14,537,247	14,537,247	20%		59,892,603	59,892,603	83%
8	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y FORMACION EDUCATIVA EN HONDURAS		499,467,419	499,467,419		499,467,419	499,467,419		39,100	39,100	0%		39,100	39,100	0%		39,100	39,100	0%
9	PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS	3,711,176	41,007,561	44,718,737	3,711,176	41,007,561	44,718,737	1,069,085	3,583,891	4,652,976	10%	497,960	300,000	797,960	2%	1,069,085	3,583,891	4,652,976	10%
10	ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS	-	-	-	11,681,750	21,630,374	33,312,124	4,757,677	10,376,573	15,134,249	45%	4,757,677	10,376,573	15,134,249	45%	4,757,677	10,376,573	15,134,249	45%
2	0028 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal	5,043,512	71,514,448	76,557,960	5,043,512	54,193,331	59,236,843	1,740,002	4,286,096	6,026,098	10%	1,075,869	3,305,754	4,381,623	7%	1,969,193	4,286,096	6,255,288	11%
1	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS DE HONDURAS- SINAPH (LIFWEB)	5,043,512	63,510,763	68,554,275	5,043,512	46,189,646	51,233,158	1,740,002	1,500,538	3,240,541	6%	1,075,869	1,500,538	2,576,407	5%	1,969,193	1,500,538	3,469,731	7%
2	PROYECTO MANEJO INTEGRADO DE LA BIOSFERA DEL RIO PLATANO		8,003,685	8,003,685		8,003,685	8,003,685		2,785,557	2,785,557	35%		1,805,216	1,805,216	23%		2,785,557	2,785,557	35%
8	0031 - Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)	-	1,464,933,147	1,464,933,147	141,217,342	1,462,721,885	1,603,939,227	-	113,318,827	113,318,827	7%	-	30,391,306	30,391,306	2%	-	143,692,738	143,692,738	9%
1	ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO (USAID-GAFSP)	-	146,221,706	146,221,706	141,217,342	146,221,706	287,439,048	-	13,290,300	13,290,300	5%	-	7,506,404	-	-3%	-	17,571,501	17,571,501	6%
2	Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II)		671,331,116	671,331,116		638,692,100	638,692,100		40,531,958	40,531,958	6%		11,564,309	11,564,309	2%		54,701,282	54,701,282	9%
3	Tipo de proyecto: Inversión Pública																		
3	CORREDOR PACÍFICO-PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL REGIONAL		47,455,983	47,455,983		47,455,983	47,455,983		35,923,150	35,923,150	76%		18,525,251	18,525,251	39%		40,187,269	40,187,269	85%
4	Libramiento Anillo Periférico CA-5 Sur		257,796,154	257,796,154		221,633,154	221,633,154		820,348	820,348	0%		369,230	369,230	0%		820,348	820,348	0%
5	PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD		185,263,035	185,263,035		183,051,773	183,051,773		7,572,361	7,572,361	4%		3,003,704	3,003,704	2%		10,252,789	10,252,789	6%
6	PROYECTO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN, SECCION I		2,425,480	2,425,480		38,588,480	38,588,480		2,424,970	2,424,970	6%		-	-	0%		2,424,970	2,424,970	6%
7	PROYECTO DE SEGURIDAD HIDRICA EN EL CORREDOR SECO DE HONDURAS		74,355,910	74,355,910		89,595,285	89,595,285		8,847,003	8,847,003	10%		2,723,773	2,723,773	3%		11,532,110	11,532,110	13%
8	Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana		80,083,763	80,083,763		97,483,404	97,483,404		3,908,737	3,908,737	4%		1,711,444	1,711,444	2%		6,202,469	6,202,469	6%
1	0037 - Servicio de Administración de Rentas		146,320,247	146,320,247		153,823,806	153,823,806		61,799,008	61,799,008	40%		30,799,890	30,799,890	20%		128,404,762	128,404,762	83%
1	Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Tributaria		146,320,247	146,320,247		153,823,806	153,823,806		61,799,008	61,799,008	40%		30,799,890	30,799,890	20%		128,404,762	128,404,762	83%
2	0050 - Secretaría de Educación	3,006,594	398,377,117	401,383,711	3,006,594	150,407,184	153,413,778	662,881	7,273,167	7,936,048	5%	432,966	2,268,712	2,701,679	2%	945,510	11,727,177	12,672,687	8%
1	PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)	3,006,594	11,632,962	14,639,556	3,006,594	11,632,962	14,639,556	662,881	2,108,513	2,771,394	19%	432,966	1,155,842	1,588,808	11%	945,510	3,863,917	4,809,427	33%
2	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN PREBÁSICA EN HONDURAS		386,744,155	386,744,155		138,774,222	138,774,222		5,164,654	5,164,654	4%		1,112,871	1,112,871	1%		7,863,260	7,863,260	6%
9	0060 - Secretaría de Salud		113,937,594	113,937,594		908,052,300	908,052,300		289,032,790	289,032,790	32%		51,573,529	51,573,529	6%		354,238,143	354,238,143	39%
1	HOSPITAL MARIA ESPECIALIDADES PEDIATRICAS (HMEP)		-	-		4,000,000	4,000,000		-	-	0%		-	-	0%		-	-	0%
2	RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID - 19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, EN HONDURAS		3,591,822	3,591,822		24,141,824	24,141,824		4,273,124	4,273,124	18%		636,392	636,392	3%		12,012,183	12,012,183	50%
3	HONDURAS SALUD MESOAMERICA GR7/HE-16838-HO		-	-		2,439,457	2,439,457		2,384,332	2,384,332	98%		1,823,027	1,823,027	75%		2,397,365	2,397,365	98%
4	PROYECTO HONDURAS - INICIATIVA REGIONAL DE ELIMINACIÓN DE LA MALARIA (IREM EN MESOAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA		24,222,016	24,222,016		30,903,150	30,903,150		7,300,802	7,300,802	24%		5,622,710	5,622,710	18%		24,439,366	24,439,366	79%
5	APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 5008/BL-HO		33,119,323	33,119,323		44,409,200	44,409,200		5,266,936	5,266,936	12%		1,116,988	1,116,988	3%		6,352,695	6,352,695	14%
6	APOYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE INTRODUCCIÓN DE LA VACUNA CONTRA LA COVID-19 EN HONDURAS		45,351,702	45,351,702		45,351,702	45,351,702		-	-	0%		-	-	0%		-	-	0%
7	MEJORA DE LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE LA INFORMÁTICA EN SALUD EN HONDURAS		7,652,731	7,652,731		7,652,731	7,652,731		-	-	0%		-	-	0%		-	-	0%
8	Proyecto de Respuesta a Emergencias Honduras COVID-19		-	-		293,225,691	293,225,691		11,482,061	11,482,061	4%		5,569,398	5,569,398	2%		16,029,616	16,029,616	5%
9	RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID-19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN HONDURAS (RISP-HO-2)		-	-		455,928,545	455,928,545		258,325,535	258,325,535	57%		36,805,016	36,805,016	8%		293,006,919	293,006,919	64%
1	0070 - Secretaría de Seguridad		178,491,787	178,491,787		252,995,954	252,995,954		125,495,246	125,495,246	50%		41,358,222	41,358,222	16%		174,335,243	174,335,243	69%
1	PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS		178,491,787	178,491,787		252,995,954	252,995,954		125,495,246	125,495,246	50%		41,358,222	41,358,222	16%		174,335,243	174,335,243	69%
1	0100 - Secretaría de Finanzas	162,000,000		162,000,000	162,000,000		162,000,000	2,136,092		2,136,092	1%	558,197		558,197	0%	16,830,794		16,830,794	10%
1	Modernización Integral de la Gestión de las Finanzas Públicas	162,000,000		162,000,000	162,000,000		162,000,000	2,136,092		2,136,092	1%	558,197		558,197	0%	16,830,794		16,830,794	10%
5	0120 - Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	621,147,663	155,112,867	776,260,530	621,147,663	155,112,867	776,260,530	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
1	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ANEXO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA, UBICADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGÜELA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN	82,133,718		82,133,718	82,133,718		82,133,718	-		-	0%	-		-	0%	-		-	0%
2	Construcción de obras de mitigacion de riesgos contra inundaciones erosión, sedimentos y drenajes menores en los Departamentos de Islas de la Bahía, Atlántida, Copan, Francisco Morazan y Comayagua.	15,000,000		15,000,000	15,000,000		15,000,000	-		-	0%	-		-	0%	-		-	0%
3	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN CON ESTRUCTURA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LOS DEPARTAMENTOS DE; VALLE, COMAYAGUA, INTIBUCA, EL PARAISO, LEMPIRA, COPÁN, OCOTEPEQUE, ATLANTIDA, COLÓN, LA PAZ, YORO, FRANCISCO MORA	80,000,000		80,000,000	80,000,000		80,000,000	-		-	0%	-		-	0%	-		-	0%

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE, 2022
Cifras en Lempias

No. Proy.	Institución / Proyecto	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado (Devengado Anual)				Ejecutado (Devengado III Trimestre)				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
		Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)
4	Construcción de Pavimentos de Concreto Hidráulico en Vías Urbanas en los Departamentos del Paraíso, Cortes, Olancha, Copan, La Paz, Francisco Morazán, Santa Barbara, Intibucá, Valle, Atlántida, Ocotepe	190,400,000		190,400,000	190,400,000		190,400,000	-		-	0%	-		-	0%	-		-	0%
5	REHABILITACIÓN VIAL DEL CORREDOR DE OCCIDENTE: LA ENTRADA - COPAN RUINAS - EL FLORIDO Y LA ENTRADA-SANTA ROSA DE COPAN	253,613,945	155,112,867	408,726,812	253,613,945	155,112,867	408,726,812	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
1	0130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social	1,156,539	500,000	1,656,539	1,156,539	7,282,409	8,438,948	1,152,371	7,269,791	8,422,162	100%	-	47,128	47,128	1%	1,152,371	7,269,791	8,422,162	100%
1	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JÓVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR)	1,156,539	500,000	1,656,539	1,156,539	7,282,409	8,438,948	1,152,371	7,269,791	8,422,162	100%	-	47,128	47,128	1%	1,152,371	7,269,791	8,422,162	100%
4	0140 - Secretaria de Agricultura y Ganadería	34,974,001	604,092,232	639,066,233	34,974,001	598,092,232	633,066,233	1,038,507	160,595,820	161,634,327	26%	496,986	88,385,866	88,882,852	14%	1,038,507	160,595,820	161,634,327	26%
1	PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL PRO-LENCA		118,949,002	118,949,002		118,949,002	118,949,002		51,289,470	51,289,470	43%		42,289,884	42,289,884	36%		51,289,470	51,289,470	43%
2	PROYECTO DE DESAROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO (PDABR)	27,262,801	216,604,399	243,867,200	27,262,801	216,604,399	243,867,200	1,038,507	109,306,350	110,344,857	45%	496,986	46,095,982	46,592,968	19%	1,038,507	109,306,350	110,344,857	45%
3	PROYECTO DE DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO DEL VALLE DE JAMASTRAN FASE 1		189,501,000	189,501,000		189,501,000	189,501,000		-	-	0%		-	-	0%		-	-	0%
4	Proyecto de inclusión económica y social de pequeños productores rurales en la región noreste de Honduras (PROINORTE)	7,711,200	79,037,831	86,749,031	7,711,200	73,037,831	80,749,031	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
2	0240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social		433,429,973	433,429,973		433,429,973	433,429,973		28,063,387	28,063,387	6%		13,772,981	13,772,981	3%		59,252,070	59,252,070	14%
1	PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL / 6401-HN		219,495,369	219,495,369		219,495,369	219,495,369		2,833,091	2,833,091	1%		842,385	842,385	0%		3,204,012	3,204,012	1%
2	APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 5008/BL-HO		213,934,604	213,934,604		213,934,604	213,934,604		25,230,296	25,230,296	12%		12,930,596	12,930,596	6%		56,048,058	56,048,058	26%
2	0244 - Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer		25,747,598	25,747,598		25,747,598	25,747,598		12,301,545	12,301,545	48%		4,405,479	4,405,479	17%		14,520,842	14,520,842	56%
1	Centros de Atención Integral para mejorar las condiciones de vida de las mujeres hondureñas (Ciudad Mujer)		14,897,598	14,897,598		14,897,598	14,897,598		8,592,105	8,592,105	58%		2,789,263	2,789,263	19%		9,022,325	9,022,325	61%
2	SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y UN ENTORNO FAVORABLE PARA LAS EMPRESARIAS DE HONDURAS		10,850,000	10,850,000		10,850,000	10,850,000		3,709,440	3,709,440	34%		1,616,216	1,616,216	15%		5,498,517	5,498,517	51%
7	0402 - Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras		1,339,872,887	1,339,872,887		1,224,033,521	1,224,033,521		161,464,635	161,464,635	13%		98,104,118	98,104,118	8%		236,135,072	236,135,072	19%
1	MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES		162,095,373	162,095,373		186,900,373	186,900,373		23,651,896	23,651,896	13%		17,343,282	17,343,282	9%		29,132,149	29,132,149	16%
2	TELESALUD PARA MITIGAR EL CORONAVIRUS Y MEJORAR EL ACCESO A LA SALUD EN HONDURAS		4,343,016	4,343,016		-	-		-	-	0%		-	-	0%		-	-	0%
3	Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven		421,727,805	421,727,805		421,727,805	421,727,805		102,927,423	102,927,423	24%		63,024,525	63,024,525	15%		158,786,563	158,786,563	38%
4	PROYECTO DE MEJORA DE LA GESTION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO-NEONATAL		223,410,251	223,410,251		198,155,251	198,155,251		26,430,211	26,430,211	13%		14,730,770	14,730,770	7%		36,457,502	36,457,502	18%
5	FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA RED DE ATENCIÓN DE TRAUMAS Y URGENCIAS DE TEGUCIGALPA		111,496,350	111,496,350		-	-		-	-	0%		-	-	0%		-	-	0%
6	PROGRAMA DE RESTAURACIÓN DE BOSQUES RESILIENTES AL CLIMA Y SILVICULTURA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS RELACIONADOS CON EL AGUA		177,934,820	177,934,820		177,934,820	177,934,820		2,696,410	2,696,410	2%		1,053,952	1,053,952	1%		3,235,357	3,235,357	2%
7	Proyecto Transformación Digital para una Mayor Competitividad		238,865,272	238,865,272		239,315,272	239,315,272		5,758,695	5,758,695	2%		1,951,589	1,951,589	1%		8,523,501	8,523,501	4%
1	0413 - Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación	-		-	155,087,364		155,087,364	-		-	0%	-		-	0%	-		-	0%
1	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE INSTALACIONES Y ESPACIOS FISICOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, PARA USO DE LA POBLACIÓN A NIVEL NACIONAL	-		-	155,087,364		155,087,364	-		-	0%	-		-	0%	-		-	0%
6	0801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica	207,000,000	2,003,588,310	2,210,588,310	207,000,000	2,003,588,310	2,210,588,310	3,089,465	573,351,989	576,441,454	26%	1,036,466	230,019,929	231,056,395	10%	4,075,284	984,498,070	988,573,354	45%
1	APOYO AL PLAN ESTRATÉGICO DE ACCESO UNIVERSAL A ELECTRICIDAD		3,665,000	3,665,000		665,000	665,000		109,103	109,103	16%		-	-	0%		109,103	109,103	16%
2	PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO	190,500,000	581,022,196	771,522,196	190,500,000	594,959,196	785,459,196	2,033,194	109,529,956	111,563,150	14%	710,222	99,841,554	100,551,776	13%	3,019,013	115,487,398	118,506,411	15%
3	APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)		3,595,000	3,595,000		3,665,000	3,665,000		1,526,102	1,526,102	42%		1,178,171	1,178,171	32%		2,344,106	2,344,106	64%
4	APOYO AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES		-	-		6,835,000	6,835,000		2,707,795	2,707,795	40%		2,317,431	2,317,431	34%		4,655,034	4,655,034	68%
5	ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LUGARES AISLADOS		121,677,000	121,677,000		117,097,000	117,097,000		31,932,059	31,932,059	27%		9,868,174	9,868,174	8%		71,695,196	71,695,196	61%
6	APOYO AL PROGRAMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	16,500,000	1,293,629,114	1,310,129,114	16,500,000	1,280,367,114	1,296,867,114	1,056,271	427,546,973	428,603,244	33%	326,244	116,814,599	117,140,843	9%	1,056,271	790,207,233	791,263,504	61%
2	1801 - Alcaldía Municipal del Distrito Central		-	-		236,413,033	236,413,033		28,839,982	28,839,982	12%		23,721,077	23,721,077	10%		39,522,981	39,522,981	17%
1	PROYECTO DE TRANSPORTE PÚBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TEGUCIGALPA - COMAYAGUELA)		-	-		88,512,013	88,512,013		17,257,139	17,257,139	19%		17,257,139	17,257,139	19%		17,257,139	17,257,139	19%
2	Proyecto para Fortalecer la Prestación de Agua Potable de Tegucigalpa		-	-		147,901,020	147,901,020		11,582,844	11,582,844	8%		6,463,939	6,463,939	4%		22,265,843	22,265,843	15%
1	0806 - Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola	-		-	98,800,000		98,800,000	-		-	0%	-		-	0%	-		-	0%
1	Fortalecimiento y Mantenimiento de la Reserva Estratégica de granos básicos a través de la Comercialización y Rehabilitación de Bodegas y Silos en San Pedro Sula, Danlí y Tegucigalpa.	-		-	98,800,000		98,800,000	-		-	0%	-		-	0%	-		-	0%
1	0807 - Suplidora Nacional de Productos Básicos	-		-	197,600,000		197,600,000	89,242,903		89,242,903	45%	89,242,903		89,242,903	45%	89,242,903		89,242,903	45%
1	Proyecto de Abastecimiento de Centros de Venta de Honduras y Fortalecimiento al BANASUPRO	-		-	197,600,000		197,600,000	89,242,903		89,242,903	45%	89,242,903		89,242,903	45%	89,242,903		89,242,903	45%
1	0505 - Instituto Hondureño de Antropología e Historia	1,112,250		1,112,250	1,112,250		1,112,250	392,234		392,234	35%	267,670		267,670	24%	392,234		392,234	35%
1	Proyecto de Clasificación y Digitalización de Fondos Documentales	1,112,250		1,112,250	1,112,250		1,112,250	392,234		392,234	35%	267,670		267,670	24%	392,234		392,234	35%
67	Total general	1,045,258,955	8,669,949,683	9,715,208,638	1,928,711,661	8,927,192,420	10,855,904,081	114,662,175	1,650,003,617	1,764,665,792	16%	104,292,551	650,456,280	754,748,831	7%	130,854,516	2,418,577,231	2,549,431,746	23%

Fuente: SIAFI, 30/09/2022

ANEXO II
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2022

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2022		
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
0402 - Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras	MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES	Hectáreas con actividades de restauración implementadas	44 - HECTÁREA	1	0	0%	0	0	0%
		Cartas acuerdo para el desarrollo de investigaciones en salud y sanidad forestal implementadas	1001 - CARTA DE ENTENDIMIENTO	1	0	0%	0	0	0%
		Consultorías para mejora en el acceso al financiamiento climático contratadas	369 - CONSULTORÍA	2	0	0%	0	0	0%
		Consultorías para el fortalecimiento Institucional contratadas	369 - CONSULTORÍA	1	0	0%	0	0	0%
		Evaluaciones y Auditorías Anuales Realizadas	149 - INFORME	1	0	0%	0	0	0%
	TELESALUD PARA MITIGAR EL CORONAVIRUS Y MEJORAR EL ACCESO A LA SALUD EN HONDURAS	Soluciones de telesalud en funcionamiento	140 - CANTIDAD	1	0	0%	0	0	0%
		Puntos de Atención con estrategia de innovación abierta	140 - CANTIDAD	1	0	0%	0	0	0%
		Start Up que logran financiamiento	140 - CANTIDAD	4	0	0%	0	0	0%
		Informe de la línea base elaborado		1	0	0%	0	0	0%
	Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven	Educando atendidos bajo convenios de prestación de servicios educativos en modalidades alternativas	1016 - EDUCANDO	1	0	0%	0	0	0%
		Docentes certificados en pedagogías de aprendizaje activo	31 - DOCENTE	1	0	0%	0	0	0%
		Implementacion de herramienta tecnológica para fortalecer los sistemas de la SEDUC.	75 - PORCENTAJE	1	0	0%	0	0	0%
		Evaluación anual de cumplimiento tecnico y financiera del proyecto joven.	149 - INFORME	1	0	0%	0	0	0%
	PROYECTO DE MEJORA DE LA GESTION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO-NEONATAL	Convenios de Gestión del II nivel de atención firmados	26 - CONVENIO	3	0	0%	0	0	0%
		Unidades de Cuidados Intensivos (UCIN), y Salas de Neonatología de obras hospitalarias construidas.	538 - OBRA	1	0	0%	0	0	0%
		Unidades de cuidados intensivos UCIN para el cuidado neonatal y áreas de Obstetricia equipadas	1082 - LOTE DE EQUIPO	1	0	0%	0	0	0%
		Consultorías para el fortalecimiento de la Secretaría de Salud (SESAL) contratadas	155 - CONTRATO	12	0	0%	0	0	0%
		Informes de Auditoría del Proyecto elaborados	149 - INFORME	1	0	0%	0	0	0%
	FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA RED DE ATENCIÓN DE TRAUMAS Y URGENCIAS DE TEGUCIGALPA	Firma para elaborar el diseño del Hospital de Trauma contratada	155 - CONTRATO	1	0	0%	0	0	0%
		Equipo para el hospital de trauma adquirido	1082 - LOTE DE EQUIPO	1	0	0%	0	0	0%
		Consultoría para el diseño de un sistema de Comunicación y Monitoreo entre la central de emergencia 911, las ambulancias y las emergencias de los Hospitales y Cliper contratada	369 - CONSULTORÍA	1	0	0%	0	0	0%
		Consultorías para realizar la Auditoría del Proyecto contratada	369 - CONSULTORÍA	1	0	0%	0	0	0%
	PROGRAMA DE RESTAURACIÓN DE BOSQUES RESILIENTES AL CLIMA Y SILVICULTURA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS RELACIONADOS CON EL AGUA	Hectáreas de bosque de pino y sistemas agroforestales restauradas.	44 - HECTÁREA	6,500	0	0%	0	0	0%
		Mecanismos financiero para el manejo de bosques en cuencas priorizadas constituidos	1132 - MECANISMO FINANCIERO	2	0	0%	0	0	0%
		Evaluaciones y Auditorías Anuales Realizadas	1068 - INFORME DE AUDITORIA	1	0	0%	0	0	0%
	Proyecto Transformación Digital para una Mayor Competitividad	Avance en cobertura y uso de Banda Ancha	603 - SITIO	100	0	0%	0	0	0%

ANEXO II
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2022

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2022		
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
		Prestación de servicios públicos a ciudadanos y empresas y de la gestión financiera del Estado por medio de la transformación Digital del Gobierno mejorada	75 - PORCENTAJE	25	0	0%	0	0	0%
		Infraestructura del Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI) actualizada.	1075 - METRO CUADRADO ARRENDADO	25	0	0%	0	0	0%
		Acciones en el ámbito Nacional para el impulso de la Economía Digital implementadas	75 - PORCENTAJE	25	0	0%	0	0	0%
		Acciones en el ámbito San Pedro Sula para el impulso de la Economía Digital implementadas	75 - PORCENTAJE	25	0	0%	0	0	0%
		Administración, Auditoría y Evaluación realizada	1068 - INFORME DE AUDITORIA	1	0	0%	0	0	0%
0413 - Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE INSTALACIONES Y ESPACIOS FÍSICOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, PARA USO DE LA POBLACIÓN A NIVEL NACIONAL.	Construcción de Canchas Deportivas para uso de la población a Nivel Nacional.	349 - CANCHA DEPORTIVA	10	0	0%	0	0	0%
0244 - Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer	Centros de Atención Integral para mejorar las condiciones de vida de las mujeres hondureñas (Ciudad Mujer)	Consultorías para Auditoria Externa	149 - INFORME	2	0	0%	0	0	0%
		Contratación Consultorías para Gestión del Proyecto	149 - INFORME	3	0	0%	0	0	0%
		Informe de Evaluación final del Proyecto Ciudad Mujer	149 - INFORME	1	0	0%	1	0	0%
	SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y UN ENTORNO FAVORABLE PARA LAS EMPRESARIAS DE HONDURAS	Consultorias para la implementación del Modelo de Servicio de Desarrollo Empresarial con énfasis en las tecnologías digitales	149 - INFORME	3	0	0%	0	0	0%
0801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica	APOYO AL PLAN ESTRATÉGICO DE ACCESO UNIVERSAL A ELECTRICIDAD	Inscripción de Capacitación a Equipos FOSODE ENEE en temas de: Diseño, Construcción y Supervisión de Proyectos de Generación de Energía Eléctrica Renovables en Microrredes Aisladas realizada	145 - REPORTE	1	0	0%	0	0	0%
		Auditoria Externa realizada	149 - INFORME	1	0	0%	0	0	0%
	PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO	Supervisión del Proyecto de Fortalecimiento del Complejo Hidroeléctrico de Cañaverál y Río Lindo realizado	145 - REPORTE	1	0	0%	0	0	0%
		Intereses durante la construcción del proyecto, regularizados	145 - REPORTE	1	0	0%	0	0	0%
		Supervisión, Gestión y Administración ENEE para la Construcción y Pruebas de las Mejoras a las Subestaciones, realizada	145 - REPORTE	1	0	0%	0	0	0%
		Orden de Inicio para los Contratos del Equipo Principal y Obras de Instalación, emitida	1081 - INFORME TÉCNICO	1	0	0%	0	0	0%
		Orden de Inicio para los Contratos del Equipo Auxiliar y Obras Civiles para la repotenciación del Complejo Hidroeléctrico, emitida	1081 - INFORME TÉCNICO	1	0	0%	0	0	0%
		Consultorias para Estudios Tecnicos del Balance Hidrico Dinamico y BatimetConsultorias para Estudios Tecnicos del Balance Hidrico Dinamico y Batimetria en el Lago de Yojoa, realizadasria en el Lago de Yojoa, realizadas	1081 - INFORME TÉCNICO	5	0	0%	0	0	0%
		Plan Estratégico de Sensibilización y Extensión Comunitaria, elaborado	32 - DOCUMENTO	1	0	0%	0	0	0%
		Consultoria para Evaluación de la Brecha de Conocimiento UMC, realizada	1081 - INFORME TÉCNICO	1	0	0%	0	0	0%

ANEXO II
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2022

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2022			
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución	
	APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)	Auditoria financiera, realizada	1081 - INFORME TÉCNICO	1	0	0%	0	0	0%	
		Rehabilitación de Obras para el Canal de Yure , realizada	1081 - INFORME TÉCNICO	1	0	0%	0	0	0%	
		Sistemas de Excitación para las Unidades Principales de generación de la CHFM, instalado	392 - EQUIPO	1	0	0%	0	0	0%	
		Auditoria externa del proyecto realizada	1081 - INFORME TÉCNICO	1	0	0%	0	0	0%	
		Medidores del Sistema de Medición Comercial de Transmisión suministrados	1081 - INFORME TÉCNICO	0	0	0%	0	0	0%	
		Auditoría Externa anual del proyecto elaborada	1068 - INFORME DE AUDITORIA	1	0	0%	0	0	0%	
		Medidores del Sistema de Medición Comercial de Transmisión suministrados	149 - INFORME	1	0	0%	0	0	0%	
	APOYO AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES	Politica Energetica, comunicada y publicitada	32 - DOCUMENTO	1	0	0%	0	0	0%	
		Construccion de un Proyecto Piloto de Generacion Termosolar a partir de Energia Renovble No Convencional realizado	538 - OBRA	1	0	0%	0	0	0%	
		Auditoria Externa realizada	1081 - INFORME TÉCNICO	1	0	0%	0	0	0%	
	ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LUGARES AISLADOS	Consultoria para el diseño de la estrategia de participación femenina en proyectos de sistemas de generación eléctrica (fotovoltaico) en lugares aislados realizada	1081 - INFORME TÉCNICO	1	0	0%	0	0	0%	
		Supervisión externa de los proyectos realizada	1081 - INFORME TÉCNICO	1	0	0%	0	0	0%	
		Sistemas fotovoltaicos domiciliarios en los municipios de El Corpus y Concepción de María, instalados y operando	1081 - INFORME TÉCNICO	2	0	0%	0	0	0%	
	APOYO AL PROGRAMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Obras para la Construcción y Pruebas de Subestaciones y Líneas iniciadas	1084 - CONTRATO DE OBRA	6	0	0%	0	0	0%	
		Términos de Referencia y Presupuestos de las Consultorías especializadas elaborados	1081 - INFORME TÉCNICO	1	0	0%	0	0	0%	
		Auditoría Externa del Proyecto de Apoyo a la Transmisión de Energía Eléctrica, elaborada	1068 - INFORME DE AUDITORIA	1	0	0%	0	0	0%	
		Supervisión, Gestión y Administración ENEE para la Construcción de las Subestaciones y Líneas de Transmisión realizada	155 - CONTRATO	1	0	0%	0	0	0%	
	0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social	Ampliación Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Ciudad De Gracias, Departamento De Lempira	Sistema eléctrico y Sistema fotovoltaico instalados. AGUA POTABLE	82 - SISTEMA	1	0	0%	0	0	0%
			Consultoría de estudio de la planta de tratamiento de agua potable y de las redes de distribución.AGUA POTABLE	369 - CONSULTORÍA	1	0	0%	1	0	0%
Consultoría de estudio ambiental realizada .AGUA POTABLE			369 - CONSULTORÍA	1	0	0%	1	0	0%	
Construcción de conexiones de sistemas de agua potable en la ciudad de Gracias, Lempira. AGUA POTABLE.			564 - CONEXIÓN	1,244	0	0%	311	0	0%	
Capacitaciones impartidas a los actores involucrados por parte de las instancias responsables y reguladoras de sistemas de agua potable en Honduras. AGUA POTABLE			1009 - CAPACITACIÓN	5	0	0%	2	0	0%	

ANEXO II
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2022

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2022		
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
		Infraestructura del sistema de agua potable supervisada. AGUA POTABLE	129 - SUPERVISION	1	0	0%	0	0	0%
		Informe con enfoque de genero elaborados. AGUA POTABLE	149 - INFORME	4	0	0%	1	0	0%
	Programa de Mejoramiento de la Infraestructura de Desarrollo Social y Comunitario en varios departamentos de Honduras	Informe de Consultoría para mejoramiento de infraestructura de Centros de Salud. PROMIDESH	149 - INFORME	1	0	0%	0	0	0%
		Estudios de laboratorio nacional de medicamentos y Hospital Oncológico. PROMIDESH	547 - ESTUDIO	1	0	0%	0	0	0%
		Licitación para Construcción de bordos en aliviaderos y río Chamelecón. PROMIDESH	425 - LICITACION	29	0	0%	16	0	0%
		Informes de Supervisión de obras de Infraestructura. PROMIDESH	149 - INFORME	31	0	0%	0	0	0%
		Estudios de factibilidad para Construcción de puente. PROMIDESH	1091 - ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	1	0	0%	0	0	0%
		Licitación para la adquisición de vehículos para el programa. PROMIDESH	425 - LICITACION	1	0	0%	0	0	0%
		Informe con enfoque de Genero. PROMIDESH	149 - INFORME	1	0	0%	0	0	0%
		Informes de Supervisión de obras en centros educativos. PROMIDESH	149 - INFORME	4	0	0%	0	0	0%
	Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras.	Expedientes de subproyectos formulados. PRE	395 - EXPEDIENTE	64	0	0%	0	0	0%
		Supervisión de subproyectos. PRE	129 - SUPERVISION	44	0	0%	17	0	0%
		Solicitudes de reembolso de gastos revisadas. PRE	500 - SOLICITUD	2	0	0%	0	0	0%
		Actas de reembolso aprobadas. PRE	991 - ACTA	1	0	0%	0	0	0%
		Acciones de fortalecimiento institucional.PRE	131 - ACTIVIDAD	1	0	0%	0	0	0%
		Participación comunitaria en la planificación y ejecución de los subproyectos. PRE	131 - ACTIVIDAD	1	0	0%	0	0	0%
		Informe con enfoque de género. PRE	149 - INFORME	4	0	0%	1	0	0%
	PROGRAMA DE EMERGENCIA EN RESPUESTA A LA TORMENTA TROPICAL ETA PROGRAMA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SU GESTION LOCAL	Consultoría para la evaluación final del programa. PCCMB-ETA	369 - CONSULTORÍA	1	0	0%	0	0	0%
		Capacitación a los miembros de comité ejecutores de proyectos (CEP’S) FASE V PROMINE	1009 - CAPACITACIÓN	1	0	0%	0	0	0%
		Capacitación a los miembros de comité ejecutores de proyectos (CEP’S) FASE IV PROMINE	1009 - CAPACITACIÓN	12	0	0%	4	0	0%
		Informe con enfoque de genero PROMINE	149 - INFORME	4	0	0%	1	0	0%
		Asistencia técnica para la ejecución del proyecto FASE V PROMINE	992 - ASISTENCIA TÉCNICA	1	0	0%	0	0	0%
		Acciones para el fortalecimiento institucional del Fondo Hondureño de Inversión Social FASE V. PROMINE	131 - ACTIVIDAD	1	0	0%	0	0	0%
		Acciones para el fortalecimiento institucional del Fondo Hondureño de Inversión Social FASE IV. PROMINE	131 - ACTIVIDAD	1	0	0%	0	0	0%
	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA	Supervisión de Proyectos para seguridad ciudadana. ICS	129 - SUPERVISION	19	0	0%	0	0	0%
		Diseño y formulación de proyectos para seguridad ciudadana ICS	291 - DISEÑO	19	0	0%	0	0	0%
		Informe con enfoque de género. ICS	149 - INFORME	2	0	0%	0	0	0%
	PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS	Actividades Deportivas del Programa Deportivo y Formación de Valores. PCCMB	312 - ACTIVIDADE DEPORTIVA	9	0	0%	0	0	0%

ANEXO II
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2022

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2022		
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
		Supervisión de sistemas de agua potable en barrios intervenidos. PCCMB	129 - SUPERVISION	6	0	0%	3	0	0%
		Supervisión de sistemas de saneamiento en barrios intervenidos. PCCMB	129 - SUPERVISION	6	0	0%	3	0	0%
		Supervisión de vías pavimentadas en barrios. PCCMB	129 - SUPERVISION	6	0	0%	3	0	0%
		Asistencia Técnica Equipo de Promoción Social ETEC. PCCMB	992 - ASISTENCIA TÉCNICA	16	0	0%	0	0	0%
		Informe con enfoque de genero. PCCMB	149 - INFORME	4	0	0%	1	0	0%
	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y FORMACION EDUCATIVA EN HONDURAS	Capacitaciones impartidas para la formación en metodologías basadas en normas y evaluación por competencia a Docente. MIFE	1009 - CAPACITACIÓN	1	0	0%	0	0	0%
		Capacitaciones impartidas para la formación en emprendimiento a docentes y alumnos. MIFE	1009 - CAPACITACIÓN	1	0	0%	0	0	0%
		Proyectos contratados para la mejora de la Infraestructura de los centros educativos. MIFE	305 - PROYECTO	3	0	0%	0	0	0%
		Informe con enfoque de genero MIFE	149 - INFORME	1	0	0%	0	0	0%
		Supervisiones contratadas para verificación de intervenciones en los centros educativos. MIFE	129 - SUPERVISION	1	0	0%	0	0	0%
		Diseño de Proyectos MIFE	291 - DISEÑO	6	0	0%	0	0	0%
	PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS	Capacitación para la formación al fortalecimiento institucional y equipamiento a funcionarios coejecutores del programa (INJ, Alcaldías, FHIS). CONVIVIR Fase II	1009 - CAPACITACIÓN	4	0	0%	0	0	0%
		Talleres para la formación de habilidades sociales y laborales para jóvenes en los lugares de incidencia del programa. CONVIVIR FASE II	156 - TALLER	4	0	0%	0	0	0%
		Supervisión de Infraestructura de recuperación de espacios públicos. CONVIVIR FASE II	129 - SUPERVISION	1	0	0%	0	0	0%
		Asistencia técnica de la Consultoría Internacional para la ejecución de proyectos de infraestructura y social. CONVIVIR FASE II	992 - ASISTENCIA TÉCNICA	4	0	0%	1	0	0%
		Equipo entregado para las obras de infraestructura del programa. CONVIVIR FASE II	392 - EQUIPO	1	0	0%	0	0	0%
		Informe con enfoque de genero. CONVIVIR FASE II	149 - INFORME	4	0	0%	1	0	0%
	ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS	Conformación y capacitación de los miembros de Comités Ejecutores de Proyectos CEP y líderes comunitarios. PIOH	22 - COMITÉ	4	0	0%	0	0	0%
		Acta de recepción de proyectos entregados PIOH	991 - ACTA	6	0	0%	0	0	0%
		Informe con enfoque de genero. PIOH	149 - INFORME	3	0	0%	1	0	0%
		Supervisión de Proyectos. PIOH	129 - SUPERVISION	10	0	0%	0	0	0%
0505 - Instituto Hondureño de Antropología e Historia	Proyecto de Clasificación y Digitalización de Fondos Documentales	Numero de documentos descritos y actualizados	32 - DOCUMENTO	11	0	0%	3	0	0%
		Documentos alojados a la página del CDIHH	32 - DOCUMENTO	11	0	0%	3	0	0%
0806 - Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola	Fortalecimiento y Mantenimiento de la Reserva Estratégica de granos básicos a través de la Comercialización y Rehabilitación de Bodegas y Silos en San Pedro Sula, Danlí y Tegucigalpa.	comercialización de quintales de frijol rojo	237 - QUINTAL	74,666	0	0%	13,666	0	0%
0028 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS DE HONDURAS- SINAPH (LIFEWEB)	Planes Operativos Anuales en Áreas Protegidas implementados.	469 - PLAN OPERATIVO ANUAL	15	0	0%	0	0	0%

ANEXO II
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2022

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2022		
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
		Actores vinculados a la administración de las áreas protegidas fortalecidos para la gestión efectiva del territorio.	74 - PERSONA	100	0	0%	50	0	0%
		Áreas protegidas con inversiones en medidas de conservación implementadas, que contribuyen a mejorar la efectividad de manejo de las áreas protegidas.	604 - AREA	15	0	0%	0	0	0%
	PROYECTO MANEJO INTEGRADO DE LA BIOSFERA DEL RIO PLATANO	Plan para la Protección y la Reducción de la Deforestación socializado y aprobado.	264 - PLAN	1	0	0%	0	0	0%
		Reuniones comunitarias para el levantamiento de información realizadas, para la formulación y diseño del Plan para la Protección y la Reducción de la Deforestación.	154 - REUNION	5	0	0%	0	0	0%
		Manuales de educación financiera actualizados, para abordar la temática de los mecanismos inclusivos para el clima.	32 - DOCUMENTO	2	0	0%	1	0	0%
		Organizaciones locales identificadas y evaluadas para acceder a mecanismos financieros.	38 - EVALUACION	1	0	0%	0	0	0%
		Modulo de alertas de deforestación en el Sistema de Información para la Gestión y Monitoreo Forestal (SIGMOF), funcionando.	1081 - INFORME TÉCNICO	2	0	0%	0	0	0%
		Capacitación realizada en el uso, manejo y mantenimiento de vehículos aéreos no tripulados, procesamiento de datos de sensores remotos utilizando plataformas no tripuladas.	1009 - CAPACITACIÓN	1	0	0%	0	0	0%
0031 - Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)	ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO (USAID-GAFSP)	Sub-proyectos de higiene en el hogar, Clúster 1	305 - PROYECTO	1,000	0	0%	0	0	0%
		Sub-proyectos de higiene en el hogar, Clúster 2	305 - PROYECTO	1,000	0	0%	0	0	0%
		Atención de niños menores de 2 años por el proyecto ACS, Clúster 1	456 - NIÑO	1,500	0	0%	0	0	0%
		Atención de niños menores de 2 años por el proyecto ACS, Clúster 2	456 - NIÑO	1,500	0	0%	0	0	0%
		Visitas de asistencia técnica y capacitación para mejorar la productividad, Clúster 1	127 - VISITA	500	0	0%	0	0	0%
		Visitas de asistencia técnica y capacitación para mejorar la productividad Cluster 2	127 - VISITA	500	0	0%	0	0	0%
		Sub-proyectos de planes de negocio, Clúster 1	305 - PROYECTO	45	0	0%	0	0	0%
		Sub-proyectos de planes de negocio, Clúster 2	305 - PROYECTO	85	0	0%	0	0	0%
	Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II) Tipo de proyecto: Inversión Pública	Perfiles de planes de negocios aprobados	302 - PERFIL	60	0	0%	20	0	0%
		Fortalecimiento Institucional de ARSA y SENASA	991 - ACTA	2	0	0%	0	0	0%
	CORREDOR PACÍFICO-PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL REGIONAL	Cierre financiero de obra del Tramo II, lote A: Júcaro Galán-Santa Elena realizado	1007 - NUMERO DE UNIDAD	1	0	0%	0	0	0%
		Cierre financiero de la supervisión del Tramo II, lote A Júcaro Galán-Santa Elena realizado	1007 - NUMERO DE UNIDAD	1	0	0%	0	0	0%
	Libramiento Anillo Periférico CA-5 Sur	Proceso para la contratación de las obras del tramo Libramiento Sur iniciado	425 - LICITACION	1	0	0%	0	0	0%
		Proceso para la contratación de la supervisión del tramo Libramiento Sur iniciado	364 - CONCURSO	1	0	0%	0	0	0%
		Porcentaje del derecho de vía del tramo licitado del "Libramiento Sur" liberado	75 - PORCENTAJE	70	0	0%	0	0	0%

ANEXO II
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2022

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2022		
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
	PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD	Productores agropecuarios con planes para la adopción de tecnologías CI, atención técnica en producción, mercado y/o nutrición con el apoyo de la intervención (PIDRyP) beneficiados	304 - PRODUCTOR	4,000	0	0%	0	0	0%
		Acceso a Financiamiento para los productores rurales con el apoyo de la intervención (PIDRyP) otorgados	304 - PRODUCTOR	1,933	0	0%	0	0	0%
	PROYECTO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN, SECCION I	Cierre financiero contrato de supervisión Villa de San Antonio -Goascorán Sección I, realizado	1007 - NUMERO DE UNIDAD	1	0	0%	0	0	0%
	PROYECTO DE SEGURIDAD HIDRICA EN EL CORREDOR SECO DE HONDURAS	Asistencia técnica para la prestación de apoyo para la Gobernanza del Agua a nivel nacional, contratada	155 - CONTRATO	1	0	0%	0	0	0%
		Diseño para la construcción de obras de la represa JCV (Compuertas), contratada	155 - CONTRATO	1	0	0%	0	0	0%
	Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana	Supervisión de obra para la rehabilitación de los sistemas de agua, contratada	155 - CONTRATO	1	0	0%	0	0	0%
		Asistencia técnica para el fortalecimiento de los prestadores del servicio de agua potable (ERSAPS), contratada	155 - CONTRATO	1	0	0%	0	0	0%
0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería	PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL PRO-LENCA	Planes de inversión aprobados por el comité de aprobación de inversiones y organismos financiador.	1089 - PLAN DE INVERSIÓN	65	0	0%	0	0	0%
		Planes de fortalecimiento organizacional aprobados por las organizaciones beneficiadas	264 - PLAN	65	0	0%	0	0	0%
		Convenio suscritos con las organizaciones (hombres, mujeres, jóvenes y etnias) beneficiadas para el financiamiento de sus planes de inversión.	26 - CONVENIO	25	0	0%	5	0	0%
		Asistencia técnica a Productores y productoras rurales de las organizaciones beneficiarias, aplicando medidas de bioseguridad.	992 - ASISTENCIA TÉCNICA	65	0	0%	0	0	0%
		Rehabilitación de líneas de conducción tuberías para sistemas de riego instalado en parcelas de tierra agrícola.	53 - KILÓMETRO	1	0	0%	0	0	0%
		Convenio suscritos con las organizaciones (hombres, mujeres, jóvenes y etnias) beneficiadas para el financiamiento de sus planes de inversión. (FIDA II)	26 - CONVENIO	40	0	0%	25	0	0%
		Rehabilitación de líneas de conducción tuberías para sistemas de riego instalado en parcelas de tierra agrícola (FIDA II)	53 - KILÓMETRO	19	0	0%	0	0	0%
		Rehabilitadas hectáreas de tierra agrícolas con acceso a riego (FIDA II).	44 - HECTÁREA	50	0	0%	0	0	0%
	PROYECTO DE DESAROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)	Capacitación impartidas en prácticas amigables con el medio ambiente y medidas de protección a las microcuencas, aplicando medidas de bioseguridad.	1009 - CAPACITACIÓN	50	0	0%	0	0	0%
		Capacitaciones brindadas a Productores y productoras de asociaciones de regantes (Organización, administración, producción, asistencia técnica y normas parlamentarias), aplicando medidas de bioseguridad.	1009 - CAPACITACIÓN	2	0	0%	0	0	0%

ANEXO II
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2022

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2022		
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
		Capacitaciones impartidas en diversificación agrícola (administración financiera, organización, canon de agua, desarrollo agroempresarial), aplicando medidas de bioseguridad.	1009 - CAPACITACIÓN	16	0	0%	7	0	0%
		Contratos suscritos de comercialización y financiamiento.	155 - CONTRATO	20	0	0%	7	0	0%
		Líneas de tubería Instaladas (Conducción, Distribución y Terciarias).	53 - KILÓMETRO	13	0	0%	4	0	0%
	PROYECTO DE DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO DEL VALLE DE JAMASTRAN FASE 1	Proceso de construcción de los módulos de riego.	75 - PORCENTAJE	100	0	0%	33	0	0%
	Proyecto de inclusión económica y social de pequeños productores rurales en la región noreste de Honduras (PROINORTE)	Diagnósticos Territoriales elaborados.	29 - DIAGNOSTICO	15	0	0%	3	0	0%
		Cadenas de valor productivas priorizadas.	149 - INFORME	3	0	0%	1	0	0%
		Diseño de campaña de concientización implementada.	149 - INFORME	1	0	0%	0	0	0%
		Planes productivos de Inversión Formulados.	1089 - PLAN DE INVERSIÓN	1	0	0%	0	0	0%
		Inversiones productivas aprobadas por el comité de inversiones.	1089 - PLAN DE INVERSIÓN	1	0	0%	0	0	0%
		Capacitaciones brindadas a los administradores de las estaciones agroclimáticas.	1009 - CAPACITACIÓN	1	0	0%	0	0	0%
		Estudio de microcuencas (alta vulnerabilidad y riesgo) elaborados.	547 - ESTUDIO	1	0	0%	1	0	0%
		Kits de herramientas entregados a las Unidades Municipales Ambientales (UMA) entregados.	1112 - KIT	2	0	0%	1	0	0%
	0240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social	Informe de implementación del modelo de gestión homologado del Programa Bono Vida Mejor	149 - INFORME	4	0	0%	1	0	0%
		Informes de Fortalecimiento del Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) y el Sistema de entrega	149 - INFORME	4	0	0%	1	0	0%
		Informes de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno a través del gabinete social y al Centro Nacional de Información del Sector Social (CENISS) para la Integración del Sistema de Protección Social	149 - INFORME	4	0	0%	1	0	0%
		Análisis priorizados y/o por demanda para la entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas a hogares participantes del Programa Bono Vida Mejor Dominio Urbano (6401-HN)	1030 - BONO VIDA MEJOR	45,820	0	0%	0	0	0%
	APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 5008/BL-HO	Informe del fortalecimiento de las Direcciones de la Sub Secretaría de Integración Social a través de la contratación y capacitación de recurso humano y contratación de la plataforma operativa en campo del Programa financiada con recursos del Préstamo BID 5008/BL-HO	149 - INFORME	4	0	0%	1	0	0%
		Informe del fortalecimiento de los servicios educativos, priorizando el tercer ciclo de educación.	149 - INFORME	4	0	0%	1	0	0%
		Informe del Fortalecimiento del Ordenamiento del Piso de Protección Social	149 - INFORME	4	0	0%	1	0	0%

ANEXO II
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2022

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2022		
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
		Analisis priorizados y/o por demanda para la entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas a hogares participantes del Programa Bono Vida Mejor Dominio Rural 5008/BL-HO	1030 - BONO VIDA MEJOR	53,653	0	0%	0	0	0%
0050 - Secretaría de Educación	PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)	Proyectos obra de infraestructura escolar diseñados y formulados	305 - PROYECTO	3	0	0%	0	0	0%
		Proyectos obra de infraestructura educativa, en los niveles Prebásica, Básica y de manera limitada en el nivel Medio, de los departamentos de: Ocotepeque, Lempira, Intibucá, La Paz, Santa Bárbara y Copán en la zona de occidente. Francisco Morazán, valle, Choluteca, Comayagua y Gracias a Dios, supervisados.	579 - OBRA DE INFRAESTRUCTURA	24	0	0%	0	0	0%
		Proyectos de obra de infraestructura escolar diseñados y formulados	305 - PROYECTO	9	0	0%	0	0	0%
		Educandos de educación media, dotados con herramientas pedagógicas.	1016 - EDUCANDO	33,000	0	0%	0	0	0%
		Proyectos obra de infraestructura educativa, en los niveles prebásica, básica y de manera limitada en el nivel medio, de los departamentos de:Ocotepeque, Lempira, Intibucá, La Paz, Santa Bárbara y Copán en la zona de occidente. Francisco Morazán, valle, Choluteca, Comayagua y Gracias a Dios supervisados	579 - OBRA DE INFRAESTRUCTURA	12	0	0%	0	0	0%
		MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN PREBÁSICA EN HONDURAS	Modelo de la Calidad en la Gestión de la Educación Prebásica (MEP) diseñado, para todas las modalidades de atención del nivel de Educación Prebásica .	32 - DOCUMENTO	1	0	0%	0	0
	Instancias de participación comunitaria y escolar (COMDE/CODDE) capacitadas.		300 - ORGANIZACION	88	0	0%	0	0	0%
	Centros de Educación Prebásica con herramientas curriculares actualizadas para todas las Modalidades de Atención del nivel de Educación Prebásica en CEPB y CCPREB		32 - DOCUMENTO	1	0	0%	0	0	0%
	Estudios de factibilidad realizados en centros de educación prebásica, de los departamentos focalizados: Gracias a Dios, Lempira, Yoro, Olancho, Copán, El Paraíso.		1091 - ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	115	0	0%	0	0	0%
	Informes de ejecución de actividades del Proyecto "Mejoramiento de la Calidad en la Educación Prebásica en Honduras" elaborados por la Unidad Coordinadora .		149 - INFORME	2	0	0%	0	0	0%
	Diseño Curricular actualizado para todas las Modalidades de Atención del nivel de Educación Prebásica y Prácticas de Enseñanza en CEPB y CCPREB mejoradas (DLI)		32 - DOCUMENTO	1	0	0%	0	0	0%
	0100 - Secretaría de Finanzas	Modernización Integral de la Gestión de las Finanzas Públicas	Contratos derivados de los diferentes procesos de Licitación y Compra menor programadas en el Plan de Compra y Contrataciones del Estado.	32 - DOCUMENTO	14	0	0%	2	0
Modernización de los Sistemas de la SEFIN.			32 - DOCUMENTO	1	0	0%	0	0	0%

ANEXO II
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2022

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2022		
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
		Formulación Presupuestaría dela Gestión de las Finanzas.	32 - DOCUMENTO	1	0	0%	1	0	0%
0120 - Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ANEXO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA, UBICADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGÜELA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN	Construcción de Edificio Anexo del TSC.	983 - METRO CUADRADO	6,374	0	0%	2,125	0	0%
		Supervisión de Construcción de Edificio Anexo del TSC.	149 - INFORME	10	0	0%	3	0	0%
		Mediante medidas de mitigación contra inundaciones sistemas de drenaje de agua pluvial y construcción de cajas y drenaje tipo cuneta.	65 - METRO CUBICO	1,452	0	0%	0	0	0%
	Construcción de obras de mitigacion de riesgos contra inundaciones erosión, sedimentos y drenajes menores en los Departamentos de Islas de la Bahía, Atlantida, Copan, Francisco Morazan y Comayagua.	Supervisión de medidas de mitigación contra inundaciones sistemas de drenaje de agua pluvial y construcción de cajas y drenaje tipo cuneta.	149 - INFORME	25	0	0%	0	0	0%
		Pavimentación de Calles	982 - METRO LINEAL	8,500	0	0%	2,550	0	0%
	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN CON ESTRUCTURA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LOS DEPARTAMENTOS DE; VALLE, COMAYAGUA, INTIBUCA, EL PARAISO, LEMPIRA, COPÁN, OCOTEPEQUE, ATLANTIDA, COLÓN, LA PAZ, YORO, FRANCISCO MORA	Supervisión de Pavimentación de Calles	149 - INFORME	75	0	0%	22	0	0%
	Construcción de Pavimentos de Concreto Hidráulico en Vías Urbanas en los Departamentos del Paraíso, Cortes, Olancho, Copan, La Paz, Francisco Morazán, Santa Barbara, Intibucá, Valle, Atlántida, Ocotepe	Construcción de Pavimentos con con concreto hidráulico en vías urbanas en 16 departamentos.	982 - METRO LINEAL	22,320	0	0%	6,696	0	0%
		Supervisión de la Construcción de Pavimentos con con concreto hidráulico en vías urbanas en 16 departamentos.	982 - METRO LINEAL	22,320	0	0%	6,696	0	0%
	REHABILITACIÓN VIAL DEL CORREDOR DE OCCIDENTE: LA ENTRADA - COPAN RUINAS - EL FLORIDO Y LA ENTRADA-SANTA ROSA DE COPAN	Construcción Rehabilitación Vial del Corredor de Occidente "La Entrada Copán Ruinas-El Florido y La Entrada-Santa Rosa de Copán"	982 - METRO LINEAL	1,400	0	0%	650	0	0%
		Supervisión Rehabilitación Vial del Corredor de Occidente "La Entrada Copán Ruinas-El Florido y La Entrada-Santa Rosa de Copán"	982 - METRO LINEAL	1,400	0	0%	650	0	0%
		Fortalecimiento Institucional para rehabilitación vial del corredor de occidente: La Entrada-Copán Ruinas-El Florido y La Entrada-Santa Rosa de Copán.	149 - INFORME	3	0	0%	1	0	0%
		Reasentamientos para rehabilitación vial del corredor de occidente: La Entrada-Copán Ruinas-El Florido y La Entrada-Santa Rosa de Copán.	149 - INFORME	6	0	0%	2	0	0%
		Equipadas las salas de quirófano, otorrinolaringología, cirugía , cuidados intensivos , sala de imagenología, entre otras con equipo biomédico especializado en el HMEP	1082 - LOTE DE EQUIPO	2	0	0%	0	0	0%
0060 - Secretaría de Salud	REEQUIPAMIENTO BIOMEDICO HOSPITAL MARIA ESPECIALIDADES PEDIATRICAS (HMEP)								
	RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID - 19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, EN HONDURAS	Fortalecida en un 70% la capacidad de respuesta de las 20 Regiones Sanitarias (4518)	149 - INFORME	56	0	0%	0	0	0%
		Fortalecida la capacidad de los servicios de salud del sistema público, para atender los pacientes con COVID19 (4518)	149 - INFORME	7	0	0%	3	0	0%
		Realizada la auditoría del Proyecto	149 - INFORME	19	0	0%	2	0	0%

ANEXO II
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2022

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2022		
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
		Fortalecida la Red de diagnostico notificacion, seguimiento y respuesta laboratorial en las 20 Regiones Sanitarias (4518)	149 - INFORME	4	0	0%	1	0	0%
		Realizada la Implementacion de la Estrategia de comunicaci3n a traves del dise1o de materiales infograficos para la promocion de conductas y habitos saludables en la poblacion, que garantice la accesibilidad de la informacion a la poblacion diversa y capacitacion de normas y lineamientos al personal de salud.	149 - INFORME	4	0	0%	1	0	0%
		Fortalecida en un 70% de la red de diagn3stico, notificaci3n, seguimiento y respuesta laboratorial en las 20 Regiones Sanitarias (3815)	149 - INFORME	1	0	0%	0	0	0%
	HONDURAS SALUD MESOAMERICA GRT/HE-16838-HO	Realizadas las Atenci3nes en preconcepci3n en embarazos, partos , puerperios , tamizaje c1ncer cervicouterino y planificaci3n familiar	149 - INFORME	6	0	0%	0	0	0%
		Impresos y reproducidos los materiales para las reuniones t1cnicas, talleres y realizado el acompa1amiento t1cnico en el seguimiento, monitoreo y evaluaci3n a los gestores del primer y segundo nivel de atencion .	149 - INFORME	3	0	0%	0	0	0%
		Realizadas las gestiones administrativas y proceso de cierre del proyecto	149 - INFORME	8	0	0%	2	0	0%
	PROYECTO HONDURAS - INICIATIVA REGIONAL DE ELIMINACI3N DE LA MALARIA (IREM EN MESOAM1RICA Y REP1BLICA DOMINICANA	Continuidad de Consultor1as de personal esencial de laboratorio y capacitados el personal de la red de unidades de an1lisis en diagn3stico de malaria.	149 - INFORME	66	0	0%	18	0	0%
		Continuidad de consultor1as de Personal m1dico y asistencial en las regiones y Capacitados en el manejo de casos de malaria.	149 - INFORME	13	0	0%	4	0	0%
		Fortalecida la conducci3n t1cnica y financiera del proyecto en el tema de la eliminaci3n de malaria en Honduras	149 - INFORME	28	0	0%	7	0	0%
	APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCI3N SOCIAL 5008/BL-HO	Mejorada la cobertura con servicios de Salud del Primer Nivel de atenci3n a la poblaci3n materno infantil	149 - INFORME	132	0	0%	37	0	0%
	APOYO PARA LA IMPLEMENTACI3N DEL PLAN NACIONAL DE INTRODUCCI3N DE LA VACUNA CONTRA LA COVID-19 EN HONDURAS	Adquiridas 130368 dosis de vacunas y aplicadas a la poblaci3n priorizada seg1n el plan de Introducci3n de la vacuna contra la COVID 19	88 - VACUNA	130,368	0	0%	0	0	0%
		Administracion y Ejecucion del Proyecto	149 - INFORME	4	0	0%	1	0	0%
		Supervision externa y Auditoria	9 - AUDITORIA	2	0	0%	0	0	0%
	MEJORA DE LA EFICIENCIA EN LA GESTI3N DE LA INFORM1TICA EN SALUD EN HONDURAS	Capacitado el personal de los Hospitales Gabriela Alvarado y Puerto Cortes en Gest1n Hospitalaria	149 - INFORME	2	0	0%	0	0	0%
		Adquirido , instalado y funcionando Equipo Infotecnologico en los hospitales seleccionados	392 - EQUIPO	8	0	0%	1	0	0%
		Ejecutados los fondos de la gesti3n administrativa	149 - INFORME	12	0	0%	3	0	0%
	PROYECTO DE RESPUESTA A EMERGENCIA HONDURAS COVID-19	Realizados los Gastos Operativos la Supervisi3n y Seguimiento de actividades del Programa.	149 - INFORME	9	0	0%	3	0	0%
		Adquirido equipo y mobiliario m1dico para los Hospitales , Regiones Sanitarias priorizadas y Laboratorio Nacional	425 - LICITACION	15	0	0%	3	0	0%

ANEXO II
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2022

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2022		
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
	RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID-19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN HONDURAS (RISP-HO-2)	Adquiridas vacunas para la población objetivo de acuerdo al Plan Nacional de Introducción de la vacuna contra la COVID-19 y Adquisición de equipo para cadena de frio	155 - CONTRATO	2	0	0%	1	0	0%
		Fortalecer en un 70% la capacidad de respuesta de las 20 Regiones Sanitarias al año 2023	149 - INFORME	12	0	0%	3	0	0%
		Fortalecido en un 70% la red de diagnóstico, notificación, seguimiento y respuesta laboratorial en las 20 Regiones Sanitarias y 26 hospitales del país, al año 2023.	149 - INFORME	1	0	0%	1	0	0%
		Implementada las estrategias de comunicación multicanal a través del diseño de materiales infográficos y videos, para la promoción de conductas y hábitos saludables en la población, que garanticen la accesibilidad de la información para poblaciones diversas y la capacitación de normas y lineamientos al personal de salud en al menos un 90% para el año 2023.	155 - CONTRATO	5	0	0%	1	0	0%
		Fortalecer la capacidad de los servicios de salud del sistema público, para atender los pacientes con COVID -19 en al menos un 90% en las 20 Regiones Sanitarias y 26 hospitales para el 2023.	26 - CONVENIO	1	0	0%	0	0	0%
		Realizadas las gestiones Administrativas y Auditados en un 100% los fondos del credito al año 2023	149 - INFORME	188	0	0%	54	0	0%
0130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JÓVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR)	Monitoreo y asistencias técnicas	32 - DOCUMENTO	1	0	0%	0	0	0%
		Fortalecimiento para integración e interconexión de sistemas de información en temas de empleo, producción y seguridad social .	32 - DOCUMENTO	1	0	0%	0	0	0%
		Fortalecimiento para la reinserción de jóvenes en el valle de Comayagua	32 - DOCUMENTO	1	0	0%	0	0	0%
0037 - Servicio de Administración de Rentas	Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Tributaria	Modernización de los sistemas y de la infraestructura tecnológica	1078 - INFORME DE EJECUCIÓN	4	0	0%	1	0	0%
0807 - Suplidora Nacional de Productos Básicos	Proyecto de Abastecimiento de Centros de Venta de Honduras y Fortalecimiento al BANASUPRO	Abastecimiento para comercialización de productos de la canasta básica	429 - LOTE	66	0	0%	0	0	0%
0702 - Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán	"Fortalecimiento Tecnológico del Programa de Vinculación Social y Extensión del Centro Universitario Regional de San Pedro Sula de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán".	Tecnología Educativa y Equipamiento	149 - INFORME	1	0	0%	0	0	0%
		Movilidad Académica	149 - INFORME	1	0	0%	0	0	0%

Fuente: SIAFI, 30/09/2022
