

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e
Inversión Pública



Informe de Avance Físico y Financiero

AL IV TRIMESTRE 2022

**Secretaría de Desarrollo Comunitario
Agua y Saneamiento
(SEDECOAS/FHIS)**

Tegucigalpa, Honduras

Febrero, 2023

IV. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

4.1 EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

La Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS) - Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), cuya finalidad es la de promover el mejoramiento de las condiciones de vida de los grupos sociales

Cuadro No. 01

Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del 2022

Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	1,743,849,872
Presupuesto Vigente	1,473,196,641
Devengado IV Trimestre-2023	507,483,828
% Ejecución (Devengado IV Trim-2022/ Vigente)	34%
Devengado Anual	599,602,881
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	41%

Fuente: SIAFI, 31/12/2023

marginados en el área rural y urbana, mediante el otorgamiento de financiamientos para programas y proyectos de desarrollo social o económico, con el propósito de aumentar su productividad, sus niveles de empleo y de ingresos y de contribuir a la satisfacción de sus necesidades básicas.

El Gobierno actual ha considerado dentro de sus prioridades atender proyectos enfocados a programas sociales y apuntar a los siguientes objetivos; En materia de Educación lo siguiente: un Sistema capaz de brindar educación gratuita y universal, reinstaurando la Matrícula Gratis y una merienda idónea, rehabilitar y repotenciar al menos el 50% de la infraestructura escolar durante el primer año de gobierno, llegando al 100% en el tercer año de gobierno, mediante mecanismos de participación comunitaria apoyada desde el municipio y el gobierno central entre otros.

En materia de Protección Social se ampliará y fortalecerá programas de asistencia como las transferencias en efectivo que se focalizarán mejor a fin de que realmente lleguen a sectores de la población en extrema pobreza, sin corrupción ni manipulación.


Entre otras, elaborar una estrategia contra la pobreza rural y por la soberanía alimentaria, enfocada en las zonas de mayor pobreza, distribuyendo tierras ejidales, nacionales y fiscales para la producción agrícola y pecuaria para la subsistencia y el mercado local a costos más competitivos.

Al cuarto trimestre del año 2022, la institución contó con un presupuesto vigente de

inversión pública de **L1,473.2 millones** y la ejecución presupuestaria del trimestre asciende a un monto de **L507.5 millones** lo que representa el (34%) con relación al presupuesto vigente, y la ejecución acumulada del 2022 representa el 41% equivalente a **L599.6 millones** del total vigente, tal como se detalla en el Cuadro No. 1.

Dicha ejecución se llevó a cabo a través de (10) diez proyectos enfocados en Agua y Saneamiento, Electrificación Rural y Caminos Rurales, Infraestructura Social, Infraestructura Escolar, Fortalecimiento de Capacidades para Jóvenes, Recuperación de Espacios Públicos y Mejora de la Infraestructura Básica. Ver Detalle de Ejecución Financiera en Anexo No. 4.

Gráfico No. 2
Presupuesto Vigente
SEDECOAS/FHIS: Financiamiento por Organismo
Cifras en millones de Lempiras

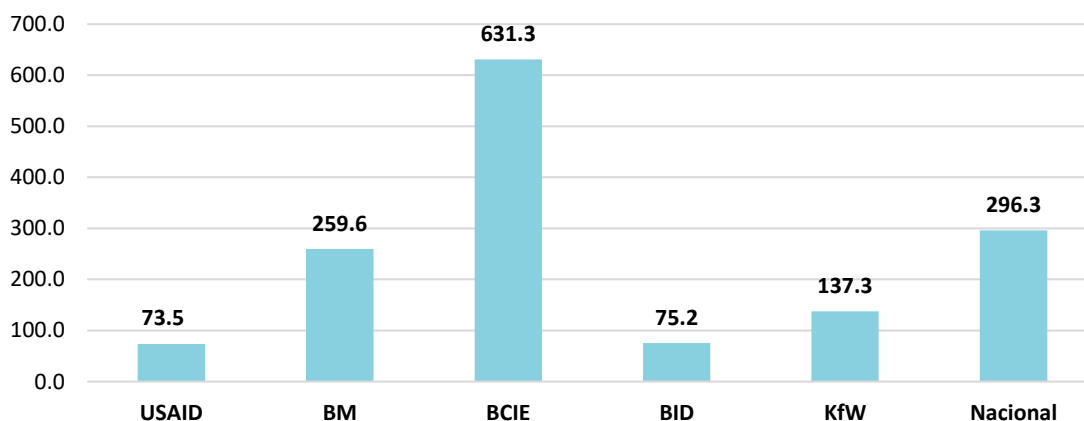


En referencia al financiamiento de Inversión Pública, el 68.3% corresponde a fondos provenientes de crédito externo expresado en términos monetarios con un monto de **L1,006.7 millones**, el 11.5% a recursos de donaciones externas con un monto de **L170.1 millones**; y un proyecto financiado con recursos nacionales, más la contraparte nacional que corresponde a gastos operativos de proyectos de fondos externos que requieren estos recursos nacionales, sumando un monto total en el presupuesto vigente de **L296.3 millones** equivalente a 20.1%. Dicha inversión es financiada por el BCIE con el **42.8%**, Banco Mundial con **17.6%**, KfW Banco Alemán con **9.3%**, BID con el **5.1%** y USAID con el **5.0%**.

4.2 COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN AL IV TRIMESTRE (2018-2022):

En los años 2018 al 2022, los proyectos de Inversión Pública de la SEDECOAS/FHIS ha considerado la ejecución de al menos 12 Proyectos de

Inversión, de los cuales se han financiado el 68% con recursos de crédito externo, 28% recursos de donación externa y el 4% restante con recursos del Tesoro Nacional como contraparte de dichos Proyectos.

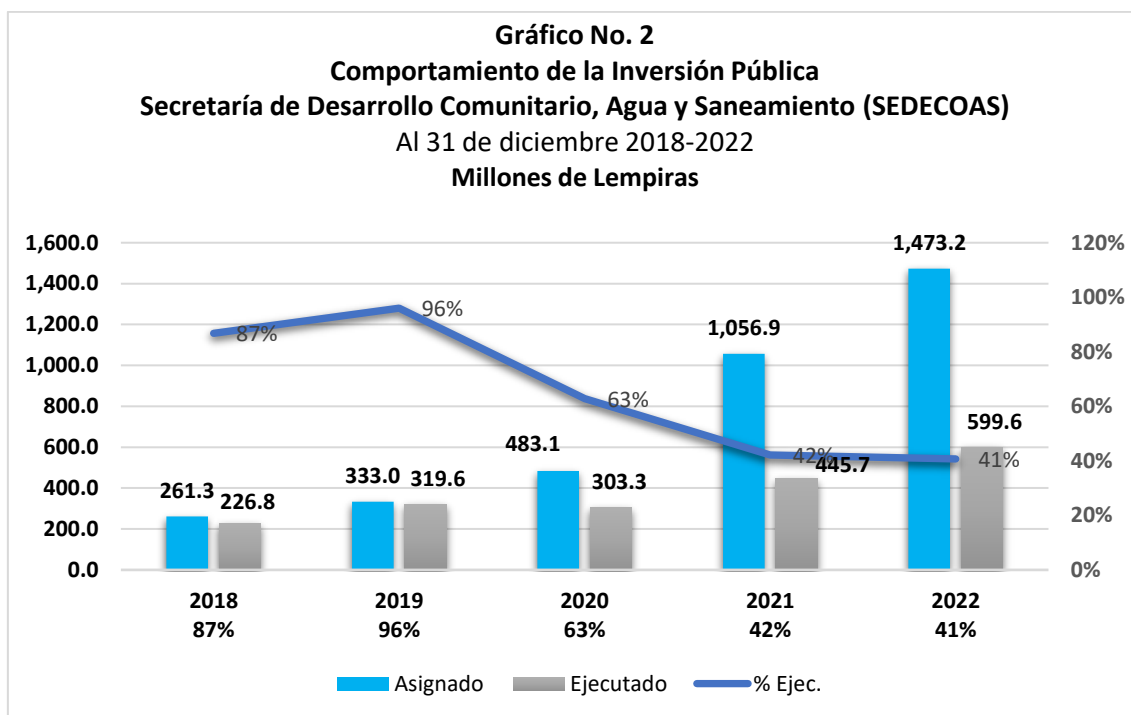

La Gráfica No.2 muestra la ejecución porcentual comparativa de los últimos años al 31 de diciembre, el pico más alto se registró en el año 2019, para el año 2021 se incorporaron al presupuesto nuevos programas entre ellos para atender la reparación y rehabilitación de escuelas y para proyectos de infraestructura en las zonas afectadas por Eta e Iota, sin embargo, pese a tener suficientes recursos la ejecución para los años 2021 y 2022 se vio mermada por la crisis ocasionada post pandemia del COVID-19, en el 2021, así como cambio de nuevo gobierno en el 2022, entre otras. Cabe mencionar que la baja ejecución en el 2022 a pesar de ser la más alta en los últimos 5 años, se debe en parte a procesos engorrosos de los organismos financiadores, contratos pendientes de ratificar por el Congreso Nacional, así como la falta de personal esencial en las unidades ejecutoras.

4.3 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión en el cuarto trimestre del año 2022 se concentró en los siguientes proyectos:

- 1 Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y su Gestión Local (PROMINE).
- 2 Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB).
- 3 Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa

- en Honduras (MIFE).
- 4 Proyecto Convivencia y Espacios Seguros para los Jóvenes en Honduras (CONVIVIR).
 - 5 Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras (PRE).
 - 6 Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (ICS).
 - 7 Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras (PIOH).
 - 8 Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Ciudad de Gracias, Departamento de Lempira (Aguas).
 - 9 Programa de Mejoramiento de la Infraestructura de Desarrollo Social y Comunitario en varios departamentos de Honduras (BCH).
 - 10 Programa de Emergencia en Respuesta a la Tormenta Tropical Eta (ETA).

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros de los principales proyectos de acuerdo con su presupuesto vigente:

Programa Modernización de la Infraestructura Educativa (PROMINE)

PROMINE tiene por objetivo general fortalecer la rectoría Sectorial en Infraestructura Educativa de la Secretaría de Educación y la gestión local participativa, así como mejorar el acceso de los alumnos de las comunidades pobres al Centro Educativo de calidad que operan de manera sostenible. De esa manera se pretende contribuir al aumento de la eficiencia y de la calidad del sistema educativo (pre-básico y básico).

Los principales avances físicos al 31 de diciembre de 2022 son los siguientes:

- De 5 centros educativos programados se finalizaron 2 centros educativos construidos, reparados y/o ampliados en el Departamento de Intibucá, generando 85 empleos directos y beneficiando a 807 personas directamente.
- L56.8 millones son anticipos a proyectos en los departamentos de Copán, Gracias a Dios, Intibucá, La Paz, Lempira y Ocotepeque.

A continuación, véase la ejecución histórica del Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y de su Gestión Local (PROMINE), cuarto trimestre 2022:

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto*/	Inicio-Fin	
Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y de su Gestión Local (PROMINE)	SE/FHIS VIII No.2008-66-178 2014 67 414 (KFW) / FHIS - SE Fondos de Donación	1,668,181,102	10/07/2012 - 31/07/2023	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	
IV Trimestre 2022	188,312,919	98,560,069	61,771,609	62.7
Acumulado 2022	188,312,919	98,560,069	66,787,202	67.8
Acumulado Vida del Proyecto*/	1,668,181,102	1,668,181,102	1,161,783,433	69.6

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB)

Consisten en contribuir a mejorar la convivencia ciudadana en Honduras a través de la mejora en la calidad de vida en barrios vulnerables y la reducción de la incidencia de delitos violentos. Los objetivos específicos son: (I) mejorar el hábitat de barrios urbanos vulnerables, aumentando el acceso a infraestructura de servicios básicos y de prevención para disminuir delitos de robos y violaciones sexuales; (II) reducir los niveles de incidencia de homicidios y violencia intrafamiliar (VIF) en los municipios intervenidos mejorando los servicios de prevención y atención a víctimas de la violencia; y (III) mejorar la efectividad policial en investigación criminal, a través del incremento de la proporción de casos de homicidio con agresor identificado e informe de investigación aceptado por el Ministerio Público.

Los principales avances físicos al 31 de diciembre de 2022 son los siguientes:

- 6 talleres de valores y/o emprendimiento para jóvenes de los barrios intervenidos en la ciudad de Comayagüela.
- 652 conexiones de sistemas de agua potable en barrios intervenidos.
- 1.7 Kilómetros de construcción de vías pavimentadas en barrios priorizados en Tegucigalpa.

A continuación, véase la ejecución histórica del **Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB)**, cuarto trimestre 2022:

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto*/	Inicio-Fin	
Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB)	BID/4518/BL-HO ATN/OC-17135-HO	369,377,190	01/10/2018 - 01/10/2023	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
IV Trimestre 2022	75,224,516	71,849,516	18,563,703	25.8
Acumulado 2022	75,224,516	71,849,516	60,325,223	84.0
Acumulado Vida del Proyecto*/	369,377,190	369,377,190	301,339,229	81.6

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras (MIFE)

Este Programa tiene como objetivo fortalecer la educación en Honduras para que los educandos tengan un acceso eficiente, con la permanencia necesaria en los Centros de Educación Media y sean promovidos con la calidad requerida. El programa estará localizado en los departamentos de: Atlántida, Choluteca, Colón, Comayagua, Copán, Cortés, El Paraíso, Francisco Morazán, Gracias a Dios, Intibucá, Islas de la Bahía, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Santa Bárbara, Valle, Yoro.

El Programa tiene como objetivo de entregable 105 centros de educación (Pre-básica, básica y Media) ampliados, mejorados y equipados, beneficiando a 480 niños de Educación prebásica, 40,759 niños de Educación Básica y 43,801 jóvenes de Educación Media, haciendo un total de 85,040 educandos de los tres niveles del sistema educativo, así mismo 3,821 docentes de Educación Pre-básica, 3,821 docentes de Educación Básica, 15,285 docentes de educación media, haciendo un total de 22,923 docentes. La duración del programa es de 4 años desde el 2020 hasta el 2023 donde habrá un desarrollo gradual de la infraestructura y la dotación de equipo, así como la formación permanente y la plataforma virtual para emprendimiento.

Los principales avances físicos al 31 de diciembre de 2022 son los siguientes:

- 0 centro educativos construidos, reparados y/o ampliados.

A continuación, véase la ejecución histórica del Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras (MIFE), cuarto trimestre 2022:

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto*/	Inicio-Fin	
Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras (MIFE)	BCIE - 2239	1,971,360,000	30/03/2021 - 30/03/2026	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
IV Trimestre 2022	499,467,419	438,079,338	821,214	0.19
Acumulado 2022	499,467,419	438,079,338	860,314	0.20
Acumulado Vida del Proyecto*/	1,971,360,000	1,971,360,000	114,393,414	5.80

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Proyecto Convivencia y Espacios Seguros para los Jóvenes en Honduras (CONVIVIR)

El programa abarca la construcción, el mejoramiento y el equipamiento de infraestructura social para jóvenes y espacios públicos, financiamiento y/o cofinanciamiento del trabajo con jóvenes y la capacitación de jóvenes, la capacitación de personal de las instituciones involucradas, las municipalidades seleccionadas, las comunidades de barrio y servicios de consultoría.

Los principales avances físicos al 31 de diciembre de 2022 son los siguientes:

- 0 capacitaciones en habilidades sociales y laborales a jóvenes de ambos sexos entre las edades de 12-30 años en los municipios de Santa Rosa de Copán, Intibucá, La Esperanza y Juticalpa.
- 0 espacios públicos recuperados y entregados para la seguridad ciudadana a las colonias, alcaldías y patronatos.
- CONVIVIR FASE II, termino su fase de preparación el abril del año 2022, sin embargo, dichos proyectos se encuentran en la fase de contratación, por lo antes expuesto no hay proyectos que reportar.

A continuación, véase la ejecución histórica del Proyecto Convivencia y Espacios Seguros para los Jóvenes en Honduras (CONVIVIR), cuarto trimestre 2022:

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto*/	Inicio-Fin	
Proyecto Convivencia y Espacios Seguros para los Jóvenes en Honduras (CONVIVIR)	BMZ Nr. 2016 65348	170,029,800	17/07/2021 - 31/12/2023	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
IV Trimestre 2022	44,718,737	42,760,750	21,920,833	51.3
Acumulado 2022	44,718,737	42,760,750	26,573,809	62.1
Acumulado Vida del Proyecto*/	170,029,800	170,029,800	11,409,749	6.7

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras (PRE)

Tiene como objetivo Coordinar, impulsar y fortalecer capacidades para el conocimiento del riesgo, reducción de este y manejo de desastre, como una estrategia para mejorar la eficiencia en la preparación para la respuesta y la recuperación post desastre naturales. Su propósito es la atención de la infraestructura dañada por el Huracán y Tormenta Tropical Eta: rehabilitación de pasos y caminos terciarios, reparación y construcción de cajas puentes rehabilitación y construcción de sistemas de drenaje, puentes (Bailey), construcción de calles terciarias, obras de mitigación entre otras.

Los principales avances físicos al 31 de diciembre de 2022 son los siguientes:

- 0 unidades de infraestructuras en centros de salud pública rehabilitados y/o reconstruidos afectados por los ciclones ETA e IOTA.
- 0 unidades de sistemas de agua rehabilitados y/o reconstruidos afectados por los ciclones ETA e IOTA.
- 0 kilómetros de Infraestructura vial rehabilitada y reconstruida afectados por los ciclones ETA e IOTA.
- 0 sistemas de saneamiento rehabilitados y/o reconstruidos afectados por ciclones ETA e IOTA.
- 0 proyectos de infraestructura comunitaria rehabilitadas y reconstruidas afectados por los ciclones ETA e IOTA.
- 0 centros educativos rehabilitados y/o reconstruidos afectados por los ciclones ETA e IOTA.
- 26 subproyectos de infraestructura educativa en ejecución, los cuales culminaran entre febrero y mayo de 2023 en los departamentos de Comayagua, Copán, Cortés, El Paraíso, Francisco Morazán, .
- La supervisión de los 26 subproyectos se desarrolla a la par de la ejecución.

- Priorización de lista de subproyectos que requieren intervención enviado por la Dirección de Proyectos para siguiente fase de rehabilitación y reconstrucción de escuelas.
- En reformulación 10 subproyectos de agua y saneamiento (Sistemas de agua potable 8 y Sistemas de alcantarillado sanitario 2).
- Caracterización ambiental y social de 14 subproyectos de centros educativos en elaboración de sus respectivos PGAS.

A continuación, véase la ejecución histórica del Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras (PRE), cuarto trimestre 2022:

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto*/	Inicio-Fin	
Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras	6822-HN	1,960,432,000	25/05/2021 - 31/12/2026	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
IV Trimestre 2022	732,341,690	3,375,000	2,515,613	74.5
Acumulado 2022	732,341,690	3,375,000	2,515,613	74.5
Acumulado Vida del Proyecto*/	1,960,432,000	1,960,432,000	2,501,684	0.1

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
 Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (ICS/USAID)

Tiene como objetivo general incrementar la resiliencia de las comunidades y los individuos a la violencia y al crimen a través de mejoras en la infraestructura pública de pequeña escala. Esto incluye el mejoramiento en las estructuras comunitarias que mitiguen el crimen eliminando o disminuyendo el riesgo de oportunidad, creando espacios comunitarios más seguros, aumento en los servicios de calidad que protejan contra la violencia, mejoramiento en la participación de los sistemas de seguridad y rendimiento de justicia nacional y municipal, mejoramiento en la participación ciudadana con los sectores de justicia y seguridad.

Los principales avances físicos al 31 de diciembre de 2022 son los siguientes:

- 2 obras complementarias reparadas y/o ampliadas en los servicios de salud ubicados en Atlántida y Cortés.
- 8 obras de espacios públicos recuperados y entregados para la seguridad ciudadana a las colonias, alcaldías y patronatos.

- 9 centro educativos construidos, reparados y/o ampliados ubicados en Choloma, San Pedro Sula, Chamelecón, La Lima, Tela y en Tegucigalpa.

A continuación, véase la ejecución histórica del Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (ICS/USAID), cuarto trimestre 2022:

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto*/	Inicio-Fin	
Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (USAID/ICS)	522-0501-4 Donación Externa	348,006,068	19/10/2017 - 30/06/2024	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	
IV Trimestre 2022	10,612,131	57,711,016	37,902,017	65.7
Acumulado 2022	10,612,131	57,711,016	55,047,659	95.4
Acumulado Vida del Proyecto*/	348,006,068	348,006,068	195,596,986	56.2

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Programa Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras (USAID/PIOH)

El propósito de esta Actividad es mejorar las pobres condiciones sociales y económicas son especialmente pronunciadas en el Occidente de Honduras. Extrema pobreza, desnutrición, vulnerabilidad al cambio climático. Bajos niveles educativos, migración, falta de acceso a los servicios básicos y otros retos socioeconómicos son endémicos. La provisión de servicios básicos de educación y nutrición son escasos en la zona de Occidente y es difícil el acceso a los ya existentes, así mismo la gestión de servicios de educación, nutrición y agua y saneamiento son deficientes por lo que los ciudadanos cuentan además con pocos espacios de participación para mejorar sus vidas a nivel de hogar y sus vidas productivas, lo que genera una gran brecha de pobreza.

Los principales avances físicos al 31 de diciembre de 2022 son los siguientes:

- 2 obras complementarias reparadas y/o ampliadas en los servicios de salud en los departamentos de Francisco Morazán y Santa Barbara
- 4 Centro educativos construidos, reparados y/o ampliados en los departamentos de Ocotepeque, Intibucá, La Paz y Lempira.

A continuación, véase la ejecución histórica del Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (PIOH/USAID), cuarto trimestre 2022:

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto*/	Inicio-Fin	
Programa Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras (USAID/PIOH)	522-0502 Cd E No.9 Donación Externa	210,053,250	01/11/2018 - 30/06/2024	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	
IV Trimestre 2022	-	37,504,624	20,343,947	54.2
Acumulado 2022	-	37,504,624	35,478,197	94.6
Acumulado Vida del Proyecto*/	210,053,250	210,053,250	66,498,635	31.7

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
 Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Proyecto Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Ciudad de Gracias, Departamento de Lempira

El proyecto tiene como objetivo mejorar el acceso a los servicios de agua potable para la población del municipio de Gracias, Departamento de Lempira, aumentando la cantidad y la calidad del agua suministrada, a través de la ampliación del sistema de abastecimiento, mediante el desarrollo de la infraestructura hidráulica.

Los principales avances físicos al 31 de diciembre de 2022 son los siguientes:

- 0 obras de infraestructura del sistema de agua potable en Mejocote, Gracias, Lempira realizada.
- Los L28.4 millones reportados como ejecución, se realizaron para compra de bienes, consultorías y Gasto Operativo del Proyecto.

A continuación, véase la ejecución histórica del Proyecto Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Ciudad de Gracias, Departamento de Lempira, cuarto trimestre 2022:

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto*/	Inicio-Fin	
Proyecto Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Ciudad de Gracias, Departamento de Lempira (BCIE)	BCIE 2261 Crédito Externo	884,322,000	03/01/2022 - 03/02/2026	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	
IV Trimestre 2022	193,172,460	193,172,460	28,412,086	14.7
Acumulado 2022	193,172,460	193,172,460	28,412,086	14.7
Acumulado Vida del Proyecto*/	884,322,000	884,322,000	28,412,086	3.2

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
 Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Programa de Mejoramiento de la Infraestructura y Desarrollo Social y Comunitario en varios departamentos de Honduras (BCH)

El Programa de Mejoramiento de la Infraestructura de Desarrollo Social y Comunitario en Varios Departamentos de Honduras es el resultado de un proceso de priorización de ocho (8) componentes que tendrán un total de 61 proyectos en 48 municipios del país que aportarán a la reducción de la pobreza y a la mejora del bienestar humano de la población.

Los principales avances físicos al 31 de diciembre de 2022 son los siguientes:

- Para el Programa 18 a finales del IV trimestre se tienen identificados y priorizados los proyectos que cumplieron el ciclo de proyectos del FHIS, de los cuales el 2.25% se encuentran en etapa de Adjudicación y Contratación; el monto contratado a la fecha corresponde al 97.57% y el Monto Ejecutado asciende al 73.5%. Cabe recalcar que debido al desembolso tardío de fondos (26 de septiembre) y en el marco de la Ley de Contratación del Estado alrededor del 80% de los proyectos adjudicados se encuentran en proceso de firma de contrato, pago de anticipo de obra y primera estimación.

A continuación, véase la ejecución histórica del Programa de Mejoramiento de la Infraestructura y Desarrollo Social y Comunitario en varios departamentos de Honduras, cuarto trimestre 2022:

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto*/	Inicio-Fin	
Programa de Mejoramiento de la Infraestructura y Desarrollo Social y Comunitario en varios departamentos de Honduras (BCH)	BCH 24798 Crédito Interno	499,700,000	01/08/2022 - 01/08/2024	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	
IV Trimestre 2022	193,172,460	270,575,637	270,575,628	100.0
Acumulado 2022	193,172,460	270,575,637	270,575,628	100.0
Acumulado Vida del Proyecto*/	499,700,000	499,700,000	270,575,628	54.1

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Programa de Emergencia en Respuesta a la Tormenta Tropical Eta (ETA).

El objetivo del programa es apoyar el proceso de transición de la población afectada por la tormenta tropical ETA hacia la recuperación de sus actividades sociales y económicas regulares, por medio del restablecimiento del nivel de acceso a la

provisión de servicios públicos básicos y la remoción de escombros.

Los principales avances físicos al 31 de diciembre de 2022 son los siguientes:

- Este programa consiste en el reconocimiento de gastos incurridos en la ejecución de proyectos para la rehabilitación de caminos, rehabilitación de sistemas de agua potable y remoción de escombros; dañados por la tormenta tropical ETA. Para lograr el reconocimiento y reembolso de gastos, se contrató en marzo 2022 la auditoría de aseguramiento razonable; en este sentido la firma auditora Deloitte realizó la revisión de expedientes de ejecución de pagos de las Secretarías: SIT, SEDECOAS Y COPECO; y ha entregado dos informes de los cuales definió que el reconocimiento de fondos elegibles corresponde a la ejecución de gastos por servicios de consultoría para el diseño de obras: 7 puentes, rehabilitación de 7 tramos carretera Santa Bárbara y la 7rehabilitación de sistemas de agua potable y/o saneamiento cuyo reconocimiento de gastos se hará efectivo en el primer trimestre de 2023.

A continuación, véase la ejecución histórica del Programa de Emergencia en Respuesta a la Tormenta Tropical Eta (ETA), cuarto trimestre 2022:

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto*/	Inicio-Fin	
Programa de Emergencia en Respuesta a la Tormenta Tropical Eta (ETA)	BID 5328/BL-HO	499,700,000	29/07/2022 - 29/07/2024	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	
IV Trimestre 2022	193,172,460	270,575,637	270,575,628	100.0
Acumulado 2022	193,172,460	270,575,637	270,575,628	100.0
Acumulado Vida del Proyecto*/	499,700,000	499,700,000	270,575,628	54.1

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

4.3.1 PROGRAMAS SOCIALES

La inversión en programas sociales según información reportada por la Dirección General de Presupuesto asciende a **L1,044.6 millones**, equivalente al **91.0%** en relación con el presupuesto aprobado 2022, destinado para gestión para atención de desastres naturales.

4.4 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- El 21 de diciembre de 2022 se autorizó la modificación presupuestaria entre categorías programáticas con FMP05 No.68 solicitada mediante Oficio no. DSM-1561-2022 del Convenio BCIE del Proyecto Ampliación Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Ciudad De Gracias, Departamento De Lempira, para cumplir compromisos adquiridos con el BCIE, pagos de diseños y comisión.

Conclusiones

- La ejecución presupuestaria acumulada al IV Trimestre del año 2022 experimentó una ejecución acumulada presupuestaria de 41% ejecución insatisfactoria, relativo a L599,6 millones con respecto al vigente de L1,743.8 esta baja ejecución es producto principalmente de la falta de ratificación por el soberano Congreso Nacional de los contratos que traspasaron periodo de gobierno, así como, actualización de firmas y reformulación del presupuesto de los proyectos.
- Para este trimestre se realizaron modificaciones presupuestarias entre proyectos y entre objetos de gasto con el fin de ir cubriendo las metas establecidas por el ajuste de la programación, POA's y compromisos de acuerdo con cada uno de los proyectos y otras actividades relativas al funcionamiento de las Unidades Ejecutoras.
- En cuanto a la ejecución porcentual comparativa se observó un aumento del porcentaje de ejecución en el presente año en 14 puntos porcentuales con respecto al año 2021, pasando de 27% en 2021 a 41% a finales de 2022.
- Todos los proyectos que incluyen componentes relacionados a centros educativos no se han atendido debido a que las Unidades Ejecutoras de los Proyectos expresan que la Secretaría de Educación (SEDUC) no permite intervenir centros educativos que no se encuentren debidamente legalizados a nombre de la SEDUC, lo cual ha generado un retraso significativo en la ejecución de estas obras en el área educativa.

Recomendaciones

- Agilizar los procesos de formulación de los nuevos proyectos con el objetivo de entregar oportunamente los beneficios a la población objetivo, básicamente aquellas personas que han sufrido por emergencias naturales y de salud.

- Coordinar gestiones para acelerar la ejecución física y financiera de los proyectos, tomar acciones correctivas, ceder espacio presupuestario a otros proyectos en vista de lo reprogramado con el objetivo de alcanzar las metas establecidas en los Planes Operativos Anuales institucionales.
- Coordinar reuniones de seguimiento en conjunto con la UCP-FHIS, UPEG y Dirección de Control y Seguimiento, Comité Ejecutor de Proyecto (CEP), en conjunto con SEFIN con el fin de apoyar a las Unidades ejecutoras donde se tenga cuellos de botella.
- Proponer y remitir al Soberano Congreso Nacional borrador de legalización automática de terrenos en donación, a nombre de las Alcaldías, entre otros casos, que cuentan con un centro educativo dentro del predio para que sea legalmente reconocidos a nombre de la SEDUC, o en su defecto llegar a un acuerdo con SEDUC para intervenir centros educativos que no estén legalizados sus terrenos.
- Actualizar mensualmente en el Sistema de Administración Financiera (SIAFI Ges) la evaluación de metas físicas en el Plan Operativo Anual.

ANEXOS

SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE, 2022

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado		Presupuesto Vigente		Ejecutado Anual (Devengado)		
			Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	% Ejecución
10	0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social		1,734,031,476.00	1,743,849,872.00	1,176,861,586.00	1,473,196,641.00	303,267,841.54	599,602,881.49	40.7%
1	001 - Ampliación Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Ciudad De Gracias, Departamento De Lempira	BCIE-2261	193,172,460.00	193,172,460.00	193,172,460.00	193,172,460.00	28,412,086.07	28,412,086.07	14.7%
2	001 - Programa de Mejoramiento de la Infraestructura de Desarrollo Social y Comunitario en varios departamentos de Honduras	BCH-24798-1		-		270,575,637.00		270,575,628.24	100.0%
3	001 - Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras .	6822-HN	732,341,690.00	732,341,690.00	259,608,231.00	259,608,231.00	53,027,150.75	53,027,150.75	20.4%
4	002 - PROGRAMA DE EMERGENCIA EN RESPUESTA A LA TORMENTA TROPICAL ETA	BID 5328/BL-HO	-	-	3,375,000.00	3,375,000.00	2,515,613.00	2,515,613.00	74.5%
5	008 - PROGRAMA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SU GESTION LOCAL	2014 67 414 (KFW) /	54,429,621.00	54,429,621.00	66,402,000.00	66,893,081.00	53,156,865.25	53,647,945.15	80.2%
		BMZ 2016 68 763	127,776,078.00	133,883,298.00	30,248,190.00	31,666,988.00	11,720,460.73	13,139,256.59	41.5%
6	011 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA	522-0501-4	10,612,131.00	10,612,131.00	47,644,766.00	57,711,016.00	44,981,408.54	55,047,658.54	95.4%
7	012 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS	BID/4518/BL-HO	75,224,516.00	75,224,516.00	71,849,516.00	71,849,516.00	60,325,223.19	60,325,223.19	84.0%
8	013 - PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y FORMACION EDUCATIVA EN HONDURAS	BCIE - 2239	499,467,419.00	499,467,419.00	438,079,338.00	438,079,338.00	860,314.43	860,314.43	0.2%
9	014 - PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS	BMZ Nr. 2016 65348	41,007,561.00	44,718,737.00	40,659,211.00	42,760,750.00	24,472,272.88	26,573,808.83	62.1%
10	060 - ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS	522-0502 Cd E No.9	-	-	25,822,874.00	37,504,624.00	23,796,446.70	35,478,196.70	94.6%

Fuente: SIAFI, 31/12/2022

