

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión
Pública



Informe de Avance Físico y Financiero

AL I TRIMESTRE 2023

**Secretaría de Agricultura y
Ganadería
(SAG)**

Tegucigalpa, Honduras
Mayo, 2023

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El presupuesto de inversión aprobado por el Congreso Nacional para la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) asciende a **L1,860.9 millones**, representativos del 38.6% del Programa de Inversión Pública 2023 (**L71,846.95 millones**);

Su presupuesto de inversión vigente al I Trimestre 2023 es L1,860.9 y su ejecución financiera acumulada actual es 1%. Ver cuadro No.1.

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del 2023
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	1,860,950,990.00
Presupuesto Vigente	1,484,663,310.00
Ejecutado (Devengado Anual)	17,320,497.00
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	1%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	17,320,497.00
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	1%


Fuente: SIAFI, 31/03/2023

En fechas 06 y 29 de abril del 2022 respectivamente, se publicaron los PCMs 05 y 11 – 2022 en donde se estableció la liquidación de la INVEST-H entre otras instituciones del Gobierno Central; como resultado de este procedimiento, el 16 de junio del 2022, se nombró un liquidador, el cual finalizó la liquidación al cierre del cuarto trimestre del 2022. En este proceso, el equipo bajo la dirección y coordinación de la Oficina Liquidadora realizó las acciones para el traspaso de cada uno de los proyectos en coordinación con las diferentes instituciones receptoras de los proyectos.

Por lo anterior, y por ser de su ramo de ejecución, se convirtió en la institución receptora de los proyectos productivos ejecutados anteriormente por la INVEST-H Los mismos, se describen a continuación:: Proyecto Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II) convenio IDA-6448-HN; Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad convenios 4940/BL-HO (HO-L1211) y 4936/BL-HO (HO-L1201); Proyecto de Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana convenio IDA 6696-HN.

Financiamiento de la Inversión

Gráfico No. 1
Financiamiento de la Inversión por Organismo
Cifras en Millones de Lempiras

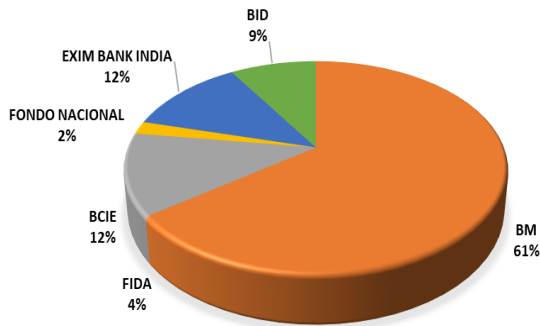


El Presupuesto Vigente del Programa de Inversiones Públicas de la SAG fue financiado en un 98% por recursos de Crédito externo; de los cuales el 61% proviene de préstamos del Banco Mundial (BM) con un monto de L908.82, seguido del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) con un 12% de participación con un monto de L184.94 millones; igual que los fondos Exim Bank – India con una participación del 12% (L179.05 millones) Finalmente, el Banco Interamericanos de Desarrollo

(BID) y el y el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola absorben en su conjunto un 13% con un monto de inversión de L182.6 millones.

Por otra parte, se contó con un monto de L29.1 millones, representativos del 2% de participación, Fondos del Tesoro Nacional tal y como se muestra en el gráfico No. 1.

Ejecución histórica 2019-2023

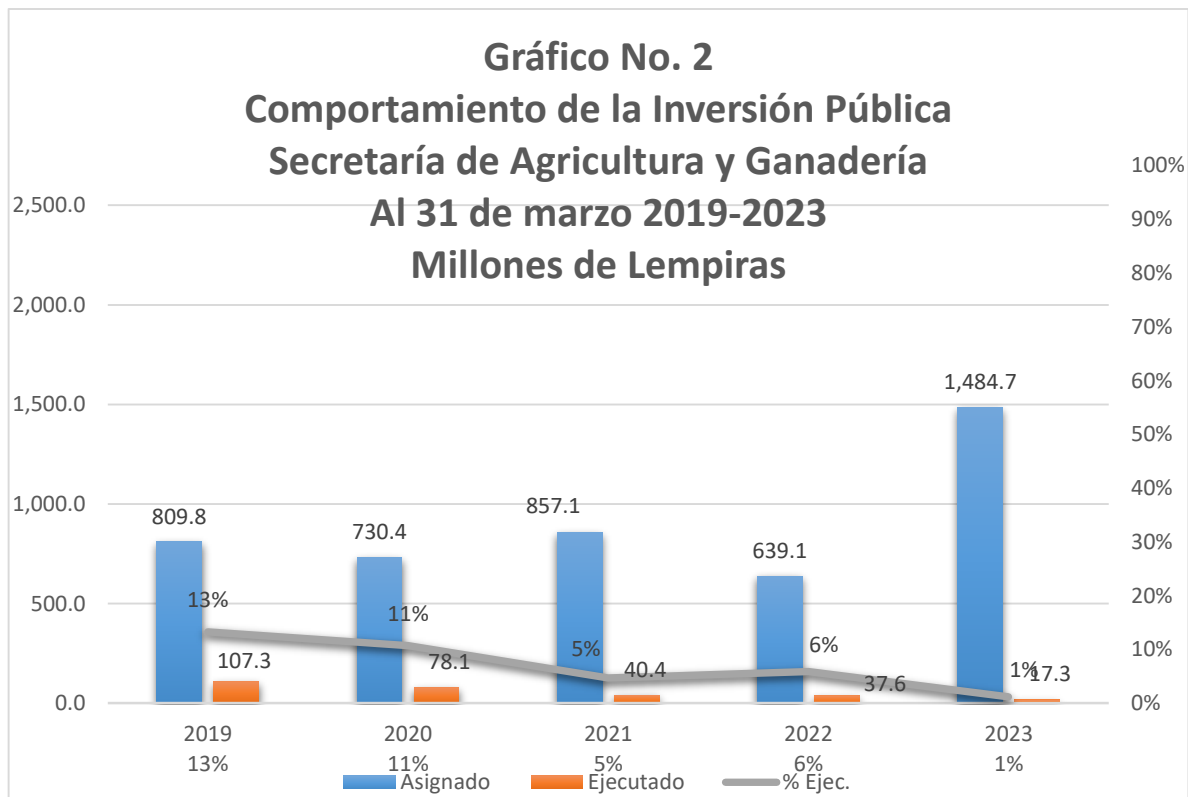

SECRETARÍA DE FINANZAS

En el periodo comprendido entre el año 2019 y el 2023, la SAG ha administrado cinco (5) proyectos de inversión pública que han sido financiados con recursos otorgados por el Exim Bank – India, BCIE, OPEC y FIDA. El Programa de Inversiones Públicas histórico de la SAG en los últimos 5 años presenta bajos porcentajes de ejecución. Lo anterior, debido a que se reestructuró la Unidad de Planificación de la Gestión (UPEG). Sumado a ello, para el año 2021 producto de los efectos de la declaratoria de emergencia sanitaria (COVID-19), y a que se formuló un presupuesto de inversión muy por encima de lo que la institución podría ejecutar de conformidad a sus capacidades institucionales; se observa que a partir del 2020 al 2023 la ejecución ha ido disminuyendo, en el 2022 presentó una ejecución de L 78.1 millones, el año 2021 presenta L40.4 millones, L37.6 millones en el 2022, y finalizando con una ejecución del L17.3 millones a marzo del 2023, respecto al año 2019 que obtuvo una ejecución de L107.3 millones, reflejando una disminución en comparación de los años 2019 y el 2023 de L90.0 millones.

En cuanto a los proyectos recibidos de la INVEST-H, los mismos no han iniciado su ejecución debido a que al cierre del I Trimestre no se cuenta con la efectividad por parte del Banco mundial para que la SAG los ejecute. Lo anterior a que no se ha concluido el traspaso de estos proyectos en los diferentes sistemas financieros nacionales.

En cuanto a los proyectos recibidos de la INVEST-H, los mismos no han iniciado su ejecución debido a que al cierre del I Trimestre no se cuenta con la efectividad por parte del Banco mundial para que la SAG los ejecute. Lo anterior a que no se ha concluido el traspaso de estos proyectos en los diferentes sistemas financieros nacionales.

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

El Programa de Inversión Pública de la SAG se concentra en 7 proyectos; los cuales conforman algunas de las inversiones más relevantes en apoyo al Desarrollo Productivo y Riego del país, los mismos se describen a continuación:

Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur Occidental Pro-Lenca (FIDA-I-899-HN)

SECRETARÍA DE FINANZAS

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
		US\$	Lempiras	
005 - PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL PRO-LENCA	FIDA-I-899-HN GEF	US\$	27,483,100	03/03/2014 31/03/2023
		Lempiras	665,132,245	
Financiera				
	Aprobado	Vigente	Devengado	% Ejecución
I Trimestre 2023	52,935,274	52,935,274	9,133,428	17.3
Acumulado 2023	52,935,274	52,935,274	9,133,428	17.3
Acumulado Vida del Proyecto */	665,132,245	665,132,245	441,728,086	66.4

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto

En cuanto al Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones Rurales las intervenciones del proyecto al primer trimestre del 2023, se encuentran en la implementación en campo, 60 planes de inversión; las inversiones están orientadas en los rubros de hortalizas, avicultura, granos básicos, café, papa, MiPymes.

Este producto tendrá avance, una vez que los planes de fortalecimiento sean elaborados, implementados y revisados para someter a la aprobación de las organizaciones beneficiarias.

En cuanto a los convenios suscritos con las organizaciones (hombres, mujeres, jóvenes y etnias) beneficiadas para el financiamiento de sus planes de inversión, se firmaron 25 convenios por parte de la organización beneficiaria y la máxima autoridad de la SAG.

Para el Desarrollo Productivo y de Negocios se generaron 50 procesos de desembolsos para 25 organizaciones, así como el seguimiento en campo de las organizaciones que están en proceso de ejecución de su plan de inversión y en proceso de cierre técnico. Se sigue de la mano con 100 asistencias técnicas en temas administrativos y financieros brindadas a familias productoras agremiadas en Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (FIDA II).

Proyecto de Inclusión Económica y Social de Pequeños Productores Rurales en la Región Noreste de Honduras (PROINORTE)

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
		US\$	Lempiras	
013 - Proyecto de inclusión económica y social de pequeños productores rurales en la región noreste de Honduras (PROINORTE)	LOAN No. 13754P 2000002595	US\$	39,087,574	01/09/2021 01/09/2027
		Lempiras	945,977,922	
Financiera				
	Aprobado	Vigente	Devengado	% Ejecución
I Trimestre 2023	190,990,557	190,990,557	1,175,004	0.6
Acumulado 2023	190,990,557	190,990,557	1,175,004	0.6
Acumulado Vida del Proyecto */	945,977,922	945,977,922	1,175,004	0.1

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto

En el mes de marzo monto ejecutado corresponde al pago de consultores como parte del personal inicial asignado a la UAP complementario al personal que recluta actualmente la

SECRETARÍA DE FINANZAS

empresa CADERH, esto en cumplimiento a las condiciones habilitantes. Actualmente la empresa que se encargará de la selección del personal que ejecutará el proyecto en campo se encuentra en proceso de revisión del producto final para la selección de los candidatos a ser contratados.

Se programó la ejecución de una cadena de valor, el diseño de una campaña de concientización, inversión productiva y capacitaciones brindadas a administradores de las estaciones agroclimáticas.

Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
		US\$		
007 - PROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)	BCIE-2101 PNUD Fondos Nacionales	55,123,754		12/4/2020 31/12/2023
		Lempiras	1,334,077,532	
Financiera				
	Aprobado	Vigente	Devengado	% Ejecución
I Trimestre 2023	202,158,612	202,158,612	7,012,065	3.5
Acumulado 2023	202,158,612	202,158,612	7,012,065	3.5
Acumulado Vida del Proyecto */	1,334,077,532	1,334,077,532	811,081,824	60.8

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto

La baja ejecución se debe a que a la fecha está pendiente el pago de dos Informes de Supervisión de la Empresa Supervisora CONASH, correspondiente a la Supervisión del Proyecto de “Construcción y Rehabilitación del Sistema de Riego de San Sebastián, Comayagua”, correspondiente a subidos a la UAP, se tenía contemplado el pago de Informe final de Empresa supervisora SEINCO; a la fecha no se ha lanzado lo procesos de licitación pendientes y en el primer trimestre el único proyecto que se encuentra en ejecución es el de Sistema de Riego San Sebastián, Comayagua; no obstante se encuentra suspendido desde el mes febrero.

Es necesaria la aprobación de la contratación de la empresa consultora para dar cumplimiento a las metas establecidas en componentes 2 y 3, es urgente la firma del convenio con las autoridades de Lamani y San Sebastián y miembros beneficiarios de la fuente de agua del río Jupuara.

Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego del Valle de JAMASTRAN FASE 1

Ejecución al I Trimestre 2023; Secretaría de Agricultura y Ganadería

SECRETARÍA DE FINANZAS

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
		US\$		
010 - PROYECTO DE DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO DEL VALLE DE JAMASTRAN FASE 1	EXIM BANK -INDIA	US\$	26,500,000	16/06/2016 29/02/2024
		Lempiras	641,339,750	
Financiera				
	Aprobado	Vigente	Devengado	% Ejecución
I Trimestre 2023	-	-	-	0.0
Acumulado 2023	-	-	-	0.0
Acumulado Vida del Proyecto */	641,339,750	641,339,750	205,286,441	32.0

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto

Entre las dificultades para la adecuada ejecución del proyecto se menciona lo siguiente:

- Se está a la espera de informe de auditoría del Tribunal superior de cuentas,
- Se han suspendido los pagos por no tener avances del Proyecto en campo.
- Revisión documental para la toma de decisiones.
- No se planificarán entregables físicos del Proyecto para el mes de marzo.
- El desembolso no ha sido procesado por temas legales que se encuentran en proceso.

Proyecto Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II) IDA-6448-HN

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
		US\$		
Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II)	IDA-6448-HN	US\$	75,000,000	12/4/2020 12/4/2025
		Lempiras	1,815,112,500	
Financiera				
	Aprobado	Vigente	Devengado	% Ejecución
I Trimestre 2023	476,495,835	476,495,835	-	0.0
Acumulado 2023	476,495,835	476,495,835	-	0.0
Acumulado Vida del Proyecto */	1,815,112,500	1,815,112,500	390,897,519	21.5

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto

Al primer trimestre 2023, el proyecto no presenta ejecución debido a que el proceso de traspaso a la SAG por parte de la comisión Liquidadora de INVEST-H ha sido lenta y no ha cumplido en tiempo y forma todos los procesos correspondientes, aún no cuentan con proceso de cumplimiento de efectividad por parte del Banco Mundial.

No secuenta con el personal clave contratado, el cual es indispensable en el acuerdo de financiamiento y además requisito para contar con la efectividad. La SAG remitió contratos y términos de referencia para aprobación y aún está pendiente de respuesta No Objeción, el banco deberá confirmar sobre el proceso alterno para lograr efectividad y/o la publicación

SECRETARÍA DE FINANZAS

de los perfiles necesarios a la brevedad posible; además no se cuenta con el Manual Operativo del proyecto.

Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad 4940/BL-HO (HO-L1211) y 4936/BL-HO (HO-L1201)

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
		Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad	BID 4940/BL-HO BID 4936/BL-HO	
Lempiras	1,331,082,500			21/8/2025
Financiera				
	Aprobado	Vigente	Devengado	% Ejecución
I Trimestre 2023	129,755,922	129,755,922	-	0.0
Acumulado 2023	129,755,922	129,755,922	-	0.0
Acumulado Vida del Proyecto */	1,331,082,500	1,331,082,500	12,901,931	1.0

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto

El proyecto no presenta una ejecución en el primer trimestre 2023, el proceso de traspaso a la SAG por parte de la comisión Liquidadora INVEST-H ha sido lenta no ha cumplido en tiempo y forma todos los procesos correspondientes, aún no cuentan con proceso de cumplimiento de efectividad por parte del Banco.

Proyecto Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana IDA 6696-HN

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
		4) Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana	IDA 6696-HN	
Lempiras	1,089,067,500			30/04/2025
Financiera				
	Aprobado	Vigente	Devengado	% Ejecución
I Trimestre 2023	242,285,548	242,285,548	-	0.0
Acumulado 2023	242,285,548	242,285,548	-	0.0
Acumulado Vida del Proyecto */	1,089,067,500	1,089,067,500	6,864,332	0.6

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto

La SAG culminó con la revisión y entrega del manual operativo y de los contratos de consultores del proyecto, mismos que fueron revisados por el Banco Mundial otorgando la No Objeción, además se confirmó al Banco Mundial que todos los procesos internos en SEFIN están completos.

El proyecto cuenta con un presupuesto vigente de 242.3 millones, mismos que fueron incorporados a finales del mes de abril por lo que no presentan ejecución. Esperando la aprobación de la efectividad del proyecto por parte del banco.

Los TDR's efectivos para el 2023 Según Nota de Prioridad son 16 Sistemas de Agua, se realizarán la licitación y ejecución de 13 sistemas de agua en los departamentos: Comayagua, Copán, Cortes, Choluteca, El Paraíso, Intibucá y La Paz, la ejecución física de dichos sistemas al 30 de abril, reportan un 16% de ejecución.

3.4 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Acompañamiento técnico para agilizar la ejecución de los proyectos.
- Requerimiento de las Proyecciones Mensuales de ejecución para el Año 2023.
- Requerimiento de matriz departamental del presupuesto de inversión 2023.

Conclusiones

- La rotación histórica del personal técnico en las unidades ejecutoras de proyectos ha afectado de manera significativa el avance adecuado de los proyectos ejecutados por la institución.
- La supervisión permanente y ejecución de acciones son indispensables conjuntamente con la SEFIN y las áreas Involucradas a fin de que los financiamientos se ejecuten en tiempo y forma para lograr el objetivo de cada uno de los proyectos.
- Es indispensable el proceso de reinicio de actividades del Proyecto Llave en Mano de Infraestructura de Riego en el Valle de Jamastrán; se debe analizar la reorientación de los recursos del proyecto.
- Es indispensable la revisión para la desobligación total del proyecto de Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR) y Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego del Valle de JAMASTRAN FASE 1 por no cumplir con la ejecución en tiempo y forma y ser una carga para la institución.

Recomendaciones

SECRETARÍA DE FINANZAS

- Hacer contrataciones efectivas del personal técnico de la unidad ejecutora de los proyectos y evitar su rotación mientras los proyectos no sean finalizados
- Agilizar los procesos para la adecuada ejecución de los proyectos de la institución.
- Se debe contar con un Plan de Acción sobre los procesos pendientes y la ejecución de los proyectos para un seguimiento puntual y cumplimiento de metas de parte de la Unidad Ejecutora.
- La SAG y la INVEST-H continuaron con los procesos de adquisición y contratación para reactivar la ejecución de los proyectos y se ha llevado a cabo misiones de supervisión conjuntas que permitieron la toma de decisiones con finalidad de alcanzar los resultados esperados e impactar positivamente los proyectos.

ANEXO

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL I TRIMESTRE, 2023

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			I Trimestre 2023		
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Secretaría de Agricultura y Ganadería	001 - PROYECTO DE SEGURIDAD HIDRICA EN EL CORREDOR SECO DE HONDURAS	04 - Empresa Consultora Contratada para iniciar la Asistencia Técnica para fortalecer la gobernanza a nivel: (i) Etapa I: nivel local, Capacitación y Reforestación en Intibucá, La Venta, Curarén y La Paz	Contrato	1	0	0	0	0	0
		05 - Empresa Consultora Contratada para la Revisión y actualización de la Estudios de Evaluación de Impactos y Riesgos Ambientales y Sociales y de Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) de los Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS): Intibucá, La Venta, Curarén y La Paz	Contrato	1	0	0	0	0	0
		06 - Empresa Consultora Contratada para la Actualización de Diseños de Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS): Intibucá, La Venta, La Paz y Curarén.	Contrato	1	0	0	0	0	0
	002 - Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana	04 - Subproyectos de rehabilitación de sistemas urbanos de agua potable licitados	Proyecto	13	0	0	0	0	0
		05 - Planes de inversión de subproyectos de rehabilitación.	Plan de Inversión	13	0	0	0	0	0
		06 - Evaluaciones de Impacto y Planes de Gestión Ambiental y Social (EIAS y PGAS).	Plan	13	0	0	0	0	0
		07 - Certificación de no requerir licenciamiento ambiental para las obras de rehabilitación.	Certificación	13	0	0	0	0	0
		08 - Formalización de Acuerdos de Asociación SAG-Municipalidad-Prestador	Acuerdo	13	0	0	0	0	0

SECRETARÍA DE FINANZAS

	09 - Licitación de bienes e insumos COVID-19	Licitación	13	0	0	0	0	0
	10 - Dictamen de aprobación del modelo por el ERSAPS	Dictámen	6	0	0	0	0	0
	11 - Conformación de Junta Directiva del proveedor de servicios de agua potable.	Cantidad	6	0	0	0	0	0
	12 - Nombramiento de gerente del proveedor de servicios de agua potable.	Cantidad	6	0	0	0	0	0
005 - PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL PRO-LENCA	06 - Planes de fortalecimiento organizacional aprobados.	Plan	60	0	0	60	0	0
	07 - Consultoría aprobada para el fortalecimiento de Organizaciones.	Consultoría	1	0	0	1	0	0
	08 - Evaluación de resultados del proyecto.	Informe	1	0	0	0	0	0
	09 - Selección de cajas rurales de ahorro y crédito.	Caja Rural	100	0	0	100	0	0
	10 - Líneas de tubería instaladas en parcelas agrícolas.	Kilómetro	1	0	0	1	0	0
	11 - Líneas de tubería instaladas en parcelas agrícolas FIDA II.	Kilómetro	1	0	0	1	0	0
	007 - PROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)	02 - Talleres de capacitación impartidos en diversificación agrícola (manejo de agua y fertigación), aplicando medidas de bioseguridad.	Taller de Capacitación	10	0	0	0	0
03 - Contratos suscritos de comercialización y financiamiento.		Contrato	6	0	0	0	0	0

SECRETARÍA DE FINANZAS

	03 - Formulación de planes de producción.	Plan	5	0	0	0	0	0
	03 - Plan de trabajo para la socialización de los planes de ordenamiento y manejo de los recursos naturales.	Plan de Trabajo	1	0	0	1	0	0
	04 - Líneas de tuberías instaladas (conducción, distribución y terciarias)	Kilómetro	14	0	0	0	0	0
	04 - Organización de productores y productoras organizados en grupos empresariales, de acuerdo a la producción agrícola.	Grupo	10	0	0	0	0	0
	04 - Plan de capacitación elaborado.	Plan	2	0	0	2	0	0
	05 - Diagnóstico situacional de los grupos empresariales organizados	Diagnóstico	10	0	0	0	0	0
	06 - Expedientes documentados a grupos empresariales organizados para la gestión de la personería jurídica.	Expediente	10	0	0	0	0	0
013 - Proyecto de inclusión económica y social de pequeños productores rurales en la región noreste de Honduras (PROINORTE)	08 - Diagnóstico territorial elaborado a municipios beneficiados por el proyecto.	Diagnóstico	20	0	0	0	0	0
	09 - Estudios complementarios en temas ambientales al proceso de diagnóstico territorial.	Estudio	2	0	0	0	0	0
	10 - Diseño de campañas de concientización nutricional.	Campaña	1	0	0	0	0	0
	11 - Selección de la institución u organización a fortalecer que brindara los servicios de investigación.	Cantidad	1	0	0	0	0	0

SECRETARÍA DE FINANZAS

	12 - Fondo concursable de innovación estratégica creado.	Concurso	1	0	0	0	0	0
	13 - Identificación de la red de gestores.	Informe	1	0	0	0	0	0
	14 - Planes de Negocios Formulados.	Plan de Negocio	10	0	0	0	0	0
	15 - Estudios de microcuencas (alta vulnerabilidad y riesgo) realizados.	Estudio	1	0	0	0	0	0
	16 - Formulación de planes de inversión en servicios ecosistémicos.	Plan de Inversión	2	0	0	0	0	0
	17 - Kit de herramientas adquiridos.	Kit	5	0	0	0	0	0
014 - PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD	04 - Planes de inversión aprobados por el equipo técnico del proyecto.	Plan de Inversión	20	0	0	0	0	0
	05 - Asistencia técnica brindada en tecnologías Climáticamente Inteligentes, producción, mercado y/o nutrición.	Asistencia Técnica	20	0	0	0	0	0
	06 - Planes de manejo de microcuena aprobados por el Instituto Conservación Forestal ICF.	Plan de Manejo de Microcuencas	5	0	0	0	0	0
	07 - Monto de créditos y garantías aprobados	Lempira	5,000,000	0	0	0	0	0
015 - Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II) Tipo de proyecto: Inversión Pública	03 - Planes de Negocios aprobados por el Comité Directivo (CD) del proyecto.	Plan de Negocio	40	0	0	0	0	0
	04 - Perfiles de negocios	Perfil	60	0	0	0	0	0
	05 - Asistencias Técnicas brindadas a las Organizaciones de Productores Rurales (OPRs)	Asistencia Técnica	92	0	0	0	0	0

Fuente: SIAFI,
31/03/2023
