

INFORME GENERAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

I Trimestre, 2023



Gobierno de la República

www.sefin.gob.hn



Reposición CEPB Dr. Andrés Arturo Martínez Guillen
Proyecto Recuperación de Emergencia A Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota (PRE)



Reparación CEB Marcelino Pineda López
Proyecto Recuperación de Emergencia A Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota (PRE)



Edificio Administrativo, las Vegas Santa Bárbara
Programa de Convivencia y Mejoramiento de Barrios



Cortina Represa Los Laureles
Proyecto para Fortalecer la Prestación de Agua Potable de Tegucigalpa

16/06/2022 16:13

Contenido

INVERSIÓN PÚBLICA AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2023	3
PRESENTACIÓN.....	3
I. ANALISIS GLOBAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA AL PRIMER TRIMESTRE 2023	4
1.1 INVERSIÓN PÚBLICA GLOBAL 2023	4
1.2 INVERSIÓN INSTITUCIONAL.....	5
1.3 PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA POR ESTRUCTURA DEL SECTOR PÚBLICO, (SIAFI)	9
1.4 LA INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL DE SECTOR (PRODUCTIVA Y SOCIAL)	10
1.5 FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN.....	11
1.6 PROGRAMAS SOCIALES.....	12
1.7 EJECUCIÓN HISTÓRICA PERÍODO 2019 - 2023:.....	13
1.8 EJECUCIÓN FÍSICA A NIVEL DE SECTORES:	13
1.8.1 Sector Carreteras:.....	13
1.8.2 Sector De Protección Social:.....	16
1.8.3 Sector Energía:	18
1.8.4 Sector Educación:.....	20
1.8.5 Sector Salud:.....	22
1.8.6 Sector Seguridad Alimentaria	23
1.8.7 Sector Seguridad y Defensa:.....	25
1.8.8 Sector Recursos Forestales y Ambiente:	26
1.8.9 Sector Modernización del Estado:	27
1.8.10 Transporte y Obras Públicas:.....	29
1.9 Factores que han Incidido en la Ejecución de la Inversión Pública, para el Primer Trimestre del Año 2023	29

INVERSIÓN PÚBLICA AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2023

PRESENTACIÓN

El presente informe, muestra el análisis del comportamiento de la ejecución física y financiera de la Inversión Pública correspondiente al Primer Trimestre del ejercicio fiscal 2023. Este documento es elaborado por la Dirección General de Inversiones Públicas (DGIP) en el marco de sus competencias como ente técnico coordinador del Programa de Inversión Pública (PIP).

En el Plan de Inversión Pública aprobado para el año 2023 se prioriza un monto de **L71,847.0 millones**, representando el 8.7% respecto al PIB para el año 2023 (L827,618.4 millones), dicha inversión está orientada a la ejecución de programas y proyectos en los sectores prioritarios de Energía para la recuperación de las empresas públicas, Carreteras, para el incremento de la productividad, conectividad y competitividad y Desarrollo Productivo como apoyo a la Seguridad Alimentaria y protección social que permita fomentar el trabajo local a través de la generación de empleo, contribuir con el mejoramiento de caminos de acceso con el fin de facilitar la comercialización del sector productivo.

Del monto Global de la Inversión Pública aprobado para el año 2023, **L71,847.0 millones** el **67.1% L48,233.1 millones**, corresponden a Programas Sociales, las cuales no requieren notas de prioridad en el Sistema Nacional de Inversión Pública de Honduras (SNIPH); el restante **33.9% L23,613.9 millones**, pertenecen a los Proyectos de Inversión Productiva, que cuentan con la respectiva nota de prioridad en el SNIPH, para la ejecución de **125 proyectos** de Inversión Pública, de los cuales 57 son nuevos proyectos y 68 proyectos de arrastre.

El Programa de Inversión Pública (PIP) aprobado en Inversión Productiva para el año 2023 asciende a **L23,613.9 millones**; al primer trimestre 2023 se contó con un presupuesto vigente de **L10,335.0 millones**, para la ejecución de **57 proyectos** en los diferentes sectores prioritarios, incluyendo proyectos coejecutados por las diferentes instituciones del sector público, reflejando a la fecha una ejecución acumulada a marzo de **L1,593.9 millones** que representan el **15%** de ejecución respecto al presupuesto vigente incorporado. Se destaca que aún se encuentran pendientes de incorporar al SIAFI el restante **L13,278.9 millones**, (que corresponden a 68 proyectos), en vista que se encuentran en cumplimiento de la normativa legal vigente para su registro en el SIAFI.

Asimismo, se cuenta con un presupuesto aprobado de **L48,233.1 millones**, para la Inversión en Programas Sociales, enfocada en el Desarrollo Humano y están formuladas en programas institucionales que no forman parte del Programa de Inversiones Públicas, por lo que no nacen dentro de la Metodología SNIPH. Durante el primer trimestre del 2023 se contó con un presupuesto vigente de **L46,392.8 millones** para Inversión Social, alcanzando una ejecución de **L5,752.2 millones**, representando el 12.4% de ejecución respecto a su presupuesto asignado.

Con relación a la Inversión Global para el primer trimestre 2023, esta asciende a **L56,731.8 millones** con una ejecución al primer trimestre de **L7,346.1 millones**, lo que representa el **12.9%** respecto al vigente.

I. ANALISIS GLOBAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA AL PRIMER TRIMESTRE 2023

1.1 INVERSIÓN PÚBLICA GLOBAL 2023

El monto Global de la Inversión Pública aprobado para el año 2023, asciende a **L71,847.0 millones** de los cuales el **67.1% L48,233.1 millones**, corresponden a Inversiones Sociales, las cuales no requieren notas de prioridad en el Sistema Nacional de Inversión Pública de Honduras (SNIPH); el restante **33.9% L23,613.9 millones**, pertenecen a los Proyectos para Inversiones Productivas, que cuentan con nota de prioridad en el SNIPH, para la ejecución de **125 proyectos** de Inversión Pública.

El Programa de Inversión Pública (PIP) aprobado en Inversión Productiva para el año 2023 asciende a **L23,613.9 millones**; al primer trimestre 2023 se contó con un presupuesto vigente de del mismo valor **L10,335.0 millones**, y una ejecución de **L1,593.9 millones**, (15.4%), para la ejecución de **57 proyectos** en los diferentes sectores prioritarios.

Del total de la Inversión Pública, La Inversión Productiva para el año 2023 según lo reportado en el Sistema de Administración Financiera Integrado (SIAFI) muestra una Inversión vigente al primer trimestre de **L10,335.0 millones** y una ejecución de **L1,593.9 millones**, (15.4%).

Respecto al presupuesto aprobado para la Inversión Social asciende a **L 48,233.1 millones**, mientras que el vigente presenta un monto de **L46,396.8 millones**, y un ejecutado de **L5,752.2 millones**, (12.4%), respecto al vigente, haciendo un monto total de Inversión Pública Vigente Productiva y Social de **L56,731.8 millones**, y una ejecución total de **L7,346.1 millones** (12.9%). Ver cuadro No.1.

Cuadro No. 1

Secretaría de Finanzas

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE, 2023

Cifras en Lempiras

No. Proy.	DETALLE	Aprobado	Vigente	Ejecutado (Devengado)	
		Total	Total	Total	% Ejecución (Ejecutado/Vigente)
125	INVERSIÓN PRODUCTIVA	23,613.9	10,335.0	1,593.9	7%
57	Registrada en SIAFI	5,455.0	10,335.0	1,593.9	15.4%
68	Pendiente en proceso de incorporación	18,158.8		-	0.0%
	INVERSIÓN SOCIAL	48,233.1	46,396.8	5,752.2	12.4%
125	TOTAL INVERSIÓN GLOBAL	71,847.0	56,731.8	7,346.1	12.9%

Fuente: SIAFI, 31/03/2023

Nota: Del Presupuesto aprobado/ L23,613.9 millones, se encuentran pendientes de incorporar al PIP L13,278.9 millones, los cuales se incorporarán una vez cumplan los requerimientos técnicos, legales y administrativos.

1.2 INVERSIÓN INSTITUCIONAL

Cuadro No.2
 Secretaría de Finanzas
 Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE, 2023
 Cifras en Millones de Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	
		Total	Total	Total	% Ejec (Ejec/Vig)
8	0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social	1,147.8	1,147.8	71.3	6.20%
2	0028 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal	125.1	125.1	0.7	0.60%
1	0037 - Servicio de Administración de Rentas	173.4	173.4	1.4	0.80%
2	0050 - Secretaría de Educación	185.1	185.1	5	2.70%
6	0060 - Secretaría de Salud	731.5	731.5	72.6	9.90%
1	0070 - Secretaría de Seguridad	200.4	200.4	7	3.50%
1	0100 - Secretaría de Finanzas	153.3	153.3	-	0.00%
7	0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería	521.5	1,484.7	17.3	1.20%
1	0144 - Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible	-	75.4	-	0.00%
1	0150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente	-	725.0	160.9	22.20%
2	0244 - Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer	22	22.0	2.9	13.40%
11	0411 - Secretaría de Infraestructura y Transporte	17	2,052.5	166.6	8.10%
1	0412 - Secretaría de Desarrollo Social	-	12.8	-	0.00%
1	0413 - Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación	-	232.7	26.5	11.40%
1	0414 - Dirección de Gestión por Resultados	-	-	-	0.00%
3	0415 - Programa de la Red Solidaria	-	525.5	8.3	1.60%
3	0505 - Instituto Hondureño de Antropología e Historia	5.2	5.2	0	0.20%
3	0801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica	2,172.80	2,172.8	1,044.20	48.10%
2	1801 - Alcaldía Municipal del Distrito Central	-	309.9	9.1	2.90%
57	(Registrada en SIAFI)	5,455.00	10,335.00	1,593.90	15.40%
	0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social	345.8		-	0.00%
	0030 - Secretaría de la Presidencia	25.7		-	0.00%
	0044 - Instituto Nacional Penitenciario (INP)	181.1		-	0.00%
	0050 - Secretaría de Educación	298.7		-	0.00%
	0060 - Secretaría de Salud	1,111.80		-	0.00%
	0100 - Secretaría de Finanzas	100		-	0.00%
	0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería	1,339.50		-	0.00%
	0150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)	725		-	0.00%
	0180 - Registro Nacional de las Personas	400		-	0.00%
	0400 - Administración Aduanera de Honduras (AAH)	45		-	0.00%
	0411 - Secretaría de Infraestructura y Transporte	3,854.7		-	0.00%
	0412 - Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)	12.8		-	0.00%
	0413 - Comisión Nacional del Deporte Honduras (CONDEPOR)	232.7		-	0.00%
	0415 - Red Solidaria	3,833.2		-	0.00%
	0503 - Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)	47.7		-	0.00%
	0511 - Universidad Nacional de Ciencias Forestales (UNACIFOR)	5.8		-	0.00%
	0703 - Universidad Nacional de Agricultura	37.5		-	0.00%
	0708 - Hospital Escuela Universitario (HEU)	127.1		-	0.00%
	0801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica	3,651.1		-	0.00%
	0803 - Empresa Nacional Portuaria	78.8		-	0.00%
	0804 - Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL)	400.0		-	0.00%
	0806 - Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)	98.8		-	0.00%
	0807 - Suplidora Nacional de Productos Básicos (BANASUPRO)	197.6		-	0.00%
	0809 - Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR)	3.4		-	0.00%
	1801 - Alcaldía Municipal del Distrito Central	309.9		-	0.00%
	Varias Instituciones	695.0		-	0.00%
68	Pendiente en Proceso para incorporación,	18,158.80		-	0.00%
125	TOTAL INVERSIÓN PRODUCTIVA	23,613.90	10,335.00	1,593.90	15.40%

Fuente: SIAFI, 31/03/2023;

Nota: Del Presupuesto aprobado/ L23,613.9 millones, se encuentran pendientes de incorporar al PIP L13,278.9 millones, los cuales se incorporarán una vez cumplan los requerimientos técnicos, legales y administrativos.

A nivel institucional para el año 2023 en relación a la Ejecución de la Inversión Productiva **L1,593.9 millones**, está concentrada en La Empresa Nacional de Energía Eléctrica **L1,044.2 millones**, seguido La Secretaría de Infraestructura y Transporte **L166.6 millones**; Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente **L160.9 millones**; Secretaría de Salud **L72.6 millones**; Fondo Hondureño de Inversión Social **L71.2 millones**; Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación

Dirección General de Inversiones Públicas

L26.4 millones; La Secretaría de Agricultura y Ganadería **L17.3 millones;** Alcaldía Municipal del Distrito Central **L9.1 millones;** La Red Solidaria **L8.3 millones** y en menor proporción para el resto de las instituciones. Ver detalle en el cuadro No.2.

Cuadro No.2
 Secretaría de Finanzas
 Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE, 2023
 Cifras en Millones de Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	
		Total	Total	Total	% Ejec (Ejec/Vig)
0001-	Congreso Nacional	200	-	-	0.00%
0003 -	Comisionado Nacional de Derechos Humanos	0	0.2	0	12.40%
0004-	Consejo Nacional Electoral	200	-	-	0.00%
0020-	presidencia de la República	212.5	-	-	0.00%
0022 -	Fondo Hondureño de Inversión Social	684.9	579.4	31.9	5.50%
0028 -	Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal	0	100.2	0	0.00%
0033 -	Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos	0	300	0	0.00%
0039 -	Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios	0	25	0	0.00%
0040 -	Secretaría de Justicia, Gobernación y Descentralización	8,270.40	79	0.2	0.20%
0045 -	Instituto Nacional de Migración	0	0.7	0	0.00%
0050 -	Secretaría de Educación	700	1099.1	0.1	0.00%
0060 -	Secretaría de Salud	1,470.00	9,125.40	363.8	4.00%
0070 -	Secretaría de Seguridad	0	153	22.1	14.50%
0080 -	Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.	54.6	134.1	21.1	15.70%
0090 -	Secretaría de Defensa	0	150.7	0	0.00%
0100-	Secretaría de Finanzas	84	-	-	0.00%
0101 -	Comisión Nacional de Telecomunicaciones	0	200	49.3	24.60%
0104-	Bienes del Estado	10			
0130 -	Secretaría de Trabajo y Seguridad Social	0	2.9	0.3	12.00%
0140 -	Secretaría de Agricultura y Ganadería	1,000.00	1,300.00	369.9	28.50%
0141 -	Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria	0	0.1	0	0.00%
0180 -	Registro Nacional de las Personas	0	1.4	0.2	13.90%
0242 -	Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia	0	104.2	2.3	2.20%
0243 -	Dirección Nacional de Parques y Recreación	0	18.2	0.3	1.70%
0300 -	Secretaría de Derechos Humanos	0	0.3	0	0.00%
0301 -	Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comer	0	3.8	0	0.00%
0310 -	Secretaría de Energía	10,774.30	14,768.20	1,166.80	7.90%
0406 -	Secretaría de Asuntos de la Mujer	0	66.8	4.5	6.80%
0410 -	Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Puc	0	55.5	2.4	4.30%
0412 -	Secretaría de Desarrollo Social	800	55.3	15.5	28.10%
0415 -	Programa de la Red Solidaria	200	759.2	0	0.00%
0416 -	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento	0	596.3	30.5	5.10%
0417 -	Programa de Acción Solidaria	0	1411.8	317.7	22.50%
0500 -	Instituto Nacional Agrario	100	7.2	1.5	20.70%
0501 -	Instituto Hondureño de Turismo	0	0.7	0	0.80%
0504-	Instituto de Crédito Educativo	87	-	-	0.00%
0506 -	Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas	9	0.1	0.1	78.30%
0507 -	Inst. Hondureño para Prev. y Trat. del Alcohol, Drog.y Farm.	7.2	1	0.8	83.90%
0511 -	Universidad de Ciencias Forestales	0	22.8	2.1	9.20%
0515-	Instituto Hondureño de Ciencia y Tecnología	4			
0601 -	Instituto Hondureño de Seguridad Social	0	8.1	0	0.00%
0602 -	Inst. Nal. de Jubi.y Pen. de los Emp. y Fun. del Poder Ejec.	0	5,930.50	1,088.20	18.30%
0603 -	Instituto Nacional de Previsión del Magisterio	0	6,994.40	1,673.50	23.90%
0604 -	Instituto de Previsión Militar	0	2,127.70	581.3	27.30%
0708 -	Hospital Escuela Universitario	0	185.3	0	0.00%
0801+	Empresa Nacional de Energía Eléctrica	9,160.50	0	0	0.0%
0803 -	Empresa Nacional Portuaria	0	28.4	5.9	20.80%
0903-	Banco Nacional de Desarrollo Agrícola	2,000.00			
	Otros Programas Sociales	12,204.70			
	Total Inversión Social	48,233.10	46,396.80	5,752.20	12.40%
125	TOTAL GENERAL	71,847.00	56,731.80	7,346.10	12.90%

Fuente: SIAFI, 31/03/2023;

Nota: Se ha incorporado presupuesto mediante traslado presupuestario a 27 instituciones, reflejadas en el presupuesto vigente.

Dirección General de Inversiones Públicas

En cambio, la ejecución de la Inversión Social de **L5,752.2 millones**, el 96.7% (L5,561.2 millones) está concentrada en siete instituciones como ser: la Empresa Nacional de Energía Eléctrica; Instituto Nacional de Previsión del Magisterio; Instituto de Previsión Militar; Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo; La Secretaría de Agricultura y Ganadería, la Secretaría de Salud y Programa de Acción Solidaria. Ver detalle en el cuadro No.2.

Asimismo, dentro de la ejecución presupuestaria se incluyen proyectos financiados con Fondos del Banco Central de Honduras (BCH), dicha ejecución asciende a **L341.1 millones**, de L3,006.0 millones que se han incorporado al primer trimestre, con un **11%** de ejecución respecto a su presupuesto asignado. Ver detalle de proyectos en el cuadro No. 3.

Cuadro No.3
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA (BCH), AÑO 2023

Cifras en Lempiras

INSTITUCIÓN / PROYECTO	Aprobado	Vigente	Devengado Aprobado	% Ejecución (Dev./ Vig.)
0150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente	0	725.0	160.9	22%
Programa de Reforestación Nacional y Protección de Cuencas Hidrográficas "PADRE ANDRÉS TAMAYO"	0	725.0	160.9	22%
0411 - Secretaría de Infraestructura y Transporte	0	2,035.5	153.7	8%
Construcción y Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Carretera Central, Tramo: "Marale - Empalme Carretera Yoro" (53.31 km), localizado en el Departamento de Francisco Morazán y Yoro.	0	236.6	57.4	24%
Construcción y Pavimentación con Concreto Hidráulico del Corredor de Oriente, Tramo Carretero: "Las Lomas - Terrero Blanco, Ruta 53" y Elaboración del Estudio y Diseño del Tramo Carretero: Ruta 119, "	0	401.6	2.8	1%
Construcción y Pavimentación Con Concreto Hidráulico del Tramo Carretero: La ENA - San José de Río Tinto - Dulce Nombre de Culmí, Sub-Tramo: "Puente Río El Pataste - Dulce Nombre de Culmí", Ruta N-83,	0	51.7	0.0	0%
Construcción y Pavimentación con Concreto Hidráulico del Tramo Carretero: "Portillo del Lobo-Reitoca - Curarén" (39.54 KM), Localizado en los Departamentos de Francisco Morazán y Choluteca.	0	98.6	1.9	2%
Construcción y Rehabilitación Vial con Concreto Hidráulico del Corredor de Occidente, Tramo Carretero: "Naco - La Entrada" (79.1 Km), Localizado en los Departamentos de Santa Bárbara y Copán.	0	507.8	2.4	0%
Pavimentación con Concreto Hidráulico del tramo Carretero Amapala - San Antonio de Cortés (R90) con una Longitud de 9.645 Km, ubicado en el Municipio de San Antonio de Cortés, Departamento de Cortés.	0	112.1	25.3	23%
Pavimentación con Concreto Hidráulico del tramo Carretero Peña Blanca - Los Naranjos (R72) con una Longitud de 2.872KM, ubicado en el Municipio de Santa Cruz de Yojoa, Departamento de Cortés.	0	36.8	0.0	0%
Proyecto Obras de Mitigación para el Control de Riesgos Geotécnicos y Geológicos, por Deslizamientos y	0	27.8	0.0	0%

**Cuadro No.3
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA (BCH), AÑO 2023**

Cifras en Lempiras

INSTITUCIÓN / PROYECTO	Aprobado	Vigente	Devengado Aprobado	% Ejecución (Dev./ Vig.)
Desprendimientos de Roca de Taludes de Corte en la Carretera CA5-Sur Tramo "Moramulca", Fase I				
Rehabilitación con Concreto Hidráulico sobre la Carpeta Asfáltica existente del tramo carretero: Tegucigalpa - El Guanábano (RN15), Longitud 7.22 KM (Salida a Olancho), ubicado en el departamento de F	0	107.2	0.0	0%
Rehabilitación del Tramo Carretero: "Siguatepeque - La Esperanza" (67.00 Km), Localizado en los Departamentos de Comayagua e Intibucá.	0	455.4	63.9	14%
0412 - Secretaría de Desarrollo Social	0	12.8	0.0	0%
Fortalecimiento en el Sistema de Extracción, Almacenamiento y Distribución del Servicio de Agua Potable y afianzamiento de la Seguridad Alimentaria para mejorar las condiciones de salud y bienestar en los municipios de San Francisco de Becerra y Dulce Nombre de Culmí en el Departamento de Olancho, Fondos Nacionales.	0	12.8	0.0	0%
0413 - Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación	0	232.7	26.5	11%
Diseño, Construcción y Remodelación de Instalaciones y Espacios Físicos de Actividades Deportivas y Recreativas para uso de la Población a Nivel Nacional.	0	232.7	26.5	11%
Total General PIP-BCH	0	3,006.0	341.1	11%


Fuente: SIAFI, al 31/03/23,

Dirección General de Inversiones Públicas

El desempeño de la ejecución al primer trimestre de 2023 a nivel de devengado muestra un incremento de **12.1** puntos porcentuales (**12.9%**) en comparación con el primer trimestre del año 2022 (**0.8%**), lo cual impacta directamente en la ejecución de los programas sociales y proyectos productivos, que en su mayoría los proyectos están orientados a generar un beneficio económico en el país, que contribuyen al incremento de los activos no financieros de las entidades que integran el Sector Público y los bienes y servicios de dominio público, con el fin de iniciar, ampliar, mejorar, modernizar, reponer o reconstruir la capacidad productiva de bienes y la prestación de servicios nacionales.

Asimismo, se observa que el presupuesto vigente para el año 2023 tiene un incremento 160.7% (L34,425.7 millones), respecto al año 2022 (L 22,306.1 millones).


Gráfico No.1
Comparativo Inversión Pública 2022 - 2023
Vigente / Devengado
Cifras en Millones de Lempiras

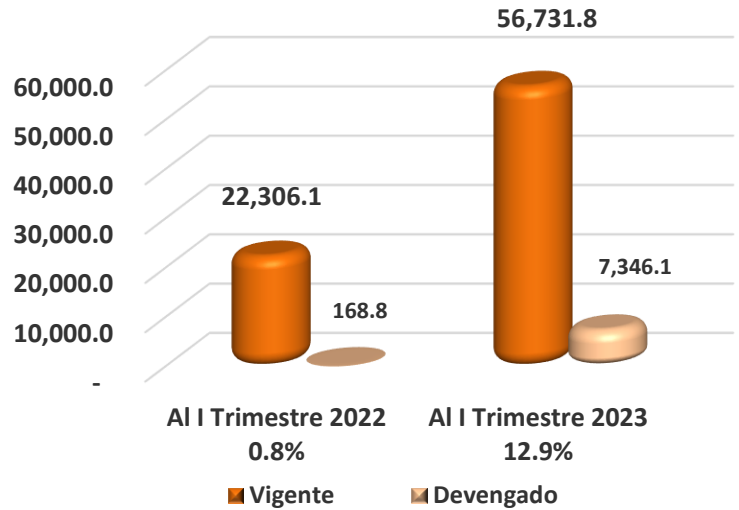

Nota: Del Presupuesto aprobado/ L23,613.9 millones, se encuentran pendientes de incorporar al PIP L13,278.9 millones, los cuales se incorporarán una vez cumplan los requerimientos técnicos, legales y administrativos.

1.3 PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA POR ESTRUCTURA DEL SECTOR PÚBLICO, (SIAFI)

Gráfico No.2
Inversión Pública por Estructura del Sector Público
al 31 de marzo de 2023
Cifras en Millones de Lempiras

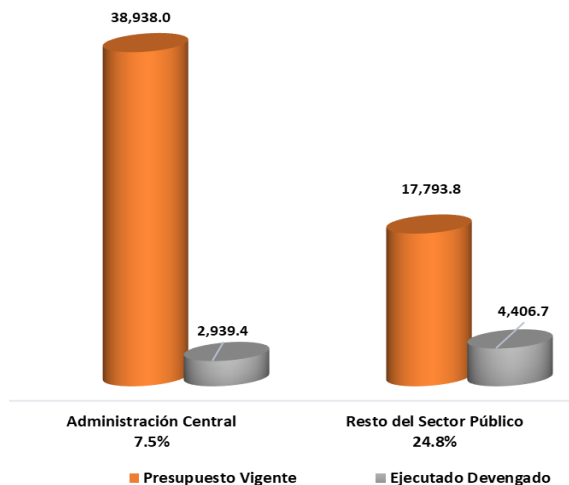

La distribución del PIP para el año 2023 de acuerdo con la Clasificación del Sector Público, muestra un Presupuesto de **L56,731.8 millones** vigentes reportados en el SIAFI, reflejando una ejecución de **L7,346.1 millones; 12.9%** respecto al presupuesto vigente.

L38,938.0 millones, corresponden a la Administración Central, y para el Resto del Sector Público **L17,793.8 millones**, con ejecución de **(L2,939.4 millones AC, 7.5%); L4,406.7 millones RSP 24.8%**). Ver Gráfico No.2 y Cuadro No. 4.

Cuadro No. 4

Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del 2023

SECTOR PÚBLICO


Cifras en millones de Lempiras

Sector Público	Presupuesto Vigente	Devengado Aprobado	% Ejecución (Ejecutado/Vigente)
Administración Central	7,847.2	540.6	6.9%
Resto del Sector Público	2,487.8	1,053.3	42.0%
Inversión Productiva	10,335.0	1,593.9	15.0%
Administración Central	31,090.8	2,398.8	7.7%
Resto del Sector Público	15,306.0	3,353.4	21.9%
Inversión Social	46,396.8	5,752.2	12.4%
Total General Inversión	56,731.8	7,346.1	12.9%

Fuente: SIAFI 31/03/2023

1.4 LA INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL DE SECTOR (PRODUCTIVA Y SOCIAL)

Gráfico No.3
Inversión Pública: Distribución Sectorial
Presupuesto Vigente L56,731.8 millones, Al 31 de marzo de 2023
Cifras en Millones de Lempiras

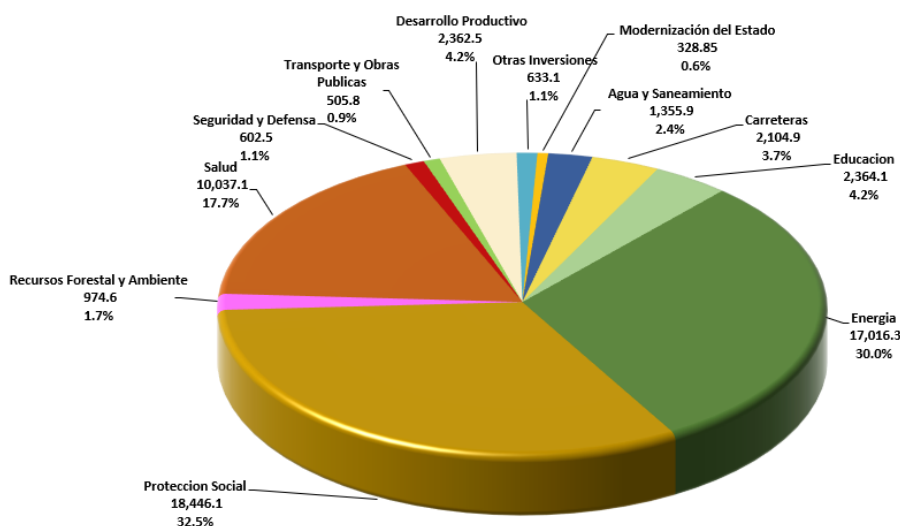

Otras Inversiones Incluye: Telecomunicaciones, Vivienda, Competitividad y Mipymes, Actividad Turística, Transferencias a ONG'S.
Fuente: SIAFI 31/03/2023

En cuanto a la inversión Sectorial, El **Sector Protección Social** con **L18,446.1 Millones (32.5%)**, incluye los aportes en Transferencias Monetarias de la Red Solidaria, así como programas sociales, que incluye; merienda escolar, otras inversiones con la intervención en Acceso y mejoramiento de vivienda, Generación de Empleo, acceso a créditos a emprendedores, ayuda a grupos vulnerables, apoyo a los centros de atención a adultos mayores y algunos proyectos ejecutados por el Fondo Hondureño de Inversión Social.

el **Sector Energía** cuenta con un monto de inversión **L17,016.3 millones (30.0%)**; para la ejecución de los proyectos de: Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico

Dirección General de Inversiones Públicas

Cañaveral-Río Lindo, Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Regional (MER). Electrificación Rural en Lugares Aislados y Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica, así como, Subsidios focalizado hasta 75 y 150 KW, Subsidio de Combustibles e Inversión en generación de energía.

Seguido el **Sector Salud** con una inversión de **L10,037.1 millones (17.7%)**, para la cobertura de los servicios de salud y la red hospitalaria del País, a través de la contratación de gestores en el Primer Nivel y Segundo Nivel de atención y para la ejecución de los proyectos como la iniciativa regional de eliminación de la malaria, y la continuidad de los proyectos de respuesta a emergencia Honduras por el Covid 19, así como respuesta inmediata de salud pública para contener y controlar el coronavirus, el diseño y construcción de hospitales, además de la Red hospitalaria del País y la Adquisición de Medicamentos.

Seguido el **Sector Desarrollo Productivo y Riego** con una inversión de **L2,362.5 millones (4.2%)**, en apoyo a la población más vulnerable, beneficiando a los agricultores mediante la cadena agrícola, a través de la ejecución de los principales proyectos: Proyecto COMRURAL, Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad, Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur Occidental Pro-Lenca y el Proyecto de inclusión económica y social de pequeños productores rurales en la región noreste de Honduras (PROINORTE). Asimismo, una inversión de L1000.0 millones, para el Bono Tecnológico Productivo con el propósito de garantizar la seguridad alimentaria, para beneficiar a 300,000 productores, en 17 departamentos (Priorizados Olancho y el Paraíso).


Seguido el **Sector Educación** con una inversión de **L2,364.1 millones (4.2%)**; ejecutando el Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y su Gestion Local (PROMINE), Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo (Proyecto Joven), asimismo, incluye Becas y Matricula gratis.

El **Sector Carretero** con una inversión **L2,104.8 millones (3.7%)**, para la Construcción y Pavimentación con Concreto Hidráulico para varios Tramos Carreteros del país como ser: Siguatepeque - La Esperanza, Peña Blanca - Los Naranjos, Amapala - San Antonio de Cortés, la Carretera Central, Tramo: "Marale - Empalme Carretera Yoro; así como Obras de Mitigación para el Control de Riesgos Geotécnicos y Geológicos, y la reconstrucción del Puente Guacirope. En menor porcentaje el resto de los sectores: Agua y Saneamiento (2.4%), Recursos Forestal y Ambiente (1.7%), (1.1%) Seguridad y Defensa, Modernización del Estado (0.6%).

1.5 FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN

El **66.2%** de la Inversión Pública Global del Presupuesto Vigente es financiado por fuente Nacionales y el **33.8%** por fondos externos; de estos el **97.4%** es financiado por crédito externo (Fuente 21) y el **2.6%** por donaciones (Fuente 22). Principalmente con recursos provenientes del BID, BCIE, BM, Unión Europea y OFID. Ver Gráfico No 4 y cuadro No.5

Gráfico No.4
Inversión Pública por Fuente de Financiamiento
al 31 de marzo de 2023
Cifras en Millones de Lempiras

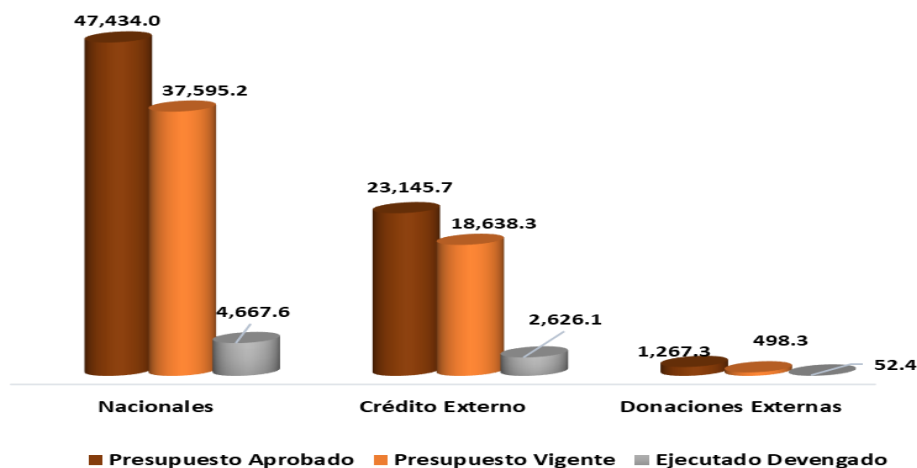

Cuadro No. 05
Inversión Pública por Fuente de Financiamiento al 31 de marzo de 2023
Cifras en Millones de Lempiras

Fuente de Financiamiento	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado Devengado	% Ejecución (Dev./Vig.)
Nacionales	47,434.0	37,595.2	4,667.6	12.4%
Crédito Externo	23,145.7	18,638.3	2,626.1	14.1%
Donaciones Externas	1,267.3	498.3	52.4	10.5%
Total Plan de Inversión	71,847.0	56,731.8	7,346.1	12.9%

Fuente: SIAFI, 31/03/2023

Nota: Se encuentran pendientes de incorporar al PIP L13,278.9 millones, los cuales se incorporarán una vez cumplan los requerimientos técnicos, legales y administrativos.


1.6 PROGRAMAS SOCIALES

Son aquellas inversiones, en su mayoría de Desarrollo Humano que están formuladas en programas institucionales que no que no están registradas en el SNIPH, y corresponden a Programas Sociales en beneficio de la población beneficiada. (no cuentan con un código BIP).

Al I trimestre dichas inversiones han ejecutado **L5,752.2 millones** correspondiente al **12.4%** de los recursos asignados. Dicha ejecución se concentra un **97% (L5,562 millones)** en siete instituciones como ser: la Empresa Nacional de Energía Eléctrica en apoyo a los subsidios Subsidio de Energía de 75 y 150 Kwh; Instituto Nacional de Previsión del Magisterio; Instituto de Previsión Militar; Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo; La Secretaría de Agricultura y Ganadería para la ejecución de los Bonos (Productivo, Cafetalero y Ganadero) en apoyo a la seguridad alimentaria. la Secretaría de Salud para la provisión de Servicios de Salud del Segundo Nivel de Atención (Servicios Hospitalarios) y Programa de Acción Solidaria con la entrega de Merienda escolar. Ver Cuadro No 2.

1.7 EJECUCIÓN HISTÓRICA PERÍODO 2019 - 2023:

Gráfico No. 5
Inversión Pública, Ejecución Histórica
01 de Enero al 31 Marzo
(Periodo, 2019-2023)
(Cifras en Millones de Lempiras)

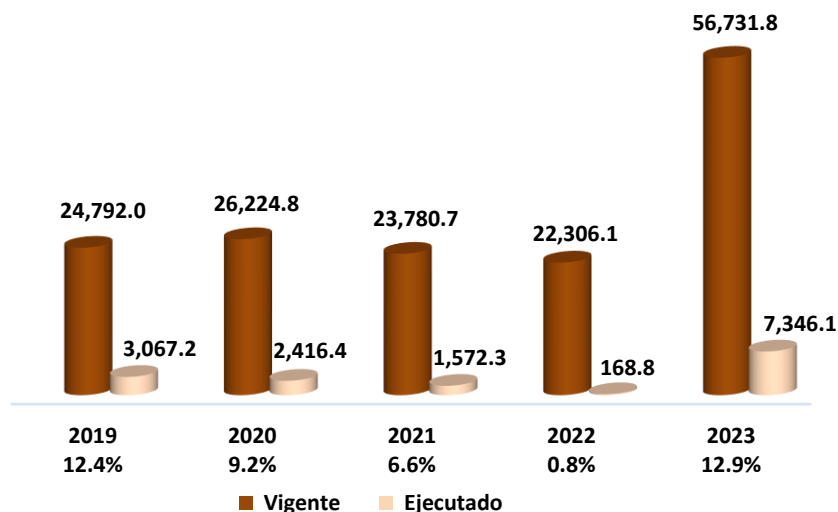

La ejecución total acumulada al 31 de marzo de 2023 L7,346.1 millones (12.9%), respecto al presupuesto vigente L56,731.8 millones, registra una ejecución satisfactoria en comparación al año 2022, evidenciando para el año 2023, 12.1 puntos porcentuales arriba del 2022 (0.8%). Esta ejecución se debe a que en algunas unidades ejecutoras sus presupuestos ya se encuentran alineados con las prioridades del Gobierno.

Por otra parte, para los años 2019, 2020 y 2021 la ejecución está 0.5, 3.7 y 6.3 puntos porcentuales respectivamente siempre por debajo del año 2023. Denotando una disminución acumulada en dichos años de 10.5 puntos porcentuales.

1.8 EJECUCIÓN FÍSICA A NIVEL DE SECTORES:

Los avances al Primer Trimestre de la ejecución física respecto al PIP y a Nivel de Sector se muestran a continuación:

1.8.1 Sector Carreteras:

Al Primer Trimestre se registraron diferentes avances de ejecución de sus proyectos de construcción de carreteras ejecutados a través de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).

Proyectos ejecutados por la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT):

Al primer trimestre de 2023, se detallan los avances físicos de los principales proyectos:

Dirección General de Inversiones Públicas

- ✓ **Construcción y Pavimentación de 15.33 KM con Concreto Hidráulico del Tramo Carretero: la Ena - San José de Río Tinto - Dulce Nombre de Culmí, subtramo: "Puente Río el Pataste - Dulce Nombre de Culmí" en el Departamento de Olancho. Fondos Nacionales.**

Durante el I Trimestre del 2023, La SIT inició la ejecución de las obras físicas sobre el tramo carretero La ENA – San José de Río Tinto - Dulce Nombre de Culmí, por medio de la empresa constructora Rosales S. de R. L. (Contrato No. SIT-CO-238-2022).

El proyecto no presenta ejecución presupuestaria ya que la empresa constructora no presentó estimaciones de obra en el trimestre.

Durante el primer trimestre, el proyecto realizó las siguientes actividades:

- Conformación de subrasante entre las estaciones 14+100 – 14+200.
 - Relleno y complemento de subrasante 14+640 – 14+720
 - Relleno en tramo de sub-excavaciones entre las estaciones 14+880 – 14+955
 - Corte a nivel de subrasante entre las estaciones 13+680 – 13+720.
- ✓ **Construcción y Rehabilitación Vial con Concreto Hidráulico del Corredor de Occidente, Tramo Carretero: "Naco - La Entrada" (79.1 km), Localizado en los Departamentos de Santa Bárbara y Copán; Fondos Nacionales.**

Se inició la ejecución de las obras físicas sobre el tramo carretero Naco – La Entrada, por medio de la empresa constructora PRODECON S.A. de C.V. (Contrato No. SIT-CO-248-2022).

En el primer trimestre, se realizó el pago a la supervisión y se efectuará el pago de la primera estimación al contratista durante el mes de abril de 2023.

Como actividades iniciales del proyecto, se realizó el levantamiento topográfico e inventario de árboles en derecho de vía del proyecto.

- ✓ **Proyecto Obras de Mitigación para el Control de Riesgos Geotécnicos y Geológicos, por Deslizamientos y Desprendimientos de Roca de Taludes de corte en la Carretera CA5-Sur, Tramo "Moramulca", fase I; Fondos Nacionales.**

Durante el I trimestre de 2023, el proyecto no presenta ejecución presupuestaria.

Dado que la fecha de cierre del proyecto es el 30 de junio del 2023 y no presenta ejecución física, la SIT deberá revisar el cronograma de trabajo elaborado por la empresa ICA INVERSIONES S. de R.L. quien es la encargada de la ejecución de las seis obras de mitigación en el tramo conocido como "La Moramulca", y así gestionar oportunamente una ampliación a la fecha de cierre del proyecto para culminar las obras.

- ✓ **Rehabilitación con Concreto Hidráulico Sobre la Carpeta Asfáltica Existente del Tramo Carretero: Tegucigalpa - El Guanábano (RN15), Longitud 7.22 km (Salida a Olancho); Fondos Nacionales.**

Dirección General de Inversiones Públicas

Durante el I Trimestre de 2023, se inició la ejecución de las obras físicas sobre el tramo carretero Tegucigalpa – El Guanábano, por medio de la empresa constructora William y Molina S.A. de C.V. (Contrato No. SIT-CO-241-2022).

El proyecto no presenta ejecución presupuestaria, la SIT realizará el pago de la primera estimación durante el mes de abril de 2023.

Durante el primer trimestre, el proyecto realizó las siguientes actividades:

- Bacheo superficial en estación 6+500 LD
- Ligado de baches, estación 6+400 LI
- Protección mediante imprimación de subtramo sin pavimento, estación 4+800
- Limpieza del derecho de vía.

✓ **Construcción y Pavimentación con Concreto Hidráulico del Tramo Carretero: "Portillo del Lobo-Reitoca - Curarén" (39.54 km), Localizado en los Departamentos de Francisco Morazán y Choluteca; Fondos Nacionales.**

Durante el I Trimestre de 2023, la SIT, inició la ejecución de las obras físicas sobre el tramo carretero Portillo del Lobo – Reitoca – Curaren, por medio de la empresa constructora CORDON S HEAVY EQUIPMENT S. de R. L. de C.V (Contrato No. SIT-CO-236-2022) donde se realizaron las siguientes actividades:

- Relleno con material del sitio en tubería de alcantarilla
- Ampliación de calzada en estaciones 2+000 a 2+100
- Pruebas de penetración en relleno sobre tuberías
- Compactación en relleno.

Construcción y Pavimentación de 79.1 km con Concreto Hidráulico del Corredor de Oriente, Tramo Carretero: "Las Lomas - Terrero Blanco, Ruta 53" y Elaboración del Estudio y Diseño del Tramo Carretero: Ruta 119"; para la: Fondos Nacionales.

Al I Trimestre de 2023, se inició la ejecución de las obras físicas sobre el tramo carretero Las Lomas – El Jicarito, etapa 1, tramo ubicado en el departamento de Olancho, por medio de la empresa constructora COSCO S. de R. L. (Contrato No. SIT-CO-242-2022) donde se realizaron las siguientes actividades:

- Visita de campo a trabajo de banqueo para la construcción de rellenos
- Compactación de material de subrasante.

✓ **Reconstrucción del Puente en Carretera Nacional No.1 Puente Guacirope, Localizado en el municipio de Nacaome, Valle.**

Durante el I Trimestre de 2023 y según Acuerdo ejecutivo Número 02-2023 de fecha 25 de enero de 2023, la SIT procedió a efectuar el pago de los reasentamientos a los pobladores afectados en la zona donde se construirá el Puente.

El pago de reasentamientos se realizó en el mes de marzo de 2023 a seis (6) personas afectadas, quedando pendiente un pago por un monto de L 301,305.4 a una persona afectada.

- ✓ **Rehabilitación del Tramo Carretero: "Siguatepeque - La Esperanza" (67.00 Km), Localizado en los Departamentos de Comayagua e Intibucá; Fondos Nacionales.**

Durante el I Trimestre de 2023, la SIT, efectuó el pago de anticipo para dar inicio de las obras físicas del proyecto, las cuales comenzaran a partir del mes de abril de 2023.

El proyecto se ejecutará por tramos a través de la contratación de la empresa PRODECON para el tramo Jesús de Otoro – La Esperanza (L 331,742,705.81) y la empresa SERMACO para el tramo Siguatepeque - Jesús de Otoro (L320,574,128.50).

1.8.2 Sector De Protección Social:

Los principales rubros de inversión están destinadas a inversión en desarrollo humano en las poblaciones más vulnerables. Al Primer Trimestre las distintas Instituciones del Sector, registran los siguientes avances físicos:

Proyecto Ejecutado por la Red Solidaria

La inversión de la institución se concentra en ocho (8) proyectos relevantes que apoyan las Traslaciones a las familias de extrema pobreza así mismo fortaleciendo la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación; proyectos de los cuales todos son financiados con créditos externos.

Proyecto de Apoyo a Poblaciones Vulnerables Afectadas por el Coronavirus (BID 5289/BL-HN)

Avance físico:

- **Sub-Componente de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC)**, se continuó con la entrega de TMC de la planilla generada en diciembre 2022, en el operativo de pago programado para 63,594 hogares, se realizó la entrega de TMC a los 20,409 hogares de las aldeas del departamento de Francisco Morazán, en el operativo del 17 al 30 de diciembre; reanudando la entrega en enero 2023 para los 43,185 hogares restantes.

A la fecha se encuentra en proceso la liquidación de la entrega con el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), para poder realizar el pago de la comisión bancaria.

- **Sub-Componente Estrategias Complementarias**, Fortalecimiento técnico de seis Unidades del Programa de la Red Solidaria.

Se realizaron los pagos correspondientes de las contrataciones de las consultorías que apoyan la operatividad del Programa de la Red Solidaria.

De igual manera se realizaron las contrataciones del personal que apoya la operatividad del Sistema de Información de la Red Solidaria.

- **Componente Gestión del Proyecto**, Se realizaron las contrataciones de las consultorías que garantizan la operatividad técnica, financiera, adquisiciones y monitoreo de la Unidad Coordinadora de Proyectos quienes garantizan la ejecución de la operación.

Proyecto Ejecutado Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL):

- **Proyecto Fortalecimiento en el Sistema de Extracción, Almacenamiento y Distribución del Servicio de Agua Potable y afianzamiento de la Seguridad Alimentaria para mejorar las condiciones de salud y bienestar en los municipios de San Francisco de Becerra y Dulce Nombre de Culmi en el Departamento de Olancho, Fondos Nacionales.**

Avances físicos:

- Para este año están listos los diseños para la construcción de una planta potabilizadora de agua en el casco urbano de San Francisco de Becerra.
- Listos los diseños para construcción y equipamiento de una planta procesadora de derivados de lácteos en el casco urbano de San Francisco de Becerra, un informe de avance de la obra.

Proyecto Ejecutado por la Dirección Nacional Ciudad Mujer:

- **Proyecto “Centros de Atención Integral para mejorar las Condiciones de Vida de las Mujeres Hondureñas (Ciudad Mujer)” BID 3371/BL-HO.**

El proyecto se encuentra en la etapa de cierre, finalizando en junio del 2023 su principal actividad en ejecución es el contrato de Suministro e Instalación de Equipo de Generación de Energía Fotovoltaica, para Autoconsumo de los Centros Ciudad Mujer San Pedro Sula y Choloma del 2023. El único pago que se realizó a cargo del presupuesto 2023 fue el de auditoría externa por L175,424.70, el resto de los pagos se efectuarán al finalizar el contrato de Instalación de Equipo de Generación de Energía Fotovoltaica.

Proyectos ejecutados por el Fondo Hondureño de Inversión Social:

- **Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB), (BID 4518/BL-HO):**

Los principales avances físicos al 31 de marzo de 2023 son los siguientes:

Se ejecutaron fondos como anticipos y avances de obra de 5 proyectos de infraestructura comunitaria en el Departamento de Francisco Morazán, generando 177 empleos directos y beneficiando a 4,472 personas directamente detallados a continuación: Proyecto de Integración Urbana en colonias Altos de la Quezada, La Huerta, Villas San Miguel, Brisas del Roble, y Altos del Mirador para un total de 633 predios; el monto del contrato es de L. 55,100,000.000 se tiene un avance físico del 73% que corresponde a la construcción de pozos e instalación de tuberías del sistema de alcantarillado sanitario, instalación de tubería para el sistema de agua potable, construcción de cunetas y pavimentación de calles con un avance financiero del 68%.

- **Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras (PRE); IDA 6822-HN**

Los principales avances físicos al 31 de marzo de 2023 son los siguientes:

Dirección General de Inversiones Públicas

- 5 proyectos de rehabilitación, reparación y reposición de Centros de Educación de manera integral incluyendo obras ambientales y de mitigación, ubicados en los Departamentos de Cortés, Francisco Morazán e Intibucá.
- Adicionalmente, se ejecutaron fondos como anticipos y avances de obra de 20 proyectos de rehabilitación, reparación y reposición de Centros de Educación de manera integral incluyendo obras ambientales y de mitigación, ubicados en los Departamentos de Comayagua, Copán, Cortés, El Paraíso, Francisco Morazán, La Paz, Lempira, Santa Barbara y Yoro, detallados a continuación:
- 25 subproyectos de infraestructura educativa en ejecución, los cuales culminaran entre febrero y mayo de 2023. Cinco de estos subproyectos poseen acta de recepción provisional al cierre del trimestre.
- Priorización de lista de subproyectos que requieren intervención enviado por la Dirección de Proyectos para siguiente fase de rehabilitación y reconstrucción de escuelas.
- En reformulación: 9 subproyectos de agua y saneamiento (Sistemas de agua potable 7 y Sistemas de alcantarillado sanitario 2), 8 subproyectos viales y 2 subproyectos de salud.

- **Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (ICS); USAID 522-0501-4:**

Los principales avances físicos al 31 de marzo de 2023 son los siguientes:

- 1 espacio público recuperado y entregado para la seguridad ciudadana a las colonias, Alcaldías y patronatos, ubicado en el Departamento de Cortés.
- De 4 proyectos finalizados planificados solamente se finalizaron 2 centros educativos construidos, reparados y/o ampliados ubicados en el Departamento de Atlántida.
- Adicional a lo anterior, se ejecutaron fondos como anticipos y avances de obra de 17 proyectos de prevención situacional/convivencia y educación, ubicados en los Departamentos de Atlántida, Comayagua, Cortés y Francisco Morazán.

- **Programa Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras (PIOH) USAID; 522-0502 Cd E No. 9:**

Los principales avances físicos al 31 de marzo de 2023 son los siguientes:

De 3 proyectos que planificaron su finalización, solamente 2 centros educativos construidos, reparados y/o ampliados se logró su finalización, ubicados en los Departamentos de Copán y Santa Bárbara.

1.8.3 Sector Energía:

El Sector destina su inversión a la construcción, operación y mantenimiento de las centrales hidroeléctricas, inversión en obras relacionadas con la integración de Honduras al SIEPAC, electrificación de viviendas y transmisión eléctrica teniendo como propósito mejorar y ampliar la cobertura del servicio eléctrico para contribuir al crecimiento y desarrollo económico y social del país, mediante los Proyectos de Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral-Río Lindo, Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional (MER), Apoyo al Desarrollo Sostenible de las Energías Renovables, Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica, Electrificación Rural en Lugares Aislados y Sistemas Fotovoltaicos de la Red. Los avances al primer trimestre se presentan a continuación.

Proyectos ejecutados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE):

- **Programa de Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional (MER), (BID 3103/BL-HO y GRT/SX-16864-HO):**

En la primera semana de marzo se firmó el último proceso del Convenio relacionado con la Contratación Directa No. AIHMER-27-CD-O para la construcción y pruebas de ampliación de la Subestación Eléctrica de El Progreso 150 MVA, 230/138 KV (Fase II), el cual ya cuenta con la No Objeción del BID.

El porcentaje promedio de carga en los transformadores de transmisión de la Subestación El Progreso, se ha visto afectado debido a fallas severas presentadas en uno de los autotransformadores existentes de 150 MVA, 230/138kV, lo que implicó que el mismo fuera retirado de servicio, asimismo la inminente salida de un segundo autotransformador que presenta daños de aislamiento interno; se traducirá en inevitables racionamientos de energía en la zona norte y litoral atlántico del país.

El cierre financiero del proyecto está previsto para julio de 2023.

- **Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral - Río Lindo, (BID 3435/BL-HO y JICA HO-P6):**

- Se suscribió el Contrato para la adquisición e instalación del equipo generador de la Central Hidroeléctrica por un monto de USD 61,948,830.52 el cual tiene pendiente el pago de anticipo hasta la presentación de las respectivas Garantías Bancarias a conformidad de la ENEE.
- Se finalizaron las especificaciones técnicas y alcances de obra del proceso para el reemplazo de grúas puente, pintura de tuberías de conducción, presurizadas, torres de oscilación y dispositivos de monitoreo de seguridad de presa, financiados con recursos de JICA.
- El cierre financiero del Convenio BID 3435/BL-HO está previsto para mayo 2023, a la fecha se han cumplido cabalmente los objetivos de dicho financiamiento. Por lo anterior y en aras de utilizar los remanentes existentes previos al cierre de dicha operación, la ENEE ha considerado realizar otras inversiones siempre alineadas a los indicadores del convenio para el fortalecimiento institucional a través de la adquisición e instalación de repuestos, comisionamiento y capacitaciones de las unidades principales de generación.

- **Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica (BID 4598/BL-HO 4599/SX-HO):**

Al primer trimestre, se emitió la Segunda Enmienda a la Nota de Prioridad No.23548-1 para el incremento de US\$21.1 millones al Componente I - Construcción y Ampliación de Infraestructura de Transmisión financiado con recursos del Tesoro Nacional; lo anterior, con base al artículo 119 de las Disposiciones Generales de Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2023.

Retrasos en la ejecución física por no contar a tiempo con el saneamiento de servidumbre ni el permiso por parte de la SIT para construir un tramo de la línea de transmisión en la mediana de la CA-5.

Retrasos en la llegada de bienes y equipos para las subestaciones, debido a la gestión de compras tardías, incumplimientos en la parte ambiental y de seguridad ocupacional del proyecto por parte del contratista.

Dirección General de Inversiones Públicas

Ampliación subestación Bonito Oriental con un transformador adicional de 50 MVA 138/34.5 Kv y cuatro nuevos circuitos de distribución, para la mejora en la calidad del servicio y la atención del crecimiento de la demanda en las comunidades de Corocito, Durango, Santa Rosa de Aguan, Piedra Blanca Fraguosa, Puerto Castilla Trujillo y la expansión de la zona de Irióna y zonas aledañas.

Ampliación subestación Coyoles Central con un transformador adicional de 50 MVA 138/34.5 Kv y cuatro nuevos circuitos de distribución, para la mejora en la calidad del servicio y la atención del crecimiento de la demanda en las comunidades de Coyoles Central, Olanchito, el Ocote, sabana Grande San Francisco, Buenos Aires y zonas aledañas

1.8.4 Sector Educación:

Este sector apoya la mejora de la calidad educativa a través de la capacitación a docentes, construcción de Aulas mediante los proyectos de Infraestructura escolar y Proyecto de Mejora de la Calidad educativa (proyecto Joven), Proyecto: “Mejoramiento de la Calidad de la Educación Prebásica en Honduras. Los avances al primer trimestre en los proyectos son los siguientes:

Proyecto Ejecutado por Secretaría de Educación:

- **Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y de su Gestión Local (PROMINE) FASE IV y V:**

En el primer trimestre el proyecto ha realizado las siguientes actividades:

- Visitas de supervisión a 5 obras: en los departamentos de Copán, La Paz y Lempira para (2) ampliaciones; (1) reposición y (2) construcciones, verificando un avance promedio de 90.0% de dichas obras, asimismo; se realizó verificación de calidad de materiales, Calidad de Obra, verificación de Normativa, verificación de actividades de proyectos, construcción de huertos educativos y productivos, generación de recomendaciones.
- Recepcionar y dar seguimiento de expedientes de Legalización correspondientes a 5 Centros Educativos del Programa PROMINE, en los departamentos de Francisco Morazán, Olancho y Ocotepeque, con un promedio de 86% de prefactibilidad.
- Visitas de Pre-Factibilidad Técnica y Social de proyectos priorizados PROMINE fase V para 5 centros educativos, en los departamentos de Francisco Morazán, Comayagua y Olancho, con un 42% de socialización.
- Visita de Socialización y análisis técnico de Infraestructura en zona de influencia del Programa, en dos centros básicos, en Olancho y Francisco Morazán.

Proyecto Ejecutado por el Fondo Hondureño de Inversión Social:

- **Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar” (PROMINE KFW Fase II):**

Se finalizó 1 Ampliación Centro de Educación Básica CRUTA y JN en marcha, en Jesús de Otoro, Intibucá, generando 33 empleos directos y beneficiando a 235 personas directamente.

- **Proyecto: “Mejoramiento de la Calidad de la Educación Prebásica en Honduras” (IDA 6560-HN):**

Dirección General de Inversiones Públicas

Al primer trimestre de acuerdo con las principales actividades realizadas por la UCP, se reporta lo siguiente:

- ✓ **Componente 1: Fortalecimiento de la capacidad institucional de la SE para la Gestión de la Educación Prebásica:**
 - Se están evaluando las firmas que participaron en el proceso para la Construcción de un Modelo de Calidad para la Educación Prebásica en Honduras para seleccionar la ganadora.
 - Seguimiento de la estrategia para el desarrollo de las actividades correspondientes al programa de fortalecimiento de los COMDE en 110 municipios.
 - Avances en la presentación a los especialistas del Banco Mundial en lo referente a los estándares ambientales y sociales del proyecto.

- ✓ **Componente 2: Actualización del Diseño Curricular para todas las Modalidades de Atención del nivel de Educación Prebásica y Mejora de las Prácticas de Enseñanza en CEPB y CCPREB.**
 - Revisión los TDR para consultoría individual de diseño y validación del manual de la estrategia articulada de formación permanentes para docentes y educadores en el nivel de Educación Prebásica en centros mentores y satélites con el modelo de redes educativas.
 - En evaluación las expresiones interés presentadas para el proceso de contratación de una firma consultora para la elaboración y revisión de los diseños y herramientas curriculares de la Educación Prebásica, con un enfoque educación intercultural bilingüe, con dominio en educación bilingüe: lenguas de los pueblos indígenas (Miskito, Maya-Chorti, Pech, Tawahka, Tolupán) y Afrohondureños (negro de habla inglesa y garífuna).
 - En revisión del DSE los TDR para la consultoría individual de diseño y validación del manual de la estrategia articulada de formación permanente para Docentes y Educadores(as) en el nivel de Educación Prebásica en Centros Mentores y Satélites con el Modelo de Redes Educativas.

- ✓ **Componente 3: Mejoramiento de los Entornos Físicos de Aprendizaje en Centros de Educación Prebásica Seleccionados que atienden a niños(as) en áreas focalizadas.**
 - Se está elaborando propuesta para nueva estrategia de supervisión de obras de la fase misma que cuenta con la no objeción del Banco Mundial, dicha propuesta corresponde a que la supervisión de obras corresponde al proceso paralelo a la ejecución, esta estrategia incluye la contratación de consultores individuales en lugar de una firma supervisora.
 - En proceso de evaluación la adquisición de equipo informático y Audiovisual.

- ✓ **Componente 4: Gestión y Evaluación del Proyecto**
 - Se encuentran contratados el coordinador de Proyecto, el Especialista ambiental y Oficial financiero y contable. pendiente la contratación del Especialista en Adquisiciones.
 - En lo que respecta al proceso de evaluación para la contratación de la firma “Auditoría Financiera”, en revisión de los informes de seguimiento financiero (IFRS) y las cuentas del proyecto, para el periodo del 11 noviembre del 2020 al 31 de diciembre de 2023.

- **Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras (MIFE); BCIE 2239:**

Los principales avances físicos al 31 de marzo de 2023 son los siguientes:

Dirección General de Inversiones Públicas

No se planificaron proyectos finalizados para este trimestre, sin embargo, se contrataron obras, a través de 12 procesos (lotes), de los cuales se tiene en ejecución los primeros 8 proyectos en ejecución, por un valor de US\$ 1,225,965, en donde se han pagado en anticipos la cantidad de US\$ 211,006. 16 proyectos de obras adjudicados y en firma de contratos por un valor de US\$ 2,654,182, un proyecto de obra adjudicado por un valor US\$ 356,937 y 27 proyectos de obras se encuentran en procesos de evaluación, por un valor de US\$ 4,460,672.0 en los Departamentos de Olancho y Santa Barbara, generando 177 empleos directos y beneficiando a 1,372 personas directamente.

Proyecto Ejecutado por el Programa de la Red Solidaria:

- **Proyecto Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven, (BID 4449/BL-HO):**

Avance Físico:

- Iniciado proceso de contratación de personal clave del Proyecto
- Iniciado proceso de contratación de personal técnico del PNTED.
- Completada la construcción de 15 módulos escolares, en municipios seleccionados.
- En ejecución Convenio de Formación Docente con UPN
- En ejecución Convenio con la Universidad de Barcelona
- En ejecución Plataforma Aleks, implementado en 29 centros educativos.
- En ejecución la consultoría para el rediseño del Sistema Integrado de Administración de Talento Humano de la SEDUC.

1.8.5 Sector Salud:

Sus intervenciones van orientadas al mejoramiento y cobertura de los servicios de salud y la red hospitalaria del País, a través de la contratación de gestores en el Primer Nivel y Segundo Nivel de atención mediante el proyecto de Mejora de la Gestión y Calidad de los servicios de salud materno-neonatal, Proyecto Respuesta Inmediata de Salud (RISP) para Contener y Controlar El Coronavirus (COVID – 19) y Mitigar su Efecto en la Prestación del Servicio, en Honduras. Los avances se muestran en la Secretaría de Salud y Red Solidaria.

Proyectos Ejecutados por Secretaría de Salud (SESAL):

- **Proyecto de Respuesta a Emergencia Honduras COVID-19 (IDA 6626-HN / IDA 6868-HN):**

Por parte de la Unidad Ejecutora Protección de la Salud Honduras (PROSALH), se reporta avances físicos en función de la matriz de resultados del proyecto, descritos a continuación:

- 90.8% camas de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) prioritarias totalmente equipadas y operando.
- 59% de la población vacunada contra la COVID-19 por grupo priorizado definido en el Plan Nacional de Introducción de la Vacuna contra el COVID-19 (Población 1ra dosis: 6,405,645; Población 2da dosis: 5,675,207).
- Laboratorios designados con equipos de diagnóstico, kits de pruebas y reactivos de COVID-19 (meta 1 laboratorio)
- 100% de centros de salud prioritarios que reciben el volumen completo de equipos de protección personal (EPPs) previsto en el proyecto.

Dirección General de Inversiones Públicas

- 63.9% de mujeres contratadas en puestos de liderazgo relacionados con la vacunación que han sido creados con financiamiento del proyecto.
- Adquisición de 650 mil jeringas; 120 mil de cajas de seguridad y 300 set de destructores de agujas; Bienes embarcados, pendientes del pago Directo del 100% del contrato.
- Introducción e Implementación de la Tecnología de SPT para apoyar la captura y procesamiento de información relacionada con el COVID-19; (SHIFO FOUNDATION, pago pendiente de 42% del contrato).

En cuanto a los procesos de adquisición en ejecución se listan a continuación:

1. Adquisición de 4 máquinas de anestesia y 300 oxímetros de pulso; los bienes ya fueron recepcionados y distribuidos a diferentes hospitales del país.
2. Adquisición de 71 monitores de signos vitales; los bienes fueron embarcados, se recibieron las facturas originales, pendiente realizar pago directo.
3. Contratación de personal en los puntos fronterizos de Honduras para supervisión de la pandemia COVID-19 (continuidad del contrato de recurso humano fue ampliado para enero – abril 2023).
4. Firma consultora para Auditoría de los estados financieros en proceso de ejecución (Deloitte, pendiente de pago US\$56,574.38 – 69%).

- **Programa Respuesta Inmediata de Salud para Contener y Controlar El Coronavirus (COVID-19) y Mitigar su Efecto en la Prestación del Servicio, en Honduras (RISP-HO-2):**

Al I Trimestre reporta una ejecución física del **30%** y financiero del **52.3%** (con relación al monto contratado de US\$53.82 millones) los avances por componentes se describen a continuación:

- ✓ **Componente 1: Conducción de la respuesta a nivel del país:**

Una (1) Asistencia Técnica de los Procesos Financieros y Administrativos relacionados con los proveedores descentralizados financiados por RISP-HO-2, dos (2) Asistencia Técnica Fortalecimiento del monitoreo y seguimiento de la respuesta a la pandemia.

- ✓ **Componente 4: Mejoramiento a la capacidad de provisión de servicios:**

Pagos del personal médico contratado (175 contratos firmados) a nivel nacional en la atención Hospitalaria, pago al consultor senior en salud digital para la definición y apoyo a la implementación de una estrategia para el uso de soluciones tecnológicas en el marco del fortalecimiento institucional de la SESAL.

Pagos de consultorías de GESALUD en apoyo a las actividades del Programa, pago de los servicios básicos (energía eléctrica, teléfono e internet de las oficinas de GESALUD y UGD, pago de viáticos a las intervenciones del RISP-HO-2, pago de la publicación de procesos.

1.8.6 Sector Seguridad Alimentaria

Los principales rubros de inversión están enfocados en la ejecución de Planes de Negocios, implementación de Sistemas de Riego, el incremento de los ingresos de las poblaciones rurales en el Corredor Seco a fin de prepararse para los efectos del cambio climático y abordar la inseguridad alimentaria. Al primer trimestre del año 2023 las distintas Instituciones del Sector, registran los siguientes avances físicos:

Proyectos Ejecutados por Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG):

- **Proyecto de Desarrollo Agrícola bajo riego (PDABR) BCIE-2101**

En el primer trimestre el único proyecto que se encontraba en ejecución es el de Sistema de Riego San Sebastián, Comayagua; no obstante, se encuentra suspendido desde el mes febrero, en vista que aún no se resuelve el problema de la servidumbre por la parcela del proyecto Joya de Ramos, dado que la asociación de regantes de Lamaní continúa sin permitir el ingreso del contratista del proyecto para seguir instalando la tubería de conducción del proyecto.

A la fecha está pendiente el pago de dos Informes de Supervisión de la Empresa Supervisora CONASH, correspondiente a la Supervisión del Proyecto de “Construcción y Rehabilitación del Sistema de Riego de San Sebastián, Comayagua”, el pago de Informe final de Empresa supervisora SEINCO.

Es necesaria la aprobación de la contratación de la empresa consultora para dar cumplimientos a las metas establecidas en los componentes 2 y 3, es urgente la firma del convenio con las autoridades de Lamaní y San Sebastián y miembros beneficiarios de la fuente de agua del río Jupura.

- **Proyecto de Inclusión Económica y Social de Pequeños Productores Rurales en la Región Noreste de Honduras (PROINORTE), FIDA-No.2000002595, OPEC- No. 13754P.**

En el mes de marzo la empresa que se encargará de la selección del personal que ejecutará el proyecto en campo, se encuentra en proceso de revisión del producto final para la selección de los candidatos a ser contratados, se espera la contratación del personal en el mes de junio por parte de la empresa reclutadora CADERH

Se programó la ejecución de una cadena de valor, el diseño de una campaña de concientización, inversión productiva y capacitaciones brindadas a administradores de las estaciones agroclimáticas.

Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur Occidental Pro-Lenca (FIDA-I-899-HN)

En cuanto al Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones Rurales las intervenciones del proyecto al primer trimestre del 2023 se encuentran en la implementación en campo, 60 planes de inversión; las inversiones están orientadas en los rubros de hortalizas, avicultura, granos básicos, café, papa, MiPymes.

Este producto tendrá avance, una vez que los planes de fortalecimiento sean elaborados, implementados y revisados para someter a la aprobación de las organizaciones beneficiarias.

En cuanto a los convenios suscritos con las organizaciones (hombres, mujeres, jóvenes y etnias) beneficiadas para el financiamiento de sus planes de inversión, se firmaron 25 convenios por parte de la organización beneficiaria y la máxima autoridad de la SAG.

Para el Desarrollo Productivo y de Negocios se generaron 50 procesos de desembolsos para 25 organizaciones, así como el seguimiento en campo de las organizaciones que están en proceso de ejecución de su plan de inversión y en proceso de cierre técnico. Se sigue de la mano con 100

Dirección General de Inversiones Públicas

asistencias técnicas en temas administrativos y financieros brindadas a familias productoras agremiadas en Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (FIDA II). El proyecto cuenta con personal clave para el proceso de cierre que finaliza en septiembre del 2023.

- **Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad 4940/BL-HO (HO-L1211) y 4936/BL-HO (HO-L1201).**

El proyecto no presenta ejecución en el primer trimestre 2023, el proceso de traspaso a la SAG por parte de la comisión Liquidadora INVEST-H ha sido lenta no ha cumplido en tiempo y forma todos los procesos correspondientes.

Se encuentra en proceso la Contratación de la firma del Sub implementador del Componente 1 Fortalecimiento Productivo, se espera concretar en el mes de abril/2023.

Con el componente 2, actualmente se realizan acciones con BANHPROVI para: Finiquitar el fideicomiso del Fondo de Crédito y Fondo de Garantía; Presentación por parte de BANHPROVI de la nueva figura legal del fondo de crédito y garantías; Identificación del mecanismo administrativo para transferir los fondos ya entregados a la nueva figura SAG y; Definir conjuntamente los mecanismos operativos del fondo fecha para concretar el proceso es el 30 de junio 2023.

Proyecto fue traspasado a la SAG e incorporado su presupuesto a finales del mes de marzo/2023.

- **Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II) IDA-6448-HN.**

Al primer trimestre del 2023, no se cuenta con el personal clave contratado, el cual es indispensable en el acuerdo de financiamiento y además requisito para contar con la efectividad. La SAG remitió contratos y términos de referencia para aprobación del Banco Mundial el 17 de marzo y aún está pendiente de respuesta la No Objeción, el banco deberá confirmar sobre el proceso alterno para lograr efectividad y/o la publicación de los perfiles necesarios a la brevedad posible; además no se cuenta con el Manual Operativo del proyecto que debe ser elaborado por la SAG.

1.8.7 Sector Seguridad y Defensa:

Para el presente año ejecuta proyectos, a fin de contribuir a mejorar la convivencia ciudadana en Honduras a través de la mejora en la calidad de vida en barrios vulnerables y la reducción de la incidencia de delitos violentos. Las principales metas ejecutadas al primer trimestre son:

Proyecto Ejecutado por Secretaría de Seguridad:

- **Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios, crédito BID 4518/BL-HO:**

Dentro de las principales actividades realizadas al primer trimestre se encuentran las siguientes:

- Construcción de jefaturas policiales en el municipio de Tela, departamento de Atlántida con un avance físico del 75%.
- En proceso de Contratación de obras de construcción de la Unidad Departamental de Intibucá.

Dirección General de Inversiones Públicas

- En proceso de Contratación de supervisión de obras de construcción de la Unidad Departamental de Intibucá.
- Construcción de jefaturas policiales en Cortés con un avance físico del 19% y Santa Bárbara con un avance físico del 100%.
- Contratación de obras complementarias en la vivienda social de la UMEP de San Pedro Sula, Cortés con un avance físico del 100%.
- Adquisición de mobiliario y equipo para las jefaturas de San Pedro Sula, Cortés, Las Vegas, Santa Bárbara, Tela, Atlántida, Olanchito, Yoro y la Unidad de Tutoría y Mentoría de la Policía Nacional de Honduras con un avance físico del 90%.
- Adquisición de equipo informático para las jefaturas de San Pedro Sula, Cortés, Las Vegas, Santa Bárbara, Tela, Atlántida, Olanchito, Yoro y la Unidad de Tutoría y Mentoría de la Policía Nacional de Honduras con un avance físico del 90%.
- Adquisición de menaje para las jefaturas de San Pedro Sula, Cortés, Las Vegas, Santa Bárbara, Tela, Atlántida, Olanchito, Yoro y la Unidad de Tutoría y Mentoría de la Policía Nacional de Honduras con un avance físico del 90%.
- Mantenimiento y actualización de tres escáneres forenses para laboratorios de investigación criminal y servicios de capacitación con un avance físico del 90%.

1.8.8 Sector Recursos Forestales y Ambiente:

Contempla la Reforestación y restauración de 34,000 hectáreas en zonas afectadas por el gorgojo a través del Programa Manejo Sostenible de Bosques, el proyecto de Reforestación Nacional y Protección de Cuencas Hidrográficas "Padre Andrés Tamayo, y la Implementación de las Medidas de Conservación y Manejo de los Recursos Naturales en las Áreas Protegidas mediante el proyecto de Fortalecimiento del Sistema Nacional de áreas Protegidas de Honduras - SINAPH (LIFEWEB). Los avances al primer trimestre se muestran a continuación:

Proyectos Ejecutados por el Programa de la Red Solidaria

- **Proyecto Manejo Sostenible de Bosques Crédito BID 3878/BL-HO:**

Avance Físico:

- Iniciado procesos de contratación de personal clave del proyecto, se espera contar con el equipo completo en el mes de junio.
- En proceso la adquisición de equipo para el banco de germoplasma.
- En ejecución Investigaciones de las plagas y enfermedades forestales, manejo forestal sostenible y especies resilientes.
- En ejecución convenios para la implementación de Planes de Restauración con Organizaciones.
- En ejecución Maestría en investigación en ciencias forestales, Universidad de San Carlos Guatemala.
- En ejecución consultoría Fortalecimiento del Sistema de Sanidad Forestal y mejora de resiliencia de los bosques al cambio climático.

Proyecto Ejecutado por La Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente:

- **Programa de Reforestación Nacional y Protección de Cuencas Hidrográficas "Padre Andrés Tamayo": Fondos Nacionales.**

Dirección General de Inversiones Públicas

Al I Trimestre del año 2023 el Programa de Reforestación “Padre Andrés Tamayo” su presupuesto fue incorporado hasta principios de Marzo y por motivos que el Ministerio Público se encontró en huelga, no les fue posible enviar la solicitud correspondiente para poder proceder al desembolso según lo programado del primer trimestre, por lo que no fue posible realizarles la transferencia y no pudieron ejecutar, y en el caso de las alcaldías se está realizando los trámites correspondientes es Gestión Comunitaria y ellos confirman que la firma de convenios se realizaran el 26 y 27 de Abril y a partir de la firma se empezará a realizar las transferencias a cada Alcaldía o Municipalidad, está presupuestado empezar a realizarles las transferencias programadas a cada alcaldía en dichos meses. Es de mencionar que en este periodo se ejecutó un valor de L160.9 millones (22.2%) del presupuesto incorporado L725.0 millones.

Proyectos Ejecutados por Instituto Nacional de Conservación Forestal (ICF):

- **Proyecto Fortalecimiento del Sistema Nacional de áreas Protegidas de Honduras - SINAPH (LIFEWEB): (KFW BMZ-No. 2011 65 984)**

Durante el I Trimestre ha realizado las siguientes actividades:

- En el primer trimestre se ha avanzado en elaboración de 5 planes de manejo, elaboración de planes específicos de 6 áreas protegidas, ambos están en proceso de aprobación; elaboración de 4 Planes Operativos Bienales
 - Se realizó jornada de evaluación de efectividad de manejo de 4 Áreas Protegidas, por parte de la oficina local de Tela la cual evidencia la necesidad de contar con instrumentos de planificación adecuados y la documentación en tiempo y forma de cada uno de los procesos.
-
- **Manejo Integrado de la Biosfera del Rio Plátano (MI BIÓSFERA)**

Dentro de las principales actividades desarrolladas para el primer trimestre son:

- Planes de restauración han sido desarrollados y entregados a los propietarios para la intervención de restauración.,
- Se desarrolló el plan de implementación de trabajo con los líderes del Pueblo Pech cuyo objetivo es mejorar los medios de vida, contribuir a la seguridad alimentaria y a la resiliencia al cambio climático de las comunidades Subirana y Jocomico.

1.8.9 Sector Modernización del Estado:

Sus inversiones están destinadas para la ejecución del Proyecto Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Tributaria, el cual está orientado a mejorar los niveles de recaudación tributaria con miras a generar el espacio fiscal necesario para financiar gastos prioritarios, y el proyecto de Modernización Integral de la Gestión de las Finanzas Públicas orientado a atender y cumplir con el propósito de mejorar la gestión y consolidación de las finanzas públicas.

Proyecto Ejecutado por la Secretaría de Finanzas (SEFIN):

- **Modernización Integral de la Gestión de las Finanzas Públicas (FN 23753-1)**

El Proyecto se ejecuta con fondos nacionales, al primer trimestre no presenta ejecución física ni financiera, es de mencionar que la ejecución física y técnica se lleva a cabo con el apoyo de la Unidad de Innovación y Tecnología (UIT). Actualmente existen procesos que se encuentra en la etapa de adjudicación, se espera su contratación en el segundo trimestre:

a) SEFIN-LPN-GC-003-2022 "Contratación de Servicios de Renovación de Licencias Varias para el Fortalecimiento Institucional de la SEFIN", (pendiente adjudicación)

b) SEFIN-LPN-GC-004-2022 "Adquisición de Infraestructura de Servidores y Equipo de Computación para el Fortalecimiento Institucional de la SEFIN 2022 " (pendiente adjudicación)

c) Proceso de Contratación de Servicios de Capacitación para el Fortalecimiento Institucional, así como la contratación del personal que conformará el equipo del proyecto.

Proyecto Ejecutado por el Servicio de Administración de Rentas (SAR):

- **Proyecto Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Tributaria (BID 3541/BL-HO):**

Al 31 de marzo del año 2023, el Proyecto, presenta un porcentaje de avance físico acumulado del 89%.

En cuanto al Componente II. Modernización de Sistemas e Infraestructura Tecnológica y Física tiene un presupuesto total de US\$ 21.10 millones de los cuales se han comprometido US\$20.48 millones de los cuales se ha ejecutado US\$13.0 equivalente a un 62%. Para el primer Trimestre se recibió el entregable correspondiente al Hito No. 4 del SIISAR, el cual tiene un valor de US\$ 2.1 millones, se encuentra en proceso de validación técnica para proceder a realizar el pago para el II trimestre, las actividades principales desarrolladas en el sistema durante este período son: diseñar el sistema informático, Desarrollar los componentes del sistema informático, planificar y ejecutar las pruebas.

El equipamiento para la infraestructura tecnológica del Servicio de Administración de Rentas (SAR) (2021-2022), el monto comprometido es de US\$ 1.4 millones, de los cuales está pendiente por ejecutar US\$ 0.1 que representa un 2%; para el primer trimestre se recibieron los Ítems siguientes: SAR-BID-3541-B-004-2022, Componentes El Orbe S.A. así como Ítem 2.2 Router de distribución (Tipo 2) a pagarse en el II Trimestre/2023.

Para el componente Fortalecimiento del Talento Humano del SAR, se tiene un presupuesto total de US\$ 14.9 millones de los cuales se ha ejecutado US\$ 14.6 millones distribuidos por fuente de financiamiento, US\$ 1.6 millones son Fondos Externos y US\$ 13.0 Fondos Nacionales, se tiene pendiente de comprometer US\$ 0.3 millones que corresponde a un Programa de Capacitación 2023-2024, que actualmente se encuentra en la definición dentro del marco del Plan Estratégico Institucional para el lanzamiento del proceso licitatorio.

1.8.10 Transporte y Obras Públicas:

Proyecto Ejecutado por la Comisión Nacional del Deporte Honduras (CONDEPOR):

- **Proyecto: Diseño, Construcción y Remodelación de Instalaciones y Espacios físicos de Actividades Deportivas y Recreativas, para uso de la Población a Nivel Nacional.**

De las 29 canchas a construir, al primer trimestre 2023 se cuenta con una ejecución física del 22.5%; 5 canchas han sido finalizadas, quedando por finalizar 24 en el transcurso del 2023 de acuerdo con lo programado por la CONDEPOR. En cuanto a los avances en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera, a la fecha se cuenta con el 98% de ejecución física el cual corresponde a la actividad de remodelación de la cancha.

1.9 Factores que han Incidido en la Ejecución de la Inversión Pública, para el Primer Trimestre del Año 2023

Durante la ejecución de programas y proyectos, se presenta una serie de obstáculos que limitan la normal ejecución de estos, en términos físicos y financieros, sin cumplir el objetivo esperado, y por ende la ausencia de impacto en la población meta. Entre los problemas relevantes sobresalen:

Área	Problemas	Acciones
Técnica	La inadecuada planificación por parte de las unidades ejecutoras de proyectos, ocasiona reprogramación de metas, lo que implica solicitar al Organismo Financiador No Objeción (en caso de los fondos externos), ocasionando retrasos en	Brindar por parte de la DGIP, asistencia técnica a las instituciones gubernamentales en la identificación, formulación y evaluación de proyectos.
	Lentos procesos de adquisiciones y contrataciones, en la mayoría de las unidades ejecutoras, desfasando la ejecución oportuna de los proyectos.	Realizar una revisión de los posibles puntos débiles en los procesos de adquisiciones, prever tiempos para cada proceso y tomar en cuenta los tiempos que estipulan los organismos de financiamiento.
Administrativa-Financiera	Falta de un mecanismo para acelerar las exoneraciones de impuestos que están sujetos los proyectos de inversión.	Implementar acciones con la Dirección General de Franquicias Aduaneras, para mejorar la atención a las gestiones de proyectos y otorgar una respuesta oportuna a las unidades ejecutoras.

Área	Problemas	Acciones
Legal	Algunos proyectos del FHIS que incluyen componentes relacionados a centros educativos no se han atendido debido a que las Unidades Ejecutoras de los Proyectos expresan que la Secretaría de Educación (SEDUC) no permite intervenir centros educativos que no se encuentren debidamente legalizados a nombre de la SEDUC, lo cual ha generado un retraso significativo en la ejecución de estas obras en el área educativa.	Proponer y remitir al Soberano Congreso Nacional la legalización automática de terrenos en donación, a nombre de las Alcaldías, entre otros casos, que cuentan con un centro educativo dentro del predio para que sea legalmente reconocidos a nombre de la SEDUC, o en su defecto llegar a un acuerdo con SEDUC para intervenir centros educativos que no estén legalizados sus terrenos.
	El cambio de Autoridades en las Unidades Ejecutoras de proyectos genera lentos procesos como ser: delegación de firmas, solicitudes de desembolsos, pagos a Proveedores, y falta de aprobaciones de Cuotas de Compromiso para efectuar pagos. Caso Proyectos de la Red Solidaría.	La Unidad Ejecutora tendrá que agilizar los trámites de delegación de firmas antes los organismos y la SEFIN, así como revisar su programación de pagos, relacionados a sus planes de adquisiciones y presupuestos.

Asimismo, se detallan otras circunstancias referentes a la baja ejecución del año 2023,

Falta de incorporar la totalidad de los fondos aprobados debido a:

- Convenios de préstamo de Proyectos en etapa de negociación ante organismos financieros internacionales y fuentes de financiamiento internas.
- En el caso de algunos proyectos financiados con recursos de BCH, requirieron de Dictámenes de ampliación de tiempo debido a que varios proyectos tenían contemplado finalizar su ejecución en el año 2022.
- Algunas propuestas de proyectos no cumplen de acuerdo con la normativa SNIPH siendo estas actividades recurrentes de la institución por lo que serán ejecutados dentro de programas institucionales.
- El cambio de prioridades por las autoridades de cada institución para ejecutar los recursos inicialmente formulados / aprobados para el PIP 2023.

Cuadro No.2
 Secretaría de Finanzas
 Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL 1 TRIMESTRE, 2023
 Cifras en Millones de Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	
		Total	Total	Total	% Ejec (Ejec/Vig)
8	0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social	1,147.8	1,147.8	71.3	6.2%
2	0028 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal	125.1	125.1	0.7	0.6%
1	0037 - Servicio de Administración de Rentas	173.4	173.4	1.4	0.8%
2	0050 - Secretaría de Educación	185.1	185.1	5.0	2.7%
6	0060 - Secretaría de Salud	731.5	731.5	72.6	9.9%
1	0070 - Secretaría de Seguridad	200.4	200.4	7.0	3.5%
1	0100 - Secretaría de Finanzas	153.3	153.3	-	0.0%
7	0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería	521.5	1,484.7	17.3	1.2%
1	0144 - Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible	-	75.4	-	0.0%
1	0150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente	-	725.0	160.9	22.2%
2	0244 - Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer	22.0	22.0	2.9	13.4%
11	0411 - Secretaría de Infraestructura y Transporte	17.0	2,052.5	166.6	8.1%
1	0412 - Secretaría de Desarrollo Social	-	12.8	-	0.0%
1	0413 - Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación	-	232.7	26.5	11.4%
1	0414 - Dirección de Gestión por Resultados	-	-	-	0.0%
3	0415 - Programa de la Red Solidaria	-	525.5	8.3	1.6%
3	0505 - Instituto Hondureño de Antropología e Historia	5.2	5.2	0.0	0.2%
3	0801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica	2,172.8	2,172.8	1,044.2	48.1%
2	1801 - Alcaldía Municipal del Distrito Central	-	309.9	9.1	2.9%
57	(Registrada en SIAFI)	5,455.0	10,335.0	1,593.9	15.4%
	0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social	345.8	-	-	0.0%
	0030 - Secretaría de la Presidencia	25.7	-	-	0.0%
	0044 - Instituto Nacional Penitenciario (INP)	181.1	-	-	0.0%
	0050 - Secretaría de Educación	298.7	-	-	0.0%
	0060 - Secretaría de Salud	1,111.8	-	-	0.0%
	0100 - Secretaría de Finanzas	100.0	-	-	0.0%
	0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería	1,399.5	-	-	0.0%
	0150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)	725.0	-	-	0.0%
	0180 - Registro Nacional de las Personas	400.0	-	-	0.0%
	0400 - Administración Aduanera de Honduras (AAH)	45.0	-	-	0.0%
	0411 - Secretaría de Infraestructura y Transporte	3,854.7	-	-	0.0%
	0412 - Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)	12.8	-	-	0.0%
	0413 - Comisión Nacional del Deporte Honduras (CONDEPOR)	232.7	-	-	0.0%
	0415 - Red Solidaria	3,833.2	-	-	0.0%
	0503 - Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)	47.7	-	-	0.0%
	0511 - Universidad Nacional de Ciencias Forestales (UNACIFOR)	5.8	-	-	0.0%
	0703 - Universidad Nacional de Agricultura	37.5	-	-	0.0%
	0708 - Hospital Escuela Universitario (HEU)	127.1	-	-	0.0%
	0801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica	3,651.1	-	-	0.0%
	0803 - Empresa Nacional Portuaria	78.8	-	-	0.0%
	0804 - Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL)	400.0	-	-	0.0%
	0806 - Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)	98.8	-	-	0.0%
	0807 - Suplidora Nacional de Productos Básicos (BANASUPRO)	197.6	-	-	0.0%
	0809 - Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR)	3.4	-	-	0.0%
	1801 - Alcaldía Municipal del Distrito Central	309.9	-	-	0.0%
	Varias Instituciones	695.0	-	-	0.0%
68	(Monto para incorporación, cambio de fuente y pendiente emisión de Nota de Prioridad)	18,158.8	-	-	0.0%
125	TOTAL INVERSIÓN PRODUCTIVA	23,613.9	10,335.0	1,593.9	15.4%
	0001 - Congreso Nacional	200.0	-	-	0.0%
	0003 - Comisionado Nacional de Derechos Humanos	0.0	0.2	0.0	12.4%
	0004 - Consejo Nacional Electoral	200.0	-	-	0.0%
	0020 - presidencia de la República	212.5	-	-	0.0%
	0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social	684.9	579.4	31.9	5.5%
	0028 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal	0.0	100.2	0.0	0.0%
	0033 - Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos	0.0	300.0	0.0	0.0%
	0039 - Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios	0.0	25.0	0.0	0.0%
	0040 - Secretaría de Justicia, Gobernación y Descentralización	8,270.4	79.0	0.2	0.2%
	0045 - Instituto Nacional de Migración	0.0	0.7	0.0	0.0%
	0050 - Secretaría de Educación	700.0	1099.1	0.1	0.0%
	0060 - Secretaría de Salud	1470.0	9125.4	363.8	4.0%
	0070 - Secretaría de Seguridad	0.0	153.0	22.1	14.5%
	0080 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.	54.6	134.1	21.1	15.7%
	0090 - Secretaría de Defensa	0.0	150.7	0.0	0.0%
	0100 - Secretaría de Finanzas	84.0	-	-	0.0%
	0101 - Comisión Nacional de Telecomunicaciones	0.0	200.0	49.3	24.6%
	0104 - Bienes del Estado	10.0	-	-	0.0%
	0130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social	0.0	2.9	0.3	12.0%
	0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería	1000.0	1300.0	369.9	28.5%
	0141 - Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria	0.0	0.1	0.0	0.0%
	0180 - Registro Nacional de las Personas	0.0	1.4	0.2	13.9%
	0242 - Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia	0.0	104.2	2.3	2.2%
	0243 - Dirección Nacional de Parques y Recreación	0.0	18.2	0.3	1.7%
	0300 - Secretaría de Derechos Humanos	0.0	0.3	0.0	0.0%
	0301 - Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de P	0.0	3.8	0.0	0.0%
	0310 - Secretaría de Energía	10,774.3	14,768.2	1,166.8	7.9%
	0406 - Secretaría de Asuntos de la Mujer	0.0	66.8	4.5	6.8%
	0410 - Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Hondu	0.0	55.5	2.4	4.3%
	0412 - Secretaría de Desarrollo Social	800.0	55.3	15.5	28.1%
	0415 - Programa de la Red Solidaria	200.0	759.2	0.0	0.0%
	0416 - Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento	0.0	596.3	30.5	5.1%
	0417 - Programa de Acción Solidaria	0.0	1411.8	317.7	22.5%
	0500 - Instituto Nacional Agrario	100.0	7.2	1.5	20.7%
	0501 - Instituto Hondureño de Turismo	0.0	0.7	0.0	0.0%
	0504 - Instituto de Crédito Educativo	87.0	-	-	0.0%
	0505 - Instituto Hondureño de Antropología e Historia	0.0	0.0	0.0	0.0%
	0506 - Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas	9.0	0.1	0.1	78.3%
	0507 - Inst. Hondureño para Prev. y Trat. del Alcohol, Drog. y Farm.	7.2	1.0	0.8	83.9%
	0511 - Universidad de Ciencias Forestales	0.0	22.8	2.1	9.2%
	0515 - Instituto Hondureño de Ciencia y Tecnología	4.0	-	-	0.0%
	0601 - Instituto Hondureño de Seguridad Social	0.0	8.1	0.0	0.0%
	0602 - Inst. Nal. de Jubi. y Pen. de los Emp. y Fun. del Poder Ejec.	0.0	5930.5	1088.2	18.3%
	0603 - Instituto Nacional de Previsión del Magisterio	0.0	6994.4	1673.5	23.9%
	0604 - Instituto de Previsión Militar	0.0	2127.7	581.3	27.3%
	0708 - Hospital Escuela Universitario	0.0	185.3	0.0	0.0%
	0801+ Empresa Nacional de Energía Eléctrica	9160.5	0.0	0.0	0.0%
	0803 - Empresa Nacional Portuaria	0.0	28.4	5.9	20.8%
	0903 - Banco Nacional de Desarrollo Agrícola	2000.0	-	-	0.0%
	Otros Programas Sociales	12204.7	-	-	0.0%
	Total Inversión Social	48,233.1	46,396.81	5,752.16	12.4%
125	TOTAL GENERAL	71,847.0	56,731.8	7,346.1	12.9%

Fuente: SIAFI, 31/03/2023;

Nota: Del Presupuesto aprobado/ L23,613.9 millones, se encuentran pendientes de incorporar al PIP L13,278.9 millones, los cuales se incorporarán una vez cumplan los requerimientos técnicos, legales y administrativos
