

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e
Inversión Pública



Informe de Avance Físico y Financiero

AL II TRIMESTRE 2023

**Secretaría de Desarrollo Comunitario
Agua y Saneamiento
(SEDECOAS/FHIS)**

Tegucigalpa, Honduras

Julio, 2023

Ejecución al II Trimestre 2023
Secretaría de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento



DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

IV. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

4.1 EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

La Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS) - Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), cuya finalidad es la de promover el mejoramiento de las condiciones de vida de los grupos sociales marginados en el área rural y urbana, mediante el otorgamiento de financiamientos para programas y proyectos de desarrollo social o económico, con el propósito de aumentar su productividad, sus niveles de empleo y de ingresos y de contribuir a la satisfacción de sus necesidades básicas.

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del 2023
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	1,147,848,393
Presupuesto Vigente	1,376,972,765
Ejecutado II Trimestre	165,548,532
% Ejecución (Devengado II Trim-2023/Vigente)	12%
Ejecutado (Devengado Anual)	236,803,792
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	17%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	412,681,302
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	30%

Fuente: SIAFI, 30/06/2023


El “Plan de Gobierno para la Refundación de la Patria y Construcción del Estado Socialista y Democrático (2022 – 2026)”, ha considerado dentro de sus prioridades atender proyectos enfocados a programas sociales y apuntar a los siguientes objetivos; En materia de Educación lo siguiente: un Sistema capaz de brindar educación gratuita y universal, reinstaurando la Matrícula Gratis y una merienda idónea, rehabilitar y repotenciar al menos el 50% de la infraestructura escolar durante el segundo año de gobierno, llegando al 100% en el tercer año de gobierno, mediante mecanismos de participación comunitaria apoyada desde el municipio y el gobierno central entre otros.

En materia de Protección Social se ampliará y fortalecerá programas de asistencia como las transferencias en efectivo que se focalizarán mejor a fin de que realmente lleguen a sectores de la población en extrema pobreza, sin corrupción ni manipulación.

Al segundo trimestre del año 2023, la institución contó con un presupuesto vigente de inversión pública de **L1,377.0 millones** y la ejecución presupuestaria del trimestre asciende a un monto de **L236.8 millones** lo que representa el (17.2%) con relación al presupuesto vigente, tal como se detalla en el Cuadro No. 1.

Dicha ejecución se llevó a cabo a través de (9) nueve proyectos enfocados en Agua y Saneamiento, Electrificación Rural y Caminos Rurales, Infraestructura Social, Infraestructura Escolar, Fortalecimiento de Capacidades para Jóvenes, Recuperación de Espacios Públicos y Mejora de la Infraestructura Básica. Ver Detalle de Ejecución Financiera en Anexo No. 4.


Gráfico No. 1
Presupuesto Vigente
SEDECOAS/FHIS: Financiamiento por Organismo
 Cifras en millones de Lempiras

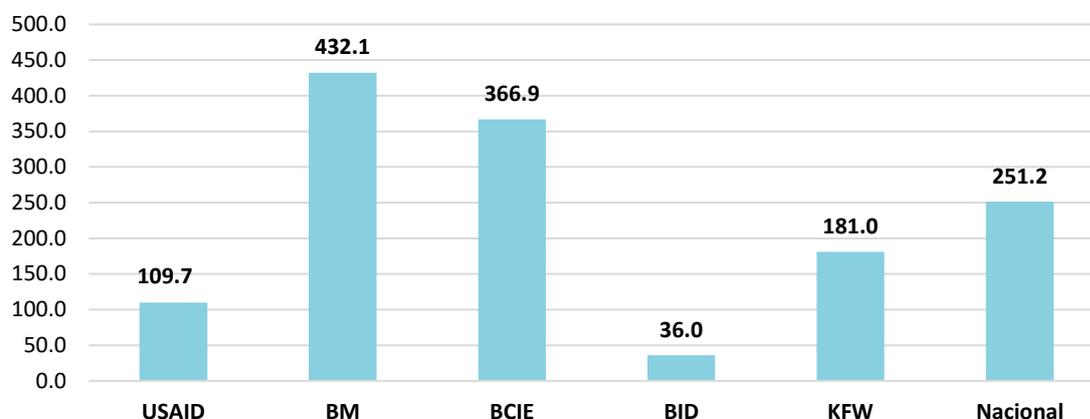

En referencia al financiamiento de Inversión Pública, el 64.9% corresponde a fondos provenientes de crédito externo expresado en términos monetarios con un monto de **L893.2 millones**, el 16.9% a recursos de donaciones externas con un monto de **L232.6 millones**; y 18.2% con fondos nacionales con un monto de **L251.2 millones**, incluye contraparte nacional que corresponde a gastos operativos de proyectos, sumando un monto total en el presupuesto vigente de **L22.1 millones** equivalente a 1.6% del presupuesto vigente. Dicha inversión es financiada por el BCIE con el **26.6%**, Banco Mundial con **31.4%**, KfW |Banco Alemán con **13.1%**, BID con el **2.6%**, USAID con el **8.0%** y Tesoro Nacional con el **18.2%**.

4.2 COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN AL II TRIMESTRE (2019-2023):

En los años 2019 al 2023, los proyectos de Inversión Pública de la SEDECOAS/FHIS ha considerado la ejecución de al menos 12 Proyectos de Inversión, de los cuales se han financiado el 68% con recursos de crédito externo, 28% recursos de donación externa y el 4% restante con recursos del Tesoro Nacional como contraparte de dichos Proyectos.

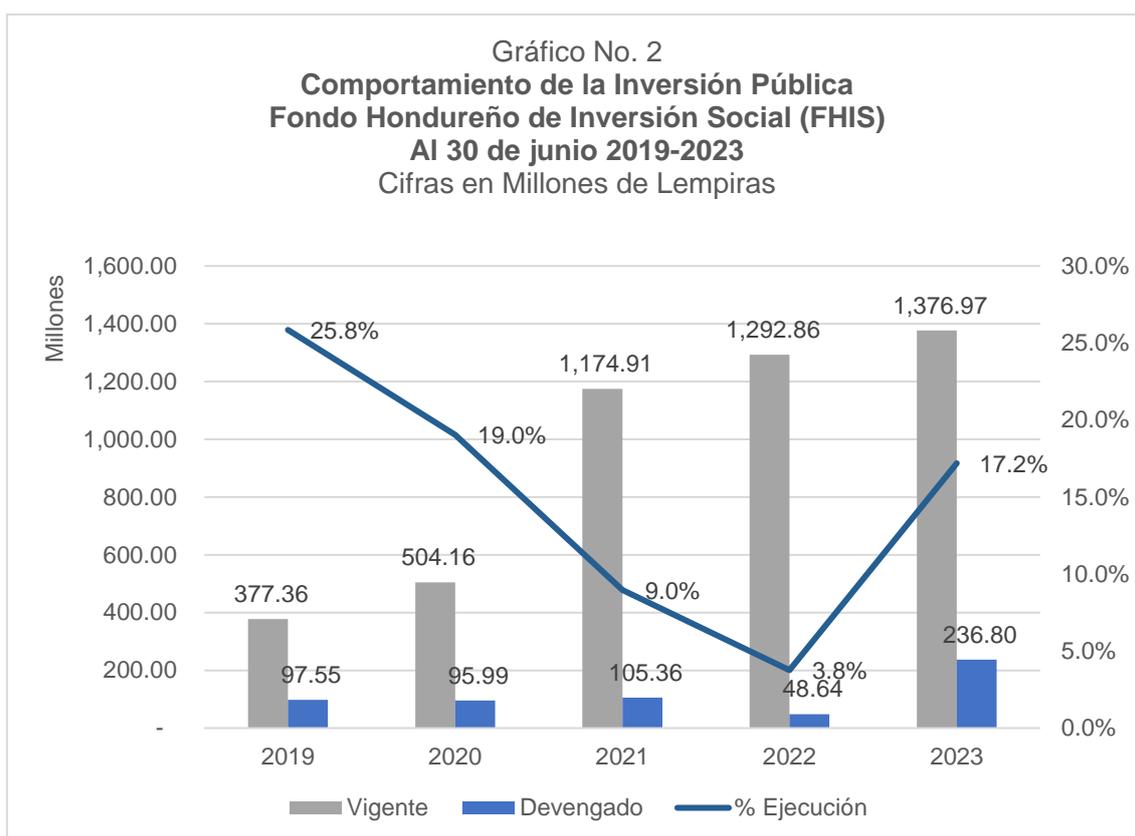

La Gráfica No.2 muestra la ejecución porcentual comparativa de los últimos años al 30 de junio, el pico más alto se registró en el año 2019, para el año 2021 se incorporaron al presupuesto nuevos programas entre ellos para atender la reparación y rehabilitación de escuelas y para proyectos de infraestructura en las zonas afectadas por Eta e Iota, sin embargo, pese a tener suficientes recursos la ejecución para los años 2021 y 2023 se vio mermada por la crisis ocasionada durante y post pandemia del COVID-19, en el 2021, así como cambio de nuevo gobierno en el 2022, entre otras. Cabe mencionar que la baja ejecución en el 2023 se debe en parte a procesos engorrosos de los organismos financiadores, así como la falta de personal esencial en las unidades ejecutoras.

4.3 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión en el segundo trimestre del año 2023 se concentró en los siguientes proyectos:

- 1 Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y su Gestión Local (PROMINE).
- 2 Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB).
- 3 Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras (MIFE).
- 4 Proyecto Convivencia y Espacios Seguros para los Jóvenes en Honduras (CONVIVIR).
- 5 Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras (PRE).
- 6 Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (ICS).
- 7 Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras (PIOH).

- 8 Proyecto Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Ciudad de Gracias, Departamento de Lempira
- 9 Programa de Mejoramiento de la Infraestructura de Desarrollo Social y Comunitario en Varios Departamentos de Honduras.

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros de los principales proyectos de acuerdo con su presupuesto vigente:

1. Programa Modernización de la Infraestructura Educativa (PROMINE)

PROMINE tiene por objetivo general fortalecer la rectoría Sectorial en Infraestructura Educativa de la Secretaría de Educación y la gestión local participativa, así como mejorar el acceso de los alumnos de las comunidades pobres al Centro Educativo de calidad que operan de manera sostenible. De esa manera se pretende contribuir al aumento de la eficiencia y de la calidad del sistema educativo (pre-básico y básico).

Los principales avances físicos al 30 de junio de 2023 son los siguientes:

Cantidad	Nombre de la Obra	Intervención	Municipio	Departamento	Empleos	Beneficiarios	Estado
1	CEB Jesus Maria Rodriguez y CEPB La Independencia	Ampliación	San José	Copán	29	223	Finalizado
1	CEB Pedro Nufio	Ampliación	Intibucá	Intibucá	32	298	Finalizado
1	CEB Lucila Perez Estrada y CEPB Hector Juarez	Reparación	La Unión	Lempira	28	188	Finalizado
3					89	709	

A continuación, véase la ejecución histórica del Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y de su Gestión Local (PROMINE), segundo trimestre 2023:

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto*/	Inicio-Fin	
Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y de su Gestión Local (PROMINE)	SE/FHIS VIII No.2008-66-178 2014 67 414 (KFW) / FHIS - SE Fondos de Donación	L1,668,181,102	10/07/2012 - 31/07/2024	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	
II Trimestre 2023	127,957,113	127,957,113	29,965,723	23.4
Acumulado 2023	127,957,113	127,957,113	32,410,269	25.3
Acumulado Vida del Proyecto*/	1,668,181,102	1,668,181,102	712,478,030	42.7

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
 Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto
 Tasa de cambio L24.6547x 1USD

2. Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB)

Consisten en contribuir a mejorar la convivencia ciudadana en Honduras a través de la mejora en la calidad de vida en barrios vulnerables y la reducción de la incidencia de delitos violentos. Los objetivos específicos son: (I) mejorar el hábitat de barrios urbanos vulnerables, aumentando el acceso a infraestructura de servicios básicos y de prevención para disminuir delitos de robos y violaciones sexuales; (II) reducir los niveles de incidencia de homicidios y violencia intrafamiliar (VIF) en los municipios intervenidos mejorando los servicios de prevención y atención a víctimas de la violencia; y (III) mejorar la efectividad policial en investigación criminal, a través del incremento de la proporción de casos de homicidio con agresor identificado e informe de investigación aceptado por el Ministerio Público. Proyecto co-ejecutado con la Secretaría de Seguridad.

Los principales avances físicos al 30 de junio de 2023 son los siguientes:

- **Mejoramiento de Barrios:** Ejecución de obras del Proyecto de Integración Urbana en colonias Altos de la Quezada, La Huerta, Villas San Miguel, Brisas del Roble, y Altos del Mirador para un total de 633 predios; el monto del contrato es de L. 55,100,000.000 se tiene un **avance físico del 81.50%** que corresponde a la construcción de pozos e instalación de tuberías del sistema de alcantarillado sanitario, instalación de tubería para el sistema de agua potable, construcción de cunetas y pavimentación de calles con un avance financiero del 74.4%.
- **Programa de Deportes y Valores:** en ejecución continua y participan aproximadamente **700 jóvenes** de las colonias intervenidas por el programa.

Durante el trimestre, la joven Giselle Roque (19 años) beneficiaria del Programa, participó en las olimpiadas especiales en Berlín, obteniendo la medalla de Bronce en el salto largo sin impulso y 4to lugar en la carrera de 50 metros.

- **Capacitación y Empleabilidad:** Al mes de junio de 2022 inició el curso de diseño gráfico a través de la fundación CADERH, donde finalizaron 15 participantes graduados en marzo del año 2023, al mes de junio del año 2023 a través de convenios con CADERH se están capacitando 17 personas en alfabetización digital.

A continuación, véase la ejecución histórica del **Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB)**, segundo trimestre 2023:

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto*/	Inicio-Fin	
PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS	BID/4518/BL-HO	497,000,000	28/11/2018-31/10/2023	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
II Trimestre 2023	36,003,735	36,003,735	8,976,649	24.9
Acumulado 2023	36,003,735	36,003,735	19,490,361	54.1
Acumulado Vida del Proyecto*/	497,000,000	497,000,000	353,930,541	71.2

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
 Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto
 Tasa de cambio L24.6547x 1USD

3. Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras (MIFE)

Este Programa tiene como objetivo fortalecer la educación en Honduras para que los educandos tengan un acceso eficiente, con la permanencia necesaria en los Centros de Educación Media y sean promovidos con la calidad requerida. El programa estará localizado en los departamentos de: Atlántida, Choluteca, Colón, Comayagua, Copán, Cortés, El Paraíso, Francisco Morazán, Gracias a Dios, Intibucá, Islas de la Bahía, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Santa Bárbara, Valle, Yoro.

El Programa tiene como objetivo de entregable 105 centros de educación (Pre-básica, básica y Media) ampliados, mejorados y equipados, beneficiando a 480 niños de Educación prebásica, 40,759 niños de Educación Básica y 43,801 jóvenes de Educación

SECRETARÍA DE FINANZAS

Media, haciendo un total de 85,040 educandos de los tres niveles del sistema educativo, así mismo 3,821 docentes de Educación Pre-básica, 3,821 docentes de Educación Básica, 15,285 docentes de educación media, haciendo un total de 22,923 docentes. La duración del programa es de 5 años desde el 2021 hasta el 2026 donde habrá un desarrollo gradual de la infraestructura y la dotación de equipo, así como la formación permanente y la plataforma virtual para emprendimiento.

Actualmente, se tienen 25 de proyectos en ejecución y 27 para orden de inicio, 18 proyectos aprobados, 13 están en revisión de control de calidad y el resto de los 113 están en proyección de ser intervenidos por parte del programa.

Los principales avances físicos al 30 de junio de 2023 de Centros Escolares son los siguientes:

Cantidad	Nombre de la Obra	Intervención	Municipio	Departamento	Empleos	Beneficiarios	Estado
1	ESCUELA RURAL MIXTA MIGUEL MORAZAN	Reposición	Manto	Olancho	11	61	Ejecución
1	ESCUELA REPUBLICA DE HONDURAS	Reposición	Salama	Olancho	11	61	Ejecución
1	CEB DIONISIO DE HERRERA	Reposición	San Fco. de la Paz	Olancho	11	61	Ejecución
1	ESCUELA GENARO MADRID PAZ	Reposición	Concepcion del Norte	Santa Bárbara	10	98	Ejecución
1	ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS	Reposición	Concepcion del Norte	Santa Bárbara	10	98	Ejecución
1	ESCUELA RURAL MIXTA MISAEL ARLANDO BUESO M.	Reposición	Concepcion del Norte	Santa Bárbara	10	98	Ejecución
1	CEB JOSE CECILIO DEL VALLE	Reposición	Ilama	Santa Bárbara	10	98	Ejecución
1	ESCUELA URBANA MIXTA LEONIDAS RIVERA M.	Reposición	Ilama	Santa Bárbara	10	98	Ejecución
1	ESCUELA RURAL MIXTA ESTEBAN GUARDIOLA	Reposición	Campamento	Olancho	11	61	Ejecución
1	ESCUELA JUAN J. CASTRO	Reposición	Campamento	Olancho	11	61	Ejecución
1	ESCUELA CRISTOBAL COLON	Reposición	Guayape	Olancho	11	61	Ejecución
1	C.E.B ANGEL G. HERNANDEZ	Reposición	Salama	Olancho	11	61	Ejecución
1	CEB MANUEL J. VARGAS	Reposición	La Union	Olancho	11	61	Ejecución
1	ESCUELA EFRAIN CRUZ	Reposición	Juticalpa	Olancho	11	61	Ejecución
1	ESCUELA RURAL MIXTA ALEJANDRO AGUILAR	Reposición	San Fco. de la Paz	Olancho	11	61	Ejecución
1	ESCUELA BENIGNO RAMON IRIAS	Reposición	Santa María del Real	Olancho	11	61	Ejecución
1	ESCUELA MIGUEL PAZ BARAHONA	Reposición	Arada	Santa Bárbara	10	98	Ejecución
1	CEB DIONISIO DE HERRERA	Reposición	Atíma	Santa Bárbara	10	98	Ejecución
1	ESCUELA JOSE ROSENDO MUÑOZ TROCHEZ	Reposición	Concepcion Del Sur	Santa Bárbara	10	98	Ejecución
1	ESCUELA RURAL MIXTA JUAN LINDO	Reposición	Azacualpa	Santa Bárbara	10	98	Ejecución
1	CENTRO EDUCACION BASICA EL PROGRESO	Reposición	Nueva Frontera	Santa Bárbara	10	98	Ejecución
1	ESCUELA JOSE ANIBAL RAPALO	Reposición	Protección	Santa Bárbara	10	98	Ejecución
1	ESCUELA URBANA MIXTA MANUEL F. RODRIGUEZ	Reposición	Petoa	Santa Bárbara	10	98	Ejecución
1	CEMG ENMANUEL	Reposición	Petoa	Santa Bárbara	10	98	Ejecución
1	JARDIN DE NIÑOS SAGRADO CORAZON	Reposición	Comayagua	Comayagua	24	128	Ejecución
1	ESCUELA NOHEMI FERRERA DE GARCIA	Reposición	Choloma	Cortés	6	85	Pendiente O/I
1	CEPB MANUEL DE JESUS VALENCIA	Reposición	LA LIMA	Cortés	6	85	Pendiente O/I
1	CEPB ESTEBAN GUARDIOLA	Reposición	LA LIMA	Cortés	6	85	Pendiente O/I
1	CEB GUBERNAMENTAL MODESTO RODAS ALVARADO	Reposición	LA LIMA	Cortés	6	85	Pendiente O/I
1	CEB MERCEDES FLORES CASTILLO	Reposición	Potrerillos	Cortés	6	85	Pendiente O/I
1	CEB MIGUEL PAZ BARAHONA	Reposición	Potrerillos	Cortés	6	85	Pendiente O/I
1	CEB PROF. RAFAEL PINEDA PONCE	Reposición	San Pedro Sula	Cortés	6	85	Pendiente O/I
1	CEB FERNANDO NARANJO	Reposición	San Pedro Sula	Cortés	6	85	Pendiente O/I
1	CEB HÉCTOR GUILLERMO GUILLEN	Reposición	San Pedro Sula	Cortés	6	85	Pendiente O/I
1	CEB ING. ROBERTO LARIOS SILVA	Reposición	San Pedro Sula	Cortés	6	85	Pendiente O/I
1	ESCUELA RAMON ROSA	Reposición	Puerto Cortés	Cortés	6	85	Pendiente O/I
1	CEB GUBERNAMENTAL JOHN F. KENNEDY #1	Reposición	San Pedro Sula	Cortés	6	85	Pendiente O/I
1	CEB JUAN LINDO	Reposición	San Pedro Sula	Cortés	6	85	Pendiente O/I
1	ESCUELA SUPERACION	Reposición	Villa Nueva	Cortés	6	85	Pendiente O/I
1	CEB PETRONILA BARRIOS CABAÑAS	Reposición	Villanueva	Cortés	6	85	Pendiente O/I
1	ESCUELA RURAL NUEVA ESPERANZA	Reposición	Juticalpa	Olancho	11	61	Pendiente O/I
1	ESCUELA LUIS LANDA	Reposición	San Fco. de Becerra	Olancho	11	61	Pendiente O/I
1	ESCUELA RURAL ALVARO CONTRERAS	Reposición	Manto	Olancho	11	61	Pendiente O/I
1	ESCUELA RURAL MIXTA UNION Y FUERZA	Reposición	Mangulile	Olancho	11	61	Pendiente O/I
1	CEB 1 DE MAYO	Reposición	Mangulile	Olancho	11	61	Pendiente O/I
1	ESCUELA URBANA MIGUEL ANGEL BUESO	Reposición	CONCEPCIÓN DEL NORTE	SANTA BÁRBARA	10	98	Pendiente O/I
1	CEB FRANCISCO MORAZAN	Reposición	Chinda	Santa Bárbara	10	98	Pendiente O/I
1	ESCUELA JUAN LINDO	Reposición	Arada	Santa Bárbara	10	98	Pendiente O/I
1	ESC. MANUEL BONILLA	Reposición	Protección	Santa Bárbara	10	98	Pendiente O/I
1	CEMG SUPERACIÓN	Reposición	Quimistán	Santa Bárbara	10	98	Pendiente O/I
1	ESCUELA VICTORIANO PERDOMO	Reposición	Azacualpa	Santa Bárbara	10	98	Pendiente O/I
1	ESCUELA OSCAR MEJIA URQUIA	Reposición	Nueva Frontera	Santa Bárbara	10	98	Pendiente O/I
1	ESCUELA RURAL MIXTA 18 DE NOVIEMBRE	Reposición	Quimistán	Santa Bárbara	10	98	Prep Doc Base
1	ESCUELA RURAL MIXTA CARLOS RIVERA	Reposición	Quimistán	Santa Bárbara	10	98	Prep Doc Base
1	ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE	Reposición	Protección	Santa Bárbara	10	98	Prep Doc Base
1	CEB JOSE SANTOS GUARDIOLA + CCEPREBB MUNDO	Reposición	Quimistán	Santa Bárbara	10	98	Prep Doc Base

SECRETARÍA DE FINANZAS

Cantidad	Nombre de la Obra	Intervención	Municipio	Departamento	Empleos	Beneficiarios	Estado
1	MARIA AUXILIADORA	Reposición	Manto	Olancho	11	61	Prep Doc Base
1	ESCUELA PRESENTACION CENTENO	Reposición	La Union	Olancho	11	61	Prep Doc Base
1	UNION Y FUERZA	Reposición	Guayape	Olancho	11	61	Prep Doc Base
1	CEB CORONEL HERNAN ACOSTA MEJIA	Reposición	Santa María del Real	Olancho	11	61	Prep Doc Base
1	CEBG Esmeralda Quiroz de Madrid	Reposición	San Pedro Sula	Cortés	6	85	Prep Doc Base
1	CEB GUBERNAMENTAL DARIO DE TURCIOS	Reposición	LA LIMA	Cortés	6	85	Prep Doc Base
1	CEB GUBERNAMENTAL MANUEL DE JESUS VALENCIA	Reposición	LA LIMA	Cortés	6	85	Prep Doc Base
1	PATRIA	Reposición	Villa Nueva	Cortés	6	85	NO
1	JOHN ARNOL COOK PROHECO	Reposición	Villa Nueva	Cortés	6	85	NO
1	INSTITUTO FROYLAN TURCIOS	Reposición	San Fco. de Becerra	Olancho	11	61	NO
1	OSWALDO LOPEZ ARELLANO	Reposición	San Fco. de Becerra	Olancho	11	61	NO
1	PROFA. GLADYS EMERITHA MUÑOZ	Reposición	Santa María del Real	Olancho	11	61	NO
1	PEDRO NUÑO	Reposición	Manto	Olancho	11	61	NO
1	ESCUELA FLORENCIO MARTINEZ	Reposición	Protección	Santa Bárbara	10	98	NO
1	ESCUELA 3 DE OCTUBRE	Reposición	Omoa	Cortés	6	85	Comité
1	RAMON ROSA	Reposición	Omoa	Cortés	6	85	Comité
1	MARCO AURELIO SOTO	Reposición	Manto	Olancho	11	61	Comité
1	ESCUELA TIMOTEO SABILLON RIVERA	Reposición	Protección	Santa Bárbara	10	98	Comité
1	REPUBLICA DE HONDURAS	Reposición	Omoa	Cortés	6	85	Revi di
1	SAN JOSE DE LAS BRISAS	Reposición	Puerto Cortés	Cortés	6	85	Revi di
1	JOSE MELITON SARMIENTO	Reposición	Mangulile	Olancho	11	61	Revi di
1	DOMINGA CHIRINOS DE BONILLA	Reposición	San Fco. de Becerra	Olancho	11	61	Revi di
1	DIONISIO DE HERRERA	Reposición	San Fco. de Becerra	Olancho	11	61	Revi di
1	RAMONA TEJEDA	Reposición	Santa María del Real	Olancho	11	61	Revi di
1	CEB GILBERTO ORLANDO LANZA	Reposición	San José de Colinas	Santa Bárbara	10	98	Revi di
1	LUIS BOGRAN	Reposición	Santa Barbara	Santa Bárbara	10	98	Revi di
1	PERFECTO H BOBADILLA	Reposición	Santa Barbara	Santa Bárbara	10	98	Revi di
1	REPARACION CEB JOSE TRINIDAD REYES	Reposición	LA LIMA	Cortés	6	85	Revi di
1	CEBG MARCO AURELIO SOTO	Reposición	Omoa	Cortés	6	85	Revi di
1	CEB MARIO ENRIQUE PRIETO	Reposición	Omoa	Cortés	6	85	Revi di
1	CEB GUBERNAMENTAL EL BUEN	Reposición	LA LIMA	Cortés	6	85	Revi di
1	NOHEMI FERRERA DE GARCIA	Reposición	Choloma	Cortés	6	85	PD
1	ESCUELA EL ESFUERZO	Reposición	Omoa	Cortés	6	85	PD
1	FRANCISCO MORAZAN	Reposición	Omoa	Cortés	6	85	PD
1	ARGENTINA REYES	Reposición	Omoa	Cortés	6	85	PD
1	REPUBLICA DE HONDURAS	Reposición	Omoa	Cortés	6	85	PD
1	CEB JOSE TRINIDAD REYES	Reposición	San Manuel	Cortés	6	85	PD
1	JULIO REYES CABALLERO	Reposición	San Manuel	Cortés	6	85	PD
1	CAZANAVE	Reposición	San Manuel	Cortés	6	85	PD
1	ESCUELA RODOLFO PADILLA SUNCERI	Reposición	San Pedro Sula	Cortés	6	85	PD
1	GUSTAVO ADOLFO CASTAÑEDA	Reposición	San Pedro Sula	Cortés	6	85	PD
1	BERLIN 2	Reposición	San Pedro Sula	Cortés	6	85	PD
1	JOSE CECILIO DEL VALLE	Reposición	Villa Nueva	Cortés	6	85	PD
1	FRANCISCO MORAZAN	Reposición	Villa Nueva	Cortés	6	85	PD
1	ARMANDO MUNGUIA GOMEZ	Reposición	Villa Nueva	Cortés	6	85	PD
1	ANEXO ESCUELA JUAN J. CASTRO	Reposición	Campamento	Olancho	11	61	PD
1	LUZ OSORIO CASCO	Reposición	Campamento	Olancho	11	61	PD
1	RENACER	Reposición	Catacamas	Olancho	11	61	PD
1	RAMON BREVE VARGAS	Reposición	Juticalpa	Olancho	11	61	PD
1	ESC. TOMAS BARDALES CASTRO	Reposición	Mangulile	Olancho	11	61	PD
1	CEB GUBERNAMENTAL ALEJANDRINA MEZA	Reposición	LA LIMA	Cortés	6	85	PD
1	CEB GUBERNAMENTAL ESTEBAN GUARDIOLA	Reposición	LA LIMA	Cortés	6	85	PD
1	CEB GUBERNAMENTAL CARLOS ROBERTO FLORES	Reposición	LA LIMA	Cortés	6	85	PD
1	Inst. Polivalente Brisas del Valle	Reposición	San Pedro Sula	Cortés	6	85	PD
1	CEB Independencia	Reposición	San Pedro Sula	Cortés	6	85	PD
1	CEB José Castro López	Reposición	San Pedro Sula	Cortés	6	85	PD
1	CEB JOSÉ TRINIDAD REYES	Reposición	Villanueva	Cortés	6	85	PD
113					982	9209	

A continuación, véase la ejecución histórica del Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras (MIFE), segundo trimestre 2023:

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto*/	Inicio-Fin	
Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras (MIFE)	BCIE - 2239	L1,971,360,000	30/03/2021 - 30/03/2026	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
II Trimestre 2023	297,119,742	297,119,742	48,550,781	16.34
Acumulado 2023	297,119,742	297,119,742	54,090,935	18.21
Acumulado Vida del Proyecto*/	1,971,360,000	1,971,360,000	169,344,664	8.59

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
 Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto
 Tasa de cambio L24.6547x 1USD

4. Proyecto Convivencia y Espacios Seguros para los Jóvenes en Honduras (CONVIVIR)

El programa abarca la construcción, el mejoramiento y el equipamiento de infraestructura social para jóvenes y espacios públicos, financiamiento y/o cofinanciamiento del trabajo con jóvenes y la capacitación de jóvenes, la capacitación de personal de las instituciones involucradas, las municipalidades seleccionadas, las comunidades de barrio y servicios de consultoría.

Los principales avances físicos al 30 de junio de 2023 son los siguientes:

DEPARTAMENTO	Municipio	Departamento	% Avance	Empleos Directos	Beneficiarios Directos
Plaza -juvenil Brisas de Copan"	Santa Rosa	Copán	42.2	19	597.00
Plaza El Mirador Santa Teresa	Santa Rosa	Copán	45.5	14	4,210.00
Parque La Piramide	La Esperanza.	Intibucá	37.8	15	10,000.00
Paseo Cultural Lenca	La Esperanza.	Intibucá	42.7	9	1,500.00
Ruta Lenca de la Juventud	La Esperanza.	Intibucá	46.6	14	1,500.00
Cancha Abe y Ben	Juticalpa	Olancho	44.9	35	1,794.00
Parque Recreativo de la Juventud	Juticalpa	Olancho	42.2	22	5,400.00
TOTAL			43.1	128	25,001.00

A continuación, véase la ejecución histórica del Proyecto Convivencia y Espacios Seguros para los Jóvenes en Honduras (CONVIVIR), segundo trimestre 2023:

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto*/	Inicio-Fin	
Proyecto Convivencia y Espacios Seguros para los Jóvenes en Honduras (CONVIVIR)	BMZ Nr. 2016 65348	L170,029,800	17/07/2021 - 14/07/2025	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
II Trimestre 2023	62,408,091	62,408,091	3,536,589	5.7
Acumulado 2023	62,408,091	62,408,091	6,266,499	10.0
Acumulado Vida del Proyecto*/	170,029,800	170,029,800	71,887,417	42.3

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
 Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto
 Tasa de cambio L24.6547x 1 €

5. Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Eta e Iota en Honduras (PRE)

Tiene como objetivo Coordinar, impulsar y fortalecer capacidades para el conocimiento del riesgo, reducción de este y manejo de desastre, como una estrategia para mejorar la eficiencia en la preparación para la respuesta y la recuperación post desastre naturales. Su propósito es la atención de la infraestructura dañada por el Huracán y Tormenta Tropical Eta: rehabilitación de pasos y caminos terciarios, reparación y construcción de cajas puentes rehabilitación y construcción de sistemas de drenaje, puentes (Bailey), construcción de calles terciarias, obras de mitigación entre otras.

Los principales avances físicos al 30 de junio de 2023 son los siguientes:

Infraestructura Educativa:

- 25 subproyectos de reposición, reparación y ampliación de centros educativos adjudicados por un monto de L85,205,034.43 y para la supervisión L 9,862,732.25. Las obras han dado inicio en noviembre de 2022. La ejecución al cierre del 2do trimestre 2023 es de L25,230,389.86.
- Un segundo paquete consta de 11 subproyectos que en el segundo semestre se adjudicaron y darán inicio en el mes de julio por un monto de L74,308,862.15. La ejecución al cierre del 2do trimestre 2023 es de L9,852,297.81.
- Un tercer paquete de 33 subproyectos se encuentra en reformulación por los técnicos del proyecto. El monto presupuestado es de L124,900,000.00.
- Un cuarto paquete de 41 subproyectos se encuentra pendiente de reformulación próximos a ser abordados por los técnicos del proyecto por un monto aproximado de L134,503,621.56.

Agua y Saneamiento:

- 3 subproyectos de agua y saneamiento han sido evaluados y adjudicados en el segundo trimestre el año. El monto de contrato es de L80,013,832.68. Al cierre del segundo semestre se han ejecutado los anticipos, por un monto total de L16,694,229.82
- 9 subproyectos de agua y saneamiento se encuentran en reformulación con un monto presupuestado de L. 274,282,300.00.

Infraestructura Vial:

- 8 subproyectos viales se encuentran en proceso de reformulación para incluir actividades de medidas ambientales y de mitigación. El monto de presupuesto es de L95,996,000.00.

Infraestructura en Salud:

- Un subproyecto de salud se encuentra en proceso de reformulación. El monto de presupuesto es de L. 5,500,000.00.

A continuación, véase la ejecución histórica del Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras (PRE), segundo trimestre 2023:

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto*/	Inicio-Fin	
Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras (PRE)	6822-HN	L1,960,432,000	25/05/2021 - 31/12/2026	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
II Trimestre 2023	432,092,852	432,092,852	47,175,975	10.9
Acumulado 2023	432,092,852	432,092,852	74,670,210	17.3
Acumulado Vida del Proyecto*/	1,960,432,000	1,960,432,000	128,814,349	6.6

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
 Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto
 Tasa de cambio L24.6547x 1USD

6. Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (ICS/USAID)

Tiene como objetivo general incrementar la resiliencia de las comunidades y los individuos a la violencia y al crimen a través de mejoras en la infraestructura pública de pequeña escala. Esto incluye el mejoramiento en las estructuras comunitarias que mitiguen el crimen eliminando o disminuyendo el riesgo de oportunidad, creando espacios comunitarios más seguros, aumento en los servicios de calidad que protejan contra la violencia, mejoramiento en la participación de los sistemas de seguridad y rendimiento de justicia nacional y municipal, mejoramiento en la participación ciudadana con los sectores de justicia y seguridad.

Los principales avances físicos al 30 de junio de 2023 son los siguientes:

Cantidad	Nombre de la Obra	Intervención	Municipio	Departamento	Empleos	Beneficiarios	Estado
1	Reparación CEB Claudio Barrera - Fase III 108882	Reparación	La Ceiba	Atlántida	20	996	Finalizado
1	Reparación CCPREB La Unidad (frente a los Juzgados), Col. La Granja, Choloma, Cortes 108861	Reparación	Choloma	Cortés	60	4012	Finalizado
1	Reparación y Equipamiento CDA 24 de Abril, Cortes 108888	Reparación	Choloma	Cortés	60	4012	Finalizado
1	Suministro e instalación de Generador Almacén Regional de Biológicos de la RMDC - Bodega Ultra Frío	Mejora	La Ceiba	Atlántida	20	996	Finalizado
1	Suministro e Instalación Generador y obras varias Clínicas COVID-19 Hospital Atlántida, 108923	Mejora	La Ceiba	Atlántida	20	996	Finalizado
5					180	11012	

A continuación, véase la ejecución histórica del Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (ICS/USAID), segundo trimestre 2023:

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto*/	Inicio-Fin	
Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (USAID/ICS)	522-0501-4 Donación Externa	L348,006,068	19/10/2017 - 30/06/2024	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	
II Trimestre 2023	70,204,050	70,204,050	16,532,236	23.5
Acumulado 2023	70,204,050	70,204,050	33,230,011	47.3
Acumulado Vida del Proyecto*/	348,006,068	348,006,068	274,271,195	78.8

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
 Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto
 Tasa de cambio L24.6547x 1USD

7. Programa Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras (USAID/PIOH)

Ejecución al II Trimestre 2023

Secretaría de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento (SEDECOAS/FHIS)

El propósito de esta Actividad es mejorar las pobres condiciones sociales y económicas son especialmente pronunciadas en el Occidente de Honduras. Extrema pobreza, desnutrición, vulnerabilidad al cambio climático. Bajos niveles educativos, migración, falta de acceso a los servicios básicos y otros retos socioeconómicos son endémicos. La provisión de servicios básicos de educación y nutrición son escasos en la zona de Occidente y es difícil el acceso a los ya existentes, así mismo la gestión de servicios de educación, nutrición y agua y saneamiento son deficientes por lo que los ciudadanos cuentan además con pocos espacios de participación para mejorar sus vidas a nivel de hogar y sus vidas productivas, lo que genera una gran brecha de pobreza.

Los principales avances físicos al 30 de junio de 2023 son los siguientes:

Cantidad	Nombre de la Obra	Intervención	Municipio	Departamento	Empleos	Beneficiarios	Estado
1	Ampliación Centro de Educación Básica Mariano Martínez, Opatoro La Paz 107390	Ampliación	Opatoro	La Paz	22	161	Finalizado
1	Ampliación CEB Mi Independencia San Miguelito 107565	Ampliación	San Miguelito	Intibucá	24	176	Finalizado
1	Ampliación Centro de Salud Rural (CESAR) ARCAMON, 107398	Ampliación	Santa Rosa	Copán	10	42	Finalizado
1	Ampliación CEB Prudencio Arita Fase II, Ocotepeque, 109139	Ampliación	La Labor	Ocotepeque	13	282	Finalizado
4					69	661	

A continuación, véase la ejecución histórica del Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (PIOH/USAID), segundo trimestre 2023:

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto*/	Inicio-Fin	
Programa Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras (USAID/PIOH)	522-0502 Cd E No.9 Donación Externa	L210,053,250	01/11/2018 - 30/06/2024	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	
II Trimestre 2023	52,246,428	52,246,428	7,822,036	15.0
Acumulado 2023	52,246,428	52,246,428	13,035,108	24.9
Acumulado Vida del Proyecto*/	210,053,250	210,053,250	115,011,939	54.8

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
 Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto
 Tasa de cambio L24.6547x 1USD

8. Proyecto Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Ciudad de Gracias, Departamento de Lempira

El proyecto tiene como objetivo mejorar el acceso a los servicios de agua potable para la población del municipio de Gracias, Departamento de Lempira, aumentando la cantidad y la calidad del agua suministrada, a través de la ampliación del sistema de abastecimiento, mediante el desarrollo de la infraestructura hidráulica.

Los principales avances físicos al 30 de junio de 2023 son los siguientes:

- No se planificaron proyectos finalizados para este trimestre, sin embargo, se realizaron actividades complementarias para comenzar con el proceso de ejecución de fondos del Proyecto de Gracias, Lempira, socializando la disminución del alcance del proyecto "Ampliación del Sistema de Abastecimiento

de Agua Potable, en la Ciudad de Gracias, Departamento de Lempira” y adicionando “Mejoramiento en la Red de Colectores y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Suroriente de Tegucigalpa”.

A continuación, véase la ejecución histórica del Proyecto Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Ciudad de Gracias, Departamento de Lempira, segundo trimestre 2023:

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto*/	Inicio-Fin	
Proyecto Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Ciudad de Gracias, Departamento de Lempira (BCIE)	BCIE 2261 Crédito Externo	L884,322,000	03/01/2022 - 03/02/2026	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	
II Trimestre 2023	69,816,382	69,816,382	1,025,060	1.5
Acumulado 2023	69,816,382	69,816,382	1,646,916	2.4
Acumulado Vida del Proyecto*/	884,322,000	884,322,000	30,059,002	3.4

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tasa de cambio L24.6547x 1USD

9. Programa de Mejoramiento de la Infraestructura y Desarrollo Social y Comunitario en varios departamentos de Honduras (BCH)

El Programa de Mejoramiento de la Infraestructura de Desarrollo Social y Comunitario en Varios Departamentos de Honduras es el resultado de un proceso de priorización de ocho (8) componentes que tendrán un total de 61 proyectos en 48 municipios del país que aportarán a la reducción de la pobreza y a la mejora del bienestar humano de la población.

Los principales avances físicos al 30 de junio de 2023 son los siguientes:

12 proyectos de infraestructura construcción y supervisión de obra en etapa de adjudicación y contratación de obra, distribuidos en varios componentes del programa 18; así como 2 proyectos de prefactibilidad y factibilidad de proyectos de impacto nacional por un monto global del programa por L 229,124,372.00.

A continuación, véase la ejecución histórica del Programa de Mejoramiento de la Infraestructura y Desarrollo Social y Comunitario en varios departamentos de Honduras, segundo trimestre 2023:

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto*/	Inicio-Fin	
Programa de Mejoramiento de la Infraestructura y Desarrollo Social y Comunitario en varios departamentos de Honduras (BCH)	BCH 24798 Crédito Interno	L499,700,000	01/08/2022 - 01/08/2024	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	
II Trimestre 2023	229,124,372	229,124,372	1,025,060	0.4
Acumulado 2023	229,124,372	229,124,372	1,963,482	0.9
Acumulado Vida del Proyecto*/	499,700,000	499,700,000	272,539,110	54.5

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
 Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

4.3.1 PROGRAMAS SOCIALES

La inversión en programas sociales según información reportada en el SIAFI, asciende a **L350.3 millones**, y una ejecución L116.5 millones equivalente al **33.3%** en relación con el presupuesto vigente 2023.

4.4 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- En el segundo trimestre se autorizaron las siguientes modificaciones presupuestarias:
 - Modificación presupuestaria entre categorías programáticas objetos de gasto del convenio programa de mejoramiento integral de infraestructura y formación educativa de honduras (MIFE), contrato de préstamo BCIE-2239-HO.
 - Modificación presupuestaria de traslados entre objetos del gasto de un mismo programa para cubrir compromisos para la operatividad de la unidad ejecutora del programa de mejoramiento integral de infraestructura y formación educativa de honduras (mife).
 - Modificación presupuestaria entre objetos de gastos para el convenio convivir /kfw, para cubrir gastos de viáticos y mantenimiento de vehículos.
 - Modificación presupuestaria entre traslados entre objetos de gastos entre categorías programáticas, del convenio del proyecto de recuperación de emergencia a causa de los ciclones tropicales ETA e IOTA en HONDURAS-PRE, financiado con fondos del crédito.
 - Modificación presupuestaria entre objetos de gastos del convenio de lab-honduras, para poder sufragar gastos operativos en el marco del proyecto laboratorio de moléculas biológicas, genética y prototipos de salud - honduras).
 - Modificación presupuestaria entre categoría programáticas del convenio promine kfw fase IV y v donación, reajuste en el gasto operativo necesidades del programa en la actualidad, reajuste en pagos de la asistencia técnica y actividades que se estarán realizando.
 - Modificación presupuestaria entre categoría programáticas del convenio promine kfw fase IV y v donación, reajuste en el gasto operativo

necesidades del programa en la actualidad, reajuste en pagos de la asistencia técnica y actividades que se estarán realizando.

Conclusiones

- La ejecución presupuestaria al II Trimestre del año 2023 experimentó una ejecución acumulada del 17.2% ejecución insatisfactoria, relativo a L165.5 millones con respecto al vigente de L1,377.0, esta baja ejecución es producto principalmente de los procesos engorrosos de los organismos financiadores en el cual destaca Banco Mundial.
- Para este trimestre se realizaron modificaciones presupuestarias entre proyectos y entre objetos de gasto con el fin de ir cubriendo las metas establecidas por el ajuste de la programación, POA's y compromisos de acuerdo con cada uno de los proyectos y otras actividades relativas al funcionamiento de las Unidades Ejecutoras.
- Todos los proyectos que incluyen componentes relacionados a centros educativos no se han atendido debido a que las Unidades Ejecutoras de los Proyectos expresan que la Secretaría de Educación (SEDUC) no permite intervenir centros educativos que no se encuentren debidamente legalizados a nombre de la SEDUC, lo cual ha generado un retraso significativo en la ejecución de estas obras en el área educativa.

Recomendaciones

- Agilizar los procesos de formulación de los nuevos proyectos con el objetivo de entregar oportunamente los beneficios a la población objetivo, básicamente aquellas personas que han sufrido por emergencias naturales y de salud.
- Coordinar gestiones para acelerar la ejecución física y financiera de los proyectos, tomar acciones correctivas, ceder espacio presupuestario a otros proyectos en vista de lo reprogramado con el objetivo de alcanzar las metas establecidas en los Planes Operativos Anuales institucionales.
- Coordinar reuniones de seguimiento en conjunto con la UCP-FHIS, UPEG y Dirección de Control y Seguimiento, Comité Ejecutor de Proyecto (CEP), en conjunto con SEFIN con el fin de apoyar a las Unidades ejecutoras donde se tenga cuellos de botella.
- Proponer y remitir al Soberano Congreso Nacional borrador de legalización automática de terrenos en donación, a nombre de las Alcaldías, entre otros casos, que cuentan con un centro educativo dentro del predio para que sea legalmente reconocidos a nombre de la SEDUC, o en su defecto llegar a un acuerdo con SEDUC para intervenir centros educativos que no estén legalizados sus terrenos.
- Actualizar mensualmente en el Sistema de Administración Financiera (SIAFI Ges) la evaluación de metas físicas en el Plan Operativo Anual.

ANEXOS

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública – Dirección General de Inversión Pública
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE, 2023
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado (Devengado) Anual		
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total
	0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social		22,053,380.0	1,125,795,013.0	1,147,848,393.0	251,177,752.0	1,125,795,013.0	1,376,972,765.0	11,663,065.4	225,140,726.1	236,803,791.5
1	ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS	522-0502 Cd E No.9	7,387,678.0	44,858,750.0	52,246,428.0	7,387,678.0	44,858,750.0	52,246,428.0	3,171,457.3	9,863,650.7	13,035,108.1
2	Ampliación Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Ciudad De Gracias, Departamento De Lempira	BCIE-2261	-	69,816,382.0	69,816,382.0	-	69,816,382.0	69,816,382.0	-	1,646,915.9	1,646,915.9
3	PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS	BID/4518/BL-HO	-	36,003,735.0	36,003,735.0	-	36,003,735.0	36,003,735.0	-	19,490,360.8	19,490,360.8
4	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA	522-0501-4	5,314,200.0	64,889,850.0	70,204,050.0	5,314,200.0	64,889,850.0	70,204,050.0	3,593,833.3	29,636,178.1	33,230,011.4
5	Programa de Mejoramiento de la Infraestructura de Desarrollo Social y Comunitario en varios departamentos de Honduras	BCH-24798-1	-	-	-	229,124,372.0	-	229,124,372.0	1,963,481.8	-	1,963,481.8
6	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y FORMACION EDUCATIVA EN HONDURAS	BCIE - 2239	-	297,119,742.0	297,119,742.0	-	297,119,742.0	297,119,742.0	-	54,090,935.5	54,090,935.5
7	PROGRAMA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SU GESTION LOCAL	2014 67 414 (KFW) / FH	-	-	-	1,352,112.0	38,697,793.0	40,049,905.0	576,374.5	10,432,788.1	11,009,162.6
		BMZ 2016 68 763	5,143,752.0	122,813,361.0	127,957,113.0	3,791,640.0	84,115,568.0	87,907,208.0	1,080,287.1	20,320,819.4	21,401,106.5
		SE/FHIS VIII No.2008-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS	BMZ Nr. 2016 65348	4,207,750.0	58,200,341.0	62,408,091.0	4,207,750.0	58,200,341.0	62,408,091.0	1,277,631.4	4,988,867.3	6,266,498.7
9	Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras.	6822-HN	-	432,092,852.0	432,092,852.0	-	432,092,852.0	432,092,852.0	-	74,670,210.4	74,670,210.4
