

INFORME GENERAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

III Trimestre, 2023

www.sefin.gob.hn



Proyecto: *Planta Potabilizadora de Agua, San Francisco de Becerra, Departamento de Olancho, SEDESOL*



Proyecto: *Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB), Fondo Hondureño de Inversión Social.*

Contenido

INVERSIÓN PÚBLICA AL TERCER TRIMESTRE DEL 2023	3
PRESENTACIÓN.....	3
I. ANALISIS GLOBAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA AL TERCER TRIMESTRE 2023	3
1.1 INVERSIÓN PÚBLICA GLOBAL 2023	3
1.3 INVERSIÓN PÚBLICA POR ESTRUCTURA DEL SECTOR PÚBLICO, (SIAFI)	7
1.4 LA INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL DE SECTOR (PRODUCTIVA Y SOCIAL)	8
1.5 FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PUBLICA GLOBAL.....	9
1.6 PROGRAMAS SOCIALES.....	10
1.7 EJECUCIÓN HISTÓRICA PERÍODO 2019 - 2023:.....	11
1.8 EJECUCIÓN FÍSICA A NIVEL DE SECTORES:	12
1.8.1 Sector Carreteras:.....	12
1.8.2 Sector De Protección Social:.....	15
1.8.3 Sector Energía:	17
1.8.4 Sector Educación:.....	20
1.8.5 Sector Salud:.....	22
1.8.6 Sector Seguridad Alimentaria	24
1.8.7 Sector Recursos Forestales y Ambiente:	26
1.8.8 Transporte y Obras Públicas:.....	27
1.9 ANÁLISIS DE IMPACTO SOCIALES POR LA BAJA EJECUCIÓN EN PROYECTOS.	28
1.10. FACTORES QUE HAN INCIDIDO EN LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA, PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023	28

INVERSIÓN PÚBLICA AL TERCER TRIMESTRE DEL 2023

PRESENTACIÓN

El presente informe, muestra el análisis del comportamiento de la ejecución física y financiera de la Inversión Pública correspondiente al Tercer Trimestre del ejercicio fiscal 2023. Este documento es elaborado por la Dirección General de Inversiones Públicas (DGIP) en el marco de sus competencias como ente técnico coordinador del Programa de Inversión Pública (PIP).

En el Plan de Inversión Pública aprobado para el año 2023 se prioriza un monto de **L71,847.0 millones**, representando el **8.7%** respecto al PIB para el año 2023 (L827,618.4 millones), dicha inversión está orientada a la ejecución de programas y proyectos en los sectores prioritarios de Energía para la recuperación de las empresas públicas, Carreteras, para el incremento de la productividad, conectividad y competitividad y Desarrollo Productivo como apoyo a la Seguridad Alimentaria y protección social que permita fomentar el trabajo local a través de la generación de empleo, contribuir con el mejoramiento de caminos de acceso con el fin de facilitar la comercialización del sector productivo.

Del monto Global de la Inversión Pública aprobado para el año 2023, **L71,847.0 millones** el **67.1%** **L48,233.1 millones**, corresponden a Programas Sociales, para el beneficio social y desarrollo humano; el restante **33.9%** **L23,613.9 millones**, pertenecen a los Proyectos de Inversión Productiva, registrados en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIPH), aplicando la metodología para la Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública para la Nota de Prioridad para la ejecución de **125 proyectos** de Inversión Pública, de los cuales 57 son nuevos proyectos y 68 proyectos de arrastre.

I. ANALISIS GLOBAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA AL TERCER TRIMESTRE 2023

1.1 INVERSIÓN PÚBLICA GLOBAL 2023

El monto Global de la Inversión Pública aprobado para el año 2023, asciende a **L71,847.0 millones** de los cuales **33.9%** **L23,613.9 millones**, corresponden a los Proyectos para Inversiones Productivas, registrados en el Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIPH), para la ejecución de **125 proyectos** de Inversión Pública, un **67.1%** **L48,233.1 millones**, corresponden a Inversiones Sociales. Ver cuadro No. 1.

La Inversión Pública Global al tercer trimestre 2023 contó con un presupuesto vigente de **L77,220.2 millones**; y una ejecución de **L33,490.7 millones**, (**43.4%**).

Del total de la Inversión Pública, **La Inversión Productiva** para el año 2023 según lo reportado en el Sistema de Administración Financiera Integrado (SIAFI) muestra una Inversión vigente al tercer trimestre de **L16,485.7 millones** y una ejecución de **L5,850.7 millones**, (**35.5%**), para la ejecución de **95 proyectos** en los diferentes sectores prioritarios del país.

Respecto al presupuesto vigente para la **Inversión Social** cuenta con un monto de **L41,675.3 millones**, y un ejecutado de **L22,412.9 millones**, (**53.8%**). Asimismo en el presente trimestre se adiciona la **Formación Bruta de Capital** con un vigente de **L19,059.1 millones** y una ejecución de **L5,227.1** (**27.4%**), ejecución que contempla Bienes Capitalizables (Grupo 40000) para las

Dirección General de Inversiones Públicas

instituciones del sector público, representando incremento de los activos fijos financieros del país, como reparaciones menores, compra de maquinaria y equipo.
Ver cuadro No.1.

Cuadro No.1

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE, 2023

Cifras en Millones de Lempiras

No. Proy.	Detalle Inversión	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado/ Devengado	% Ejecución Ejec./Vig.
125	Inversión Productiva	23,613.8	16,485.7	5,850.7	20.1%
71	Registrados en SIAFI	5,455.0	16,485.7	5,850.7	35.5%
54	Pendiente de Incorporación	18,158.8	-	-	-
-	Inversión Social	48,233.1	41,675.3	22,412.9	53.8%
-	Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF)		19,059.1	5,227.1	27.4%
Total, Inversión Global		71,846.9	77,220.2	33,490.7	43.4%

* Del Presupuesto vigente/ L16,485.7 millones, pendientes de incorporar al PIP L7,128.1 millones, los cuales se incorporarán una vez cumplan los requerimientos técnicos, legales y administrativos.

Fuente: SIAFI al 30/09/2023

1.2 INVERSIÓN INSTITUCIONAL

Cuadro No.2

Inversión Pública (PIP) al 30 de Septiembre de 2023

Cifras en Millones de Lempiras

Institución / Tipo de Inversión	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejec. (Ejc./Vig.)
0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social	1,727.3	738.5	42.8%
0028 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal	125.1	30.0	24.0%
0030 - Secretaría de la Presidencia	10.9	0.0	0.0%
0033 - Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos	300.0	205.0	68.3%
0037 - Servicio de Administración de Rentas	173.4	93.0	53.7%
0039 - Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios	134.4	35.4	26.3%
0042 - Cuerpo de Bomberos de Honduras	40.7	15.0	36.9%
0044 - Instituto Nacional Penitenciario	201.5	0.0	0.0%
0050 - Secretaría de Educación	483.9	65.7	13.6%
0060 - Secretaría de Salud	747.5	261.4	35.0%
0070 - Secretaría de Seguridad	200.4	34.4	17.2%
0091 - Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil	1.7	0.0	0.0%
0100 - Secretaría de Finanzas	115.8	90.1	77.8%
0101 - Comisión Nacional de Telecomunicaciones	386.2	49.3	12.8%
0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería	1,552.1	95.9	6.2%
0144 - Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible	75.4	61.4	81.5%
0150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente	725.0	445.5	61.4%
0243 - Dirección Nacional de Parques y Recreación	28.0	17.6	62.9%
0244 - Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer	22.0	13.9	62.9%
0406 - Secretaría de Asuntos de la Mujer	25.0	0.0	0.0%
0411 - Secretaría de Infraestructura y Transporte	2,041.9	1,195.4	58.5%
0412 - Secretaría de Desarrollo Social	12.8	3.8	29.8%
0413 - Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación	495.0	164.7	33.3%
0414 - Dirección de Gestión por Resultados	207.5	5.4	2.6%
0415 - Programa de la Red Solidaria	2,946.7	517.1	17.5%
0416 - Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento	593.3	337.7	56.9%
0503 - Instituto Nacional de Formación Profesional	69.9	0.0	0.0%
0505 - Instituto Hondureño de Antropología e Historia	5.2	1.6	31.0%
0511 - Universidad de Ciencias Forestales	30.0	6.6	21.9%
0515 - Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación	10.0	0.0	0.0%
0702 - Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán	10.0	0.0	0.0%
0703 - Universidad Nacional de Agricultura	37.5	0.2	0.5%
0708 - Hospital Escuela Universitario	127.1	0.0	0.0%
0801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica	2,254.1	1,259.2	55.9%
0803 - Empresa Nacional Portuaria	16.1	0.0	0.0%
0806 - Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola	8.9	1.3	14.6%
0807 - Suplidora Nacional de Productos Básicos	227.3	62.8	27.6%
0809 - Empresa de Correos de Honduras	6.5	4.9	75.1%
1801 - Alcaldía Municipal del Distrito Central	309.9	37.8	12.2%
Total Inversión Productiva	16,485.7	5,850.7	35.5%

Cuadro No.2
Inversión Pública (PIP) al 30 de Septiembre de 2023
 Cifras en Millones de Lempiras

Institución / Tipo de Inversión	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejec. (Ejc./Vig.)
0003 - Comisionado Nacional de Derechos Humanos	0.2	0.2	99.3%
0028 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal	100.2	0.1	0.1%
0039 - Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios	10.0	5.0	50.0%
0040 - Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización	79.0	52.3	66.1%
0045 - Instituto Nacional de Migración	0.7	0.0	0.0%
0050 - Secretaría de Educación	1,032.0	155.5	15.1%
0060 - Secretaría de Salud	7,589.1	2,887.5	38.0%
0070 - Secretaría de Seguridad	153.0	109.7	71.7%
0080 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.	127.4	86.9	68.3%
0090 - Secretaría de Defensa	150.7	75.1	49.9%
0130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social	3.0	1.3	44.1%
0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería	1,300.0	1,145.2	88.1%
0141 - Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria	0.1	0.0	6.2%
0180 - Registro Nacional de las Personas	1.5	0.7	48.2%
0242 - Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia	104.0	66.9	64.4%
0300 - Secretaría de Derechos Humanos	2.0	0.4	18.7%
0301 - Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas	3.8	0.8	22.3%
0310 - Secretaría de Energía	13,365.9	4,770.1	35.7%
0406 - Secretaría de Asuntos de la Mujer	37.3	16.8	44.9%
0410 - Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras	22.6	11.3	50.1%
0412 - Secretaría de Desarrollo Social	102.8	101.6	98.9%
0415 - Programa de la Red Solidaria	749.2	316.5	42.2%
0417 - Programa de Acción Solidaria	1,447.4	1,154.3	79.8%
0500 - Instituto Nacional Agrario	7.2	5.3	74.2%
0501 - Instituto Hondureño de Turismo	0.7	0.0	0.8%
0505 - Instituto Hondureño de Antropología e Historia	0.0	0.0	0.0%
0506 - Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas	0.1	0.1	78.3%
0507 - Inst. Hondureño para Prev. y Trat. del Alcohol, Drog. y Farm.	1.2	1.2	100.0%
0511 - Universidad de Ciencias Forestales	14.5	8.6	59.4%
0601 - Instituto Hondureño de Seguridad Social	8.1	0.0	0.0%
0602 - Inst. Nal. de Jubi. y Pen. de los Emp. y Fun. del Poder Ejec.	5,930.5	4,699.2	79.2%
0603 - Instituto Nacional de Previsión del Magisterio	6,994.4	5,226.8	74.7%
0604 - Instituto de Previsión Militar	2,127.7	1,492.8	70.2%
0708 - Hospital Escuela Universitario	181.0	1.1	0.6%
0803 - Empresa Nacional Portuaria	28.4	19.5	68.9%
Total Inversión Social	41,675.3	22,412.9	53.8%
Total Formación Bruta de Capital	19,059.1	5,227.1	27.4%
Total general	77,220.2	33,490.7	43.4%

Fuente: SIAFI, al 30 de septiembre de 2023

A nivel institucional la Ejecución de la **Inversión Productiva** ha sido de **L5,850.7 millones (35.5%)**, las instituciones con mayores montos ejecución al III trimestre del 2023 son: La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) L1,259.2 (55.9%), La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) L1,195.4 millones (58.5%), Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) L738.5 (42.8%), Programa de la Red Solidaria (PRS) L517.1 millones (17.5%), Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente L445.5 (61.4%) lo anterior en relación con el presupuesto vigente. Ver detalle en el cuadro No.2.

En cambio, la ejecución de la **Inversión Social** corresponde a **L22,412.9 millones (53.8%)** la cual está concentrada en siete instituciones como ser: Instituto Nacional de Previsión del Magisterio L5,226.8 millones (74.7%); Secretaría de Energía L4,770.1 millones (35.7%); el Instituto Nacional

Dirección General de Inversiones Públicas

de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y funcionarios del Poder Ejecutivo L4,699.2 millones (79.2%); la Secretaría de Salud L2,887.5 millones (38.0%); el Instituto de Previsión Militar L1,492.8 millones (70.2%); (Programa de la Red Solidaria (PRS) L1,154.3 millones (79.8%), y Secretaría de Agricultura y Ganadería L1,145.2 (88.1%). Ver detalle en el cuadro No.2.

Cuadro No 3
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA (BCH), AÑO 2023
 Cifras en Lempiras

INSTITUCION	Presupuesto Vigente	Devengado Aprobado	% Ejecución (Dev./ Vig.)
0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social	229.1	159.4	69.6%
0030 - Secretaría de la Presidencia	10.9	0.0	0.0%
0039 - Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios	134.4	35.4	26.3%
0042 - Cuerpo de Bomberos de Honduras	40.7	15.0	36.9%
0044 - Instituto Nacional Penitenciario	201.5	0.0	0.0%
0050 - Secretaría de Educación	298.7	41.6	13.9%
0091 - Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil	1.7	0.0	0.0%
0101 - Comisión Nacional de Telecomunicaciones	186.2	0.0	0.0%
0150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente	725.0	445.5	61.4%
0411 - Secretaría de Infraestructura y Transporte	1,428.9	624.9	43.7%
0412 - Secretaría de Desarrollo Social	12.8	3.8	29.8%
0413 - Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación	495.0	164.7	33.3%
0503 - Instituto Nacional de Formación Profesional	69.9	0.0	0.0%
0511 - Universidad de Ciencias Forestales	30.0	6.6	21.9%
0515 - Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación	10.0	0.0	0.0%
0702 - Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán	10.0	0.0	0.0%
0703 - Universidad Nacional de Agricultura	37.5	0.2	0.5%
0708 - Hospital Escuela Universitario	127.1	0.0	0.0%
0806 - Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola	8.9	1.3	14.6%
0807 - Suplidora Nacional de Productos Básicos	227.3	62.8	27.6%
0809 - Empresa de Correos de Honduras	6.5	4.9	75.1%
Total General PIP-BCH	4,292.2	1,566.0	36.5%

Fuente: SIAFI, al 30/09/23

Asimismo, dentro de la ejecución presupuestaria se incluyen proyectos financiados con Fondos del Banco Central de Honduras (BCH), dicha ejecución asciende a **L1,566.0 millones**, de L4,292.2 millones vigentes al tercer trimestre, con un **36.5%** de ejecución respecto a su presupuesto asignado. Ver detalle en el cuadro No. 3.

Gráfico No.1
Comparativo Inversión Pública 2022 - 2023
Vigente / Devengado
 Cifras en Millones de Lempiras




El desempeño de la ejecución de la Inversión Pública al tercer trimestre del 2023 a nivel de devengando, muestra un incremento de 27.1 puntos porcentuales en comparación con el tercer trimestre del año 2022 que fue de 16.3, lo cual impacta directamente en la ejecución de los programas sociales y proyectos productivos, que en su mayoría los proyectos están orientados a generar un beneficio económico en el país, que contribuyen al incremento de los activos no financieros de las entidades que integran el Sector Público y los bienes y servicios de dominio público, con el fin de iniciar, ampliar, mejorar, modernizar, reponer o reconstruir la capacidad productiva de bienes y la prestación de servicios nacionales.

Asimismo, se observa que el presupuesto vigente para el año 2023 de L77,220.2 millones tiene un incremento del 611.3% es decir (L66,364.3 millones) en relación con el presupuesto vigente 2022 de L10,855.9 millones. Incremento considerable debido a que el actual gobierno está realizando una gran apuesta a la Inversión Pública Productiva y Social en proyectos enfocados al Plan de Gobierno para Refundar Honduras.

1.3 INVERSIÓN PÚBLICA POR ESTRUCTURA DEL SECTOR PÚBLICO, (SIAFI)

Gráfico No.2
Inversión Pública por Estructura del Sector Público
L77,220.2 millones Vigente, al 30 de Septiembre de 2023
 Cifras en millones de Lempiras

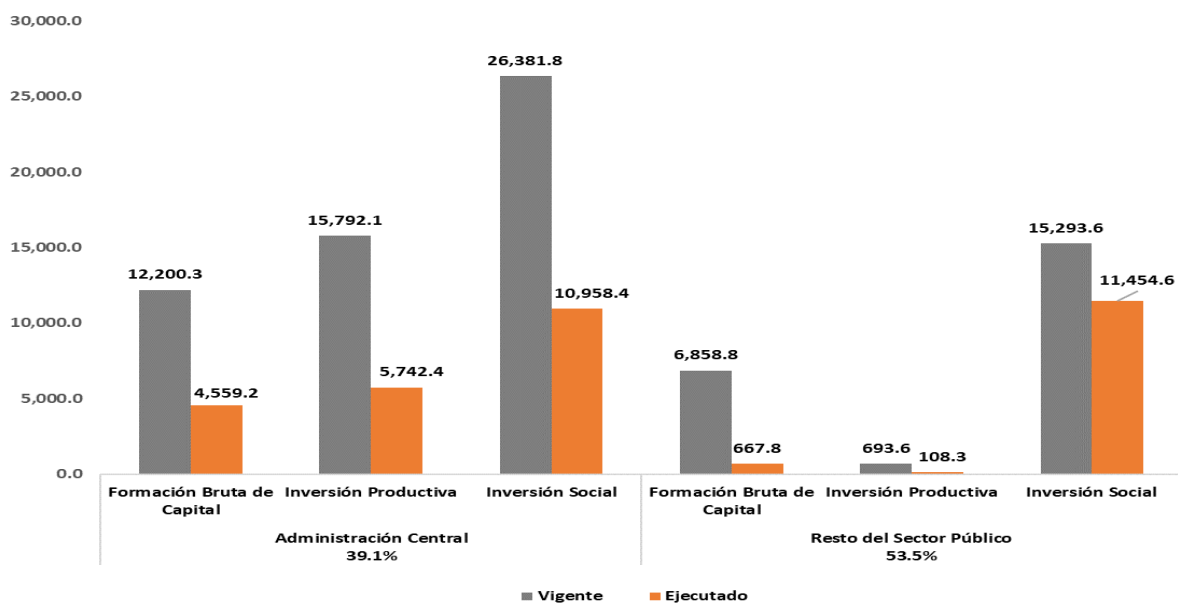

Dirección General de Inversiones Públicas

La distribución del PIP para el tercer trimestre 2023 de acuerdo con la Clasificación del Sector Público, muestra un Presupuesto vigente de **L77,220.2 millones** reportado en el SIAFI, reflejando una ejecución de **L33,490.7 millones; 43.4%** respecto al presupuesto vigente.

L54,374.2 millones, corresponden a la Administración Central, y para el Resto del Sector Público **L22,846.0 millones**, con ejecución de **(L21,260.0 millones AC, 39.1%); L12,230.7 millones RSP 53.5%)**. Ver Gráfico No.2 y Cuadro No. 4

Cuadro No. 4
Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2023

SECTOR PÚBLICO


Cifras en millones de Lempiras

Sector Público	Presupuesto Vigente	Devengado Aprobado	% Ejecución (Ejecutado/Vigente)
Inversión Productiva	16,485.7	5,850.7	35.5%
Administración Central	15,792.1	5,742.4	36.4%
Resto del Sector Público	693.6	108.3	15.6%
Inversión Social	41,675.3	22,412.9	53.8%
Administración Central	26,381.8	10,958.4	41.5%
Resto del Sector Público	15,293.6	11,454.6	74.9%
Formación Bruta de Capital	19,059.1	5,227.1	27.4%
Administración Central	12,200.3	4,559.2	37.4%
Resto del Sector Público	6,858.8	667.8	9.7%
Total General Inversión	77,220	33,491	43.4%

Fuente: SIAFI, 30/09/2023

1.4 LA INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL DE SECTOR (PRODUCTIVA Y SOCIAL)

Gráfico No.03
Inversión Pública: Distribución Sectorial
Presupuesto Vigente L77,220.2 millones
Al 30 de Septiembre de 2023
Cifras en Millones de Lempiras

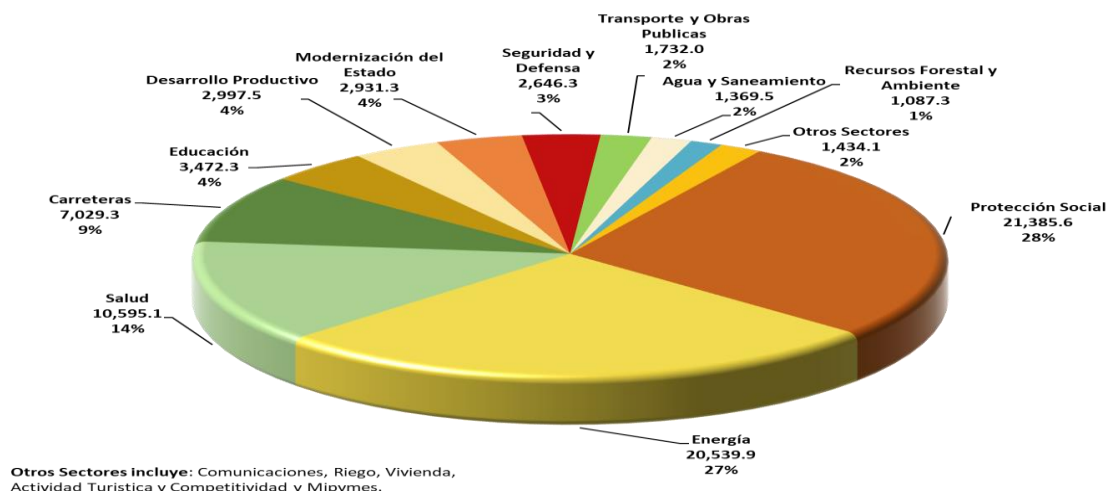

Dirección General de Inversiones Públicas

En cuanto a la Inversión Sectorial, El **Sector Protección Social** con **L21,385.6 millones (28%)**, y una ejecución de **L13,710.0 millones (64%)**, incluye los aportes en Transferencias Monetarias de la Red Solidaria, así como programas sociales, que incluye; merienda escolar, otras inversiones con la intervención en Acceso y mejoramiento de vivienda, Generación de Empleo, acceso a créditos a emprendedores, ayuda a grupos vulnerables, apoyo a los centros de atención a adultos mayores y algunos proyectos ejecutados por el Fondo Hondureño de Inversión Social.

El **Sector Energía** cuenta con un monto de inversión **L20.539.9 millones (27%)** de los cuales se ha ejecutado **L6,623.4 millones (32%)**; para la ejecución de los proyectos de: Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral-Río Lindo, Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Regional (MER). Electrificación Rural en Lugares Aislados y Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica, así como, Subsidios focalizado hasta 75 y 150 KW, Subsidio de Combustibles e Inversión en generación de energía.

Seguido el **Sector Salud** con una inversión de **L10,595.1 millones (14%)** y una ejecución de **L3,243.5 millones (31%)**, para la cobertura de los servicios de salud y la red hospitalaria del País, a través de la contratación de gestores en el Primer Nivel y Segundo Nivel de atención y para la ejecución de los proyectos como la iniciativa regional de eliminación de la malaria, y la continuidad de los proyectos de respuesta a emergencia Honduras por el Covid 19, así como respuesta inmediata de salud pública para contener y controlar el coronavirus, el diseño y construcción de hospitales, además de la Red hospitalaria del País y la Adquisición de Medicamentos.

El **Sector Carretero** con una inversión **L7,029.3 millones (9%)** y una ejecución de **L4,321.7 millones (61%)**, para la Construcción y Pavimentación con Concreto Hidráulico para varios Tramos Carreteros del país como ser: Siguatepeque - La Esperanza, Peña Blanca - Los Naranjos, Amapala - San Antonio de Cortés, la Carretera Central, Tramo: "Marale - Empalme Carretera Yoro; así como Obras de Mitigación para el Control de Riesgos Geotécnicos y Geológicos, y la reconstrucción del Puente Guaciropo.

Seguido el **Sector Educación** con una inversión de **L3,472.3 millones (4%)** con una ejecución de **L773.7 millones (22%)**; ejecutando el Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y su Gestion Local (PROMINE), Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo (Proyecto Joven), asimismo, incluye Becas y Matricula gratis.

Seguido **Seguridad Alimentaria (Desarrollo Productivo)** con una inversión de **L2,997.5 millones (4%)** y un ejecutado de **L1,430.5 millones (48%)**, en apoyo a la población más vulnerable, beneficiando a los agricultores mediante la cadena agrícola, a través de la ejecución de los principales proyectos: Proyecto COMRURAL, Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad, Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur Occidental Pro-Lenca y el Proyecto de inclusión económica y social de pequeños productores rurales en la región noreste de Honduras (PROINORTE). Asimismo, una inversión de L1000.0 millones, para el Bono Tecnológico Productivo con el propósito de garantizar la seguridad alimentaria, para beneficiar a 300,000 productores, en 17 departamentos (Priorizados Olancho y el Paraíso).

1.5 FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PUBLICA GLOBAL


El 70.3% de la **Inversión Pública Global** del Presupuesto Vigente es financiado por fondos nacionales (Fuentes 11 Tesoro Nacional y 12 Recursos Propios) y el 29.7% por fondos externos; de estos el 96% es financiado por Crédito Externo (Fuente 21) y el 4% por Donaciones (Fuentes 22

Dirección General de Inversiones Públicas

Donaciones Externas, 23 Apoyo Presupuestario y 27 Alivio de la Deuda). Principalmente con recursos provenientes del BID, BCIE, BM, JICA, el Gobierno de España y el Gobierno Alemán.

En cuanto a la ejecución presupuestaria por fuente 45.9% corresponde a Fondos Nacionales, 38.1% a crédito Externo y 22.3% a Donaciones Ver Gráfico No. 4 y Cuadro No.5.

Gráfico No.4
Inversión Pública por Fuente de Financiamiento
L77,220.2 millones vigente, al 30 de Septiembre de 2023
 Cifras en Millones de Lempiras

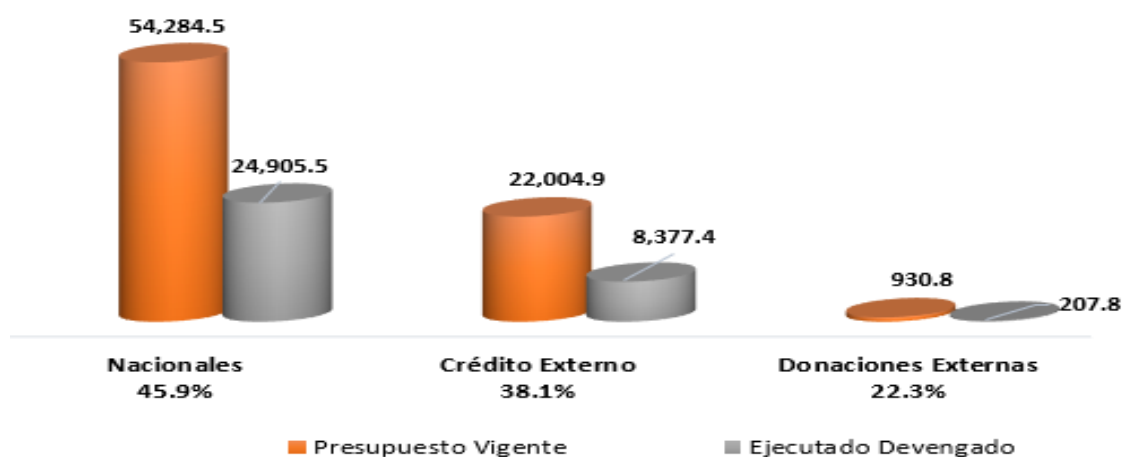

Cuadro No.05

Inversión Pública Global por Fuente de Financiamiento al 30 de Septiembre de 2023

Cifras en Millones de Lempiras

Fuente de Financiamiento	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución (Ejec./Vig.)
Nacionales	54,284.5	24,905.5	45.9%
Crédito Externo	22,004.9	8,377.4	38.1%
Donaciones Externas	930.8	207.8	22.3%
Total, Plan de Inversión	77,220.2	33,490.7	43.4%

Fuente: SIAFI, 30/09/2023

1.6 PROGRAMAS SOCIALES

Son aquellas intervenciones orientadas al Desarrollo Humano que están formuladas en programas institucionales y no están registradas en el SNIPH, y corresponden a Programas Sociales en beneficio de la población beneficiada. (no cuentan con un código BIP).


Al tercer trimestre de 2023, dichas inversiones han ejecutado L22,412.9 millones correspondientes al 53.8% de los recursos asignados. Dicha ejecución se concentra un 95.4% (L21,375.9 millones) en

Dirección General de Inversiones Públicas

siete instituciones como ser: la Secretaría de Salud para la provisión de servicios de salud de primer y segundo nivel de atención (Servicios Hospitalarios), la Secretaría de Agricultura y Ganadería para la ejecución de los Bonos Productivo, Cafetalero y Ganadero en apoyo a la seguridad alimentaria, la Secretaría de Energía a través de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica para el otorgamiento de subsidios de energía de 75 y 150 Kwh; el Programa de Acción Solidaria para la entrega de la merienda escolar, el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo, el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio y el Instituto de Previsión Militar para el otorgamiento de beneficios de previsión y servicios sociales. Ver Cuadro No 2.

1.7 EJECUCIÓN HISTÓRICA PERÍODO 2019 - 2023:

Gráfico No 5
Inversión Pública Ejecución Histórica
01 de Enero al 30 de septiembre
(Periodo: 2019-2023)
(Cifras en Millones de Lempiras)

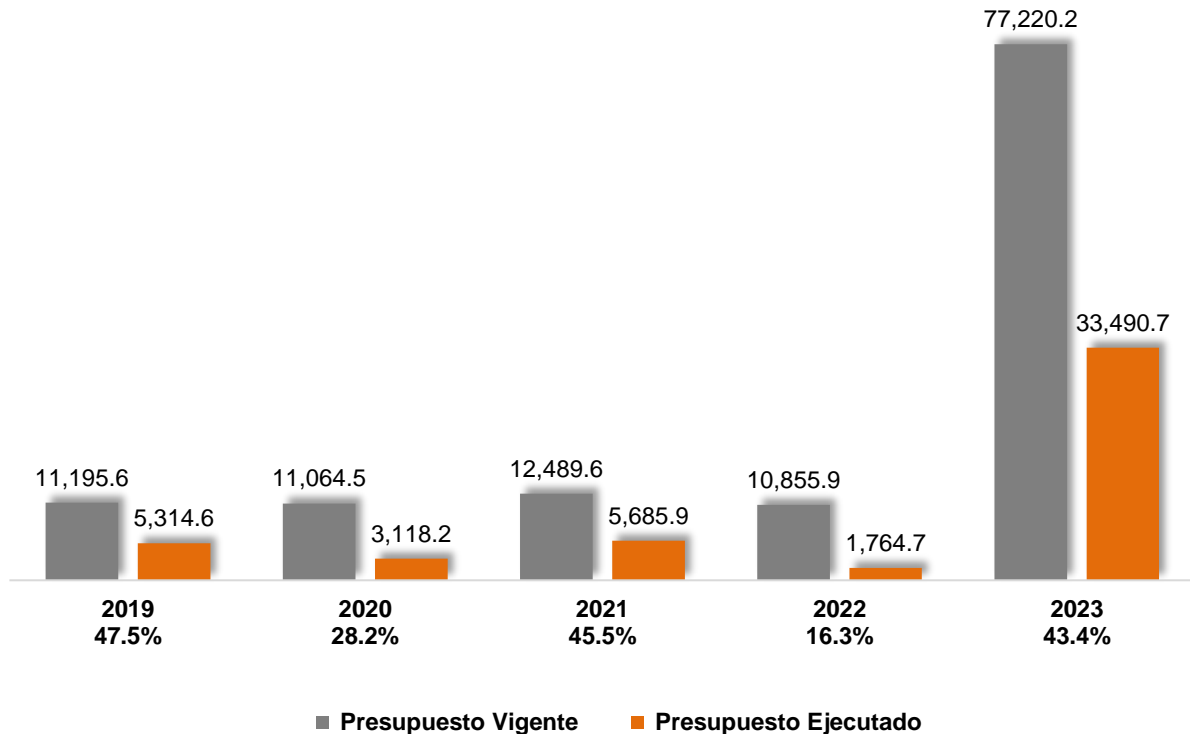

La ejecución total acumulada al 30 de septiembre de 2023 asciende a L33,490.7 millones (43.4%), respecto al presupuesto vigente L77,220.2 millones, registra una ejecución satisfactoria en comparación al año 2022, evidenciando para el año 2023, 27.1 puntos porcentuales arriba del 2022 (16.3%). Esta ejecución se debe a que en algunas unidades ejecutoras sus presupuestos ya se encuentran alineados con las prioridades del Gobierno.

Por otra parte, para los años del 2019 al 2021 la ejecución porcentual promedio fue de 21.6% situando 7.5% debajo de la ejecución con relación al año 2023 que es de 29.1%.

Por otra parte, durante el tercer trimestre como parte de las acciones de la inversión pública que financia el gobierno, en el presente informe se adiciona la Formación Bruta de Capital con un presupuesto vigente de L19,059.1 millones y una ejecución de L5,227.1 (27.4%), dicha ejecución contempla Bienes Capitalizables (Grupo 40000) para las instituciones del sector público, representando incremento de los activos fijos financieros del país, como reparaciones menores, compra de maquinaria y equipo.

1.8 EJECUCIÓN FÍSICA A NIVEL DE SECTORES:

Los avances al Tercer Trimestre de la ejecución física respecto al PIP y a Nivel de Sector se muestran a continuación:

1.8.1 Sector Carreteras:

Al Tercer Trimestre se registraron diferentes avances de ejecución de sus proyectos de construcción de carreteras ejecutados a través de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).

Proyectos ejecutados por la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT):

Al tercer trimestre de 2023, se detallan los avances físicos de los principales proyectos:

- ✓ **Construcción y Pavimentación de 15.33 KM con Concreto Hidráulico del Tramo Carretero: la Ena - San José de Río Tinto - Dulce Nombre de Culmí, subtramo: "Puente Río el Pataste - Dulce Nombre de Culmí" en el Departamento de Olancho. Fondos Nacionales.**

Durante el tercer trimestre, el proyecto realizó las siguientes actividades:

- Subexcavación de zonas inestables
- Afinamiento de Subbase en tramo 15+100 - 15+300 Ambos Lados, 15 CMS.
- Colocando Material de Subbase con espesor de 15 cm en tramo 11+040 - 11+260 Ambos Lados
- Subbase Estabilizada del tramo 14+060 - 14+130 Lado Derecho con 5% cemento, utilizando 132 bolsas
- Relleno y compactación de TCR en salida de Alcantarilla de 30 pulgadas en estaciones 1+368
- Remoción de alcantarilla existente 24 pulgadas en estación 1+565.28 Lado Derecho.
- Construcción de Tragante de 30 pulgadas 9+964 lado derecho.
- Construcción de subdrenaje transversal Est. 10+325, Long= 18m.
- Construcción de subdrenaje longitudinal tramo 13+270 - 13+390 lado izquierdo.

El proyecto presenta un avance físico del 9.44% correspondiente a 1.5 kilómetros de carretera construidos y pavimentados.

- ✓ **Construcción y Rehabilitación Vial con Concreto Hidráulico del Corredor de Occidente, Tramo Carretero: "Naco - La Entrada" (79.1 km), Localizado en los Departamentos de Santa Bárbara y Copán; Fondos Nacionales.**

Dirección General de Inversiones Públicas

La ejecución física del proyecto es a través de tres subtramos ubicados en el corredor de occidente, los cuales al 30 de septiembre de 2023 presentan el siguiente avance físico:

- Subtramo Naco - Quimistan: Cuenta con una ejecución física de 2.47 km de carretera rehabilitada con un avance del 8.76% de la meta esperada en este subtramo (28.2 km).
- Subtramo Quimistan - Sula: Cuenta con una ejecución física de 0.95 km de carretera rehabilitada con un avance del 4.11% de la meta esperada en este subtramo (23.0 km).
- Subtramo Sula - La Entrada: Cuenta con una ejecución física de 0.94 km de carretera rehabilitada con un avance del 3.38% de la meta esperada en este subtramo (29.9 km).

Por medio de este proyecto se espera la Construcción y rehabilitación de 81.1 km, de los cuales al 30 de septiembre de 2023, se cuenta con 4.36 km rehabilitados, representando un avance físico del 5.37%.

- ✓ **Proyecto Obras de Mitigación para el Control de Riesgos Geotécnicos y Geológicos, por Deslizamientos y Desprendimientos de Roca de Taludes de corte en la Carretera CA5-Sur, Tramo "Moramulca", fase I; Fondos Nacionales.**

Durante el III trimestre de 2023, la empresa constructora realizó las siguientes actividades:

- Construcción de dados de anclaje de postes de barreras 1, 2, 3, 4
- Perforaciones para tensores
- Trabajo de anclaje en barreras
- Instalación de tres barreras

Este proyecto es ejecutado por la empresa ICA INVERSIONES y presenta un avance físico del 80%.

- ✓ **Rehabilitación con Concreto Hidráulico Sobre la Carpeta Asfáltica Existente del Tramo Carretero: Tegucigalpa - El Guanábano (RN15), Longitud 7.22 km (Salida a Olancho); Fondos Nacionales.**

El proyecto al cierre del III Trimestre de 2023 presenta un avance físico equivalente al 21.17% que corresponden a trabajos de terracería, drenaje transversal y longitudinal, excavación estructural, remoción de alcantarillas, muros de mampostería, mampostería para obras de drenaje, demoliciones, imprimación asfáltica, bacheo superficial, mantenimiento en ruta alterna El Lolo, reciclado de estructura existente, rigidización de base, pavimentación y administración delegada. Se presentan 1.48 km de carretera construida.

El retraso acumulado al cierre de septiembre 2023 es crítico y requiere la toma de decisiones urgentes para asegurar la finalización del proyecto dentro del plazo contractual como ser:

- Liberación del derecho de vía en estaciones 0+000 y 2+000. Se requiere apoyo por parte de la AMDC.
- Señalización de todos los frentes de trabajo para evitar cualquier tipo de accidente.
- Reuniones conjuntas entre SIT - UMAPS - CONASH para analizar la posible construcción del sistema de agua potable con tubería PCV SDR-17.

El Proyecto es ejecutado por empresa constructora William y Molina.

Dirección General de Inversiones Públicas

- ✓ **Construcción y Pavimentación con Concreto Hidráulico del Tramo Carretero: "Portillo del Lobo-Reitoca - Curarén" (39.54 km), Localizado en los Departamentos de Francisco Morazán y Choluteca; Fondos Nacionales.**

Durante el tercer trimestre, el proyecto realizó las siguientes actividades:

- Construcción de muro de concreto ciclópeo.
- Instalación de alcantarillas.
- Perfilado de cunetas.
- Reubicación de líneas primarias y secundarias del sistema eléctrico.
- Instalación de tragantes y cabezales.

El proyecto presenta un avance físico del 17.77% correspondiente a 1.83 kilómetros de carretera construidos y pavimentados.

- ✓ **Construcción y Pavimentación de 79.1 km con Concreto Hidráulico del Corredor de Oriente, Tramo Carretero: "Las Lomas - Terrero Blanco, Ruta 53" y Elaboración del Estudio y Diseño del Tramo Carretero: Ruta 119"; para la: Fondos Nacionales.**

La etapa 1 del proyecto es ejecutada por la empresa SERMACO y a la fecha presenta una ejecución física del 38.25% que representa 11.59 kilómetros de carretera construida en el tramo Las Lomas - El Jicarito.

La etapa 2 del proyecto es ejecutada por la empresa COSCO y a la fecha presenta una ejecución física del 28.02% que representa 8.49 kilómetros de carretera construida en el tramo El Jicarito - Terrero Blanco.

- ✓ **Rehabilitación del Tramo Carretero: "Siguatepeque - La Esperanza" (67.00 Km), Localizado en los Departamentos de Comayagua e Intibucá; Fondos Nacionales.**

Avance Físico:

El proyecto se ejecuta por tramos a través de la contratación de la empresa PRODECON para el tramo Jesús de Otoro - La Esperanza (L 331,742,705.81) y la empresa SERMACO para el tramo Siguatepeque - Jesús de Otoro (L 320,574,128.50).

Tramo Carretero Siguatepeque - Jesús de Otoro: Presenta un avance físico del 4.69% que representa 1.5 kilómetros de carretera rehabilitada. Este tramo es ejecutado por la empresa SERMACO.

Tramo Carretero Jesús de Otoro - La Esperanza: Se realizó el relleno y compactación de material selecto en varias estaciones del tramo, reubicación de tubería PVC, suministro, excavación, instalación y ligado de alcantarilla transversal.

- ✓ **Programa Caminos Productivos**

El Programa Nacional de Intervención en Caminos Productivos, es una iniciativa del Gobierno de la República ejecutado por la SIT en respuesta a la necesidad de proyectos de infraestructura en los municipios del país, orientada al mejoramiento, fortalecimiento y construcción de infraestructura vial terciaria y vecinal a través de la ejecución de 4 tipos de proyectos: conectividad de caminos,

Dirección General de Inversiones Públicas

cajas puentes, vados y alcantarillados, que permitan optimizar los procesos de distribución por parte de los sectores productivos del país.

Una vez firmado el Convenio Marco, La AMHON y SGJD por medio de las y los gobernadores, realizarán una socialización del Programa de Caminos Productivos. Las gobernaciones en conjunto con las municipalidades identificarán y priorizarán los proyectos para ejecutar en sus respectivos municipios para dar uso a los fondos disponibles de la SIT.

Tipos de proyectos a ejecutar por medio del programa Caminos Productivos:

- Caminos: Huellas de concreto, adoquinado, pavimento con empedrado
- Cajas Puente
- Vado
- Alcantarillado: Drenaje pluvial, Cunetas, Tubería para drenaje

Bajo este programa, la SIT ha realizado transferencias a 296 municipalidades con un monto devengado de L 557.2 millones al 30 de septiembre de 2023 que representa un 99% de ejecución presupuestaria. Con lo cual impulsaran la economía de las comunidades mejorando el acceso a las zonas productivas del país.

Para el tercer trimestre se programó la ejecución de 16 metros lineales de los cuales se ejecutaron 10 metros lineales equivalente al 62.5% de ejecución física.

1.8.2 Sector De Protección Social:

Los principales rubros de inversión están destinadas a inversión en desarrollo humano en las poblaciones más vulnerables. Al tercer trimestre las distintas Instituciones del Sector, registran los siguientes avances físicos:

Proyecto Ejecutado por la Red Solidaria

- ✓ **Proyecto de Apoyo a Poblaciones Vulnerables Afectadas por el Coronavirus (BID 5289/BL-HN).**

Avance físico:

El proyecto al III trimestre de 2023 realizó las siguientes actividades.

- Realizó entrega de TMC en el mes de Julio para aproximadamente **12,664 hogares beneficiarios**, por un monto de L50,909,280 la unidad ejecutora está a la espera de la liquidación por parte de BANADESA para contabilizar los hogares beneficiarios.
- Asimismo, se tiene programada en el mes de noviembre una segunda entrega de TMC para **104,639 hogares beneficiarios**.
- Se realizaron las contrataciones de las consultorías que garantizan la operatividad técnica, financiera, adquisiciones y monitoreo de la Unidad Coordinadora de Proyectos quienes garantizan la ejecución de la operación.

Proyecto Ejecutado Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL):

- ✓ **Proyecto Fortalecimiento en el Sistema de Extracción, Almacenamiento y Distribución del Servicio de Agua Potable y afianzamiento de la Seguridad Alimentaria para mejorar las condiciones de salud y bienestar en los municipios de San Francisco de Becerra y Dulce Nombre de Culmí en el Departamento de Olancho, Fondos Nacionales.**

Avances físicos:

- Construcción de la planta potabilizadora de agua, en el casco urbano de San Francisco de Becerra, Olancho; **la obra presenta un avance físico del 80%.**
- Construcción de 1 tanque de almacenamiento de agua potable con capacidad de 50,000 galones, en el municipio de San Francisco de Becerra, Olancho; **la obra presenta un avance físico del 95%.**

Proyectos ejecutados por el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS):

- ✓ **Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB), (BID 4518/BL-HO):**

Los principales avances físicos al 30 de Septiembre de 2023 son los siguientes:

- **Mejoramiento de Barrios:** Ejecución de obras del Proyecto de Integración Urbana en colonias Altos de la Quezada, La Huerta, Villas San Miguel, Brisas del Roble, y Altos del Mirador para un total de 633 predios; el monto del contrato es de L. 55,100,000. se tiene un **avance físico del 100%** que corresponde a la construcción de pozos e instalación de tuberías del sistema de alcantarillado sanitario, instalación de tubería para el sistema de agua potable, construcción de cunetas y pavimentación de calles con un avance financiero del 88.4%.
- **Programa de Deportes y Valores:** en ejecución continua y participan aproximadamente **700 jóvenes** de las colonias intervenidas por el programa.

Durante el trimestre, se han ejecutado capacitaciones para jóvenes en temas de salud y se registran 702 asistencias; teniendo un avance financiero del 72%.

- **Capacitación y Empleabilidad:** en el mes de junio de 2022 inició el curso de diseño gráfico a través de la fundación CADERH, donde finalizaron 15 participantes (8 mujeres) graduados en marzo del año 2023, al mes de Septiembre del año 2023 a través de convenios con CADERH se realizaron tres talleres de capacitación donde participaron: 15 jóvenes (9 mujeres) en alfabetización digital, 11 personas (2 mujeres) en Ilustrador para publicistas y 21 (10 mujeres) personas en serigrafía.
- ✓ **Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras (PRE); IDA 6822-HN**

Los principales avances físicos al 30 de septiembre de 2023 son los siguientes:

Infraestructura Educativa:

- 25 subproyectos de reposición, reparación y ampliación de centros educativos adjudicados por un monto de L88,133,682.603 y para la supervisión L9,862,732.25. Las obras han dado inicio en noviembre de 2022. La ejecución al cierre del 3er trimestre 2023 es de L 60,518,268.31.
- Un segundo paquete consta de 17 subproyectos los cuales iniciaron su ejecución en el presente trimestre por un monto de L127,025,993.67 y para la supervisión L17,661,922.00. La ejecución al cierre del 3er trimestre 2023 es de L26,306,113.92.
- Un tercer paquete de 23 subproyectos se encuentra en reformulación por los técnicos del proyecto.
- Un cuarto paquete de 39 subproyectos se encuentra pendiente de reformulación próximos a ser abordados por los técnicos del proyecto por un monto aproximado de L134,503,621.56.

Agua y Saneamiento:

- Subproyectos de agua y saneamiento han iniciado ejecución en el tercer trimestre del año. El monto de contrato es de L80,013,832.68 y para la supervisión L9,862,732.25. Al cierre del tercer trimestre se han ejecutado un monto total de L22,135,956.22.
- 9 subproyectos de agua y saneamiento se encuentran en reformulación con un monto presupuestado de L274,282,300.00.

Infraestructura Vial:

- Un total de 4 subproyectos se encuentran en evaluación y proceso de adjudicación, el monto presupuestado es de L43,855,886.41.
- 4 subproyectos viales se encuentran en proceso de reformulación para incluir actividades de medidas ambientales y de mitigación. El monto de presupuesto es de L42,996,000.00.

Infraestructura en Salud:

- 1 subproyecto de salud se encuentra en proceso de reformulación. El monto de presupuesto es de L13,849,204.38.

1.8.3 Sector Energía:

El Sector destina su inversión a la construcción, operación y mantenimiento de las centrales hidroeléctricas, inversión en obras relacionadas con la integración de Honduras al SIEPAC, electrificación de viviendas y transmisión eléctrica teniendo como propósito mejorar y ampliar la cobertura del servicio eléctrico para contribuir al crecimiento y desarrollo económico y social del país, mediante los Proyectos de Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral-Río Lindo, Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional (MER), Apoyo al Desarrollo Sostenible de las Energías Renovables, Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica, Electrificación Rural en Lugares Aislados y Sistemas Fotovoltaicos de la Red. Los avances al segundo trimestre se presentan a continuación.

Proyectos ejecutados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE):

- ✓ **Programa de Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional (MER), (BID 3103/BL-HO y GRT/SX-16864-HO):**
 - Al término del tercer trimestre de 2023, se gestionó y obtuvo el último desembolso de la operación previo a la fecha máxima establecida que era el 06 de julio de 2023.
 - Durante este periodo de evaluación, se recibió el último Informe de los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2022, enviado al BID mediante Oficio No.UCP-598-IV-2023 obteniendo respuesta el 11 de mayo de 2023 a través de documento O-CID/CHO-408/2023 en el cual el organismo financiador indica que no tiene observaciones y da por cumplido el Artículo 5.03 de las Normas Generales del Convenio de Préstamo en referencia.
 - Se culminó la consultoría para la elaboración del Informe de Evaluación Final de la operación, el cual concluye que la clasificación de la eficiencia para el programa es Excelente.
 - La operación tuvo precios bastantes competitivos, lo cual permitió financiar actividades adicionales que son parte de la operación.
 - En el tercer trimestre del 2023 se completó el pago del anticipo del Contrato No.033/2023 para la Construcción y Pruebas de Ampliación de la Subestación Eléctrica de El Progreso 150 MVA, 230/138 KV, 150 MVA (Fase II), con lo cual se terminan de ejecutar los fondos de esta operación (La ENEE asumirá los costos restantes por las obras de este contrato).

Actualmente la operación está en cierre financiero, quedando únicamente pendiente el último pago por los servicios de Auditoría Externa.

- ✓ **Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaverl - Río Lindo, (BID 3435/BL-HO y JICA HO-P6):**

Convenio de Préstamo JICA HO-P6

- Se inició la ejecución de los trabajos para la Rehabilitación y Repotenciación de la Central Hidroeléctrica Río Lindo (Lote 2 “Equipo Generador de la Central Hidroeléctrica Río Lindo, Adquisición e Instalación de los Equipos Principales y Auxiliares”), Contrato No.77/2022 a ejecutarse en un periodo de 48 meses, reportándose un avance físico acumulado del contrato del 5% al mes de septiembre 2023.
- Se continúa avanzando en los trabajos para la Rehabilitación y Repotenciación de la Central Hidroeléctrica Cañaverl (Lote 1 “Equipo Generador de la Central Hidroeléctrica Cañaverl, Adquisición e Instalación de los Equipos Principales y Auxiliares”), Contrato No.122/2021, logrando un avance físico acumulado del contrato del 30%, que incluye avances en las actividades de ingeniería de detalle y avance de suministros.
- Se concluyó el proceso Licitación Pública Internacional para la Contratación de las Obras Civiles de las Centrales Hidroeléctricas de Cañaverl y Río Lindo (ENEE-01-LPI-O- Lote III- Paquete 1), lográndose la adjudicación del Lote No.1 Reemplazo de Grúas Puente, el cual está en proceso de firma de contrato.
- Se solicitó a la SEFIN ampliación del plazo de desembolsos del Acuerdo de Préstamo JICA HO-P6 presentado de conformidad a lo establecido en las Disposiciones Generales del Presupuesto 2023.

Convenio de Préstamo BID 3435/BL-HO

- Durante este período se recibió el último Informe de los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2022, mismo que fue remitido al BID mediante Oficio No.UCP-621-IV-2023 y atendido a través del documento O-CID/CHO-411/2023, el cual se recibió sin observaciones al respecto y se da por cumplido el Artículo 7.04 de las Normas Generales del Convenio de Préstamo en referencia.
 - Se concluyó el Informe de Evaluación Final de la operación, el cual se remitió al BID mediante Oficio UCP-340-II-2023.
 - La ejecución de la operación fue exitosa y mantuvo una calificación satisfactoria durante la vida del proyecto, generando incluso ahorros que permitieron realizar inversiones complementarias.
- ✓ **Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica (BID 4598/BL-HO 4599/SX-HO):**
- Se iniciaron las obras para la "Construcción de Subestaciones Eléctricas La Victoria 138/13.8 kV, 50 MVA y Subestación Eléctrica Calpules 138/13.8 kV, 2 X 50 MVA" (Contrato 124/2022 -Lote 1-Paquete 3) a ejecutarse en un periodo de 24 meses, al mes de septiembre 2023 se reporta un avance general del Contrato del 15%.
 - Se iniciaron las obras para la "Construcción de Subestación Eléctrica El Sitio 230/13.8 kV, 50 MVA; Ampliación Subestación San Pedro Sula Sur, 230 kV; Ampliación Subestación Eléctrica Santa Marta, 138/69kV, 50 MVA; Ampliación Subestación Eléctrica Santa Marta, 138kV, 15 MVARs; Ampliación Subestación Eléctrica Progreso, 230 kV; Ampliación Subestación Eléctrica Progreso, 138kV, 30 MVARs; y Construcción Línea Transmisión Doble Terna en 230kV entre las Subestaciones San Pedro Sula Sur-Progreso" (Contrato 125/2022 -Lote 2-Paquete 3) a ejecutarse en un periodo de 24 meses, al mes de septiembre 2023 están en proceso de aprobación la ingeniería de detalle y solicitudes proforma para importación de equipos.
 - Se iniciaron las obras para la "Ampliación Subestación Bermejo, 138kV, 30 MVARs; Ampliación Subestación La Puerta, 138kV, 30 MVARs; Ampliación Subestación Circunvalación, 138kV, 30 MVARs; Ampliación Subestación Comayagua, 138kV, 24 MVARs; Ampliación Subestación Villanueva, 138kV, 30 MVARs y Ampliación Subestación Zamorano, 138kV, 9 MVARs" (Contrato 126/2022 -Lote 3-Paquete 3) a ejecutarse en un periodo de 24 meses, al mes de septiembre 2023 están en proceso de aprobación la ingeniería de detalle y solicitudes proforma para importación de equipos.
 - En el marco del Contrato No.39/2021 se continúa avanzando en los trabajos de Construcción y Pruebas de Ampliación de Subestaciones San Buenaventura (SVB), San Pedro Sula Sur (SPSS) 230/138 kV y Línea de Transmisión Doble Terna 230 kV, reportándose un avance físico general en septiembre de 2023 del 15% y de forma

Dirección General de Inversiones Públicas

acumulada del 70% total del contrato; destacándose que los trabajos de las Subestaciones SBV y SPSS reportan un avance promedio acumulado del 98%.

- En el marco del Contrato No.03/2022, a septiembre de 2023 se ha logrado un avance general de 41% en la "Ampliación Subestación Eléctrica Toncontin 138/13.8 kV, 50 MVA" y un avance general de 38% en la "Ampliación Subestación Eléctrica Siguatepeque 138/13.8 kV, 50 MVA".

1.8.4 Sector Educación:

Este sector apoya la mejora de la calidad educativa a través de la capacitación a docentes, construcción de Aulas mediante los proyectos de Infraestructura escolar y Proyecto de Mejora de la Calidad educativa (proyecto Joven), Proyecto: "Mejoramiento de la Calidad de la Educación Prebásica en Honduras. Los avances al tercer trimestre en los proyectos son los siguientes:

Proyectos Ejecutados por Secretaría de Educación:

- ✓ **Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y de su Gestión Local (PROMINE) FASE IV y V:**

Para el tercer trimestre, se realizaron las siguientes actividades en la gira de supervisión:

- Visitas de supervisión, verificación de calidad de materiales, Calidad de Obra, Porcentajes de avance, verificación de Normativa, verificación de actividades de proyectos, construcción de huertos educativos y productivos actividades realizadas para 7 Centros Escolares Básicos (CEB), en los departamentos de Ocotepeque, Intibucá y la Paz.
- Recepción y seguimiento de expedientes de Legalización correspondientes a 3 Centros Educativos del Programa PROMINE, en Comayagua, Francisco Morazán y Olancho.

- ✓ **Proyecto: "Mejoramiento de la Calidad de la Educación Prebásica en Honduras" (IDA 6560-HN):**

Al tercer trimestre de presentan las siguientes actividades realizadas por el proyecto:

- Se elaboró el documento base de licitación para la contratación de la firma encargada de la Construcción del Modelo de Calidad de la Educación Prebásica en Honduras (MCEP), se envió la invitación a presentar "Solicitud de Propuestas (SDP)" a las 5 firmas que conforman la lista corta.
- Continua en evaluación de expresiones de interés para la contratación de la firma encargada de hacer la revisión y elaboración de los diseños y herramientas curriculares del nivel de Educación Prebásica, se espera que la adjudicación de este proceso sea en el siguiente trimestre
- Adquisición y distribución de materiales educativos para los espacios de aprendizaje a los Centros de Educación Prebásica a nivel nacional, se estará entregando el próximo año.
- Se recibieron 5 expresiones de interés para la contratación de El Diseño del diplomado Capacidades Pedagógicas para Docentes y Educadores en Educación Prebásica.

Dirección General de Inversiones Públicas

- Publicado el proceso “contratación de Contratistas para la Ejecución de Obras de Infraestructura Escolar en los departamentos de Copán, Lempira, Olancho y El Paraíso”, la contratación se realizará mediante una competencia nacional utilizando la Solicitud de Ofertas (SDO) obras menores, que se especifica en las “Regulaciones de Adquisiciones para los Prestatarios de Financiamiento para Proyectos de Inversión.
- Contratado el Coordinador de Supervisión de Obras, el cual dará monitoreo y dirigirá a los ingenieros supervisores para asegurar el cumplimiento de la estrategia de supervisión de obras de la fase I.
- Contratados 14 ingenieros/arquitectos que garantizan el cumplimiento de los alcances contractuales definidos para cada proyecto de infraestructura; con base en la Normativa establecida en el Manual Para la Planificación y Diseño de Centros Educativos (MPDCE), Lineamientos para el Mejoramiento de la Infraestructura de la Educación Prebásica en Honduras y Diseños Arquitectónicos Bioclimáticos para Modelos de Referencia (DMR).

Proyecto Ejecutado por el Fondo Hondureño de Inversión Social:

✓ **Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar” (PROMINE KFW Fase II):**

Al cierre del tercer trimestre de 2023, se finalizó la ampliación y rehabilitación de los siguientes Centros de Educación Básica:

Los principales avances físicos al 30 de Septiembre de 2023 son los siguientes:

No.	Centro de Educación Básica	Intervención	Municipio	Departamento	Empleos	Beneficiarios	Estado
1.	Jesús María Rodríguez y CEPB La Independencia	Ampliación	San José	Copán	29	223	Finalizado
2.	CEB CRUTA y JN en Marcha	Ampliación	Jesús de Otoro	Intibucá	33	244	Finalizado
3.	CEB Lucila Pérez Estrada y Héctor Juárez	Reparación	La Unión	Lempira	28	188	Finalizado
4.	CEB Francisco Morazán	Reparación	Colomoncagua	Intibucá	30	240	Finalizado

Estas intervenciones generaron 120 empleos y beneficiaran 895 estudiantes.

✓ **Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras (MIFE); BCIE 2239:**

Los principales avances físicos al 30 de septiembre de 2023 son los siguientes:

Actualmente, se tienen **25 proyectos en ejecución** y **27 para orden de inicio**, **18** proyectos aprobados, **13** están en revisión de control de calidad y el resto (30), de los **113** están en proyección de ser intervenidos por parte del programa. En los departamentos de Olancho, Santa Bárbara y Cortés.

Proyecto Ejecutado por el Programa de la Red Solidaria:

- ✓ **Proyecto Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven, (BID 4449/BL-HO):**

Avance Físico:

- Suscripción del Convenio interinstitucional con el Instituto Hondureño de Educación por Radio (IHER), para la modalidad flexible presencial, con el cual se da continuidad de atención en el tercer ciclo para el año 2023. dicho convenio beneficiará un máximo de 3,125 estudiantes pertenecientes al octavo y noveno grado. Los estudiantes contarán con la dotación de un paquete didáctico, el convenio contempla el pago a 174 gestores educativos.
- Se remitió a No Objeción del BID los documentos de licitación para el lanzamiento de la implementación de 35 Centros de Educación Básica la (CEB) y la Rehabilitación de 09 (CE) Educativos.
- Se trabaja en la actualización de los términos de referencia para el proceso de contratación de 18 consultores individuales cuya función principal será la supervisión en la construcción de 35 Centros de Educación Básica (CEB) y la Rehabilitación de 09 Centros Educativos (CE).
- En el marco del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Secretaría de Educación y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) se ha iniciado con la implementación del Programa de Formación Docente para la Innovación en el Tercer Ciclo de la Educación Básica dirigido a 2,708 docentes, directores, supervisores, gestores educativos, tutores y facilitadores que laboran en el tercer ciclo de la educación básica en el territorio nacional. A la fecha se concluyó con la formación de 1,080 docentes, directores, supervisores y gestores educativos.
- Convenio de Cooperación Interinstitucional firmado entre la Red Solidaria, Secretaría de Educación y Fundación Zamora Terán, para la implementación del componente de formación para 1,024 docentes del Programa Nacional de Transformación Educativa Digital, fueron formados y acompañados, 950 docentes de 72 centros educativos a nivel nacional.
- Con la plataforma de formación docente se ha firmado un contrato para la adquisición de 20,000 licencias de la plataforma TERRITORIUM con el fin de facilitar la formación y certificación de competencias docentes la cual está en proceso de implementación.

1.8.5 Sector Salud:

Sus intervenciones van orientadas al mejoramiento y cobertura de los servicios de salud y la red hospitalaria del País, a través de la contratación de gestores en el Primer Nivel y Segundo Nivel de atención mediante el proyecto de Mejora de la Gestión y Calidad de los servicios de salud materno-neonatal, Proyecto Respuesta Inmediata de Salud (RISP) para Contener y Controlar El Coronavirus (COVID - 19) y Mitigar su Efecto en la Prestación del Servicio, en Honduras.

Proyectos Ejecutados por Secretaría de Salud (SESAL):

- ✓ **Proyecto de Respuesta a Emergencia Honduras COVID-19 (IDA 6626-HN / IDA 6868-HN):**

Por parte de la Unidad Ejecutora Protección de la Salud Honduras (PROSALH), se reporta avances físicos en función de la matriz de resultados del proyecto, descritos a continuación:

Dirección General de Inversiones Públicas

- 92% camas de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) prioritarias totalmente equipadas y operando.
 - 73% de la población vacunada contra la COVID-19 por grupo priorizado definido en el Plan Nacional de Introducción de la Vacuna contra el COVID-19 (Población 2da dosis: 5,760,184)
 - Laboratorio designado con equipos de diagnóstico, kits de pruebas y reactivos de COVID-19 (meta 1 laboratorio)
 - 100% de centros de salud prioritarios que reciben el volumen completo de equipos de protección personal (EPPs) previsto en el proyecto.
 - 63.9% de mujeres contratadas en puestos de liderazgo relacionados con la vacunación que han sido creados con financiamiento del proyecto.
 - Continúa en proceso de pilotaje la implementación de la Tecnología de Papel Inteligente (SPT) en la Región Metropolitana del Distrito Central.
- ✓ **Programa Respuesta Inmediata de Salud para Contener y Controlar El Coronavirus (COVID-19) y Mitigar su Efecto en la Prestación del Servicio, en Honduras (RISP-HO-2):**

Al III Trimestre, la Unidad Ejecutora de Proyectos BID (GESALUD), reporta una ejecución física del **52%** y financiero del **55%** (con relación al monto contratado de US\$53.82 millones) los avances por componentes se describen a continuación:

- ✓ Componente 1: Conducción de la respuesta a nivel del país:
2 consultorías en apoyo a las intervenciones del programa, para apoyo financiero y monitoreo.
 - ✓ Componente 2: Detección y seguimiento de casos:
Se firmó los contratos para la adquisición de reactivos para el Laboratorio Nacional a través de una licitación pública internacional (LPI).
 - ✓ Componente 3: Interrupción de la Cadena de transmisión:
En proceso la adquisición de plantas eléctricas y Banco de Transformadores para almacenes de biológicos.
 - ✓ Componente 4: Mejoramiento a la capacidad de provisión de servicios:
Pagos del personal médico contratado (248 contratos firmados) a nivel nacional en la atención Hospitalaria: ayudantes de enfermería, Auxiliares de enfermería, microbiólogos, licenciados en enfermería, médico anestesiólogo, médico cirujano, médicos internistas, médicos pediatras, médicos Gineco obstetra, médicos generales, técnicos de Laboratorio Clínico, técnico en anestesia y técnicos en radiología; especialista en infraestructura hospitalaria.
- ✓ **Programa de Mejora de la Gestión y la Calidad de los Servicios Materno-Neonatales (4619/BL-HO)**

Por parte de la Unidad Ejecutora Red Solidaria se reporta avances físicos al tercer trimestre.

Dirección General de Inversiones Públicas

- ✓ En primer nivel de atención: En proceso de elaboración el informe de evaluación de la consultoría para desarrollar las competencias, habilidades y destrezas en telesonografía obstétrica y ginecológica, a través de la capacitación a médicos que brindan atención prenatal en los establecimientos de salud (ES) de Primer Nivel priorizados.
- ✓ En segundo nivel de atención: En coordinación con las autoridades de la Unidad de Gestión Descentralizada-SESAL, se suscribieron 4 convenios de gestión por un monto de L18,081,000.00, en los siguientes hospitales:
 - Fundación Gestora de la Salud (FUNDAGES) del Hospital Enrique Aguilar Cerrato
 - Fundación Manos Transformando el Puerto (FUMATREP)
 - Fundación Hospital Leonardo Martínez Valenzuela
 - Comité Hospital Roberto Suazo Córdova
- ✓ Diseño-Supervisión-Construcción de obras: Terminada Etapa de Diseño de la Consultoría “Diseño y supervisión de las Obras en el Hospital Regional de Occidente; Hospital Roberto Suazo Córdova; Hospital San Francisco; Hospital Santa Teresa y Hospital Escuela”, suscrito entre la empresa Taller de Arquitectura Sánchez - Horneros SLP (TASH) Honduras, en fecha 10 de julio del 2022 con vigencia hasta el 10 de julio del 2024, por un monto inicial de contrato de \$ 3,116,827.06. Para los siguientes hospitales: Bloque Materno Infantil del Hospital de Occidente en Santa Rosa de Copán; Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales para los Hospitales Escuela en Tegucigalpa y Hospital Santa Teresa de Comayagua; Sala de Neonatología y Hogar Materno del Hospital Roberto Suazo Córdova en La Paz y Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital San Francisco en Juticalpa Olancho.
- ✓ Referente al equipamiento requerido para cada obra hospitalaria; se han compartido las especificaciones técnicas, los planos de distribución y el presupuesto con las máximas autoridades de la Secretaria de Salud y se ha llegado a una coordinación interinstitucional para el financiamiento del equipamiento en un 100% de los requerimientos establecidos para los hospitales financiados por el programa, para tal fin, está en proceso la realización de Convenio entre SESAL y Programa de Red Solidaria.
- ✓ Se publicó la convocatoria pública para la Licitación Pública Internacional PMGCSSMN-273-LPI-OPRS-LPI-013-2023 “Construcción, Remodelación y Ampliación de Obras Hospitalarias en los departamentos de Copán (1), La Paz (1), Comayagua (1), Olancho (1) y Francisco Morazán (1)”.

1.8.6 Sector Seguridad Alimentaria

Los principales rubros de inversión están enfocados en la ejecución de Planes de Negocios, implementación de Sistemas de Riego, el incremento de los ingresos de las poblaciones rurales en el Corredor Seco a fin de prepararse para los efectos del cambio climático y abordar la inseguridad alimentaria. Al tercer trimestre del año 2023 las distintas Instituciones del Sector, registran los siguientes avances físicos:

Proyectos Ejecutados por Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG):

- ✓ **Proyecto de Inclusión Económica y Social de Pequeños Productores Rurales en la Región Noreste de Honduras (PROINORTE), FIDA-No.2000002595, OPEC- No. 13754P.**

El proyecto entró en operatividad en el mes de junio de 2023.

En el tercer trimestre se logró la apertura de las dos oficinas sede del proyecto en las ciudades de Tocoa en el departamento de Colón y el Olanchito en el departamento de Yoro, iniciando las operaciones presenciales a partir del 11 de septiembre de 2023.

El equipo del proyecto de las sedes de Tocoa y Olanchito se han desplazado a los 22 municipios para realizar socialización del proyecto en primera instancia con las municipalidades con el objetivo de realizar consultas y levantamiento de inventario de organizaciones en la zona del proyecto, con mujeres, jóvenes y etnias.

Los principales procesos de adquisiciones que se están llevando a cabo son los siguientes: Adquisición de equipo informático, adquisiciones de mobiliario de oficina.

Pendiente la notificación oficial de la ONCAE para proceder a la compra conjunta de los vehículos

- ✓ **Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur Occidental Pro-Lenca (FIDA-I-899-HN)**

El proyecto finalizó oficialmente y durante este trimestre se realizó el cierre administrativo.

Así como la conclusión de las consultorías del informe de terminación del proyecto y de la evaluación final de los resultados. Actualmente, estos productos ya fueron revisados por el FIDA. La UAP -SAG ya socializó internamente los resultados.

- ✓ **Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad 4940/BL-HO (HO-L1211) y 4936/BL-HO (HO-L1201).**

La efectividad del proyecto se aprobó recién en junio de 2023 el proyecto presenta atrasos en procesos clave del componente 1. actualmente, está en proceso la contratación del personal técnico (incluyendo al coordinador del proyecto).

Durante el trimestre, se realizó la revisión del listado de organizaciones productoras que conformaban la base de datos del levantamiento de línea base (Consultoría BID) para validar la información del estudio.

También continúa el proceso de negociación para el reintegro de \$4.1 millones del primer desembolso para la nueva figura administrativa del fondo para financiamiento rural con BANHPROVI y la liquidación/transferencia de los fondos desembolsados por el proyecto en 2021. Para esto, se da seguimiento a la revisión del borrador del convenio de donación, IGR HO-G1261 (por los \$1.4 millones), que serán financiados por la Iniciativa de Financiamiento para Mujeres Emprendedoras (WEF).

Adicionalmente, se realizó la solicitud de notificación de firmas para desembolso de los fondos FONPRODE, para el apalancamiento de USD 35 millones para la Fase II.

Dirección General de Inversiones Públicas

Mientras tanto, se continuo con la asistencia técnica a grupos de productores con riego y seguimiento a la Organización de Mujeres Indígenas con información actualizada sobre el Proyecto.

✓ **Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II) IDA-6448-HN.**

Durante el trimestre, fueron ratificados por el Comité Directivo, 9 planes de negocio (24 de agosto de 2023) por un monto de 80.3 millones de lempiras beneficiando alrededor de 850 familias. Esta cifra corresponde un 56% de las transferencias no reembolsables, un 33% a AFP y un 11% a OPR.

La inversión está enfocada a la cadena de cafés especiales, hortalizas y granos básicos. Este proceso de transferencias no reembolsables se encuentra actualmente en proceso y se espera se ejecute completamente el próximo trimestre.

Actualmente se logró desembolsar los recursos de Un Plan de Negocio (PN), por un monto de L. 4.3 millones, se han realizado 10 convocatorias públicas, de las cuales se estima en el mes de Octubre a realizar la 11va convocatoria pública para perfiles de negocios.

En el último trimestre del año 2023, se espera desarrollar jornadas de capacitación para la Socialización de la Aplicación de la Guía de Adquisiciones y Contrataciones de las OPRs del Proyecto, aspectos ambientales y sociales y de seguimiento, así como culminar con 8 procesos de contrataciones del personal vacante y nuevo a contratar, y la contratación de la firma implementadora para la ventanilla 1, los cuales están cargadas las líneas bajo el sistema BM-STEP.

1.8.7 Sector Recursos Forestales y Ambiente:

Proyecto Ejecutado por el Programa de la Red Solidaria

✓ **Proyecto Manejo Sostenible de Bosques Crédito BID 3878/BL-HO:**

Avance Físico:

- Implementación de los Planes de Restauración-PR en bosques públicos es: 38 planes de restauración (PR) aprobados, equivalentes a 32,583.04 hectáreas, lo que representa un 95.83% en relación con la meta del proyecto (34,000 has).
- En ejecución contrato de asistencia técnica a organizaciones beneficiarias en la ejecución de los PR de bosque público.
- Obtenida la No objeción a la adenda al convenio original para restauración de áreas plagadas a firmar con las Organizaciones beneficiarias.
- Obtenida la no objeción a la Propuesta de Asistencia Técnica para la implementación del Programa Piloto de Incentivos a la restauración de bosques privados en áreas afectadas por plagas.
- Iniciado el proceso de pre-identificación de 3,000 hectáreas de bosque privado en Francisco Morazán y Comayagua.
- Enviada a no objeción borrador de carta acuerdo, para el desarrollo de la investigación “Identificación Morfológica y Molecular de Insectos de Interés Forestal en Honduras”, el monto de propuesto es de US\$60,000.00 y tiene una duración proyectada de 10 meses.
- Desarrollado el Diplomado “Técnicas de muestreo y mediciones para determinar la fluctuación poblacional de potenciales plagas y enfermedades forestales”, ejecutado por

Dirección General de Inversiones Públicas

CURLA/FUCSA, a través del cual se fortalecieron las capacidades de 20 profesionales vinculados al sistema nacional de salud y sanidad forestal.

- En ejecución el IV Semestre de la Maestría en investigación en ciencias forestales con la participación de 4 funcionarios del ICF.
- En proceso de adquisición las feromonas para la operatividad del Sistema de Monitoreo del Gorgojo Descortezador del Pino (*Dendroctonus frontalis*) utilizando Trampas Cebadas con Semioquímicos.
- Adjudicado equipo de Infotecnología para la OCP – ICF.

Proyecto Ejecutado por la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA)

- ✓ **Programa Nacional de Reforestación Nacional y Protección de Cuencas Hidrográficas “Padre Andrés Tamayo” (SERNA). BCH-24814-1**

Avance Físico:

- Hasta el mes de septiembre se ha logrado remover un total de 485,500 libras de lirio acuático sobre el espejo de agua del Lago de Yojoa, de las cuales 204,900 se alcanzaron mediante contrato de 20 jornales de la zona y 280,600 libras mediante los 2 voluntariados organizados y realizados por el PPAT.
- Durante el tercer trimestre del 2023 el PPAT, se alcanzó la sensibilización de 181 personas, a través de 3 jornadas de difusión de información o sensibilización realizadas con diferentes instituciones.
- Se realizó remoción de especies vegetales acuáticas en la zona El Dique, San Pedro Zacapa en compañía del Tercer Batallón de Protección Ambiental. En dicha jornada se logró remover 56,100 libras de lirio acuático y 1,000 libra de residuos sólidos recolectados en el espejo y orillas del Lago de Yojoa.

1.8.8 Transporte y Obras Públicas:

Proyecto Ejecutado por la Comisión Nacional del Deporte Honduras (CONDEPOR):

- ✓ **Proyecto: Diseño, Construcción y Remodelación de Instalaciones y Espacios físicos de Actividades Deportivas y Recreativas, para uso de la Población a Nivel Nacional.**

Al tercer trimestre 2023 se cuenta con una ejecución física global del 42% en donde por componte se ha ejecutado el 75% en el Fortalecimiento Institucional; 75% Construcción de 13 Canchas Deportivas de futbol 11, 2 canchas de futbol 7 con grama sintética y 15 canchas de polideportivos bajo techo (multiuso), a la fecha se han finalizado 18 canchas y 11 se encuentran en ejecución.

Por otra parte, se cuenta con un avance de un 18% en Mejoras y Remodelación de Estadios a Nivel Nacional que corresponden a la instalación de grama hibrida en el estadio José de la Paz Herrera en un 99.3% instalada, para este componente aún está pendiente la ejecución del Acondicionamiento y Equipamiento de Local Dentro del Estadio Nacional para la implementación de una Maquila para Confección de Uniformes Deportivos Escolares. En relación con el Estadio Francisco Morazán, se ha ejecutado el 51% en donde se han completado las obras previas a la instalación de la grama hibrida

tales como: Trazado y marcado con topografía, remoción de grama, acarreo de grama, remoción de porterías, corte de material existente, acarreo de material de desperdicio entre otras.

1.9 ANÁLISIS DE IMPACTO SOCIALES POR LA BAJA EJECUCIÓN EN PROYECTOS.

La falta de capacidad en las instituciones ejecutoras de proyectos es una de las causas importantes de la baja ejecución de la inversión pública, la carencia de recursos humanos, capacitados, procesos ineficientes o falta de experiencia en la ejecución de los proyectos obstaculizan una ejecución efectiva en los proyectos, lo que impacta en la población de diversas maneras y esto conlleva a la pérdida de oportunidades de empleo, la incapacidad para mejorar la calidad de la salud, educación, mejoras en infraestructura, seguridad alimentaria, impactando en la producción agrícola además limita el acceso a los agricultores a nuevas tecnologías y prácticas agrícolas, generando estancamiento en el desarrollo económico local, la movilidad social y el bienestar general de la población, estos impactos ocasionan retrasos en la construcción de infraestructura clave, como carreteras, hospitales y escuelas que afectan directamente la calidad de vida de los habitantes, ya que no se reciben los beneficios esperados y ofrecidos a la población.

Desde la perspectiva de los fondos externos, honduras estaría siendo evaluado negativamente por los organismos internacionales por la incapacidad de las instituciones para la ejecución eficiente de los proyectos, generando en estas preocupaciones para cumplir con compromisos financieros afectando los créditos y la percepción del riesgo, por lo que el país resultaría con condiciones para los préstamos menos favorables y mayores costos de endeudamiento.

Además, la baja ejecución en proyectos también está asociada a la prolongación de la ejecución de estos, ocasionando incremento en los costos a largo plazo, dado que se tienen que ampliar los proyectos para su ejecución y cierre de los mismos, por otra parte se debe mantener una unidad ejecutora, incrementos de precios de los materiales para llevar a cabo las obras y adquisiciones de equipos, y ajustes contractuales en los mismos convenios de crédito.

Desde la Secretaría de Finanzas a través de la Dirección General de Inversiones Públicas, se realizan acciones tales como: Seguimiento con las máximas autoridades y técnicos de las instituciones ejecutoras de proyectos, a fin de revisar proyecciones de ejecución, solicitudes de cuotas de compromisos de pagos, avances de los procesos de licitaciones, seguimiento a los principales procesos que impactan en la ejecución de la inversión pública, revisiones de cartera verificando los avances de los proyectos en ejecución que muestran dificultades en el cumplimiento de las metas establecidas, identificando oportunidades para acelerar la ejecución de dichos proyectos.

1.10. FACTORES QUE HAN INCIDIDO EN LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA, PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Durante la ejecución de programas y proyectos, se presenta una serie de obstáculos que limitan la normal ejecución de estos, en términos físicos y financieros, sin cumplir el objetivo esperado, y por ende la ausencia de impacto en la población meta. Entre los problemas relevantes sobresalen:

Área	Problemas	Acciones
Técnica	La inadecuada planificación por parte de las unidades ejecutoras de proyectos, ocasiona reprogramación de metas, lo que implica solicitar al Organismo Financiador No Objeción (en caso de los fondos externos), ocasionando retrasos en la ejecución.	Brindar por parte de la DGIP, asistencia técnica a las instituciones gubernamentales en la identificación, formulación y evaluación de proyectos.
	Lentos procesos de adquisiciones y contrataciones, en la mayoría de las unidades ejecutoras, desfasando la ejecución oportuna de los proyectos.	Realizar una revisión de los posibles puntos débiles en los procesos de adquisiciones, prever tiempos para cada proceso y tomar en cuenta los tiempos que estipulan los organismos de financiamiento.
Administrativa-Financiera	Falta de un mecanismo para acelerar las exoneraciones de impuestos que están sujetos los proyectos de inversión.	Implementar acciones con la Dirección General de Franquicias Aduaneras, para mejorar la atención a las gestiones de proyectos y otorgar una respuesta oportuna a las unidades ejecutoras.
Legal	La Falta de contratación en los puestos claves, debido a la alta dispersión en rangos de honorarios ha retrasado en su mayoría la ejecución presupuestaria de los proyectos especialmente los ejecutados con fondos externos.	Las Unidades Ejecutoras tendrán que revisar las ofertas de acuerdo con los honorarios promedio del mercado para la contratación de los puestos claves.
	Los proyectos de construcción y rehabilitación de carreteras requieren de la emisión de licencias ambientales para el inicio de obras la cual ha generado atrasos por su tardía aprobación	La Unidad ejecutora deberá revisar cuales han sido los puntos críticos para que las licencias no sean aprobadas a la brevedad posible, con ello abordar las debilidades en la documentación presentada. Así mismo, se deberá tener un acercamiento con la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA)

Asimismo, se detallan otras circunstancias referentes a la baja ejecución del año 2023,

Falta de incorporar la totalidad de los fondos aprobados debido a:

- Algunas propuestas de proyectos no cumplen de acuerdo con la normativa SNIPH siendo estas actividades recurrentes de la institución por lo que serán ejecutados dentro de programas institucionales.
- El cambio de prioridades por las autoridades de cada institución para ejecutar los recursos inicialmente formulados / aprobados para el PIP 2023.
- Falta de una adecuada planificación a nivel de ejecución presupuestaria.

SECRETARÍA DE FINANZAS
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
INSTITUCIONAL: PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE, 2023
Cifras en Lempiras

No. Proy.	INSTITUCIÓN / PROYECTO	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado (Devengado) Anual			Ejecutado (Devengado) al III Trimestre			Comprometido					
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total general	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total general	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total general	% Ejecución (Ejec./Vigite.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total general	% Ejecución (Ejec./Vigite.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total general	% Ejecución (Compr./Vigite.)
10	0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social		22,053,380	1,125,795,013	1,147,848,393	555,630,575	1,171,620,089	1,727,250,664	371,946,096	366,580,666	738,526,762	43%	243,748,848	141,439,940	385,188,788	22%	371,946,096	510,452,643	882,398,739	51%
1	ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS	522-0502 Cd E No.9	7,387,678	44,858,750	52,246,428	7,387,678	44,858,750	52,246,428	5,244,457	17,352,139	22,596,596	43%	2,073,000	7,488,488	9,561,488	18%	5,244,457	17,352,139	22,596,596	43%
	TOTAL ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS		7,387,678	44,858,750	52,246,428	7,387,678	44,858,750	52,246,428	5,244,457	17,352,139	22,596,596	43%	2,073,000	7,488,488	9,561,488	18%	5,244,457	17,352,139	22,596,596	43%
2	PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS	BID/4518/BL-HO	-	36,003,735	36,003,735	-	36,003,735	36,003,735	-	26,332,006	26,332,006	73%	-	6,841,645	6,841,645	19%	-	31,377,137	31,377,137	87%
	TOTAL PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS		-	36,003,735	36,003,735	-	36,003,735	36,003,735	-	26,332,006	26,332,006	73%	-	6,841,645	6,841,645	19%	-	31,377,137	31,377,137	87%
3	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA	522-0501-4	5,314,200	64,889,850	70,204,050	5,314,200	64,889,850	70,204,050	5,314,200	41,576,162	46,890,362	67%	1,720,367	11,939,984	13,660,351	19%	5,314,200	41,576,162	46,890,362	67%
	TOTAL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA		5,314,200	64,889,850	70,204,050	5,314,200	64,889,850	70,204,050	5,314,200	41,576,162	46,890,362	67%	1,720,367	11,939,984	13,660,351	19%	5,314,200	41,576,162	46,890,362	67%
4	PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)	2014 67 414 (KFW) / FHS - SE	-	-	-	1,352,112	44,099,693	45,451,805	1,151,710	14,637,229	15,788,939	35%	575,336	4,204,441	4,779,776	11%	1,151,710	14,637,229	15,788,939	35%
		BMZ 2016 68 763	5,143,752	122,813,361	127,957,113	3,791,640	78,713,668	82,505,308	1,639,046	22,382,420	24,021,466	29%	558,758	2,061,601	2,620,359	3%	1,639,046	22,382,420	24,021,466	29%
		SE/FHS VIII No.2008-66-178	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%	
	TOTAL PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)		5,143,752	122,813,361	127,957,113	5,143,752	122,813,361	127,957,113	2,790,756	37,019,649	39,810,405	31%	1,134,094	6,266,041	7,400,136	6%	2,790,756	37,019,649	39,810,405	31%
5	Programa de Mejoramiento de la Infraestructura de Desarrollo Social y Comunitario en varios departamentos de Honduras	BCH-24798-1	-	-	-	229,124,372	-	229,124,372	159,370,009	-	159,370,009	70%	157,406,527	-	157,406,527	69%	159,370,009	-	159,370,009	70%
	TOTAL Programa de Mejoramiento de la Infraestructura de Desarrollo Social y Comunitario en varios departamentos de Honduras		-	-	-	229,124,372	-	229,124,372	159,370,009	-	159,370,009	70%	157,406,527	-	157,406,527	69%	159,370,009	-	159,370,009	70%
6	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y FORMACION EDUCATIVA EN HONDURAS	BCIE - 2239	-	297,119,742	297,119,742	-	297,119,742	297,119,742	-	95,789,810	95,789,810	32%	-	41,698,874	41,698,874	14%	-	234,616,656	234,616,656	79%
	TOTAL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y FORMACION EDUCATIVA EN HONDURAS		-	297,119,742	297,119,742	-	297,119,742	297,119,742	-	95,789,810	95,789,810	32%	-	41,698,874	41,698,874	14%	-	234,616,656	234,616,656	79%
7	PROGRAMA DE REHABILITACION DE CENTROS EDUCATIVOS A NIVEL NACIONAL	0	-	-	-	304,452,823	45,825,076	350,277,899	196,799,214	-	196,799,214	56%	80,265,031	-	80,265,031	23%	196,799,214	-	196,799,214	56%
	TOTAL PROGRAMA DE REHABILITACION DE CENTROS EDUCATIVOS A NIVEL NACIONAL		-	-	-	304,452,823	45,825,076	350,277,899	196,799,214	-	196,799,214	56%	80,265,031	-	80,265,031	23%	196,799,214	-	196,799,214	56%
8	PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JOVENES EN HONDURAS	BMZ No. 2016 65348	4,207,750	58,200,341	62,408,091	4,207,750	58,200,341	62,408,091	2,427,460	15,890,161	18,017,621	29%	1,149,829	10,601,294	11,751,123	19%	4,207,750	58,200,341	62,408,091	29%
	TOTAL PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JOVENES EN HONDURAS		4,207,750	58,200,341	62,408,091	4,207,750	58,200,341	62,408,091	2,427,460	15,890,161	18,017,621	29%	1,149,829	10,601,294	11,751,123	19%	4,207,750	58,200,341	62,408,091	29%
9	PROYECTO DE AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE GRACIAS	BCIE-2261	-	69,816,382	69,816,382	-	69,816,382	69,816,382	-	2,648,996	2,648,996	4%	-	1,002,080	1,002,080	1%	-	2,648,996	2,648,996	4%
	TOTAL PROYECTO DE AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE GRACIAS		-	69,816,382	69,816,382	-	69,816,382	69,816,382	-	2,648,996	2,648,996	4%	-	1,002,080	1,002,080	1%	-	2,648,996	2,648,996	4%
10	Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras.	6822-HN	-	432,092,852	432,092,852	-	432,092,852	432,092,852	-	130,271,743	130,271,743	30%	-	55,601,533	55,601,533	13%	-	130,271,743	130,271,743	30%
	TOTAL Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras.		-	432,092,852	432,092,852	-	432,092,852	432,092,852	-	130,271,743	130,271,743	30%	-	55,601,533	55,601,533	13%	-	130,271,743	130,271,743	30%
3	0028 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal		4,792,201	120,311,813	125,104,014	4,792,201	120,311,813	125,104,014	2,150,944	27,883,986	30,034,930	24%	747,603	12,854,535	13,602,138	11%	2,150,944	27,883,986	30,034,930	24%
1	DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN PILOTO DEL SISTEMA PARA ASEGURAR LA LEGALIDAD DE LA MADERA EN BOSQUE DE PINO	INDICI LA/2021/043-250	-	-	-	-	10,910,959	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
	TOTAL DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN PILOTO DEL SISTEMA PARA ASEGURAR LA LEGALIDAD DE LA MADERA EN BOSQUE DE PINO		-	-	-	-	10,910,959	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
2	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS DE HONDURAS-SINAPH (LIFEWEB)	BMZ No201165984	4,792,201	98,591,546	103,383,747	4,792,201	87,680,587	92,472,788	2,150,944	16,727,921	18,878,864	20%	747,603	4,043,487	4,791,090	5%	2,150,944	16,727,921	18,878,864	20%
	TOTAL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS DE HONDURAS-SINAPH (LIFEWEB)		4,792,201	98,591,546	103,383,747	4,792,201	87,680,587	92,472,788	2,150,944	16,727,921	18,878,864	20%	747,603	4,043,487	4,791,090	5%	2,150,944	16,727,921	18,878,864	20%
3	PROYECTO MANEJO INTEGRADO DE LA BIOSFERA DEL RIO PLATANO	ENV/2019/042229	-	21,720,267	21,720,267	-	21,720,267	21,720,267	-	11,156,065	11,156,065	51%	-	8,811,048	8,811,048	41%	-	11,156,065	11,156,065	51%
	TOTAL PROYECTO MANEJO INTEGRADO DE LA BIOSFERA DEL RIO PLATANO		-	21,720,267	21,720,267	-	21,720,267	21,720,267	-	11,156,065	11,156,065	51%	-	8,811,048	8,811,048	41%	-	11,156,065	11,156,065	51%
1	0030 - Secretaría de la Presidencia		-	-	-	10,858,605	-	10,858,605	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
1	Equipamiento de la Escuela de Profesionalización la Administración Pública, con sede en Francisco Morazán y fortalecimiento de la capacidad de los servidores públicos a nivel nacional	BCH - 24958 - 1	-	-	-	10,858,605	-	10,858,605	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
	TOTAL Equipamiento de la Escuela de Profesionalización la Administración Pública, con sede en Francisco Morazán y fortalecimiento de la capacidad de los servidores públicos a nivel nacional		-	-	-	10,858,605	-	10,858,605	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
1	0033 - Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos		-	-	-	300,000,000	-	300,000,000	-	205,000,000	-	68%	95,000,000	-	95,000,000	32%	205,000,000	-	205,000,000	68%
1	PROGRAMA DE DESARROLLO HABITACIONAL-VIVIENDA SOLIDARIA	0	-	-	-	300,000,000	-	300,000,000	-	205,000,000	-	68%	95,000,000	-	95,000,000	32%	205,000,000	-	205,000,000	68%
	TOTAL PROGRAMA DE DESARROLLO HABITACIONAL-VIVIENDA SOLIDARIA		-	-	-	300,000,000	-	300,000,000	-	205,000,000	-	68%	95,000,000	-	95,000,000	32%	205,000,000	-	205,000,000	68%
1	0037 - Servicio de Administración de Rentas		-	173,394,931	173,394,931	-	173,394,931	173,394,931	-	93,038,665	93,038,665	54%	-	43,043,740	43,043,740	25%	-	146,598,869	146,598,869	85%
1	PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y OPERATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	BID-3541/BL-HO	-	173,394,931	173,394,931	-	173,394,931	173,394,931	-	93,038,665	93,038,665	54%	-	43,043,740	43,043,740	25%	-	146,598,869	146,598,869	85%
	TOTAL PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y OPERATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		-	173,394,931	173,394,931	-	173,394,931	173,394,931	-	93,038,665	93,038,665	54%	-	43,043,740	43,043,740	25%	-	146,598,869	146,598,869	85%
1	0039 - Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios		-	-	-	134,363,961	-	134,363,961	-	35,359,758	35,359,758	26%	-	35,359,758	35,359,758	26%	-	35,359,758	35,359,758	26%
1	Programa para el fortalecimiento de la economía de las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYME) y el Sector Social de la Economía (SSE) en Honduras.	BCH-25038-1	-	-	-	134,363,961	-	134,363,961	-	35,359,758	35,359,758	26%	-	35,359,7						

SECRETARÍA DE FINANZAS
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
INSTITUCIONAL: PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE, 2023
Cifras en Lempiras

No. Proy.	INSTITUCIÓN / PROYECTO	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado (Devengado) Anual			Ejecutado (Devengado) al III Trimestre			Comprometido					
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total general	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total general	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total general	% Ejecución (Ejec./Vigite.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total general	% Ejecución (Ejec./Vigite.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total general	% Ejecución (Compr./Vigite.)
7	TOTAL PROYECTO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES EN LA REGIÓN		11,938,330	254,423,333	266,361,663	11,938,330	172,552,227	184,490,557	3,019,239	6,296,823	9,316,062	5%	1,098,032	4,087,061	5,185,093	3%	3,019,239	6,296,823	9,316,062	5%
	PROYECTO DE SEGURIDAD HIDRICA EN EL CORREDOR SECO DE HONDURAS	IDA-6680-HN	-	-	-	-	190,041,562	190,041,562	-	5,867,945	5,867,945	3%	-	1,940,061	1,940,061	1%	-	7,686,778	7,686,778	4%
	TOTAL PROYECTO DE SEGURIDAD HIDRICA EN EL CORREDOR SECO DE HONDURAS		-	-	-	-	190,041,562	190,041,562	-	5,867,945	5,867,945	3%	-	1,940,061	1,940,061	1%	-	7,686,778	7,686,778	4%
8	PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD	4936-BL-HO 4940-BL-HO	-	-	-	-	33,113,726	33,113,726	-	6,285,131	6,285,131	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
	TOTAL PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD		-	-	-	-	96,642,196	96,642,196	-	6,285,131	6,285,131	7%	-	1,998,301	1,998,301	2%	-	8,499,623	8,499,623	9%
1044	Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible		-	-	-	-	129,755,922	129,755,922	-	6,285,131	6,285,131	5%	-	1,998,301	1,998,301	2%	-	8,499,623	8,499,623	7%
	PROYECTO DE ENERGÍA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PRO-ENERGÍA RURAL	EDCF No. HND-5	-	-	-	-	75,371,106	75,371,106	-	61,400,849	61,400,849	81%	-	-	-	0%	-	61,400,849	61,400,849	81%
	TOTAL PROYECTO DE ENERGÍA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PRO-ENERGÍA RURAL		-	-	-	-	75,371,106	75,371,106	-	61,400,849	61,400,849	81%	-	-	-	0%	-	61,400,849	61,400,849	81%
1050	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		-	-	-	-	725,000,000	725,000,000	-	445,493,949	445,493,949	61%	139,894,109	139,894,109	19%	446,342,370	-	446,342,370	62%	
	PROGRAMA DE REFORESTACIÓN NACIONAL Y PROTECCIÓN DE CUENCAS	BCH-24814-1	-	-	-	-	725,000,000	725,000,000	-	445,493,949	445,493,949	61%	139,894,109	139,894,109	19%	446,342,370	-	446,342,370	62%	
	HIDROGRAFICAS PADRE ANDRES TAMAYO		-	-	-	-	725,000,000	725,000,000	-	445,493,949	445,493,949	61%	139,894,109	139,894,109	19%	446,342,370	-	446,342,370	62%	
	TOTAL PROGRAMA DE REFORESTACIÓN NACIONAL Y PROTECCIÓN DE CUENCAS HIDROGRAFICAS PADRE ANDRES TAMAYO		-	-	-	-	725,000,000	725,000,000	-	445,493,949	445,493,949	61%	139,894,109	139,894,109	19%	446,342,370	-	446,342,370	62%	
1043	Dirección Nacional de Parques y Recreación		-	-	-	-	28,030,278	28,030,278	-	17,634,168	17,634,168	63%	7,463,134	7,463,134	27%	27,985,166	-	27,985,166	100%	
	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS RECREATIVAS Y ACTIVIDADES FÍSICAS	0	-	-	-	-	28,030,278	28,030,278	-	17,634,168	17,634,168	63%	7,463,134	7,463,134	27%	27,985,166	-	27,985,166	100%	
	TOTAL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS RECREATIVAS Y ACTIVIDADES FÍSICAS		-	-	-	-	28,030,278	28,030,278	-	17,634,168	17,634,168	63%	7,463,134	7,463,134	27%	27,985,166	-	27,985,166	100%	
2044	Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer		-	22,041,275	22,041,275	-	22,041,275	22,041,275	-	13,870,745	13,870,745	63%	-	7,657,341	7,657,341	35%	-	18,196,241	18,196,241	83%
	CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES HONDUREÑAS (CIUDAD MUJER)	BID-3771-BL-HO	-	6,585,600	6,585,600	-	6,585,600	6,585,600	-	5,264,637	5,264,637	80%	-	5,089,213	5,089,213	77%	-	5,264,637	5,264,637	80%
	TOTAL CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES HONDUREÑAS (CIUDAD MUJER)		-	6,585,600	6,585,600	-	6,585,600	6,585,600	-	5,264,637	5,264,637	80%	-	5,089,213	5,089,213	77%	-	5,264,637	5,264,637	80%
2	SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y UN ENTORNO FAVORABLE PARA LAS EMPRESARIAS DE HONDURAS	ATNWE-17867-HO	-	15,455,675	15,455,675	-	15,455,675	15,455,675	-	8,606,108	8,606,108	56%	-	2,568,129	2,568,129	17%	-	12,931,604	12,931,604	84%
	TOTAL SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y UN ENTORNO FAVORABLE PARA LAS EMPRESARIAS DE HONDURAS		-	15,455,675	15,455,675	-	15,455,675	15,455,675	-	8,606,108	8,606,108	56%	-	2,568,129	2,568,129	17%	-	12,931,604	12,931,604	84%
1046	Secretaría de Asuntos de la Mujer		-	-	-	-	25,000,000	25,000,000	-	6,606,108	6,606,108	0%	-	2,568,129	2,568,129	7%	-	12,931,604	12,931,604	0%
	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO CASA REFUGIO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA MUJER	0	-	-	-	-	25,000,000	25,000,000	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
	TOTAL CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO CASA REFUGIO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA MUJER		-	-	-	-	25,000,000	25,000,000	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
130411	Secretaría de Infraestructura y Transporte		17,003,246	-	17,003,246	2,041,905,806	-	2,041,905,806	1,195,406,692	-	1,195,406,692	59%	306,047,740	-	306,047,740	15%	1,900,300,435	-	1,900,300,435	93%
	Construcción y Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Carretera Central, Tramo: "Marale - Empalme Carretera Yoro" (53.31 km), localizado en el Departamento de Francisco Morazán y Yoro.	FN-24887-1	-	-	-	-	114,466,981	114,466,981	80,239,670	-	80,239,670	70%	21,278,225	-	21,278,225	19%	114,466,981	-	114,466,981	100%
	TOTAL Construcción y Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Carretera Central, Tramo: "Marale - Empalme Carretera Yoro" (53.31 km), localizado en el Departamento de Francisco Morazán y Yoro.		-	-	-	-	114,466,981	114,466,981	80,239,670	-	80,239,670	70%	21,278,225	-	21,278,225	19%	114,466,981	-	114,466,981	100%
2	Construcción y Pavimentación con Concreto Hidráulico del Corredor de Oriente, Tramo Carretero: "Las Lomas - Terrero Blanco, Ruta 53" y Elaboración del Estudio y Diseño del Tramo Carretero: Ruta 119.	FN-25047-1	-	-	-	-	264,902,273	264,902,273	195,336,936	-	195,336,936	74%	148,428,903	-	148,428,903	56%	243,103,959	-	243,103,959	92%
	TOTAL Construcción y Pavimentación con Concreto Hidráulico del Corredor de Oriente, Tramo Carretero: "Las Lomas - Terrero Blanco, Ruta 53" y Elaboración del Estudio y Diseño del Tramo Carretero: Ruta 119.		-	-	-	-	264,902,273	264,902,273	195,336,936	-	195,336,936	74%	148,428,903	-	148,428,903	56%	243,103,959	-	243,103,959	92%
3	Construcción y Pavimentación con Concreto Hidráulico del Tramo Carretero: "Porcillo del Lobo-Reitoca - Curarén" (39.54 KM), Localizado en los Departamentos de Francisco Morazán y Choluteca.	FN-25029-1	-	-	-	-	95,550,208	95,550,208	25,743,806	-	25,743,806	27%	13,537,779	-	13,537,779	14%	92,429,500	-	92,429,500	97%
	TOTAL Construcción y Pavimentación con Concreto Hidráulico del Tramo Carretero: "Porcillo del Lobo-Reitoca - Curarén" (39.54 KM), Localizado en los Departamentos de Francisco Morazán y Choluteca.		-	-	-	-	95,550,208	95,550,208	25,743,806	-	25,743,806	27%	13,537,779	-	13,537,779	14%	92,429,500	-	92,429,500	97%
4	CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL TRAMO CARRETERO: LA ENA - SAN JOSÉ DE RÍO TINTO - DULCE NOMBRE DE CULMI, SUB TRAMO: "PUENTE RÍO EL PATASTE - DULCE NOMBRE DE CULMI"	FN-24850-1	-	-	-	-	51,705,278	51,705,278	2,631,685	-	2,631,685	5%	1,133,362	-	1,133,362	2%	3,000,000	-	3,000,000	6%
	TOTAL CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL TRAMO CARRETERO: LA ENA - SAN JOSÉ DE RÍO TINTO - DULCE NOMBRE DE CULMI, SUB TRAMO: "PUENTE RÍO EL PATASTE - DULCE NOMBRE DE CULMI"		-	-	-	-	51,705,278	51,705,278	2,631,685	-	2,631,685	5%	1,133,362	-	1,133,362	2%	3,000,000	-	3,000,000	6%
5	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN VIAL CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CORREDOR DE OCCIDENTE, TRAMO CARRETERO: "NACIO - LA ENTRADA" (79.1 KM), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA BÁRBARA Y COPÁN	FN-24878-1	-	-	-	-	336,413,583	336,413,583	32,196,067	-	32,196,067	10%	16,269,438	-	16,269,438	5%	330,960,058	-	330,960,058	98%
	TOTAL CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN VIAL CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CORREDOR DE OCCIDENTE, TRAMO CARRETERO: "NACIO - LA ENTRADA" (79.1 KM), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA BÁRBARA Y COPÁN		-	-	-	-	336,413,583	336,413,583	32,196,067	-	32,196,067	10%	16,269,438	-	16,269,438	5%	330,960,058	-	330,960,058	98%
6	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL ANILLO AGRÍCOLA, TRAMO CARRETERO: "EL BUAGUAL - SAN FRANCISCO DE BECERRA (R77)", CON UNA LONGITUD DE 15.09 KM, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO	BCH-25234-1	-	-	-	-	50,500,000	50,500,000	36,751,951	-	36,751,951	73%	36,751,951	-	36,751,951	73%	47,000,000	-	47,000,000	93%
	TOTAL PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL ANILLO AGRÍCOLA, TRAMO CARRETERO: "EL BUAGUAL - SAN FRANCISCO DE BECERRA (R77)", CON UNA LONGITUD DE 15.09 KM, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO		-	-	-	-	50,500,000	50,500,000	36,751,951	-	36,751,951	73%	36,751,951	-	36,751,951	73%	47,000,000	-	47,000,000	93%
7	Pavimentación con Concreto Hidráulico del tramo Carretero Amapa - San Antonio de Cortés (R90) con una Longitud de 9.645 KM, ubicado en el Municipio de San Antonio de Cortés, Departamento de Cortés.	FN-25083-1	-	-	-	-	58,519,190	58,519,190	58,519,190	-	58,519,190	99%	22,243,850	-	22,243,850	38%	59,131,315	-	59,131,315	100%
	TOTAL Pavimentación con Concreto Hidráulico del tramo Carretero Amapa - San Antonio de Cortés (R90) con una Longitud de 9.645 KM, ubicado en el Municipio de San Antonio de Cortés, Departamento de Cortés.		-	-	-	-	58,519,190	58,519,190	58,519,190	-	58,519,190	99%	22,243,850	-	22,243,850	38%	59,131,315	-	59,131,315	100%
8	Pavimentación con Concreto Hidráulico del tramo Carretero Peña Blanca - Los Naranjos (R72) con una Longitud de 2.872KM, ubicado en el Municipio de Santa Cruz de Yojoa, Departamento de Cortés.	FN-25109-1	-	-	-	-	23,361,137	23,361,137	10,842,263	-	10,842,263	46%	2,292,907	-	2,292,907	10%	23,361,137	-	23,361,137	100%
	TOTAL Pavimentación con Concreto Hidráulico del tramo Carretero Peña Blanca - Los Naranjos (R72) con una Longitud de 2.872KM, ubicado en el Municipio de Santa Cruz de Yojoa, Departamento de Cortés.		-	-	-	-	23,361,137	23,361,137	10,842,263	-	10,842,263	46%	2,292,907	-	2,292,907	10%	23,361,137	-	23,361,137	100%
9	PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCIÓN A CAMINOS PRODUCTIVOS	0	-	-	-	-	596,000,000	596,000,000	557,199,225	-	557,199,225	93%	19,828,417	-	19,828,417	3%	557,199,225	-	557,199,225	93%
	TOTAL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCIÓN A CAMINOS PRODUCTIVOS		-	-	-	-	596,000,000	596,000,000	557,199,225	-	557,199,225	93%	19,828,417	-	19,828,417	3%	557,199,225	-	557,199,225	93%
10	PROYECTO OBRAS DE MITIGACIÓN PARA EL CONTROL DE RIESGOS GEOTÉCNICOS Y GEOLÓGICOS, POR DESLIZAMIENTOS Y DESPRENDIMIENTOS DE ROCA DE TALUDES DE CORTE EN LA CARRETERA CAS-SUR TRAMO "MORAMULCA", FASE I	FN-24805	-	-	-	-	30,909,240	30,909,240	27,348,949	-	27,348,949	88%	4,842,565	-	4,842,565	16%	28,793,420	-	28,793,420	93%</

SECRETARÍA DE FINANZAS
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
INSTITUCIONAL: PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE, 2023
Cifras en Lempias

No. Proy.	INSTITUCIÓN / PROYECTO	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado (Devengado) Anual			Ejecutado (Devengado) al III Trimestre			Comprometido					
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total general	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total general	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total general	% Ejecución (Ejec./Vigte.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total general	% Ejecución (Ejec./Vigte.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total general	% Ejecución (Compr./Vigte.)
1	ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS COMUNITARIOS DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN UBICADOS EN IRIONA (COLÓN), LA ESPERANZA (INTIBUCA) Y TEGUCIGALPA (FRANCISCO MORAZÁN)	BCH - 24967-1	-	-	-	4,773,090	-	4,773,090	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
	TOTAL ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS COMUNITARIOS DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN UBICADOS EN IRIONA (COLÓN), LA ESPERANZA (INTIBUCA) Y TEGUCIGALPA (FRANCISCO MORAZÁN)		-	-	-	4,773,090	-	4,773,090	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
2	INSTALACIÓN DE PARQUE TECNOLÓGICO PARA LA PRODUCCIÓN DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO A JOVENES ESTUDIANTES DE BAJOS RECURSOS, UBICADO ALDEA FLORES, VILLA SAN ANTONIO, COMAYAGUA	BCH - 24976-1	-	-	-	5,226,910	-	5,226,910	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
	TOTAL INSTALACIÓN DE PARQUE TECNOLÓGICO PARA LA PRODUCCIÓN DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO A JOVENES ESTUDIANTES DE BAJOS RECURSOS, UBICADO ALDEA FLORES, VILLA SAN ANTONIO, COMAYAGUA		-	-	-	5,226,910	-	5,226,910	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
1	0702 - Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán		-	-	-	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
1	FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DEL PROGRAMA DE VINCULACIÓN SOCIAL Y EXTENSIÓN DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE LA UPNFM	FN-24618	-	-	-	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
	TOTAL FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DEL PROGRAMA DE VINCULACIÓN SOCIAL Y EXTENSIÓN DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE LA UPNFM		-	-	-	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
1	0703 - Universidad Nacional de Agricultura		-	-	-	37,500,000	-	37,500,000	174,993	-	174,993	0%	174,993	-	174,993	0%	174,993	-	174,993	0%
1	Proyecto Fortalecimiento de las Capacidades Educativas, Productivas y Sociales de la Universidad Nacional de Agricultura, Catacamas, Olancho, PROFORCEPS	BCH 25001-1	-	-	-	37,500,000	-	37,500,000	174,993	-	174,993	0%	174,993	-	174,993	0%	174,993	-	174,993	0%
	TOTAL Proyecto Fortalecimiento de las Capacidades Educativas, Productivas y Sociales de la Universidad Nacional de Agricultura, Catacamas, Olancho, PROFORCEPS		-	-	-	37,500,000	-	37,500,000	174,993	-	174,993	0%	174,993	-	174,993	0%	174,993	-	174,993	0%
1	0708 - Hospital Escuela Universitario		-	-	-	127,070,182	-	127,070,182	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
1	Fortalecimiento de infraestructura y equipamiento tecnológico en el Hospital Escuela ubicado en la ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazán	BCH-24985-1	-	-	-	127,070,182	-	127,070,182	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
	TOTAL Fortalecimiento de infraestructura y equipamiento tecnológico en el Hospital Escuela ubicado en la ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazán		-	-	-	127,070,182	-	127,070,182	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
5	0801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica		111,860,711	2,050,899,231	2,172,759,942	111,860,711	2,142,195,232	2,254,055,943	8,978,320	1,250,249,285	1,259,227,605	56%	3,106,278	134,178,577	137,285,034	6%	10,838,859	1,823,564,230	1,834,503,089	81%
1	APOYO A LA INTEGRACIÓN DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)	GRT/SX-16864-HO	-	18,880,000	18,880,000	-	19,265,000	19,265,000	-	19,001,068	19,001,068	99%	-	15,462,762	15,462,762	80%	-	19,108,920	19,108,920	99%
	TOTAL APOYO A LA INTEGRACIÓN DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)		-	18,880,000	18,880,000	-	19,265,000	19,265,000	-	19,001,068	19,001,068	99%	-	15,462,762	15,462,762	80%	-	19,108,920	19,108,920	99%
2	APOYO AL PROGRAMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	BID-4598/BL-HO BID-4599/SX-HO	18,950,001	1,368,771,354	1,387,721,355	23,550,001	1,368,771,354	1,392,321,355	7,679,977	240,033,472	747,713,449	54%	2,485,968	117,252,351	119,738,319	9%	8,003,389	1,277,723,267	1,285,726,657	92%
	TOTAL APOYO AL PROGRAMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA		18,950,001	1,427,610,862	1,446,560,863	23,550,001	1,427,610,862	1,451,160,863	7,679,977	762,770,659	770,450,636	53%	2,485,968	117,252,351	119,738,319	8%	8,003,389	1,335,480,177	1,343,483,566	93%
3	ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LUGARES AISLADOS	BID-GRT/SX-17123-HO	-	-	-	11,568,000	-	11,568,000	-	703,549	703,549	6%	-	703,549	703,549	6%	-	1,201,124	1,201,124	10%
	TOTAL ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LUGARES AISLADOS		-	-	-	11,568,000	-	11,568,000	-	703,549	703,549	6%	-	703,549	703,549	6%	-	1,201,124	1,201,124	10%
4	PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑEVERAL-RÍO LINDO	ATN/JF-17247-HO ATN-OC-14905-HO BID 3435/BL-HO JICA HO-P6	-	2,773,282	2,773,282	-	-	2,388,282	2,388,282	2,242,079	2,242,079	94%	-	-	-	0%	-	2,242,079	2,242,079	94%
	TOTAL PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑEVERAL-RÍO LINDO		-	2,773,282	2,773,282	-	-	2,388,282	2,388,282	2,242,079	2,242,079	94%	-	-	-	0%	-	2,242,079	2,242,079	94%
5	RENOVACIÓN DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA FRANCISCO MORAZÁN PARA FACILITAR EL	BID 5132/BL-HO	92,910,710	611,635,087	704,545,797	88,310,710	614,023,369	702,334,079	1,298,343	467,774,009	469,072,352	67%	620,310	760,094	1,380,404	0%	2,935,469	465,531,929	468,467,399	77%
	TOTAL RENOVACIÓN DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA FRANCISCO MORAZÁN PARA FACILITAR EL		92,910,710	614,408,369	707,319,079	88,310,710	614,023,369	702,334,079	1,298,343	467,774,009	469,072,352	67%	620,310	760,094	1,380,404	0%	2,935,469	467,774,009	470,709,478	67%
3	0803 - Empresa Nacional Portuaria		-	-	-	16,100,000	-	16,100,000	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
1	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL MALECON DE PUERTO CORTÉS	RP-24869-1	-	-	-	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
	TOTAL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL MALECON DE PUERTO CORTÉS		-	-	-	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
2	ESTUDIO Y DISEÑO DEL PROYECTO DE REPARACIÓN DE PUENTE DE ACCESO, MUELLE, Y CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO PUENTE DE ACCESO ALTERNATIVO AL MUELLE DEL PUERTO DE SAN LORENZO, VALLE	RP-25225-1	-	-	-	8,200,000	-	8,200,000	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
	TOTAL ESTUDIO Y DISEÑO DEL PROYECTO DE REPARACIÓN DE PUENTE DE ACCESO, MUELLE, Y CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO PUENTE DE ACCESO ALTERNATIVO AL MUELLE DEL PUERTO DE SAN LORENZO, VALLE		-	-	-	8,200,000	-	8,200,000	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
3	PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA TERMINAL MARITIMA DE GRANELES LIQUIDOS DE PUERTO CORTÉS	RP-24770-1	-	-	-	2,900,000	-	2,900,000	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
	TOTAL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA TERMINAL MARITIMA DE GRANELES LIQUIDOS DE PUERTO CORTÉS		-	-	-	2,900,000	-	2,900,000	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
1	0806 - Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola		-	-	-	8,928,206	-	8,928,206	1,307,361	-	1,307,361	15%	816,804	-	816,804	9%	1,307,361	-	1,307,361	15%
1	Fortalecimiento y Mantenimiento de la Reserva Estratégica de granos básicos a través de la Comercialización y Rehabilitación de Bodegas y Silos en San Pedro Sula, Danlí y Tegucigalpa.	BCH-24832-1	-	-	-	8,928,206	-	8,928,206	1,307,361	-	1,307,361	15%	816,804	-	816,804	9%	1,307,361	-	1,307,361	15%
	TOTAL Fortalecimiento y Mantenimiento de la Reserva Estratégica de granos básicos a través de la Comercialización y Rehabilitación de Bodegas y Silos en San Pedro Sula, Danlí y Tegucigalpa.		-	-	-	8,928,206	-	8,928,206	1,307,361	-	1,307,361	15%	816,804	-	816,804	9%	1,307,361	-	1,307,361	15%
1	0807 - Suplidora Nacional de Productos Básicos		-	-	-	227,307,505	-	227,307,505	62,768,701	-	62,768,701	28%	62,743,860	-	62,743,860	28%	62,768,701	-	62,768,701	28%
1	Proyecto de Abastecimiento de Centros de Venta de Honduras y Fortalecimiento al BANASUPRO	BCH-24912-1	-	-	-	227,307,505	-	227,307,505	62,768,701	-	62,768,701	28%	62,743,860	-	62,743,860	28%	62,768,701	-	62,768,701	28%
	TOTAL Proyecto de Abastecimiento de Centros de Venta de Honduras y Fortalecimiento al BANASUPRO		-	-	-	227,307,505	-	227,307,505	62,768,701	-	62,768,701	28%	62,743,860	-	62,743,860	28%	62,768,701	-	62,768,701	28%
1	0809 - Empresa de Correos de Honduras		-	-	-	6,537,546	-	6,537,546	4,912,603	-	4,912,603	75%	2,544,864	-	2,544,864	39%	4,912,603	-	4,912,603	75%
1	FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO POSTAL HONDUREÑO, en las oficinas postales, Centro - Tegucigalpa, Toncortín, Nacoame, San Pedro Sula, La Entrada, Comayagua, La Ceiba, Danlí, Jutiaca, Choluteca, Santa Bárbara	BCH - 24761-1	-	-	-	6,537,546	-	6,537,546	4,912,603	-	4,912,603	75%	2,544,864	-	2,544,864	39%	4,912,603	-	4,912,603	75%
	TOTAL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO POSTAL HONDUREÑO, en las oficinas postales, Centro - Tegucigalpa, Toncortín, Nacoame, San Pedro Sula, La Entrada, Comayagua, La Ceiba, Danlí, Jutiaca, Choluteca, Santa Bárbara		-	-	-	6,537,546	-	6,537,546	4,912,603	-	4,912,603	75%	2,544,864	-	2,544,864	39%	4,912,603	-	4,912,603	75%
2	1801 - Alcaldía Municipal del Distrito Central		-	-	-	309,906,685	-	309,906,685	-	37,798,747	37,798,747	12%	-	13,945,348	13,945,348	4%	-	49,439,276	49,439,276	16%
1	PROYECTO DE TRANSPORTE PÚBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TEGUCIGALPA - COMAYAGUELA)	BID-2465/BL-HO	-	-	-	52,458,949	-	52,458,949	-	25,557,735	25,557,735	49%	-	9,729,916	9,729,916	19%	-	25,557,735	25,557,735	49%
2	Proyecto para Fortalecer la Prestación de Agua Potable de Tegucigalpa	IDA 6460	-	-	-	257,447,736	-	257,447,736	-	12,241,013	12,241,013	5%	-	4,215,432	4,215,432	2%	-	23,881,542	23,881,542	9%
	TOTAL Proyecto para Fortalecer la Prestación de Agua Potable de Tegucigalpa		-	-	-	257,447,736	-	257,447,736	-	12,241,013	12,241,013	5%	-	4,215,432	4,215,432	2%	-	23,881,542	23,881,542	9%
95	SUB-TOTAL INVERSIÓN PRODUCTIVA (Registrada en SIAFI)		346,031,957	5,109,013,174	5,455,045,131	6,624,991,091	9,860,740,823	16,485,731,914	3,037,323,566	2,813,362,408	5,850,685,974	35%	1,252,480,547	913,724,516	2,166,205,064	13%	3,881,701,783	3,748,487,261	7,630,189,044	46%
-	0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social		-	345,825,076	345,825,076	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
-	0032 - Secretaría de la Presidencia		-	25,652,000	25,652,000	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
-	0044 - Instituto Nacional Penitenciario		-	181,147,810	181,147,810	-	-	-	-	-	-	0%	-							

SECRETARÍA DE FINANZAS
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
INSTITUCIONAL: PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE, 2023
Cifras en Lempiras

No. Proy.	INSTITUCIÓN / PROYECTO	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado (Devengado) Anual				Ejecutado (Devengado) al III Trimestre				Comprometido			
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total general	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total general	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total general	% Ejecución (Ejec./Vigte.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total general	% Ejecución (Ejec./Vigte.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total general	% Ejecución (Compr./Vigte.)
-	0416 - Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	1,800,000	1,800,000	0%	
-	0417 - Programa de Acción Solidaria		-	-	-	1,442,887,653	4,500,000	1,447,387,653	1,152,523,449	1,800,000	1,154,323,449	80%	585,192,387	1,800,000	586,992,387	41%	1,152,523,449	-	1,152,523,449	80%
-	0500 - Instituto Nacional Agrario		-	100,000,000	100,000,000	7,178,449	-	7,178,449	5,324,699	-	5,324,699	74%	1,064,699	-	1,064,699	15%	5,324,699	-	5,324,699	74%
-	0501 - Instituto Hondureño de Turismo		-	-	-	656,000	-	656,000	5,572	-	5,572	1%	-	-	-	0%	5,572	-	5,572	1%
-	0504 - Instituto de Crédito Educativo		-	87,000,000	87,000,000	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
-	0505 - Instituto Hondureño de Antropología e Historia		-	-	-	31,500	-	31,500	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
-	0506 - Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas		8,993,389	-	8,993,389	70,000	-	70,000	54,830	-	54,830	78%	-	-	-	0%	54,830	-	54,830	78%
-	0507 - Inst. Hondureño para Prev. y Trat. del Alcohol, Drog. y Farm.		-	7,239,952	7,239,952	1,170,435	-	1,170,435	1,170,435	-	1,170,435	100%	-	-	-	0%	1,170,435	-	1,170,435	100%
-	0511 - Universidad de Ciencias Forestales		-	-	-	14,495,615	-	14,495,615	8,613,497	-	8,613,497	59%	3,206,693	-	3,206,693	22%	8,613,497	-	8,613,497	59%
-	0515 - Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación		-	4,000,000	4,000,000	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
-	0601 - Instituto Hondureño de Seguridad Social		-	-	-	8,068,000	-	8,068,000	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
-	0602 - Inst. Nat. de Jubil. y Pen. de los Emp. y Fun. del Poder Ejec.		-	-	-	5,930,500,000	-	5,930,500,000	4,699,153,191	-	4,699,153,191	79%	1,816,671,245	-	1,816,671,245	31%	4,699,153,191	-	4,699,153,191	79%
-	0603 - Instituto Nacional de Previsión del Magisterio		-	-	-	6,994,389,258	-	6,994,389,258	5,226,785,381	-	5,226,785,381	75%	1,799,956,795	-	1,799,956,795	26%	5,226,785,381	-	5,226,785,381	75%
-	0604 - Instituto de Previsión Militar		-	-	-	2,127,672,477	-	2,127,672,477	1,492,846,371	-	1,492,846,371	70%	462,724,677	-	462,724,677	22%	1,492,846,371	-	1,492,846,371	70%
-	0708 - Hospital Escuela Universitario		-	-	-	180,980,135	-	180,980,135	1,076,565	-	1,076,565	1%	554,890	-	554,890	0%	1,076,565	-	1,076,565	1%
-	0801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica		9,160,500,000	-	9,160,500,000	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
-	0803 - Empresa Nacional Portuaria		-	-	-	28,350,000	-	28,350,000	19,525,579	-	19,525,579	69%	5,751,675	-	5,751,675	20%	19,525,579	-	19,525,579	69%
-	0903 - Banco Nacional de Desarrollo Agrícola		-	2,000,000,000	2,000,000,000	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
-	Otros Programas Sociales (antes fidelcomisos)		12,204,679,707	-	12,204,679,707	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
-	Transferencias a Cruz Roja, Cruz Verde, Fundación Niños con Cáncer, Operación Sonrisa.		1,256,839,932	-	1,256,839,932	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
-	Transferencias a 298 Alcaldías Municipales		7,013,516,311	-	7,013,516,311	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	1,800,000	1,800,000	0%
-	TOTAL INVERSIÓN SOCIAL		45,824,826,751	2,408,239,952	48,233,066,703	31,041,796,093	10,633,540,582	41,675,336,675	16,668,049,820	5,744,860,280	22,412,910,100	54%	6,534,813,491	1,960,774,169	8,495,587,661	20%	16,703,052,213	6,914,166,768	23,617,218,981	57%
-	TOTAL FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO (FBKF)		-	-	-	16,617,760,021	2,441,368,271	19,059,128,292	5,200,126,839	26,936,623	5,227,063,461	27%	2,654,810,792	22,455,498	2,677,266,290	14%	6,245,569,073	52,617,619	6,298,186,692	33%
-	TOTAL GENERAL		47,433,966,163	24,412,990,598	71,846,956,761	54,284,547,205	22,935,649,676	77,220,196,881	24,905,500,225	8,585,159,311	33,490,659,536	43%	10,442,104,831	2,896,954,183	13,339,059,014	17%	26,830,323,068	10,715,271,648	37,545,594,717	49%

Fuente: SIAFI, 30/09/2023

SECRETARÍA DE FINANZAS
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
SECTORES: PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE, 2023
Cifras en Lempiras

SECTOR / INSTITUCIÓN	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado (Devengado)				Ejecutado (Devengado) al III Trimestre				Comprometido			
	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Ejecutado/Vigente)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Ejecutado/Vigente)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Compromiso/Vigente)
AGUA Y SANEAMIENTO	32,949,800	824,878,949	857,828,749	554,722,102	798,182,727	1,352,904,829	307,980,300	56,071,026	364,051,326	27%	218,096,190	9,039,697	227,135,886	17%	307,980,300	70,655,909	378,636,208	28%
0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social	-	69,816,382	69,816,382	-	69,816,382	69,816,382	-	2,648,996	2,648,996	4%	-	1,002,080	1,002,080	1%	-	2,648,996	2,648,996	4%
0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería	32,949,800	432,327,110	465,276,910	-	432,327,110	432,327,110	-	11,420,402	11,420,402	3%	-	3,822,184	3,822,184	1%	-	14,364,756	14,364,756	3%
0412 - Secretaría de Desarrollo Social	-	12,828,772	12,828,772	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
0416 - Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento	-	-	-	554,722,102	38,591,499	593,313,601	307,980,300	29,760,615	337,740,915	57%	218,096,190	-	218,096,190	37%	307,980,300	29,760,615	337,740,915	57%
1801 - Alcaldía Municipal del Distrito Central	-	309,906,685	309,906,685	-	257,447,736	257,447,736	-	12,241,013	12,241,013	5%	-	4,215,432	4,215,432	2%	-	23,881,542	23,881,542	9%
CARRETERAS	918,862,248	2,952,859,810	3,871,722,058	2,041,905,806	-	2,041,905,806	1,195,406,692	-	1,195,406,692	59%	306,047,740	-	306,047,740	15%	1,900,300,435	-	1,900,300,435	93%
0411 - Secretaría de Infraestructura y Transporte	918,862,248	2,952,859,810	3,871,722,058	2,041,905,806	-	2,041,905,806	1,195,406,692	-	1,195,406,692	59%	306,047,740	-	306,047,740	15%	1,900,300,435	-	1,900,300,435	93%
1801 - Alcaldía Municipal del Distrito Central	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
COMPETITIVIDAD Y MIPYMES	134,363,961	-	134,363,961	-	134,363,961	134,363,961	35,359,758	-	35,359,758	26%	35,359,758	-	35,359,758	26%	35,359,758	-	35,359,758	26%
0039 - Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios	-	-	-	-	134,363,961	134,363,961	35,359,758	-	35,359,758	26%	35,359,758	-	35,359,758	26%	35,359,758	-	35,359,758	26%
COMUNICACIONES	-	400,000,000	400,000,000	-	386,193,483	386,193,483	49,281,850	-	49,281,850	13%	-	-	-	0%	49,281,850	-	49,281,850	13%
0101 - Comisión Nacional de Telecomunicaciones	-	-	-	-	386,193,483	386,193,483	49,281,850	-	49,281,850	13%	-	-	-	0%	49,281,850	-	49,281,850	13%
0804 - Empresa Hondureña de Telecomunicaciones	-	400,000,000	400,000,000	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
DESARROLLO PRODUCTIVO	-	-	-	248,174,041	775,876,261	1,024,050,302	67,095,300	59,589,644	126,684,944	12%	64,655,695	21,818,861	86,474,556	8%	67,095,300	66,530,466	133,625,766	13%
0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería	-	-	-	248,174,041	775,876,261	1,024,050,302	67,095,300	59,589,644	126,684,944	12%	64,655,695	21,818,861	86,474,556	8%	67,095,300	66,530,466	133,625,766	13%
0806 - Instituto Hondureño de Mercado Agrícola	-	-	-	-	8,928,206	8,928,206	-	1,307,361	1,307,361	15%	816,804	-	816,804	9%	1,307,361	-	1,307,361	15%
0807 - Suplidora Nacional de Productos Básicos	-	-	-	-	227,307,505	227,307,505	-	62,768,701	62,768,701	28%	62,743,860	-	62,743,860	28%	62,768,701	-	62,768,701	28%
EDUCACION	10,858,805	1,320,925,870	1,331,784,675	1,237,332,923	781,434,941	2,018,767,864	408,371,767	160,352,388	568,724,155	28%	190,706,412	57,271,339	247,977,751	12%	533,821,678	192,671,990	726,493,668	36%
0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social	5,143,752	122,813,361	127,957,113	1,237,332,923	168,638,437	478,235,012	199,589,970	276,609,619	568,724,155	28%	81,399,125	6,266,041	87,665,166	18%	533,821,678	192,671,990	726,493,668	36%
0030 - Secretaría de la Presidencia	-	-	-	10,858,805	-	10,858,805	-	-	10,858,805	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
0050 - Secretaría de Educación	2,716,013	481,139,474	483,855,487	301,463,141	182,392,346	483,855,487	42,621,950	23,099,132	65,721,082	14%	31,437,088	10,634,841	42,071,929	9%	168,071,861	33,595,379	201,667,241	42%
0413 - Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación	-	232,700,000	232,700,000	495,008,362	-	495,008,362	164,672,652	-	164,672,652	33%	76,574,516	-	76,574,516	15%	164,672,652	-	164,672,652	33%
0415 - Programa de la Red Solidaria	-	440,955,448	440,955,448	-	430,404,158	430,404,158	-	100,233,607	100,233,607	23%	-	40,370,457	40,370,457	9%	-	122,056,961	122,056,961	28%
0503 - Instituto Nacional de Formación Profesional	-	-	-	69,907,200	-	69,907,200	-	-	69,907,200	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
0505 - Instituto Hondureño de Antropología e Historia	2,999,040	-	2,999,040	2,999,040	-	2,999,040	-	-	2,999,040	44%	1,120,690	-	1,120,690	37%	1,312,202	-	1,312,202	44%
0511 - Universidad de Ciencias Forestales	-	5,817,587	5,817,587	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
0702 - Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán	-	-	-	10,000,000	-	10,000,000	-	-	10,000,000	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
0703 - Universidad Nacional de Agricultura	-	37,500,000	37,500,000	37,500,000	-	37,500,000	174,993	-	174,993	0%	174,993	-	174,993	0%	174,993	-	174,993	0%
ENERGIA	261,313,661	5,562,527,232	5,823,840,893	111,860,711	2,217,566,338	2,329,427,049	8,978,320	1,311,650,135	1,320,628,455	57%	3,106,278	134,178,757	137,285,034	6%	10,938,859	1,884,965,080	1,895,903,939	81%
0144 - Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible	-	-	-	111,860,711	2,217,566,338	2,329,427,049	8,978,320	1,311,650,135	1,320,628,455	57%	3,106,278	134,178,757	137,285,034	6%	10,938,859	1,884,965,080	1,895,903,939	81%
0801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica	261,313,661	5,562,527,232	5,823,840,893	111,860,711	2,217,566,338	2,329,427,049	8,978,320	1,311,650,135	1,320,628,455	57%	3,106,278	134,178,757	137,285,034	6%	10,938,859	1,884,965,080	1,895,903,939	81%
MODERNIZACION DEL ESTADO	255,452,385	1,159,545,071	1,414,997,456	136,172,540	380,867,956	517,040,496	95,272,938	98,454,845	193,727,783	37%	7,236,524	45,302,934	52,539,458	10%	96,147,542	1,823,564,230	2,498,859,628	48%
0030 - Secretaría de la Presidencia	-	25,652,000	25,652,000	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
0037 - Servicio de Administración de Rentas	-	173,394,931	173,394,931	-	173,394,931	173,394,931	-	93,038,665	93,038,665	54%	-	43,043,740	43,043,740	25%	-	146,598,869	146,598,869	85%
0091 - Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil	-	-	-	1,712,818	-	1,712,818	-	-	1,712,818	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
0100 - Secretaría de Finanzas	253,290,168	-	253,290,168	111,860,711	2,217,566,338	2,329,427,049	8,978,320	1,311,650,135	1,320,628,455	57%	3,106,278	134,178,757	137,285,034	6%	10,938,859	1,884,965,080	1,895,903,939	81%
0180 - Registro Nacional de las Personas	-	400,000,000	400,000,000	-	75,371,106	75,371,106	-	61,400,849	61,400,849	81%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
0400 - Administración Aduanera de Honduras	-	45,000,000	45,000,000	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
0414 - Dirección de Gestión por Resultados	-	-	-	-	207,473,025	207,473,025	-	5,416,180	5,416,180	3%	-	2,259,194	2,259,194	1%	-	7,113,216	7,113,216	3%
0415 - Programa de la Red Solidaria	-	464,398,140	464,398,140	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
0503 - Instituto Nacional de Formación Profesional	-	47,700,000	47,700,000	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
0505 - Instituto Hondureño de Antropología e Historia	2,162,217	-	2,162,217	2,162,217	-	2,162,217	288,767	-	288,767	13%	278,566	-	278,566	13%	288,767	-	288,767	13%
0515 - Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	10,000,000	-	10,000,000	-	-	10,000,000	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
0809 - Empresa de Correos de Honduras	-	3,400,000	3,400,000	6,537,546	-	6,537,546	4,912,603	-	4,912,603	75%	2,544,864	-	2,544,864	39%	4,912,603	-	4,912,603	75%
PROTECCION SOCIAL	12,701,878	3,661,856,652	3,674,558,530	91,230,650	2,627,039,899	2,718,270,549	29,401,280	518,680,117	548,081,397	20%	18,807,418	393,378,493	412,185,911	15%	29,401,280	682,823,741	712,225,020	26%
0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social	12,701,878	1,184,786,270	1,197,488,148	91,230,650	2,627,039,899	2,718,270,549	29,401,280	518,680,117	548,081,397	20%	18,807,418	393,378,493	412,185,911	15%	29,401,280	682,823,741	712,225,020	26%
0042 - Cuerpo de Bomberos de Honduras	-	-	-	40,700,000	-	40,700,000	-	-	40,700,000	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
0060 - Secretaría de Salud	-	37,822,172	37,822,172	-	34,012,479	34,012,479	-	615,944	615,944	2%	-	615,944	615,944	2%	-	615,944	615,944	2%
0244 - Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer	-	22,041,275	22,041,275	-	22,041,275	22,041,275	-	13,870,745	13,870,745									

SECRETARÍA DE FINANZAS
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
SECTORES: PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE, 2023
Cifras en Lempiras

SECTOR / INSTITUCIÓN	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado (Devengado)				Ejecutado (Devengado) al III Trimestre				Comprometido			
	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Ejecutado/Vigente)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Ejecutado/Vigente)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Compromiso/Vigente)
0411 - Secretaría de Infraestructura y Transporte	3,180,000,000	-	3,180,000,000	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
EDUCACION	900,000,000	287,000,000	1,187,000,000	1,069,066,508	-	1,069,066,508	175,469,885	-	175,469,885	16%	105,431,122	-	105,431,122	10%	209,190,688	-	209,190,688	20%
0050 - Secretaría de Educación	700,000,000	-	700,000,000	1,031,950,800	-	1,031,950,800	155,531,388	-	155,531,388	15%	97,574,429	-	97,574,429	9%	189,252,191	-	189,252,191	18%
0410 - Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras	-	-	-	22,620,093	-	22,620,093	11,325,000	-	11,325,000	50%	4,650,000	-	4,650,000	21%	11,325,000	-	11,325,000	50%
0412 - Secretaría de Desarrollo Social	200,000,000	-	200,000,000	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
0415 - Red Solidaria	-	200,000,000	200,000,000	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
0504 - Instituto de Crédito Educativo	-	87,000,000	87,000,000	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
0511 - Universidad de Ciencias Forestales	-	-	-	14,495,615	-	14,495,615	8,613,497	-	8,613,497	59%	3,206,693	-	3,206,693	22%	8,613,497	-	8,613,497	59%
ENERGÍA	19,934,800,000	-	19,934,800,000	8,633,369,636	-	8,633,369,636	4,732,537,278	-	4,732,537,278	36%	502,734,295	-	502,734,295	11%	975,607,341	-	975,607,341	36%
0310 - Secretaría de Energía	10,774,300,000	-	10,774,300,000	8,633,369,636	-	8,633,369,636	4,732,537,278	-	4,732,537,278	36%	502,734,295	-	502,734,295	11%	975,607,341	-	975,607,341	36%
0801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica	9,160,500,000	-	9,160,500,000	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
MODERNIZACIÓN DEL ESTADO	2,586,504,456	121,239,952	2,707,744,408	208,800,676	-	208,800,676	140,150,063	-	140,150,063	67%	43,579,564	-	43,579,564	21%	140,206,582	-	140,206,582	67%
0001 - Congreso Nacional	200,000,000	-	200,000,000	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
0003 - Comisionado Nacional de Derechos Humanos	-	-	-	161,918	-	161,918	160,862	-	160,862	99%	100,862	-	100,862	62%	160,862	-	160,862	99%
0004 - Consejo Nacional Electoral	200,000,000	-	200,000,000	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
0020 - Presidencia de la República	212,491,834	-	212,491,834	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
0040 - Secretaría de Justicia, Gobernación y Descentralización	-	-	-	79,046,000	-	79,046,000	52,280,000	-	52,280,000	66%	18,420,000	-	18,420,000	23%	52,280,000	-	52,280,000	66%
0045 - Instituto Nacional de Migración	-	-	-	695,165	-	695,165	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
0080 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.	54,629,086	-	54,629,086	127,356,859	-	127,356,859	86,944,941	-	86,944,941	68%	-	-	-	0%	87,001,460	-	87,001,460	68%
0100 - Secretaría de Finanzas	84,000,000	-	84,000,000	-	-	-	-	-	-	0%	24,787,921	-	24,787,921	0%	-	-	-	0%
0104 - Dirección Nacional de Bienes del Estado	-	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
0180 - Registro Nacional de las Personas	-	-	-	1,470,734	-	1,470,734	709,429	-	709,429	48%	270,780	-	270,780	18%	709,429	-	709,429	48%
0500 - Instituto Nacional Agrario	-	100,000,000	100,000,000	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
0501 - Instituto Hondureño de Turismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
0506 - Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas	8,993,389	-	8,993,389	70,000	-	70,000	54,830	-	54,830	78%	-	-	-	0%	54,830	-	54,830	78%
0507 - Inst. Hondureño para Prev. y Trat. del Alcohol, Drog. y Farm.	-	7,239,952	7,239,952	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
0602 - Inst. Nal. de Jubil. y Pen. de los Emp. y Fun. del Poder Ejec.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
0603 - Instituto Nacional de Previsión del Magisterio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
0604 - Instituto de Previsión Militar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
0604 - Instituto de Previsión Militar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
0515 - Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación	-	4,000,000	4,000,000	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
Sistema Tecnológico y Logístico para la Administración de los Derechos de Propiedad en la República de Honduras (SITEC)	1,826,390,147	-	1,826,390,147	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
PROTECCION SOCIAL	5,662,041,492	-	5,662,041,492	17,498,671,549	4,500,000	17,503,171,549	13,076,871,898	1,800,000	13,078,671,898	75%	5,036,394,508	1,800,000	5,038,194,508	29%	13,077,013,548	1,800,000	13,078,813,548	75%
0003 - Comisionado Nacional de Derechos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social	684,876,492	-	684,876,492	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
0033 - Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
0130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social	-	-	-	2,987,361	-	2,987,361	1,317,293	-	1,317,293	44%	423,122	-	423,122	14%	1,317,293	-	1,317,293	44%
0242 - Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia	-	-	-	104,007,602	-	104,007,602	66,929,044	-	66,929,044	64%	40,666,708	-	40,666,708	39%	66,929,044	-	66,929,044	64%
0300 - Secretaría de Derechos Humanos	-	-	-	2,000,000	-	2,000,000	373,840	-	373,840	19%	373,840	-	373,840	19%	373,840	-	373,840	19%
0301 - Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas	-	-	-	3,750,000	-	3,750,000	837,492	-	837,492	22%	837,492	-	837,492	22%	837,492	-	837,492	22%
0406 - Secretaría de Asuntos de la Mujer	-	-	-	37,330,630	-	37,330,630	16,779,822	-	16,779,822	45%	6,038,657	-	6,038,657	16%	16,921,472	-	16,921,472	45%
0412 - Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	102,810,755	-	102,810,755	101,645,996	-	101,645,996	99%	7,000,000	-	7,000,000	7%	101,645,996	-	101,645,996	99%
0415 - Programa de la Red Solidaria	-	-	-	749,165,378	-	749,165,378	316,509,584	-	316,509,584	42%	316,509,584	-	316,509,584	42%	316,509,584	-	316,509,584	42%
0417 - Programa de Acción Solidaria	-	-	-	1,442,887,653	4,500,000	1,447,387,653	1,152,523,449	1,800,000	1,154,323,449	80%	585,192,387	1,800,000	586,992,387	41%	1,152,523,449	1,800,000	1,154,323,449	80%
0505 - Instituto Hondureño de Antropología e Historia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
0506 - Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
0507 - Inst. Hondureño para Prev. y Trat. del Alcohol, Drog. y Farm.	-	-	-	1,170,435	-	1,170,435	1,170,435	-	1,170,435	100%	-	-	-	0%	1,170,435	-	1,170,435	100%
0511 - Universidad de Ciencias Forestales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
0601 - Instituto Hondureño de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
0602 - Inst. Nal. de Jubil. y Pen. de los Emp. y Fun. del Poder Ejec.	-	-	-	5,930,500,000	-	5,930,500,000	4,699,153,191	-	4,699,153,191	79%	1,816,671,245	-	1,816,671,245	31%	4,699,153,191	-	4,699,153,191	79%
0603 - Instituto Nacional de Previsión del Magisterio	-	-	-	6,994,389,258	-	6,994,389,258	5,226,785,381	-	5,226,785,381	75%	1,799,956,795	-	1,799,956,795	26%	5,226,785,381	-	5,226,785,381	75%
0604 - Instituto de Previsión Militar	-	-	-	2,127,672,477	-	2,127,672,477	1,492,846,371	-	1,492,846,371	70%	462,724,677	-	462,724,677	22%	1,492,846,371	-	1,492,846,371	70%
Solidaridad y Protección Social para la Reducción de la Pobreza; Fondo de Servicios de Desarrollo Empresarial (FOSEDEH); Fondo de Solidaridad con el Migrante Hondureño (FOSMIH); Fomento de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa FOMIMYPE; Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos	4,977,165,000	-	4,977,165,000	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
RECURSOS FORESTAL Y AMBIENTE	100,000,000	-	100,000,000	100,200,000	-	100,200,000	57,062	-	57,062	0%	18,375	-	18,375	0%	57,062	-	57,062	0%
0028 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal	100,000,000	-	100,000,000	100,200,000	-	100,200,000	57,062	-	57,062	0%	18,375	-	18,375	0%	57,062	-	57,062	0%
SALUD	2,770,000,000	-	2,770,000,000	1,881,660,696	5,896,503,304	7,778,164,000	940,013,294	1,948,568,412	2,888,581,706	37%	335,122,268	1,021,574,333	1,356,696,601	17%	941,096,714	3,116,074,900	4,057,171,614	52%
0060 - Secretaría de Salud	1,470,000,000	-	1,470,000,000	1,692,612,561	5,896,503,304	7,589,115,865	938,936,729	1,948,568,412	2,887,505,141	38%	334,567,379	1,021,574,333	1,356,141,712	18%	940,020,149	3,116,074,900	4,056,095,049	53%
0601 - Instituto Hondureño de Seguridad Social	-	-	-	8,068,000	-	8,068,000	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
0708 - Hospital Escuela Universitario	-	-	-	180,980,135	-	180,980,135	1,076,565	-	1,076,565	1%	554,890	-	554,890	0%	1,076,565	-	1,076,565	1%
Adquisición de Medicamentos	1,300,000,000	-	1,300,000,000	-	-	-	-	-	-	0%	-							

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2023

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2023		
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social	001 - Ampliación Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Ciudad De Gracias, Departamento De Lempira	08 - Consultoría para captación agua, represamiento en reservorios y aprovechamiento de fuentes alternas. AGUA	369 - CONSULTORÍA	1	0	0%	0	0	0%
		09 - Consultoría de estudio ambiental. AGUA	369 - CONSULTORÍA	1	0	0%	0	0	0%
		10 - Capacitaciones impartidas a los actores involucrados por parte de las instancias responsables y reguladoras de sistemas de agua potable en Honduras. AGUA	1009 - CAPACITACIÓN	1	0	0%	0	0	0%
		11 - Infraestructura del sistema de agua potable supervisada. AGUA	149 - INFORME	1	0	0%	0	0	0%
		12 - Informe con enfoque de genero elaborados. AGUA	149 - INFORME	1	0	0%	0	0	0%
		13 - Consultoría de estrategia de sostenibilidad de sistema. AGUA	369 - CONSULTORÍA	1	0	0%	0	0	0%
		001 - Programa de Mejoramiento de la Infraestructura de Desarrollo Social y Comunitario en varios departamentos de Honduras	04 - Informes de Supervisión de obras de Infraestructura. PROMIDESH	149 - INFORME	31	0	0%	0	0
	05 - Estudios de laboratorio nacional de medicamentos y Hospital Oncológico. PROMIDESH		547 - ESTUDIO	1	0	0%	0	0	0%
	15 - Estudios de factibilidad para Construcción de puente. PROMIDESH		1091 - ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	1	0	0%	0	0	0%
	16 - Informe con enfoque de Género. PROMIDESH		149 - INFORME	1	0	0%	0	0	0%
	23 - Informes de Supervisión de obras en centros educativos. PROMIDESH		149 - INFORME	4	0	0%	0	0	0%
	001 - Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras.	04 - Expedientes de subproyectos formulados. PRE	395 - EXPEDIENTE	73	0	0%	12	0	0%
		05 - Informes de supervisión de subproyectos. PRE	149 - INFORME	6	0	0%	2	0	0%
		06 - Informe con enfoque de género PRE.	149 - INFORME	4	0	0%	1	0	0%
	008 - PROGRAMA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SU GESTION LOCAL	02 - Capacitación a los miembros de comité ejecutores de proyectos (CEP'S) FASE V PROMINE	22 - COMITÉ	1	0	0%	0	0	0%
		04 - Capacitación a los Miembros de Comité Ejecutores de Proyecto (CEP'S) FASE IV PROMINE	22 - COMITÉ	8	0	0%	2	0	0%
		09 - Actividades para el fortalecimiento institucional del Fondo Hondureño de Inversión Social FASE V. PROMINE	131 - ACTIVIDAD	1	0	0%	0	0	0%
		10 - Asistencia técnica para la ejecución del proyecto FASE V PROMINE	992 - ASISTENCIA TÉCNICA	1	0	0%	0	0	0%
		11 - Informe con enfoque de género PROMINE	149 - INFORME	4	0	0%	1	0	0%
		21 - Acciones de Fortalecimiento Institucional del Fondo Hondureño de Inversión Social FASE IV PROMINE	131 - ACTIVIDAD	1	0	0%	0	0	0%
	011 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA	03 - Acta de recepción de proyectos entregados. ICS	991 - ACTA	23	0	0%	8	0	0%
		03 - Conformación y capacitación de los miembros de Comités Ejecutores de Proyectos CEP y líderes comunitarios. ICS	1009 - CAPACITACIÓN	216	0	0%	36	0	0%
		04 - Supervisión de Proyectos. ICS	129 - SUPERVISION	23	0	0%	8	0	0%
		06 - Informe con enfoque de genero. ICS	149 - INFORME	4	0	0%	1	0	0%
	012 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS	02 - Supervisión de obra en barrios intervenidos. PCCMB	129 - SUPERVISION	5	0	0%	5	0	0%
		02 - Talleres de valores y/o emprendimiento para jóvenes de los barrios intervenidos en la ciudad de Comayagüela. PCCMB	156 - TALLER	9	0	0%	3	0	0%
		03 - Asistencia Técnica Equipo de Promoción Social ETEC. PCCMB	992 - ASISTENCIA TÉCNICA	10	0	0%	0	0	0%
04 - Informe con enfoque de género. PCCMB		149 - INFORME	4	0	0%	1	0	0%	
06 - Actividades Deportivas del Programa Deportivo y Formación de Valores. PCCMB		312 - ACTIVIDADE DEPORTIVA	8	0	0%	0	0	0%	
01 - Capacitaciones impartidas para la formación en metodologías basadas en normas y evaluación por competencia a Docente. MIFE		1009 - CAPACITACIÓN	1	0	0%	0	0	0%	

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2023

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2023		
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
		02 - Capacitaciones impartidas para la formación en emprendimiento a docentes y alumnos. MIFE	1009 - CAPACITACIÓN	1	0	0%	0	0	0%
		13 - Proyectos contratados para lo centros educativos MIFE	305 - PROYECTO	63	0	0%	27	0	0%
		16 - Supervisiones contratadas para verificación de intervenciones en los centros educativos MIFE	129 - SUPERVISION	63	0	0%	27	0	0%
		17 - Informe con enfoque de género MIFE	149 - INFORME	4	0	0%	1	0	0%
		18 - Estudios de Factibilidad para proyectos del sector educación. MIFE	1091 - ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	42	0	0%	10	0	0%
		19 - Proyectos contratados para el equipamiento de centros educativos. MIFE	305 - PROYECTO	35	0	0%	0	0	0%
	014 - PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS	04 - Talleres para la formación de habilidades sociales y laborales para jóvenes en los lugares de incidencia del programa. CONVIVIR FASE II	156 - TALLER	12	0	0%	12	0	0%
		05 - Capacitación para la formación al fortalecimiento institucional y equipamiento a funcionarios coejecutores del programa (INJ, Alcaldías, FHIS). CONVIVIR Fase II	1009 - CAPACITACIÓN	9	0	0%	9	0	0%
		08 - Supervisión de Infraestructura de recuperación de espacios públicos. CONVIVIR FASE II	129 - SUPERVISION	7	0	0%	0	0	0%

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2023

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2023		
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
		09 - Asistencia Técnica de la Consultoría Internacional para la ejecución de proyectos de infraestructura y social. CONVIVIR FASE II	992 - ASISTENCIA TÉCNICA	4	0	0%	1	0	0%
		10 - Equipo entregado para las obras de infraestructura del programa. CONVIVIR FASE II	392 - EQUIPO	7	0	0%	0	0	0%
		11 - Informe con enfoque de género CONVIVIR FASE II	149 - INFORME	4	0	0%	1	0	0%
	060 - ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS	01 - Conformación y capacitación de los miembros de Comités Ejecutores de Proyectos CEP y líderes comunitarios. PIOH	1009 - CAPACITACIÓN	162	0	0%	54	0	0%
		04 - Acta de recepción de proyectos entregados. PIOH	991 - ACTA	9	0	0%	3	0	0%
		05 - Supervisión de Proyectos. PIOH	129 - SUPERVISION	9	0	0%	2	0	0%
		06 - Informe con enfoque de género. PIOH	149 - INFORME	4	0	0%	1	0	0%
Total 0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social				881	0	0%	228	0	0%
0028 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal	001 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS DE HONDURAS- SINAPH (LIFEWEB)	08 - Planes Operativos Anuales en Áreas Protegidas implementados.	469 - PLAN OPERATIVO ANUAL	24	0	0%	0	0	0%
		09 - Actores vinculados a la administración de las áreas protegidas fortalecidos para la gestión efectiva del territorio.	74 - PERSONA	200	0	0%	50	0	0%
		10 - Áreas protegidas con inversiones en medidas de conservación implementadas, que contribuyen a mejorar la efectividad de manejo de las áreas protegidas.	604 - AREA	12	0	0%	0	0	0%
	001 - PROYECTO MANEJO INTEGRADO DE LA BIOSFERA DEL RIO PLATANO	09 - Información estadística, geoespacial y documental generada, sobre el estado actual y dinámica de la cobertura boscosa en la zona de influencia del proyecto, con base en metodologías oficiales de país.	149 - INFORME	2	0	0%	0	0	0%
		10 - Plan de restauración de las fincas elaborados.	264 - PLAN	2	0	0%	0	0	0%
		11 - Eventos de promoción sobre mecanismos de crédito de fondo verdes para el clima realizado, conforme a las Cartillas de Adaptación al Cambio Climático.	39 - EVENTO	2	0	0%	1	0	0%
		12 - Reportes del funcionamiento del módulo de alertas por deforestación, generados.	145 - REPORTE	3	0	0%	1	0	0%
		13 - Reportes de valoración económica de los servicios ecosistémicos generados.	145 - REPORTE	2	0	0%	0	0	0%
		14 - Informe de gestión y administración del proyecto, elaborado.	149 - INFORME	1	0	0%	0	0	0%
	002 - DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN PILOTO DEL SISTEMA PARA ASEGURAR LA LEGALIDAD DE LA MADERA EN BOSQUE DE PINO	16 - Elaborar Guía Metodológica de Lineamientos y Normas para la Evaluación Efectiva de Planes de Manejo Forestal.	1035 - DOCUMENTO DE SISTEMATIZACION	1	0	0%	0	0	0%
		17 - Actualizar el censo de los talleres, artesanales, industria primaria, secundaria y planteles de venta.	17 - CENSO	1	0	0%	0	0	0%
		18 - Organizar la integración inicial de la Secretaría Interinstitucional para la Implementación del AVA (SIIAVA), a través de la conformación de 2 comités interinstitucionales de trabajo (Tierras, Derecho Laboral).	991 - ACTA	2	0	0%	1	0	0%
Total 0028 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal				252	0	0%	53	0	0%
0030 - Secretaría de la Presidencia	001 - Equipamiento de la Escuela de Profesionalización la Administración Pública, con sede en Francisco Morazán y fortalecimiento de la capacidad de los servidores públicos a nivel nacional	03 - Compilación de data e información de necesidades de capacitación, elaborada.	149 - INFORME	2	0	0%	1	0	0%
		04 - Planes de capacitación para el desarrollo profesional de servidores y servidoras públicas, realizados.	149 - INFORME	2	0	0%	1	0	0%
		05 - Sistema de evaluación de impacto de las capacitaciones brindadas por la EPAP, implementado.	149 - INFORME	2	0	0%	1	0	0%

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2023

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2023		
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
		06 - Instrumentos, materiales y elementos esenciales para el desarrollo de las metodologías de capacitación de la EPAP, adquiridos	149 - INFORME	2	0	0%	1	0	0%
		07 - Plataforma de educación en línea desarrollada e implementada	149 - INFORME	2	0	0%	1	0	0%
		08 - Programa integral de formación y crecimiento profesional para la óptima eficiencia del personal de la administración pública, realizado.	149 - INFORME	2	0	0%	1	0	0%
Total 0030 - Secretaría de la Presidencia				12	0	0%	6	0	0%
0037 - Servicio de Administración de Rentas	001 - Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Tributaria	02 - Modernización de los sistemas y de la infraestructura tecnológica	149 - INFORME	4	0	0%	1	0	0%
		03 - Fortalecimiento del talento humano del SAR	149 - INFORME	4	0	0%	1	0	0%
Total 0037 - Servicio de Administración de Rentas				8	0	0%	2	0	0%
0039 - Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios	001 - Programa para el fortalecimiento de la economía de las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYME) y el Sector Social de la Economía (SSE) en Honduras.	02 - Apoyo a productores denominado "AGROEMPRENDE"	339 - BENEFICIARIO	1,007	0	0%	501	0	0%
		03 - Creación y Fortalecimiento de Cajas de Ahorro y Crédito	339 - BENEFICIARIO	20,070	0	0%	10,035	0	0%
		04 - Apoyo a Migrantes denominado "Yo Emprendo en mi tierra con SENPRENDE"	339 - BENEFICIARIO	616	0	0%	306	0	0%
Total 0039 - Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios				21,693	0	0%	10,842	0	0%
0042 - Cuerpo de Bomberos de Honduras	480 - EQUIPAMIENTO LOGISTICO DE LAS 44 ESTACIONALES LOCALES DEL CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS	07 - Adquisición de equipo para la atención de extinción de incendios, inundaciones, atención prehospitalaria y rescate a la población en general a nivel nacional	1082 - LOTE DE EQUIPO	28	0	0%	5	0	0%
		08 - Adquisición de herramientas para la atención de extinción de incendios, inundaciones, atención prehospitalaria y rescate a la población en general a nivel nacional	1082 - LOTE DE EQUIPO	1	0	0%	0	0	0%
Total 0042 - Cuerpo de Bomberos de Honduras				29	0	0%	5	0	0%
0044 - Instituto Nacional Penitenciario	001 - Ampliación y Mejoramiento de los Centros Penitenciarios de Honduras	61 - Mejoradas las cocinas para la elaboración de alimentos de Personas Privadas de Libertad.	149 - INFORME	1	0	0%	0	0	0%
		65 - Proceso de compra flota vehicular ejecutado.	149 - INFORME	1	0	0%	0	0	0%

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2023

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2023		
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Total 0044 - Instituto Nacional Penitenciario				2	0	0%	0	0	0%
0050 - Secretaría de Educación	007 - PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)	03 - Proyectos obra de infraestructura educativa, en los niveles prebásica, básica y de manera limitada en el nivel medio, de los departamentos de: Ocotepeque, Lempira, Intibucá, La Paz, Santa Bárbara y Copán en la zona de occidente. Francisco Morazán, valle, Choluteca, Comayagua y Gracias a Dios supervisados.	579 - OBRA DE INFRAESTRUCTURA	18	0	0%	0	0	0%
		04 - Proyectos obra de infraestructura escolar diseñados y formulados.	305 - PROYECTO	6	0	0%	0	0	0%
		05 - Educandos de educación media, dotados con herramientas pedagógicas (manuales técnicos para BTP-PAA y nueva oferta académica, licencias de simuladores virtuales).	1016 - EDUCANDO	225	0	0%	0	0	0%
	010 - MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN PREBÁSICA EN HONDURAS	08 - Modelo de la Calidad de la Educación Prebásica (MCEPB) Desarrollado e Implementado.	82 - SISTEMA	1	0	0%	0	0	0%
		09 - Promoción de la participación comunitaria en la educación prebásica.	25 - CONSULTA	6	0	0%	0	0	0%
		10 - Mejora de la capacidad operativa, administrativa y técnica de los recursos humanos (RRHH) para el nivel de Educación Prebásica.	134 - EMPLEADO	7	0	0%	0	0	0%
		11 - Mejora de la organización de los sistemas de planificación y monitoreo de la SE.	134 - EMPLEADO	97	0	0%	0	0	0%
		12 - Apoyo a la implementación de prácticas pedagógicas mejoradas.	32 - DOCUMENTO	1	0	0%	0	0	0%
		13 - Actualización del diseño curricular del nivel de educación prebásica y materiales de aprendizaje asociados, y su provisión.	32 - DOCUMENTO	1	0	0%	0	0	0%
		14 - Implementación de herramientas de medición para el desarrollo infantil y la calidad de los entornos de aprendizaje.	32 - DOCUMENTO	1	0	0%	0	0	0%
		15 - Mejoramiento de los entornos físicos de aprendizaje en los centros de educación prebásica existentes en áreas focalizadas.	1091 - ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	253	0	0%	0	0	0%
		16 - Gestión y Evaluación del proyecto.	149 - INFORME	253	0	0%	0	0	0%
		17 - COMDE fortalecidos.	300 - ORGANIZACION	110	0	0%	0	0	0%
	011 - PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E IMPLEMENTACIÓN DE HUERTOS ESCOLARES PRODUCTIVOS EN CENTROS EDUCATIVOS DE HONDURAS, FASE I.	19 - Reconstrucción, rehabilitación o mejora de la infraestructura de centros educativos escolares en los niveles de educación Pre Básica, Básica y Media.	101 - CENTRO EDUCATIVO	87	0	0%	0	0	0%
		20 - Centros educativos equipados con mobiliario escolar en los niveles de educación Pre Básica, Básica y Media.	101 - CENTRO EDUCATIVO	87	0	0%	0	0	0%
		21 - Administración de los recursos asignados al programa.	104 - RECURSO	1	0	0%	0	0	0%
	Total 0050 - Secretaría de Educación				1,154	0	0%	0	0
0060 - Secretaría de Salud	019 - REEQUIPAMIENTO BIOMEDICO HOSPITAL MARIA ESPECIALIDADES PEDIATRICAS (HMEP)	06 - Realizada la regularización de fondo de los lotes 3 y 9 del proveedor ALTHEA	149 - INFORME	1	0	0%	0	0	0%
		024 - RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID - 19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, EN HONDURAS	16 - Realizada capacitación en prevención y atención de Violencia Contra la Mujer (VCM) en el contexto de la emergencia por Covid-19.	149 - INFORME	1	0	0%	1	0
		17 - Fortalecidas las unidades del segundo nivel de atención (construcción , equipo, telemedicina y RRHH)	149 - INFORME	26	0	0%	24	0	0%
		18 - Realizada la auditoria del Proyecto	149 - INFORME	2	0	0%	1	0	0%

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2023

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2023		
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
		19 - Fortalecida la capacidad de los Servicios de Salud del Sistema Publico, con la contratación de RRHH en el marco del Plan de Respuesta Inmediata ante la Pandemia por COVID-19, para el año 2023 (4449)	149 - INFORME	46	0	0%	23	0	0%
		20 - Fortalecida la Red de diagnóstico notificación, seguimiento y respuesta laboratorial en las 20 Regiones Sanitarias (4518)	155 - CONTRATO	1	0	0%	0	0	0%
	027 - PROYECTO HONDURAS - INICIATIVA REGIONAL DE ELIMINACIÓN DE LA MALARIA (IREM EN Mesoamérica y República Dominicana)	06 - Realizada la renovación del contrato de Servicios con el Gestor CHAI para el año 2023, para fortalecer la calidad de los servicios de diagnóstico, tratamiento, investigación y respuesta de los casos confirmados de malaria, ampliada de 39 en 2022 a 45 municipios en 2023, en 12 departamentos.	149 - INFORME	4	0	0%	0	0	0%
		07 - Realizada la renovación del contrato de Servicios con el Gestor CHAI para el año 2023, para fortalecer la vigilancia epidemiológica entomológica y parasitológica en 45 municipios.	149 - INFORME	2	0	0%	1	0	0%
		08 - Fortalecida la conducción técnica y financiera del proyecto en el tema de la eliminación de malaria en Honduras	149 - INFORME	55	0	0%	19	0	0%
	028 - APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 5008/BL-HO	09 - Mejorada la cobertura con servicios de Salud del Primer Nivel de atención a la población materno infantil	149 - INFORME	169	0	0%	44	0	0%
	030 - MEJORA DE LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE LA INFORMÁTICA EN SALUD EN HONDURAS	07 - Realizada la Capacitación en Gestión y elaborado el docuemto de Gestion Hospitalaria para los Hospitales San Lorenzo y Puerto Cortes	1009 - CAPACITACIÓN	8	0	0%	2	0	0%
		08 - Realizados los procesos técnicos y administrativos del proyecto	149 - INFORME	21	0	0%	4	0	0%
		09 - Realizada la adquisicion de equipo Infotecnológico y distribuida en los hospitales San Lorenzo y Puerto Cortes	1082 - LOTE DE EQUIPO	1	0	0%	0	0	0%
		10 - Realizados talleres de capacitación para a personal de los Hospitales San Lorenzo y Puerto Cortes	1039 - TALLERE DE CAPACITACION	8	0	0%	2	0	0%
	031 - Proyecto de Respuesta a Emergencias Honduras COVID-19	08 - Instalado el equipo medico, no medico y adquiridos insumos y Equipos de Protección Personal para hospitales , laboratorios nacionales y regionales	429 - LOTE	2	0	0%	1	0	0%
		09 - Realizados los Gastos Operativos la Supervisión y Seguimiento de actividades del Programa.	149 - INFORME	1	0	0%	0	0	0%
		10 - Adquiridas y aplicadas las vacuna COVID-19 a la poblacion de acuerdo al Plan Nacional de Introducción de la vacuna contra la COVID-19 y fortalecidos los almacenes de biologicos con equipo para cadena de frio	88 - VACUNA	2	0	0%	0	0	0%
		11 - Realizadas las funciones de gestión financiera, adquisiciones, monitoreo y evaluación y salvaguardias y para llevar a cabo auditorías del Proyecto	1068 - INFORME DE AUDITORIA	1	0	0%	0	0	0%
	032 - RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID-19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN HONDURAS (RISP-HO-2)	09 - Realizada la contratación de asistencias técnicas para la continuidad del monitoreo a las intervenciones del Programa.	149 - INFORME	18	0	0%	3	0	0%
		10 - Realizada la adquisición de reactivos e insumos para cuatro laboratorios públicos	155 - CONTRATO	2	0	0%	0	0	0%

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2023

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2023		
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
		11 - Realizada la Contratación de firma consultora para elaboración de los Diseños de Infraestructura Hospitalaria para los Hospitales de Trauma de San Pedro Sula y Tegucigalpa. Contrato llave en mano para los Hospitales de Santa Bárbara, Ocotepeque y Salamá.	155 - CONTRATO	1	0	0%	0	0	0%

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2023

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2023		
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
		12 - Realizada la contratación de RRHH para fortalecer la capacidad de los servicios de salud del sistema publico , para atender los pacientes de COVID-19	155 - CONTRATO	1	0	0%	0	0	0%
		13 - Realizadas las gestiones Administrativas en un 100% y auditados los fondos en dos etapas para el 2023	149 - INFORME	163	0	0%	39	0	0%
Total 0060 - Secretaría de Salud				536	0	0%	164	0	0%
0091 - Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil	001 - Desarrollo del Sistema de Saneamiento de la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (AHAC).	01 - Proyecto Saneamiento AHAC	538 - OBRA	1	0	0%	0	0	0%
		14 - Pozo construido que suministrara 217 M3 por día	982 - METRO LINEAL	949,699	0	0%	0	0	0%
		15 - Instalación de tubería independiente.	982 - METRO LINEAL	316,465	0	0%	0	0	0%
		16 - Remodelados tres Núcleos de Baño.	983 - METRO CUADRADO	446,864	0	0%	85	0	0%
Total 0091 - Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil				1,713,029	0	0%	85	0	0%
0100 - Secretaría de Finanzas	001 - Modernización Integral de la Gestión de las Finanzas Públicas	03 - Contratos derivados de los diferentes procesos de Licitación y Compra menor programadas en el Plan de Compra y Contrataciones del Estado.	32 - DOCUMENTO	14	0	0%	2	0	0%
		04 - Modernización de los Sistemas de la SEFIN.	32 - DOCUMENTO	1	0	0%	0	0	0%
		05 - Formulación Presupuestaria de la Gestión de las Finanzas.	32 - DOCUMENTO	1	0	0%	0	0	0%
		06 - Procesos de Licitación.	32 - DOCUMENTO	8	0	0%	2	0	0%
		08 - Capacitación de Personal	149 - INFORME	6	0	0%	2	0	0%
		10 - Adquisición de compras menores	32 - DOCUMENTO	30	0	0%	9	0	0%
Total 0100 - Secretaría de Finanzas				60	0	0%	15	0	0%
0101 - Comisión Nacional de Telecomunicaciones	001 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS Y LOGÍSTICAS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL) A NIVEL NACIONAL	03 - Sistemas de Monitoreo y Control del espectro y la conectividad implementados.	82 - SISTEMA	2	0	0%	0	0	0%
		04 - Sistemas para la medición de la calidad de servicios y protección a los usuarios de servicios de telecomunicaciones implementados.	1082 - LOTE DE EQUIPO	2	0	0%	1	0	0%
		05 - Equipos adquiridos y procesos realizados para el fortalecimiento técnico y logístico de CONATEL.	392 - EQUIPO	4	0	0%	1	0	0%
Total 0101 - Comisión Nacional de Telecomunicaciones				8	0	0%	2	0	0%
0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería	001 - PROYECTO DE SEGURIDAD HIDRICA EN EL CORREDOR SECO DE HONDURAS	04 - Empresa Consultora Contratada para iniciar la Asistencia Técnica para fortalecer la gobernanza a nivel: (i) Etapa I: nivel local, Capacitación y Reforestación en Intibucá, La Venta, Curarén y La Paz	155 - CONTRATO	1	0	0%	0	0	0%
		05 - Empresa Consultora Contratada para la Revisión y actualización de la Estudios de Evaluación de Impactos y Riesgos Ambientales y Sociales y de Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) de los Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS): Intibucá, La Venta, Curarén y La Paz	155 - CONTRATO	1	0	0%	0	0	0%
		06 - Empresa Consultora Contratada para la Actualización de Diseños de Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS): Intibucá, La Venta, La Paz y Curarén.	155 - CONTRATO	1	0	0%	0	0	0%
	002 - Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana	04 - Subproyectos de rehabilitación de sistemas urbanos de agua potable licitados	305 - PROYECTO	13	0	0%	5	0	0%
		05 - Planes de inversión de subproyectos de rehabilitación.	1089 - PLAN DE INVERSIÓN	13	0	0%	5	0	0%
		06 - Evaluaciones de Impacto y Planes de Gestión Ambiental y Social (EIAS y PGAS).	264 - PLAN	13	0	0%	2	0	0%
		07 - Certificación de no requerir licenciamiento ambiental para las obras de rehabilitación.	18 - CERTIFICACION	13	0	0%	2	0	0%
		08 - Formalización de Acuerdos de Asociación SAG-Municipalidad-Prestador	314 - ACUERDO	13	0	0%	8	0	0%

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2023

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2023		
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
		09 - Licitación de bienes e insumos COVID-19	425 - LICITACION	13	0	0%	7	0	0%
		10 - Dictamen de aprobación del modelo por el ERSAPS	30 - DICTÁMEN	6	0	0%	2	0	0%
		11 - Conformación de Junta Directiva del proveedor de servicios de agua potable.	140 - CANTIDAD	6	0	0%	5	0	0%
		12 - Nombramiento de gerente del proveedor de servicios de agua potable.	140 - CANTIDAD	6	0	0%	3	0	0%
	003 - ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO (USAID-GAFSP)	03 - Asistencia técnica brindada para mejorar la productividad y producción agropecuaria a través en PSAN-FO, Clúster 1	992 - ASISTENCIA TÉCNICA	1	0	0%	0	0	0%
		04 - Asistencia técnica brindada para mejorar la productividad y producción agropecuaria a través en PSAN-FO, Cluster 2	992 - ASISTENCIA TÉCNICA	1	0	0%	0	0	0%
		05 - Kit de bienes productivos (bombas, mochila, semilla, fertilizantes, accesorios para riego) entregados a hogares beneficiados. FO, Clúster 1	1023 - KIT DE RIEGO	1	0	0%	0	0	0%
		06 - Kit de bienes productivos (bombas, mochila, semilla, fertilizantes, accesorios para riego) entregados a hogares beneficiados. FO, Clúster 2	1112 - KIT	750	0	0%	0	0	0%
		07 - Asistencia técnica brindada en nutrición e higiene en el hogar a través en PHH. FO, Clúster 1	992 - ASISTENCIA TÉCNICA	1	0	0%	0	0	0%
		08 - Infraestructura básica (Ecofiltro, ecofogones, letrinas, piso de cocina o en el sitio elegido por el hogar) entregada a Hogares del corredor seco. FO, Clúster 1	140 - CANTIDAD	1	0	0%	0	0	0%
		09 - Asistencia técnica brindada en nutrición e higiene en el hogar a través en PHH. FO, Clúster 2	992 - ASISTENCIA TÉCNICA	1	0	0%	0	0	0%
		10 - Infraestructura básica (Ecofiltro, ecofogones, letrinas, piso de cocina o en el sitio elegido por el hogar) entregada a Hogares del corredor seco. FO, Clúster 2	140 - CANTIDAD	1	0	0%	0	0	0%

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2023

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2023				
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución		
005 - PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL PRO-LENCA		06 - Planes de fortalecimiento organizacional aprobados.	264 - PLAN	60	0	0%	0	0	0%		
		07 - Consultoría aprobada para el fortalecimiento de Organizaciones.	369 - CONSULTORÍA	1	0	0%	0	0	0%		
		08 - Evaluación de resultados del proyecto.	149 - INFORME	1	0	0%	1	0	0%		
		09 - Selección de cajas rurales de ahorro y crédito.	288 - CAJA RURAL	100	0	0%	0	0	0%		
		10 - Líneas de tubería instaladas en parcelas agrícolas.	53 - KILÓMETRO	1	0	0%	0	0	0%		
		11 - Líneas de tubería instaladas en parcelas agrícolas FIDA II.	53 - KILÓMETRO	1	0	0%	0	0	0%		
		007 - PROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)		02 - Talleres de capacitación impartidos en diversificación agrícola (manejo de agua y fertigación), aplicando medidas de bioseguridad.	1039 - TALLERE DE CAPACITACION	10	0	0%	10	0	0%
				03 - Contratos suscritos de comercialización y financiamiento.	155 - CONTRATO	6	0	0%	3	0	0%
				03 - Formulación de planes de producción.	264 - PLAN	5	0	0%	0	0	0%
				03 - Plan de trabajo para la socialización de los planes de ordenamiento y manejo de los recursos naturales.	468 - PLAN DE TRABAJO	1	0	0%	0	0	0%
				04 - Líneas de tuberías instaladas (conducción, distribución y terciarias)	53 - KILÓMETRO	14	0	0%	14	0	0%
04 - Organización de productores y productoras organizados en grupos empresariales, de acuerdo a la producción agrícola.	294 - GRUPO			10	0	0%	0	0	0%		
04 - Plan de capacitación elaborado.	264 - PLAN			2	0	0%	0	0	0%		
05 - Diagnóstico situacional de los grupos empresariales organizados	29 - DIAGNOSTICO			10	0	0%	5	0	0%		
013 - Proyecto de inclusión económica y social de pequeños productores rurales en la región noreste de Honduras (PROINORTE)		06 - Expedientes documentados a grupos empresariales organizados para la gestión de la personería jurídica.	395 - EXPEDIENTE	10	0	0%	0	0	0%		
		08 - Diagnóstico territorial elaborado a municipios beneficiados por el proyecto.	29 - DIAGNOSTICO	20	0	0%	0	0	0%		
		09 - Estudios complementarios en temas ambientales al proceso de diagnostico territorial.	547 - ESTUDIO	2	0	0%	0	0	0%		
		10 - Diseño de campañas de concientización nutricional.	14 - CAMPAÑA	1	0	0%	1	0	0%		
		11 - Selección de la institución u organización a fortalecer que brindara los servicios de investigación.	140 - CANTIDAD	1	0	0%	1	0	0%		
		12 - Fondo concursable de innovación estratégica creado.	364 - CONCURSO	1	0	0%	0	0	0%		
		13 - Identificación de la red de gestores.	149 - INFORME	1	0	0%	1	0	0%		
		14 - Planes de Negocios Formulados.	582 - PLAN DE NEGOCIO	10	0	0%	0	0	0%		
		15 - Estudios de microcuencas (alta vulnerabilidad y riesgo) realizados.	547 - ESTUDIO	1	0	0%	0	0	0%		
		16 - Formulación de planes de inversión en servicios ecosistémicos.	1089 - PLAN DE INVERSIÓN	2	0	0%	0	0	0%		
		17 - Kit de herramientas adquiridos.	1112 - KIT	5	0	0%	0	0	0%		
014 - PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD		04 - Planes de inversión aprobados por el equipo técnico del proyecto.	1089 - PLAN DE INVERSIÓN	20	0	0%	0	0	0%		
		05 - Asistencia técnica brindada en tecnologías Climáticamente Inteligentes, producción, mercado y/o nutrición.	992 - ASISTENCIA TÉCNICA	20	0	0%	0	0	0%		
		06 - Planes de manejo de microcuenca aprobados por el Instituto Conservación Forestal ICF.	1071 - PLAN DE MANEJO DE MICROCUENCAS	5	0	0%	0	0	0%		
		07 - Monto de créditos y garantías aprobados	55 - LEMPIRA	5,000,000	0	0%	0	0	0%		
015 - Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II) Tipo de proyecto: Inversión Pública		03 - Planes de Negocios aprobados por el Comité Directivo (CD) del proyecto.	582 - PLAN DE NEGOCIO	40	0	0%	20	0	0%		
		04 - Perfiles de negocios	302 - PERFIL	60	0	0%	20	0	0%		

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2023

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2023		
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
		05 - Asistencias Técnicas brindadas a las Organizaciones de Productores Rurales (OPRs)	992 - ASISTENCIA TÉCNICA	92	0	0%	10	0	0%
Total 0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería				5,001,369	0	0%	125	0	0%
0144 - Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible	010 - PROYECTO DE ENERGÍA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PRO-ENERGÍA RURAL	02 - Número de juntas de energía establecidas	421 - JUNTA COMUNAL	10	0	0%	0	0	0%
Total 0144 - Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible				10	0	0%	0	0	0%
0150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente	001 - PROGRAMA DE REFORESTACIÓN NACIONAL Y PROTECCIÓN DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS "PADRE ANDRÉS TAMAYO"	02 - Diseño de los santuarios de abejas meliponas, elaborado y establecidos.	140 - CANTIDAD	4	0	0%	1	0	0%
		02 - Implementado y desarrollado el jardín botánico	291 - DISEÑO	1	0	0%	1	0	0%
		02 - Informe de seguimiento y monitoreo de municipalidades receptoras de fondos, elaborados.	149 - INFORME	4	0	0%	1	0	0%
		03 - Fortalecidas las capacidades técnicas de los Jornales (Pescadores) para remover el lirio acuático del espejo de agua del Lago de Yojoa	74 - PERSONA	20	0	0%	20	0	0%
		03 - Identificadas las familias taxonómicas para las colecciones del Jardín Botánico	140 - CANTIDAD	9	0	0%	9	0	0%
		03 - Perfiles de Proyectos para la Gestión Integral de Residuos Sólidos aprobados	465 - PERFIL DE PROYECTO	298	0	0%	298	0	0%
		04 - "Cajas INPA distribuidas para abejas meliponas en los departamentos de Olancho y Copán, "	140 - CANTIDAD	500	0	0%	200	0	0%
		04 - Convenios entre SERNA y municipalidades aprobados para el desembolso destinado al proyecto de Gestión Integral de Residuos Sólidos, firmados	26 - CONVENIO	298	0	0%	298	0	0%
		04 - Jornadas de difusión de información sobre la importancia de la protección y conservación del Lago de Yojoa a través del centro de difusión de información, realizadas.	417 - JORNADA	13	0	0%	9	0	0%
		05 - Base de datos digital diseñada en dispositivo electrónico para Jardín Botánico	140 - CANTIDAD	42	0	0%	26	0	0%
		06 - Reforestaciones con Viveros construidos para la producción de plántulas que serán utilizadas para la reforestación de las hectareas propuestas	309 - VIVERO	2	0	0%	1	0	0%
		06 - Capacitaciones a los Meliponicultores en la producción de miel y sus derivados, de los departamentos de Copán y Olancho, realizadas	1009 - CAPACITACIÓN	4	0	0%	0	0	0%
		07 - Adquirido el equipo e insumos para fortalecer el Laboratorio de Cultivos de Tejidos en el Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico (CURLA)	140 - CANTIDAD	1	0	0%	0	0	0%
		07 - Viveros restaurados para la producción de plántulas que serán utilizadas para la reforestación de las hectáreas propuestas en las Vegas, Santa Bárbara.	309 - VIVERO	1	0	0%	1	0	0%
		08 - Difundido el material divulgativo sobre la importancia ecológica de las abejas meliponas, disponibles en los santuarios.	32 - DOCUMENTO	1	0	0%	0	0	0%
09 - Completadas las fichas de recolección o donación de especímenes de Rhyncholaelia digbyana), en sitios identificados.	140 - CANTIDAD	5	0	0%	3	0	0%		
11 - Implementado y desarrollado el centro de exhibición de la flor nacional (Rhyncholaelia digbyana)	140 - CANTIDAD	1	0	0%	1	0	0%		
12 - Convenio entre SERNA y CURLA, firmado	26 - CONVENIO	1	0	0%	0	0	0%		
14 - Semillas adquiridas para la producción de plántulas de los dos viveros del teosinte (Dioon mejiae), construidos.	140 - CANTIDAD	2,000	0	0%	2,000	0	0%		

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2023

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2023		
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
		16 - Socializada la Declaratoria municipal: "Gualaco, hogar del teosinte (Dioon mejiae)"	32 - DOCUMENTO	1	0	0%	1	0	0%
		18 - Feria del teosinte (Dioon mejiae) en Gualaco, Olancho, realizada	140 - CANTIDAD	1	0	0%	1	0	0%
		19 - Implementados y desarrollados los senderos jurásicos.	140 - CANTIDAD	2	0	0%	2	0	0%
		20 - Museo desmontable para visitantes, en espacio facilitado por la Casa de la Cultura del casco urbano del Municipio de Gualaco, Olancho, implementado	140 - CANTIDAD	9	0	0%	4	0	0%
		21 - Fásiculo educativo en la temática del Teosinte, elaborado	140 - CANTIDAD	500	0	0%	0	0	0%
		23 - Sitios identificados para muestrear en las aldeas de Río Grande y Saguy del municipio de Gualaco	140 - CANTIDAD	3	0	0%	3	0	0%
Total 0150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente				3,721	0	0%	2,880	0	0%
0244 - Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer	001 - Centros de Atención Integral para mejorar las condiciones de vida de las mujeres hondureñas (Ciudad Mujer)	05 - Equipamiento de los Centros Ciudad Mujer SPS y Choloma con sistemas fotovoltaicos	149 - INFORME	1	0	0%	0	0	0%
		06 - Informe de Auditoria Externa del Proyecto	1068 - INFORME DE AUDITORIA	1	0	0%	0	0	0%
	003 - SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y UN ENTORNO FAVORABLE PARA LAS EMPRESARIAS DE HONDURAS	08 - Mujeres empresarias capacitadas en servicios de desarrollo empresarial	149 - INFORME	4	0	0%	1	0	0%
Total 0244 - Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer				6	0	0%	1	0	0%
0411 - Secretaría de Infraestructura y Transporte	001 - Construcción y Pavimentación Con Concreto Hidráulico del Tramo Carretero: La ENA - San José de Río Tinto - Dulce Nombre de Culmí, Sub Tramo: "Puente Río El Pataste - Dulce Nombre de Culmí", Ruta N-83,	09 - Construcción Y Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Tramo Carretero La Ena - San José De Río Tinto - Dulce Nombre De Culmí, Sub Tramo: "Puente Río El Pataste - Dulce Nombre De Culmí", Ruta N-83	982 - METRO LINEAL	10,885	0	0%	6,593	0	0%
		10 - Supervicion Del Tramo Carretero: La Ena - San José De Río Tinto - Dulce Nombre De Culmí, Sub Tramo: "Puente Río El Pataste - Dulce Nombre De Culmí", Ruta N-83	982 - METRO LINEAL	10,885	0	0%	6,593	0	0%
	001 - Proyecto Obras de Mitigación para el Control de Riesgos Geotécnicos y Geológicos, por Deslizamientos y Desprendimientos de Roca de Taludes de Corte en la Carretera CA5-Sur Tramo "Moramulca", Fase I	04 - Construcción Obras de Mitigación para Control de Riesgos Geotécnicos y Geológicos Carretera CA-5 Sur, Tramo Moramulca, Fase 1.	982 - METRO LINEAL	360	0	0%	214	0	0%
		05 - Supervisión de la Construcción Obras de Mitigación para Control de Riesgos Geotécnicos y Geológicos Carretera CA-5 Sur, Tramo Moramulca, Fase 1.	982 - METRO LINEAL	360	0	0%	214	0	0%
	001 - Reconstruccion del Puente en Carretera Nacional No.1 Puente Guacirope, Localizado en el municipio de Nacaome, Valle.	04 - Servicios de Administración	149 - INFORME	1	0	0%	1	0	0%
		05 - Implementación de Reasentamientos	140 - CANTIDAD	10	0	0%	3	0	0%
		05 - Servicios de Administración	149 - INFORME	1	0	0%	1	0	0%
		06 - Implementación de Reasentamiento	140 - CANTIDAD	1	0	0%	0	0	0%
	002 - Construcción y Rehabilitación Vial con Concreto Hidráulico del Corredor de Occidente, Tramo Carretero: "Naco - La Entrada" (79.1 Km), Localizado en los Departamentos de Santa Bárbara y Copán.	12 - Construcción Y Rehabilitación Vial Con Concreto Hidráulico Del Corredor De Occidente, Tramo Carretero: "Naco - La Entrada, Localizado En Los Departamentos De Santa Bárbara Y Copán.	982 - METRO LINEAL	20,224	0	0%	7,173	0	0%
		13 - Supervisión De La Construcción Y Rehabilitación Vial Con Concreto Hidráulico Del Corredor De Occidente, Tramo Carretero: "Naco - La Entrada, Localizado En Los Departamentos De Santa Bárbara Y Copán.	982 - METRO LINEAL	21,883	0	0%	8,832	0	0%
002 - Rehabilitación con Concreto Hidráulico sobre la Carpeta Asfáltica existente del tramo carretero: Tegucigalpa - El Guanábano (RN15), Longitud 7.22 KM (Salida a Olancho), ubicado en el departamento de F	09 - Rehabilitación con Concreto Hidráulico sobre la Carpeta Asfáltica existente del tramo carretero: Tegucigalpa - El Guanábano (RN15), Longitud 7.22 KM (Salida a Olancho), ubicado en el departamento de Francisco Morazán	982 - METRO LINEAL	4,790	0	0%	3,107	0	0%	

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2023

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2023		
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
		11 - Supervisión de Rehabilitación del tramo carretero: Tegucigalpa - El Guanábano (RN15), Longitud 7.22 KM (Salida a Olancho), ubicado en el departamento de Francisco Morazán	982 - METRO LINEAL	4,790	0	0%	3,107	0	0%
	003 - Construcción y Pavimentación con Concreto Hidráulico del Corredor de Oriente, Tramo Carretero: "Las Lomas - Terrero Blanco, Ruta 53" y Elaboración del Estudio y Diseño del Tramo Carretero: Ruta 119, "	15 - Construcción Y Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Corredor De Oriente, Tramo Carretero: "Las Lomas - Terrero Blanco ruta 53	982 - METRO LINEAL	22,783	0	0%	6,507	0	0%
		16 - Supervisión De La Construcción Y Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Corredor De Oriente, Tramo Carretero: "Las Lomas - Terrero Blanco" ruta 53	982 - METRO LINEAL	37,221	0	0%	19,070	0	0%
	003 - Rehabilitación del Tramo Carretero: "Siguatepeque - La Esperanza" (67.00 Km), Localizado en los Departamentos de Comayagua e Intibucá.	08 - Rehabilitación del tramo carretero Siguatepeque-La Esperanza, en los departamentos de Comayagua e Intibucá.	982 - METRO LINEAL	5,289	0	0%	0	0	0%
		10 - Supervisión de la Rehabilitación del tramo carretero Siguatepeque-La Esperanza, en el departamento de Comayagua e Intibucá.	982 - METRO LINEAL	5,289	0	0%	512	0	0%
	004 - Construcción y Pavimentación con Concreto Hidráulico del Tramo Carretero: "Portillo del Lobo-Reitoca - Curarén" (39.54 KM), Localizado en los Departamentos de Francisco Morazán y Choluteca.	17 - Construcción y Pavimentación con concreto hidráulico del tramo Carretero Portillo de Lobo-Reitoca-Curarén	982 - METRO LINEAL	6,156	0	0%	2,315	0	0%
		20 - Supervisión de la Construcción y Pavimentación con concreto hidráulico del tramo Carretero Portillo de Lobo-Reitoca-Curarén.	982 - METRO LINEAL	6,156	0	0%	2,315	0	0%
	004 - Rehabilitación con Concreto Hidráulico de la Carretera de Occidente, Tramo: Cucuyagua - Ocotepeque - El Poy - Ocotepeque - Agua Caliente (CA-4, CA-10), con una Longitud de 93.6 Km, Ubicado en los Depa	13 - Rehabilitación con concreto hidráulico carretera de Occidente, tramo Cucuyagua-Ocotepeque-El Poy-Ocotepeque-Agua Caliente	982 - METRO LINEAL	100	0	0%	0	0	0%
		14 - Supervisión Rehabilitación concreto hidráulico carretera de Occidente tramo Cucuyagua-Ocotepeque-El Poy-Ocotepeque-Agua Caliente	982 - METRO LINEAL	100	0	0%	0	0	0%
	005 - Construcción y Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Carretera Central, Tramo: "Marale - Empalme Carretera Yoro" (53.31 km), localizado en el Departamento de Francisco Morazán y Yoro.	22 - Construcción y Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Carretera Central, Tramo "Marale - Empalme Carretera a Yoro" (53.31 km) localizado en el departamento de Francisco Morazán y Yoro	982 - METRO LINEAL	5,960	0	0%	2,267	0	0%
		23 - Supervisión de Construcción y Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Carretera Central, Tramo "Marale - Empalme Carretera a Yoro" (53.31 km) localizado en el departamento de Francisco Morazán y Yoro	982 - METRO LINEAL	8,506	0	0%	4,813	0	0%
	005 - Rehabilitación con Concreto Hidráulico de la Carretera CA-6, Tramo: "Tegucigalpa (Posta de Villa Vieja) - Empalme Concreto Hidráulico Neteapa (Desvío a Morocelí)", con una Longitud de 50.5 Km, Ubicado	16 - Rehabilitación con concreto hidráulico carretera CA-6 tramo; Tegucigalpa-Empalme	982 - METRO LINEAL	100	0	0%	0	0	0%
		17 - Supervisión rehabilitación con concreto hidráulico carretera CA-6, tramo; Tegucigalpa-Empalme	982 - METRO LINEAL	100	0	0%	0	0	0%
	006 - Pavimentación con Concreto Hidráulico del tramo Carretero Amapa - San Antonio de Cortés (R90) con una Longitud de 9.645 Km, ubicado en el Municipio de San Antonio de Cortés, Departamento de Cortés.	24 - Pavimentación con Concreto Hidráulico del tramo Carretero Amapa - San Antonio de Cortés (R90) con una Longitud de 9.645KM, ubicado en el Municipio de San Antonio de Cortés, Departamento de Cortés.	982 - METRO LINEAL	3,130	0	0%	306	0	0%
		25 - Supervisión de Pavimentación tramo Carretero Amapa - San Antonio de Cortés (R90) con una Longitud de 9.645KM, ubicado en el Municipio de San Antonio de Cortés, Departamento de Cortés.	982 - METRO LINEAL	3,130	0	0%	306	0	0%

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2023

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2023		
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
	007 - Pavimentación con Concreto Hidráulico del tramo Carretero Peña Blanca - Los Naranjos (R72) con una Longitud de 2.872KM, ubicado en el Municipio de Santa Cruz de Yojoa, Departamento de Cortés.	27 - Construcción del Tramo Carretero Peña Blanca- Los Naranjos (R72) con una longitud de 2.872 km municipio de Santa Cruz de Yojoa, departamento de Cortés	982 - METRO LINEAL	1,206	0	0%	258	0	0%
		28 - Supervisión de la construcción del Tramo Carretero Peña Blanca- Los Naranjos (R72) con una longitud de 2.872 km municipio de Santa Cruz de Yojoa, departamento de Cortés	982 - METRO LINEAL	1,593	0	0%	258	0	0%
	009 - Pavimentación con Concreto Hidráulico del Anillo Agrícola, Tramo Carretero: "El Bijagual - San Francisco de Becerra (R77)", con una Longitud de 15.09 km, Ubicado en el Departamento de Olancho	32 - Construcción pavimentación con concreto hidráulico del anillo agrícola, tramo carretero El Bijagual-San Francisco de Becerra	982 - METRO LINEAL	600	0	0%	0	0	0%
		33 - Supervisión de la pavimentación con concreto hidráulico anillo agrícola, tramo carretero El Bijagual-San Francisco de Becerra	982 - METRO LINEAL	600	0	0%	0	0	0%
	010 - Pavimentación con Concreto Hidráulico del Tramo Carretero: "San Juan de Flores-Talanga", (R73), con una Longitud de 18.46 Km, Ubicado en el Departamento de Francisco Morazán .	39 - Supervisión pavimentación con concreto hidráulico tramo carretero; San Juan de Flores-Talanga	982 - METRO LINEAL	100	0	0%	0	0	0%
		40 - Pavimentación con concreto hidráulico tramo carretero; San Juan de Flores-Talanga	982 - METRO LINEAL	100	0	0%	0	0	0%
	011 - Diseño, Construcción y Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Carretera de Alivio del Tramo: "Tegucigalpa - Santa Lucía", Ubicado en el Departamento de Francisco Morazán.	41 - Construcción del tramo carretero de alivio del tramo Tegucigalpa-Santa Lucía	982 - METRO LINEAL	100	0	0%	0	0	0%
		43 - Derecho de Vía	982 - METRO LINEAL	2	0	0%	0	0	0%
		44 - Supervisión de la construcción y pavimentación con concreto hidráulico de la carretera de alivio tramo Tegucigalpa-Santa Lucía	982 - METRO LINEAL	100	0	0%	0	0	0%
Total 0411 - Secretaría de Infraestructura y Transporte				182,611	0	0%	74,765	0	0%
0412 - Secretaría de Desarrollo Social	001 - Fortalecimiento en el Sistema de Extracción, Almacenamiento y Distribución del Servicio de Agua Potable y afianzamiento de la Seguridad Alimentaria para mejorar las condiciones de salud y bienestar en	08 - Planta Potabilizadora de Agua Construida	149 - INFORME	3	0	0%	1	0	0%
		09 - Planta Procesadora de Derivados Lácteos Construida	149 - INFORME	3	0	0%	1	0	0%
		11 - Tanques de almacenamiento de agua potable construidos	149 - INFORME	3	0	0%	1	0	0%
Total 0412 - Secretaría de Desarrollo Social				9	0	0%	3	0	0%
0413 - Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación	001 - DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE INSTALACIONES Y ESPACIOS FISICOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, PARA USO DE LA POBLACIÓN A NIVEL NACIONAL.	04 - Construcción de Canchas deportivas a nivel nacional,	349 - CANCHA DEPORTIVA	31	0	0%	0	0	0%
		06 - Maquila para confección instalada y equipada, en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera..	1086 - ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA	1	0	0%	0	0	0%
		07 - Adiciones y/o mejoras en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera	579 - OBRA DE INFRAESTRUCTURA	8	0	0%	0	0	0%
Total 0413 - Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación				40	0	0%	0	0	0%
0414 - Dirección de Gestión por Resultados	001 - Proyecto Transformación Digital para una Mayor Competitividad	02 - Bootcamps planificados y ejecutados en Tegucigalpa	39 - EVENTO	2	0	0%	1	0	0%
		02 - Centros de Operación de Redes (NOC), operando	536 - ESTABLECIMIENTO	280	0	0%	0	0	0%
		02 - Propuesta de diseño de la plataforma SIAFI elaborada	32 - DOCUMENTO	1	0	0%	1	0	0%
		02 - Tramites de Instituciones públicas priorizadas registrados en el catastro de República Digital.	247 - ATENCION	10	0	0%	0	0	0%
Total 0414 - Dirección de Gestión por Resultados				293	0	0%	2	0	0%
0415 - Programa de la Red Solidaria	001 - MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES	19 - Área de bosque de pino en terrenos públicos y privados, incentivados para el manejo forestal sostenible.	44 - HECTÁREA	22,600	0	0%	0	0	0%

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2023

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2023		
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
		20 - Sistema de Alerta Temprana de Plagas Operando	82 - SISTEMA	1	0	0%	0	0	0%
		21 - Agencias gubernamentales que han modificado sus instrumentos legales y administrativos para alinearse con la reforma de la gobernanza climática.	150 - INSTITUCION	3	0	0%	0	0	0%
		22 - Funcionando la Unidad de Gestión del Proyecto a través de consultorías para el fortalecimiento Institucional.	369 - CONSULTORÍA	6	0	0%	3	0	0%
		23 - Realizada la auditoría externa del Proyecto.	1068 - INFORME DE AUDITORIA	2	0	0%	0	0	0%
		24 - Planes de restauración en bosque público y privado implementados.	469 - PLAN OPERATIVO ANUAL	36	0	0%	0	0	0%
		25 - Convenios tripartitos suscritos entre beneficiarios, Red Solidaria e ICF.	26 - CONVENIO	36	0	0%	0	0	0%
		26 - Investigaciones de las plagas y enfermedades forestales, manejo forestal sostenible y especies resilientes al Cambio Climático Realizadas y validadas	1005 - INFORME DE INVESTIGACIÓN	3	0	0%	0	0	0%
		27 - Banco de germoplasma de especies resilientes al Cambio Climático construido y operando.	1134 - BANCO DE GERMOPLASMA	1	0	0%	0	0	0%
	001 - PROYECTO DE APOYO A POBLACIONES VULNERABLES AFECTADAS POR CORONAVIRUS	04 - Familias atendidas con transferencia monetaria con recursos de la operación BID 5289/BL-HO.	1057 - FAMILIA BENEFICIADA	42,961	0	0%	0	0	0%
		05 - Fortalecimiento Institucional del Programa de la Red Solidaria	1007 - NUMERO DE UNIDAD	54	0	0%	18	0	0%
		06 - Sistema de Pago de las Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) fortalecido	82 - SISTEMA	1	0	0%	0	0	0%
	002 - Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven	07 - Cobertura del Tercer Ciclo de Educación Básica.	3 - ALUMNO (A)	6,808	0	0%	0	0	0%
		08 - Mejora de la calidad y pertinencia de los servicios educativos	3 - ALUMNO (A)	45,000	0	0%	0	0	0%
		09 - Herramienta tecnológica para fortalecer los sistemas de la SEDUC, implementada.	75 - PORCENTAJE	1	0	0%	0	0	0%
		10 - Realizada la auditoría externa del Proyecto.	1068 - INFORME DE AUDITORIA	1	0	0%	0	0	0%
		11 - Servicios educativos en modalidad presencial flexible a jóvenes en el Tercer Ciclo de Educación Básica	3 - ALUMNO (A)	5,008	0	0%	0	0	0%
		12 - Módulos escolares construidos.	101 - CENTRO EDUCATIVO	15	0	0%	0	0	0%
		13 - Docentes capacitados en pedagogías de aprendizaje activo.	31 - DOCENTE	1,654	0	0%	0	0	0%
		14 - Licencias de plataforma de formación y certificación docente.	31 - DOCENTE	20,000	0	0%	0	0	0%
		15 - Reproducción y entrega de guías para la nivelación de aprendizajes en Matemáticas.	32 - DOCUMENTO	940,518	0	0%	0	0	0%
		16 - Licencias de plataforma adaptativa de matemáticas para facilitar el aprendizaje.	3 - ALUMNO (A)	10,000	0	0%	0	0	0%
		17 - Evaluación de rendimiento académico con muestra municipal.	38 - EVALUACION	298	0	0%	0	0	0%
		46 - Asistencia técnica especializada para la SEDUC en materia de educación híbrida a través del uso de tecnologías digitales.	369 - CONSULTORÍA	3	0	0%	0	0	0%
		47 - Alianzas estratégicas con actores del sector educativo tanto público como privado para el posicionamiento del PNTE.	26 - CONVENIO	2	0	0%	1	0	0%
		48 - Realizada la auditoría externa del Proyecto	1068 - INFORME DE AUDITORIA	1	0	0%	0	0	0%
	002 - PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL / 6401-HN	13 - Familias atendidas con transferencia monetaria (TMC)	1057 - FAMILIA BENEFICIADA	95,909	0	0%	0	0	0%
		14 - Implementación y Seguimiento de la calidad de la educación formal alternativa	1016 - EDUCANDO	800	0	0%	0	0	0%
		15 - Fortalecimiento del Sistema de entrega de TMC	1007 - NUMERO DE UNIDAD	2	0	0%	0	0	0%
		16 - Fortalecimiento institucional del programa de TMC y la integración del sistema de protección social	1007 - NUMERO DE UNIDAD	5	0	0%	0	0	0%

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2023

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2023		
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
	003 - FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	18 - Familias atendidas con transferencia monetaria con recursos de la operación 6918.	1057 - FAMILIA BENEFICIADA	170,210	0	0%	0	0	0%
		19 - Familias atendidas con transferencia monetaria con recursos de la operación 6918 dominio rural	1057 - FAMILIA BENEFICIADA	95,909	0	0%	0	0	0%
		20 - Familias atendidas con transferencia monetaria con recursos de la operación 6918 dominio urbano	1057 - FAMILIA BENEFICIADA	74,301	0	0%	0	0	0%
		21 - Implementación y Seguimiento de la calidad de la educación formal alternativa.	1016 - EDUCANDO	800	0	0%	0	0	0%
		22 - Fortalecimiento del Sistema de entrega de TMC.	1007 - NUMERO DE UNIDAD	2	0	0%	0	0	0%
		23 - Fortalecimiento para el análisis de la información para la articulación de programas sociales	1007 - NUMERO DE UNIDAD	5	0	0%	0	0	0%
		003 - PROYECTO DE MEJORA DE LA GESTION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO-NEONATAL	31 - Convenios de Gestión de Segundo nivel de atención para la prestación de servicios de salud suscritos.	26 - CONVENIO	4	0	0%	0	0
	32 - Planos para el diseño de obras de Unidades de Cuidados Intensivos y Bloque Materno Infantil finalizados.		429 - LOTE	5	0	0%	0	0	0%
	33 - Equipo de radiocomunicación adquirido.		392 - EQUIPO	1	0	0%	0	0	0%
	34 - Capacidad técnica de la SESAL fortalecida.		155 - CONTRATO	18	0	0%	0	0	0%
	35 - Auditoría externa del Proyecto realizada.		1068 - INFORME DE AUDITORIA	1	0	0%	0	0	0%
	36 - Contratación de Recurso humano para Equipos de salud familiar.		155 - CONTRATO	31	0	0%	0	0	0%
	37 - Dotado de equipo médico menor para los Equipos de Salud Familiar, ESFAM.		1082 - LOTE DE EQUIPO	20	0	0%	0	0	0%
	38 - Tablet para los ESFAM adquiridas.		392 - EQUIPO	20	0	0%	0	0	0%
	39 - Capacitados Equipos de Salud Familiar (ESFAM) sobre Guía técnica.		1009 - CAPACITACIÓN	2	0	0%	0	0	0%
	40 - Contratada Consultoría Individual de Telesonografía.		155 - CONTRATO	1	0	0%	0	0	0%
	41 - Lotes adjudicados para la construcción de Obra en Hospitales Seleccionados.		429 - LOTE	5	0	0%	0	0	0%
	42 - Taller de Capacitación para fortalecimientos de Departamento de Hospitales Fortalecidos en gestión de procesos y de gestores descentralizados hospitalario.		1039 - TALLERE DE CAPACITACION	2	0	0%	0	0	0%
	43 - Contratación de Firma para la Evaluación de Línea Base y Evaluación Operativa Elaborado Realizada.		155 - CONTRATO	1	0	0%	0	0	0%
	44 - Contratación de consultorias para la operatividad de la unidad ejecutora realizada.		155 - CONTRATO	5	0	0%	0	0	0%
	004 - APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 5008/BL-HO		08 - Fortalecimiento institucional del programa de la Red Solidaria	1007 - NUMERO DE UNIDAD	6	0	0%	0	0
		09 - Educandos matriculados en tercer ciclo bajo una modalidad alternativa	1016 - EDUCANDO	2	0	0%	0	0	0%
10 - Unidades de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) fortalecidas		1007 - NUMERO DE UNIDAD	800	0	0%	0	0	0%	
11 - Informe de Transferencias Monetarias Condicionadas		1080 - INFORME DE LIQUIDACIÓN	1	0	0%	0	0	0%	
Total 0415 - Programa de la Red Solidaria				1,533,881	0	0%	22	0	0%
0503 - Instituto Nacional de Formación Profesional	001 - EQUIPAMIENTO DE TALLERES EN LAS CINCO REGIONALES DEL INFOP Y CAPACITACIÓN DE INSTRUCTORES	08 - Adquisición de maquinaria, equipo y herramientas moderna a 80 talleres del INFOP, acorde al avance tecnológico del país.	75 - PORCENTAJE	100	0	0%	40	0	0%
Total 0503 - Instituto Nacional de Formación Profesional				100	0	0%	40	0	0%
0505 - Instituto Hondureño de Antropología e Historia	001 - ACONDICIONAMIENTO Y PROMOCIÓN CULTURAL Y TURÍSTICA DE LOS PARQUES ARQUEOLÓGICOS DE "EL PUENTE" Y "COPÁN RUINAS" EN EL DEPARTAMENTO DE COPÁN Y "LAS CUEVAS DE TALGUA" EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO	02 - Instalación de rótulos en los circuitos de recorrido interno de senderos naturales y culturales de cada parque.	411 - INSTALACION	4	0	0%	1	0	0%

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2023

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2023		
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
		03 - Spot radiofónicos, cápsulas de TV, impresiones de materiales informativos y otra publicidad de promoción para los Parque Arqueológicos de Copan Ruinas y El Puente.	126 - PUBLICIDAD	4	0	0%	1	0	0%
	002 - Capacitación en Restauración de Bienes Culturales Muebles, Departamento de Francisco Morazán, Tegucigalpa M.D.C., Villa Roy	02 - Seleccionar 8 personas egresadas de la Escuela de Bellas Artes en restauración de bienes muebles del patrimonio cultural.	32 - DOCUMENTO	4	0	0%	1	0	0%
		03 - Conservación y restauración de piezas arqueológicas, documentos, pinturas y esculturas, con el método aprender haciendo.	1103 - INFORME DE INSPECCIÓN	4	0	0%	1	0	0%
		04 - Exposición temporal de las piezas arqueológicas, documentos, pinturas y esculturas restauradas.	41 - EXPOSICION	4	0	0%	1	0	0%
	003 - Renovación Museográfica y Servicios de Turismo Cultural en el Museo de Comayagua y Formación de la Comunidad en la Protección del Patrimonio Cultural	02 - Instalados paneles con cédulas informativas generales y específicas con información en Ingles y Español.	149 - INFORME	4	0	0%	1	0	0%
		03 - Diseño de paneles informativos en Ingles y Español.	149 - INFORME	4	0	0%	1	0	0%
		04 - Fabricación de mobiliario expositivo y acondicionamiento de áreas de descanso.	411 - INSTALACION	4	0	0%	1	0	0%
Total 0505 - Instituto Hondureño de Antropología e Historia				32	0	0%	8	0	0%
0511 - Universidad de Ciencias Forestales	001 - Remodelación de obras de infraestructura y equipamiento para el campus central de la UNACIFOR e instalación de fibra óptica en el Centro de Investigación y Jardín Botánico Lancetilla y UNACIFOR	02 - Compra de mobiliario y equipo para laboratorio de Ingles, compra de 10 pantallas inteligente digitales, adquisición de equipo y herramientas tecnológicas para practicas de campo y compra de un (1) servidor en rack	1082 - LOTE DE EQUIPO	1	0	0%	0	0	0%
		03 - Instalación y conexión de 500 metros de fibra óptica en al campus Central de la UNACIFOR e instalación de 3.7 km de fibra óptica en el Centro de Investigación y Jardín Botánico Lancetilla	973 - KILÓMETROS LINEALES	1	0	0%	0	0	0%
		04 - Contratar una persona o empresa para supervisión de las obras	74 - PERSONA	8	0	0%	0	0	0%
		05 - Remodelación de 8 obras de infraestructura ubicadas en el campus central de la UNACIFOR, Siguatepeque	567 - EDIFICIO	8	0	0%	0	0	0%
Total 0511 - Universidad de Ciencias Forestales				18	0	0%	0	0	0%
0515 - Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación	001 - Acondicionamiento y Equipamiento de Espacios Comunitarios de la Ciencia, Tecnología e Innovación ubicados en Iriona (Colón), La Esperanza (Intibucá) y Tegucigalpa (Francisco Morazán).	08 - Instalacion de centro comunitario de formacion	411 - INSTALACION	1	0	0%	0	0	0%
		09 - formacion de personal	96 - CAPACITADO(A)	1	0	0%	0	0	0%
	002 - Instalación de Parque Tecnológico para la producción de insumos de bioseguridad y transferencia de conocimiento a jóvenes estudiantes de bajos recursos, ubicado en Aldea Flores, Villa de San Antonio,	06 - instalacion de equipos	392 - EQUIPO	1	0	0%	0	0	0%
		07 - formacion de personal	96 - CAPACITADO(A)	1	0	0%	0	0	0%
Total 0515 - Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación				4	0	0%	0	0	0%
0702 - Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán	001 - "Fortalecimiento Tecnológico del Programa de Vinculación Social y Extensión del Centro Universitario Regional de San Pedro Sula de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán".	06 - Tecnología educativa y equipamiento para Fortalecimiento Tecnológico del Centro Universitario Regional de San Pedro Sula de la UPFNM	149 - INFORME	2	0	0%	1	0	0%
		07 - Movilidad académica para Fortalecimiento Tecnológico del Centro Universitario Regional de San Pedro Sula de la UPNFM	149 - INFORME	2	0	0%	1	0	0%
Total 0702 - Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán				4	0	0%	2	0	0%
0703 - Universidad Nacional de Agricultura	006 - Proyecto Fortalecimiento de las Capacidades Educativas, Productivas y Sociales de la Universidad Nacional de Agricultura, Catacamas, Olancho. PROFORCEPS	14 - Laboratorios del Departamento de Ingeniería Agrícola (topografía, riegos, energía y mecanización) equipados.	1007 - NUMERO DE UNIDAD	4	0	0%	0	0	0%
		15 - Instalado y funcionando el Sistema Fotovoltaico de la Sede Regional de Mistruck.	82 - SISTEMA	1	0	0%	0	0	0%

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2023

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2023		
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
		16 - Construido laboratorio de topografía del área de Ingeniería Agrícola.	333 - AULA	1	0	0%	0	0	0%
		17 - Aulas y laboratorios equipados con tecnología.	1007 - NUMERO DE UNIDAD	18	0	0%	0	0	0%
		18 - Equipado laboratorio de Limnología.	1007 - NUMERO DE UNIDAD	1	0	0%	0	0	0%
		19 - Adquiridos autobuses para el transporte de estudiantes y personal.	517 - VEHICULO	2	0	0%	0	0	0%
		26 - Realizado estudio y diseño de un sistema de riego: Obra toma y pre filtrado, sistema de conducción y distribución.	291 - DISEÑO	1	0	0%	0	0	0%
		27 - Equipado laboratorio de tecnologías postcosecha.	1007 - NUMERO DE UNIDAD	1	0	0%	0	0	0%
		28 - Mejorada infraestructura del Laboratorio Ciencias de la Carne.	538 - OBRA	1	0	0%	0	0	0%
		29 - Adquiridos materiales y equipo para el Centro de Alto Rendimiento para Producción de Hortalizas.	429 - LOTE	1	0	0%	0	0	0%
Total 0703 - Universidad Nacional de Agricultura				31	0	0%	0	0	0%
0708 - Hospital Escuela Universitario	001 - Fortalecimiento de infraestructura y equipamiento tecnológico en el Hospital Escuela ubicado en la ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazán	05 - Realizados los Estudios y Diseños requeridos para la ejecución del Proyecto	291 - DISEÑO	1	0	0%	0	0	0%
		06 - Adquirido e instalados el equipamiento médico y tecnológico del Hospital Escuela para una mejor atención al paciente	429 - LOTE	1	0	0%	0	0	0%
		08 - Realizadas las Mejoras de Infraestructura Bloque Materno Infantil y Bloque Médico Quirúrgico para una atención con Calidad, Calidez y Humanismo	986 - OBRA MEJORADA	1	0	0%	0	0	0%
Total 0708 - Hospital Escuela Universitario				3	0	0%	0	0	0%
0801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica	018 - PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO	02 - Supervisión del Proyecto de Fortalecimiento del Complejo Hidroeléctrico de Cañaveral y Río Lindo Realizado.	1081 - INFORME TÉCNICO	1	0	0%	0	0	0%
		03 - Intereses durante la construcción del proyecto, regularizados	145 - REPORTE	1	0	0%	0	0	0%
		04 - Supervisión, Gestión y Administración ENEE para la Construcción y Pruebas de las Mejoras a las Subestaciones, Realizada.	145 - REPORTE	1	0	0%	0	0	0%
		05 - Equipo Generador del complejo Hidroeléctrico de la Central Cañaveral y Río Lindo(Adquisición e Instalación de los equipos Principales y Auxiliares)" Emitida	1081 - INFORME TÉCNICO	1	0	0%	0	0	0%
		06 - Orden de Inicio para el Contrato del Equipo Principal y Obras de Instalación, emitida.	1081 - INFORME TÉCNICO	1	0	0%	0	0	0%
		08 - Consultorías para (Fortalecimiento de las Capacidades Técnicas y Operativas de la Unidad de Gestión de Cuencas Hidrográficas de la Empresa de Generación ENEE), Realizadas.	1081 - INFORME TÉCNICO	1	0	0%	0	0	0%
		09 - Adquisición de Equipo para el Desarrollo de Capacidades de la Comunidad de la Cuenca, Realizados.	32 - DOCUMENTO	1	0	0%	0	0	0%
		10 - Consultoría para Evaluación Técnica Final de la Cooperación Técnica No Reembolsable, Realizada.	1081 - INFORME TÉCNICO	1	0	0%	0	0	0%
		11 - Auditoría Financiera, realizada.	1081 - INFORME TÉCNICO	1	0	0%	0	0	0%
		12 - Supervisión, Gestión y Administración ENEE para el Proyecto Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral y Río Lindo, realizada.	145 - REPORTE	1	0	0%	0	0	0%
	019 - RENOVACION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZÁN PARA FACILITAR EL ACCESO A ENERGIAS RENOVABLES	18 - Plan de Trabajo de la consultoría del Diagnóstico y especificaciones técnicas para la modernización de las Grúas de pórtico, realizado	264 - PLAN	1	0	0%	0	0	0%
		19 - Terminos de Referencia para Estudios de batimetría y topografía validado	32 - DOCUMENTO	1	0	0%	0	0	0%

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2023

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2023		
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
		20 - Fortalecimiento institucional realizado a través de la adquisición de vehículos y software especializados	429 - LOTE	1	0	0%	0	0	0%
		21 - Unidad Ejecutora de Proyectos UCP-BID-ENEE/JICA, Fortalecida	1081 - INFORME TÉCNICO	1	0	0%	0	0	0%
	020 - APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)	03 - Medidores del Sistema de Medición Comercial de Transmisión, Suministrados	1081 - INFORME TÉCNICO	1	0	0%	0	0	0%
		04 - Auditoría Externa Anual del Proyecto, Elaborada	1081 - INFORME TÉCNICO	1	0	0%	0	0	0%
	023 - APOYO AL PROGRAMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	06 - Obras para la Construcción y Pruebas de Subestaciones y Líneas, Iniciadas	579 - OBRA DE INFRAESTRUCTURA	3	0	0%	0	0	0%
		07 - Términos de Referencia y Presupuestos de las Consultorías Especializadas, Elaborados	149 - INFORME	1	0	0%	0	0	0%
		08 - Auditoría Externa Anual del Programa Nacional de Transmisión, Elaborada	1081 - INFORME TÉCNICO	1	0	0%	0	0	0%
		09 - Supervisión, Gestión y Administración ENEE para la Construcción de las Subestaciones y Líneas de Transmisión, Realizada	1081 - INFORME TÉCNICO	1	0	0%	0	0	0%
	027 - ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LUGARES AISLADOS	14 - Servicios Post venta de las Plantas Fotovoltaicas en Guanaja y Brus Laguna brindados	1081 - INFORME TÉCNICO	2	0	0%	0	0	0%
		15 - Asistencia Técnica sobre Modelos de Sostenibilidad Financiera del Sistema de Generación Eléctrica Mediante Microrred en Brus Laguna y los Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios en el Corpus y Concepción De María, implementados.	1081 - INFORME TÉCNICO	2	0	0%	0	0	0%
		16 - Auditoría externa y evaluación final de la operación, realizada	1081 - INFORME TÉCNICO	2	0	0%	0	0	0%
Total 0801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica				28	0	0%	0	0	0%
0803 - Empresa Nacional Portuaria	001 - ESTUDIO Y DISEÑO DEL PROYECTO DE REPARACIÓN DE PUENTE DE ACCESO, MUELLE, Y CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO PUENTE DE ACCESO ALTERNATIVO AL MUELLE DEL PUERTO DE SAN LORENZO, VALLE.	22 - Estudio del puente de acceso al puerto de San Lorenzo Valle	547 - ESTUDIO	1	0	0%	0	0	0%
		23 - Diseño del puente de acceso al puerto de San Lorenzo, Valle	291 - DISEÑO	1	0	0%	0	0	0%
	002 - Ampliación de la Terminal Marítima de Graneles Líquidos de Puerto Cortes	25 - Actualización de Estudio, Diseño y Aspectos Ambientales	547 - ESTUDIO	1	0	0%	0	0	0%
	003 - DISEÑO Y CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL MALECON DE PUERTO CORTÉS	27 - Estudio y Diseño para la Rehabilitación del Malecon de Puerto Cortes	547 - ESTUDIO	1	0	0%	0	0	0%
Total 0803 - Empresa Nacional Portuaria				4	0	0%	0	0	0%
0806 - Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola	001 - Fortalecimiento y Mantenimiento de la Reserva Estratégica de granos básicos a través de la Comercialización y Rehabilitación de Bodegas y Silos en San Pedro Sula, Danlí y Tegucigalpa.	08 - Número de bandas compradas	335 - BANDA	6	0	0%	6	0	0%
Total 0806 - Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola				6	0	0%	6	0	0%
0807 - Suplidora Nacional de Productos Básicos	001 - Proyecto de Abastecimiento de Centros de Venta de Honduras y Fortalecimiento al BANASUPRO	13 - Compra de vehículos para fortalecer la flota logística	517 - VEHICULO	12	0	0%	0	0	0%
		14 - Implementación de herramienta informática	82 - SISTEMA	1	0	0%	0	0	0%
		15 - Cobertura del gasto operativo	459 - OPERATIVO	1	0	0%	0	0	0%
		16 - Vehículos reparados y funcionando	429 - LOTE	32	0	0%	0	0	0%
		17 - Abastecimiento para comercialización de productos de la canasta básica (act)	429 - LOTE	113	0	0%	0	0	0%
Total 0807 - Suplidora Nacional de Productos Básicos				159	0	0%	0	0	0%
0809 - Empresa de Correos de Honduras	001 - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO POSTAL HONDUREÑO, en las oficinas postales, Centro -Tegucigalpa, Toncontín, Nacaome, San Pedro Sula, La Entrada, Comayagua, La Ceiba, Danlí, Juticalpa, Choluteca, Santa Bá	10 - Fortalecimiento de Equipo Tecnológico/ Logístico	1007 - NUMERO DE UNIDAD	1,182	0	0%	0	0	0%
Total 0809 - Empresa de Correos de Honduras				1,182	0	0%	0	0	0%
