

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e
Inversión Pública



Informe de Avance Físico y Financiero

AL IV TRIMESTRE 2023

**Secretaría de Desarrollo Comunitario
Agua y Saneamiento
(SEDECOAS/FHIS)**

Tegucigalpa, Honduras

Enero, 2024

Ejecución al IV Trimestre 2023
Secretaría de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento



DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

IV. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

4.1 EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

La Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS) - Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), cuya finalidad es la de promover el mejoramiento de las condiciones de vida de los grupos sociales marginados en el área rural y urbana, mediante

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del 2023
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	1,147,848,393
Presupuesto Vigente	1,690,259,644
Ejecutado IV Trimestre	655,044,840
% Ejecución (Devengado IV Trim-2023/Vigente)	39%
Ejecutado (Devengado Anual)	1,393,571,602
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	82%

Fuente: SIAFI, 30/06/2023

el otorgamiento de financiamientos para programas y proyectos de desarrollo social o económico, con el propósito de aumentar su productividad, sus niveles de empleo y de ingresos y de contribuir a la satisfacción de sus necesidades básicas.


El “Plan de Gobierno para la Refundación de la Patria y Construcción del Estado Socialista y Democrático (2022 – 2026)”, ha considerado dentro de sus prioridades atender proyectos enfocados a programas sociales y apuntar a los siguientes objetivos; En materia de Educación lo siguiente: un Sistema capaz de brindar educación gratuita y universal, reinstaurando la Matrícula Gratis y una merienda idónea, rehabilitar y repotenciar al menos el 50% de la infraestructura escolar durante el segundo año de gobierno, llegando al 100% en el tercer año de gobierno, mediante mecanismos de participación comunitaria apoyada desde el municipio y el gobierno central entre otros.

En materia de Protección Social se ampliará y fortalecerá programas de asistencia como las transferencias en efectivo que se focalizarán mejor a fin de que realmente lleguen a sectores de la población en extrema pobreza, sin corrupción ni manipulación.

Al cuarto trimestre del año 2023, la institución contó con un presupuesto vigente de inversión pública de **L1,690.3 millones** y la ejecución presupuestaria del trimestre asciende a un monto de **L655.0 millones** lo que representa el 39% con relación al presupuesto vigente, y su ejecución acumulada asciende a **L1,393.6 millones**, representando un 82%, tal como se detalla en el Cuadro No. 1.

Dicha ejecución se llevó a cabo a través de (9) nueve proyectos enfocados en Agua y Saneamiento, Electrificación Rural y Caminos Rurales, Infraestructura Social, Infraestructura Escolar, Fortalecimiento de Capacidades para Jóvenes, Recuperación de Espacios Públicos y Mejora de la Infraestructura Básica. Ver Detalle de Ejecución Financiera en Anexo No. 4.

Gráfico No. 1
Presupuesto Vigente
SEDECOAS/FHIS: Financiamiento por Organismo
 Cifras en millones de Lempiras

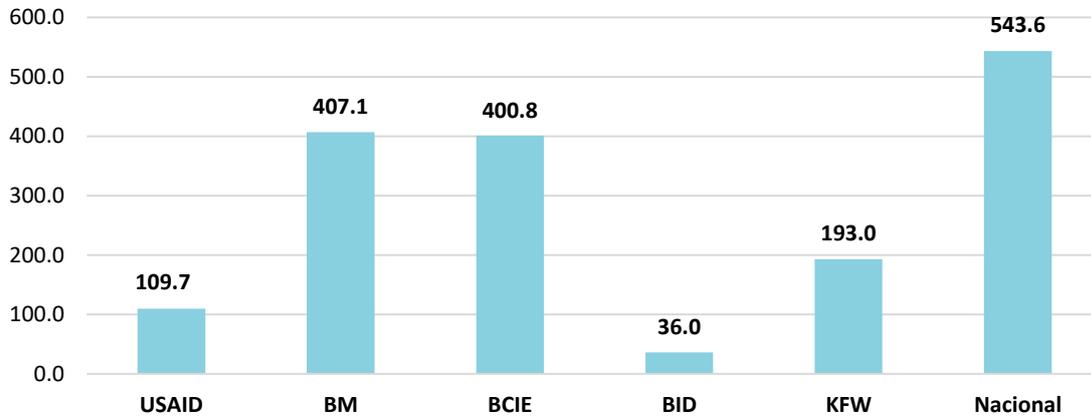


En referencia al financiamiento de Inversión Pública, el 67.8% corresponde a fondos provenientes de crédito externo expresado en términos monetarios con un monto de **L1,146.6 millones**, el 13.8% a recursos de donaciones externas con un monto de **L232.6 millones**; y 32.2% con fondos nacionales con un monto de **L543.6 millones**, incluye contraparte nacional que corresponde a gastos operativos de proyectos, sumando un monto total en el presupuesto vigente de **L22.1 millones** equivalente a 1.3% del presupuesto vigente. Dicha inversión es financiada por el BCIE con el **26.5%**, Banco Mundial con **30.4%**, KfW Banco Alemán con **14.4%**, BID con el **2.7%**, USAID con el **8.2%** y Tesoro Nacional con el **17.8%**.

4.2 COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN AL IV TRIMESTRE (2019-2023):

En los años 2019 al 2023, los proyectos de Inversión Pública de la SEDECOAS/FHIS ha considerado la ejecución de al menos 12 Proyectos de Inversión, de los cuales se han financiado el 68% con recursos de crédito externo, 28% recursos de donación externa y el 4% restante con recursos del Tesoro Nacional como contraparte de dichos Proyectos.

Gráfico No. 2
Comportamiento de la Inversión Pública
Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)
Al 31 de Diciembre 2019-2023
 Cifras en Millones de Lempiras

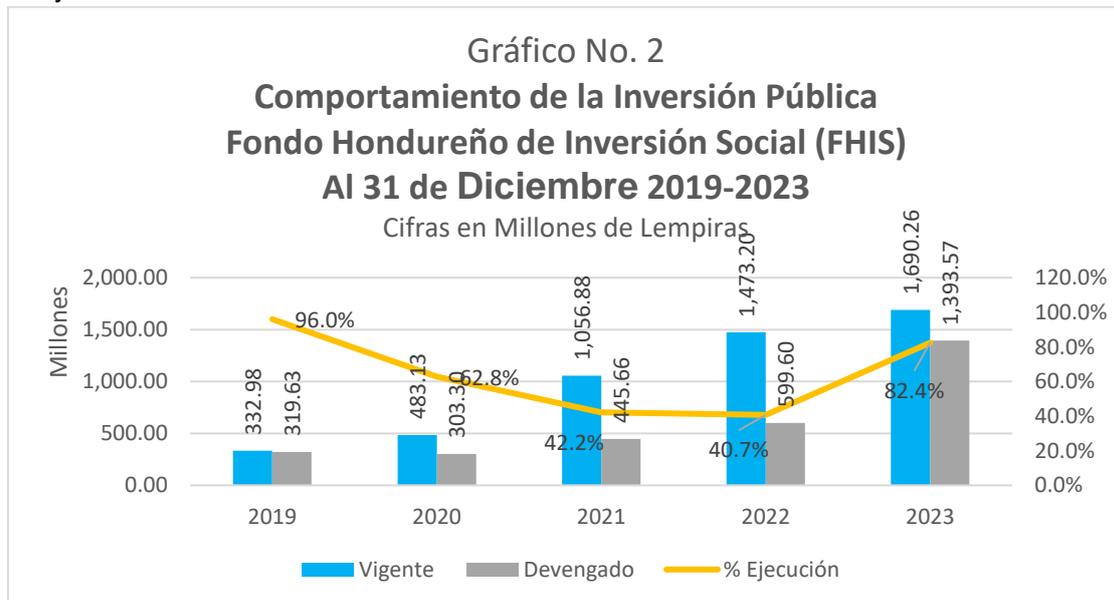

*La Gráfica No.2 muestra la ejecución porcentual comparativa de los últimos años al 31 de diciembre, El punto más alto se alcanza durante el presente ejercicio fiscal, correspondiente al año 2023, en términos de monto vigente y ejecución. Durante los años 2021 y 2022, la ejecución se vio afectada por la crisis generada durante y después de la pandemia de COVID-19 en 2021, así como por el cambio de gobierno en 2022, entre otros factores. Es importante destacar que la baja ejecución durante los primeros meses de 2023 se debe en parte a los procesos burocráticos de los organismos financiadores y a la falta de planificación, así como a la carencia de personal esencial en las unidades ejecutoras. Sin embargo, se constató que la mayor ejecución presupuestaria se logró durante el último trimestre del año 2023.

4.3 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión en el cuarto trimestre del año 2023 se concentró en los siguientes proyectos:

- 1 Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y su Gestión Local (PROMINE).
- 2 Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB).
- 3 Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras (MIFE).
- 4 Proyecto Convivencia y Espacios Seguros para los Jóvenes en Honduras (CONVIVIR).
- 5 Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras (PRE).
- 6 Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (ICS).
- 7 Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras (PIOH).
- 8 Proyecto Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Ciudad de Gracias, Departamento de Lempira
- 9 Programa de Mejoramiento de la Infraestructura de Desarrollo Social y Comunitario en Varios Departamentos de Honduras.

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros de los principales proyectos de acuerdo con su presupuesto vigente:

1. Programa Modernización de la Infraestructura Educativa (PROMINE)

PROMINE tiene por objetivo general fortalecer la rectoría Sectorial en Infraestructura Educativa de la Secretaría de Educación y la gestión local participativa, así como mejorar el acceso de los alumnos de las comunidades pobres al Centro Educativo de calidad que operan de manera sostenible. De esa manera se pretende contribuir al aumento de la eficiencia y de la calidad del sistema educativo (pre-básico y básico).

Los principales avances físicos al 31 de diciembre de 2023 son los siguientes:

SECRETARÍA DE FINANZAS

Cantidad	Subproyecto	Intervención	Municipio	Departamento	Empleos	Beneficiarios	Avance
1	CEB JESUS MARIA RODRIGUEZ Y CEPB LA INDEPENDENCIA	Ampliación	San José	Copán	29	223	100%
1	CEB CRUTA Y JN EN MARCHA	Ampliación	Jesús de Otoro Intibucá		33	235	100%
1	CEB LUCILA PEREZ ESTRADA Y CEPB HECTOR JUAREZ	Reparación	La Unión	Lempira	28	188	100%
1	CEB FRANCISCO MORAZAN	Reparación	Colomoncagua Intibucá		30	249	100%
1	CEB José Trinidad Reyes y CEPB Nimia Baquedano	Reposición	San Jorge	Ocotepeque	22	120	100%
1	CEB 21 de Octubre y JN Dr. Ramón Rosa	Ampliación	Nueva Arcadia	Copán	27	265	100%
1	CEB Dr. Miguel Paz Barahona y CEPB Jesús María Rodríguez	Ampliación	Tambla	Lempira	149	296	100%
7					318	1576	

A continuación, véase la ejecución histórica del Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y de su Gestión Local (PROMINE), cuarto trimestre 2023:

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto*/	Inicio-Fin	
Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y de su Gestión Local (PROMINE)	SE/FHIS VIII No.2008-66-178 2014 67 414 (KFW) / FHIS - SE Fondos de Donación	L1,668,181,102	10/07/2012 - 31/07/2024	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	
IV Trimestre 2023	127,957,113	127,957,113	72,881,417	57.0
Acumulado 2023	127,957,113	127,957,113	112,691,822	88.1
Acumulado Vida del Proyecto*/	1,668,181,102	1,668,181,102	1,337,214,005	80.2

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
 Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto
 Tasa de cambio L24.6422 x1USD

2. Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB)

Consisten en contribuir a mejorar la convivencia ciudadana en Honduras a través de la mejora en la calidad de vida en barrios vulnerables y la reducción de la incidencia de delitos violentos. Los objetivos específicos son: (I) mejorar el hábitat de barrios urbanos vulnerables, aumentando el acceso a infraestructura de servicios básicos y de prevención para disminuir delitos de robos y violaciones sexuales; (II) reducir los niveles de incidencia de homicidios y violencia intrafamiliar (VIF) en los municipios intervenidos mejorando los servicios de prevención y atención a víctimas de la violencia; y (III) mejorar la efectividad policial en investigación criminal, a través del incremento de la proporción de casos de homicidio con agresor identificado e informe de investigación aceptado por el Ministerio Público. Proyecto co-ejecutado con la Secretaría de Seguridad.

Los principales avances físicos al 31 de diciembre de 2023 son los siguientes:

- **Mejoramiento de Barrios:** Ejecución de obras del Proyecto de Integración Urbana en colonias Altos de la Quezada, La Huerta, Villas San Miguel, Brisas del Roble, y Altos del Mirador para un total de 633 predios; el monto del contrato es de L. 55,100,000. se tiene un **avance físico del 100%** que corresponde a la construcción de pozos e instalación de tuberías del sistema de alcantarillado sanitario, instalación de tubería para el sistema de agua

potable, construcción de cunetas y pavimentación de calles con un avance financiero del 88.4%.

- **Programa de Deportes y Valores:** en ejecución continua y participan aproximadamente **700 jóvenes** de las colonias intervenidas por el programa. Durante el trimestre, se han ejecutado capacitaciones para jóvenes en temas de salud y se registran 702 asistencias; teniendo un avance financiero del 72%.
- **Capacitación y Empleabilidad:** en el mes de junio de 2022 inició el curso de diseño gráfico a través de la fundación CADERH, donde finalizaron 15 participantes (8 mujeres) graduados en marzo del año 2023, al mes de diciembre del año 2023 a través de convenios con CADERH se realizaron tres talleres de capacitación donde participaron: 15 jóvenes (9 mujeres) en alfabetización digital, 11 personas (2 mujeres) en Ilustrador para publicistas y 21 (10 mujeres) personas en serigrafía.

A continuación, véase la ejecución histórica del **Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB)**, cuarto trimestre 2023:

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto*/	Inicio-Fin	
PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS	BID/4518/BL-HO	L370,695,000	28/11/2018-	31/12/2023
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
IV Trimestre 2023	36,003,735	36,003,735	8,623,077	24.0
Acumulado 2023	36,003,735	36,003,735	34,955,083	97.1
Acumulado Vida del Proyecto*/	370,695,000	370,695,000	369,395,263	99.6

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tasa de cambio L24.7694x1USD

3. Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras (MIFE)

Este Programa tiene como objetivo fortalecer la educación en Honduras para que los educandos tengan un acceso eficiente, con la permanencia necesaria en los Centros de Educación Media y sean promovidos con la calidad requerida. El programa estará localizado en los departamentos de: Atlántida, Choluteca, Colón, Comayagua, Copán, Cortés, El Paraíso, Francisco Morazán, Gracias a Dios, Intibucá, Islas de la Bahía, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Santa Bárbara, Valle, Yoro.

El Programa tiene como objetivo de entregable 105 centros de educación (Pre-básica, básica y Media) ampliados, mejorados y equipados, beneficiando a 480 niños de Educación prebásica, 40,759 niños de Educación Básica y 43,801 jóvenes de Educación Media, haciendo un total de 85,040 educandos de los tres niveles del sistema educativo, así mismo 3,821 docentes de Educación Pre-básica, 3,821 docentes de Educación Básica, 15,285 docentes de educación media, haciendo un total de 22,923 docentes. La duración del programa es de 5 años desde el 2021 hasta el 2026 donde habrá un desarrollo gradual de la infraestructura y la dotación de equipo, así como la formación permanente y la plataforma virtual para emprendimiento.

SECRETARÍA DE FINANZAS

Actualmente, se tienen **25 de proyectos en ejecución** y **27 para orden de inicio**, 18 proyectos aprobados, 13 están en revisión de control de calidad y el resto (30), de los 113 están en proyección de ser intervenidos por parte del programa. Los principales avances físicos al 31 de diciembre de 2023 de Centros Escolares son los siguientes:

Código	Descripción del Proyecto	Contratista	Municipio	Departamento	Monto Proyecto	Avance Físico	Avance financiero
108460	Reparación CEPB Manuel de Jesús Valencia	Servicios de Diseño y Construcción S. de R.L. de C.V (SERDICON)	LA LIMA	CORTÉS	4,046,470.64	88.00%	80.18%
108468	Reposición CEB Darío E. Turcios	Legalización	LA LIMA	CORTÉS	5,047,453.48	0.00%	0.00%
109036	Reparación CEB Ingeniero Roberto Larios Silva	Servicios de Diseño y Construcción S. de R.L. de C.V (SERDICON)	SAN PEDRO SULA	CORTÉS	5,355,992.43	57.00%	51.14%
108572	Ampliación CEMG Superación	Grupo LOGA S. de R.L.	QUIMISTÁN	SANTA BÁRBARA	5,104,141.76	35.00%	29.29%
108583	REPARACION CEB FRANCISCO MORAZAN	COCHASA S. de R.L.	CHINDA	SANTA BÁRBARA	1,645,778.98	30.00%	23.51%
108585	Reparación CEBG Esmeralda Quiroz de Madrid	Legalización	SAN PEDRO SULA	CORTÉS	3,181,535.07	0.00%	0.00%
108613	Reposición CEPB Esteban Guardiola	Servicios de Diseño y Construcción S. de R.L. de C.V (SERDICON)	LA LIMA	CORTÉS	4,840,182.78	60.00%	49.71%
108617	Reposición CEB Petronila Barrios de Cabañas	Consultoría de Inversiones Múltiples S. de R.L. (COIM)	VILLANUEVA	CORTÉS	4,855,410.58	55.00%	49.94%
108887	Reparación CEB Juan Lindo	COCHASA S. de R.L.	SAN PEDRO SULA	CORTÉS	7,073,990.38	55.00%	27.76%
108889	Reparación CEB Gubernamental John F. Kennedy No.1	COCHASA S. de R.L.	SAN PEDRO SULA	CORTÉS	5,674,057.09	55.00%	19.54%
108956	Reparación CEB Mercedes Flores Castillo	Martínez Vásquez Consultores y Contratistas (MARVAS)	POTRERILLOS	CORTÉS	7,428,324.94	30.00%	19.34%
108957	Reparación CEB Miguel Paz Barahona	Martínez Vásquez Consultores y Contratistas (MARVAS)	POTRERILLOS	CORTÉS	5,943,831.11	30.00%	18.83%
108961	Reposición Escuela Superación	Consultoría de Inversiones Múltiples S. de R.L. (COIM)	VILLANUEVA	CORTÉS	2,346,199.42	60.00%	40.32%
108963	Reparación Escuela Nohemí Ferrera de García	Servicios de Diseño y Construcción S. de R.L. de C.V (SERDICON)	CHOLOMA	CORTÉS	7,600,011.98	12.00%	38.23%
108966	Reposición CEB Rafael Pineda Ponce	Soluciones Integrales de Construcción S. de R.L. (SOLINTEC)	SAN PEDRO SULA	CORTÉS	8,394,603.02	69.00%	66.25%
108978	REPARACION ESCUELA REPUBLICA DE HONDURAS	Lempira S. de R.L.	SALAMÁ	OLANCHO	6,676,126.71	100.00%	81.36%
108979	REPOSICION ESCUELA RURAL NUEVA ESPERANZA	Grupo LOGA S. de R.L.	JUTICALPA	OLANCHO	2,184,789.36	40.00%	36.70%
108981	REPARACION ESCUELA JUAN LINDO	COCHASA S. de R.L.	ARADA	SANTA BÁRBARA	1,702,126.58	35.00%	27.62%
108984	Reposición Escuela Rural Mixta 18 de Noviembre	Legalización	QUIMISTÁN	SANTA BÁRBARA	3,612,172.64	0.00%	0.00%
108985	Reposición Escuela Rural Mixta Carlos Rivera	Legalización	QUIMISTÁN	SANTA BÁRBARA	2,761,585.52	0.00%	0.00%

SECRETARÍA DE FINANZAS

Código	Descripción del Proyecto	Contratista	Municipio	Departamento	Monto Proyecto	Avance Físico	Avance financiero
108990	REPARACION ESCUELA LUIS LANDA	Grupo LOGA S. de R.L.	SAN FRANCISCO DE BECERRA	OLANCHO	2,349,098.49	60.00%	54.79%
108992	Reparación Centro de Educación Básica Presentación Centeno	Legalización	LA UNIÓN	OLANCHO	1,795,363.21	0.00%	0.00%
108995	REPARACION CEB DIONISIO DE HERRERA	Lempira S. de R.L.	SAN FRANCISCO DE LA PAZ	OLANCHO	7,609,109.75	88.00%	66.32%
108999	Reposición CEB 1 de Mayo	Servicios de Diseño y Construcción S. de R.L. de C.V (SERDICON)	MANGULILE	OLANCHO	4,349,089.97	70.00%	86.93%
109008	Reparación Escuela Rural Mixta José Cecilio del Valle	Legalización	PROTECCIÓN	SANTA BÁRBARA	2,009,221.15	0.00%	0.00%
109011	REPOSICION ESCUELA OSCAR MEJIA URQUIA	Grupo LOGA S. de R.L.	NUEVA FRONTERA	SANTA BÁRBARA	3,890,791.62	100.00%	19.11%
109012	Reposición CEB José Santos Guardiola	Legalización	QUIMISTÁN	SANTA BÁRBARA	5,712,120.92	0.00%	0.00%
109014	Reparación CEB Coronel Hernán Acosta Mejía	Legalización	SANTA MARÍA DEL REAL	OLANCHO	12,096,212.35	0.00%	0.00%
109022	REPARACION ESCUELA RURAL MIXTA UNION Y FUERZA	Servicios de Diseño y Construcción S. de R.L. de C.V (SERDICON)	MANGULILE	OLANCHO	1,826,940.31	75.00%	54.15%
109024	Reparación Escuela María Auxiliadora	Legalización	MANTO	OLANCHO	2,737,734.88	0.00%	0.00%
109025	REPOSICION ESCUELA RURAL ALVARO CONTRERAS	Grupo LOGA S. de R.L.	MANTO	OLANCHO	2,368,341.97	25.00%	37.03%
109026	Reparación Escuela Unión y Fuerza	Legalización	GUAYAPE	OLANCHO	7,577,513.38	0.00%	0.00%
109036	Reparación Escuela Ramon Rosa	COCHASA S. de R.L.	PUERTO CORTÉS	CORTÉS	2,629,571.10	43.00%	21.77%
107298	Reconstrucción Jardín de Niños Sagrado Corazón	H.J.J. S.A. Consultoría y Construcción	COMAYAGUA	COMAYAGUA	10,203,709.99	75.00%	90.18%
107844	Reparación Escuela Urbana Miguel Ángel Bueso	COCHASA S. de R.L.	CONCEPCIÓN DEL NORTE	SANTA BÁRBARA	8,230,052.77	7.11%	20.61%
108319	Reparación CEB Manuel de Jesús Valencia	Legalización	LA LIMA	CORTÉS	17,318,731.36	0.00%	0.00%
108320	Reposición CEB Modesto Rodas Alvarado	Servicios de Diseño y Construcción S. de R.L. de C.V (SERDICON)	LA LIMA	CORTÉS	11,603,629.28	18.00%	35.57%
108353	Ampliación Escuela Manuel Bonilla	Inversiones y Desarrollos Modernos S. de R.L. (INDEMO)	PROTECCIÓN	SANTA BÁRBARA	3,903,693.03	24.05%	40.18%
108388	Reparación CEB Héctor Guillermo Guillen	Servicios de Diseño y Construcción S. de R.L. de C.V (SERDICON)	SAN PEDRO SULA	CORTÉS	3,471,904.84	60.00%	64.92%
108389	Reparación CEB Fernando Naranjo	Servicios de Diseño y Construcción S. de R.L. de C.V (SERDICON)	SAN PEDRO SULA	CORTÉS	1,869,595.21	95.00%	75.60%

A continuación, véase la ejecución financiera histórica del Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras (MIFE), cuarto trimestre 2023:

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto*/	Inicio-Fin	
Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras (MIFE)	BCIE - 2239	L1,981,552,000	30/03/2021 - 30/03/2026	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
IV Trimestre 2023	297,119,742	297,119,742	94,187,100	31.70
Acumulado 2023	297,119,742	297,119,742	189,976,909	63.94
Acumulado Vida del Proyecto*/	1,981,552,000	1,981,552,000	305,230,638	15.40

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
 Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto
 Tasa de cambio L24.7694x1USD

4. Proyecto Convivencia y Espacios Seguros para los Jóvenes en Honduras (CONVIVIR)

El programa abarca la construcción, el mejoramiento y el equipamiento de infraestructura social para jóvenes y espacios públicos, financiamiento y/o cofinanciamiento del trabajo con jóvenes y la capacitación de jóvenes, la capacitación de personal de las instituciones involucradas, las municipalidades seleccionadas, las comunidades de barrio y servicios de consultoría.

Los principales avances físicos al 31 de diciembre de 2023 son los siguientes:

Cantidad	Subproyecto	Intervención	Municipio	Departamento	Empleos	Beneficiarios	Estado
1	Plaza Juvenil Brisas de Copán (Obra de Confianza)	Construcción	Santa Rosa	Copán	7	11,500	74%
1	Casa de la Juventud	Construcción	Santa Rosa	Copán	7	11,500	10%
1	Plaza El Mirador – Santa Teresa	Construcción	Santa Rosa	Copán	6	11,500	67%
1	Parque La Pirámide (Obra de Confianza)	Construcción	Intibucá	Intibucá	5	240	85%
1	THAU MISHU (Casa de La Juventud)	Construcción	Intibucá	Intibucá	5	7,933	10%
1	Ruta Lenca de la Juventud	Construcción	Intibucá	Intibucá	5	7,933	66%
1	Paseo Cultural Lenca (Obra de Confianza)	Construcción	La Esperanza	Intibucá	5	7,933	80%
1	Plaza de La Juventud Buenos Aires	Construcción	La Esperanza	Intibucá	5	7,933	10%
1	Centro Deportivo Integral San Carlos	Construcción	La Esperanza	Intibucá	5	7,933	10%
1	Cancha ABE y BEN (Obra de Confianza)	Construcción	Juticalpa	Olancho	7	8,600	79%
1	Centro de Formación Integral Juvenil	Construcción	Juticalpa	Olancho	7	8,600	10%
1	Parque Recreativo de La Juventud	Construcción	Juticalpa	Olancho	7	8,600	69%
12					71	100,205	

A continuación, véase la ejecución histórica del Proyecto Convivencia y Espacios Seguros para los Jóvenes en Honduras (CONVIVIR), cuarto trimestre 2023:

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto*/	Inicio-Fin	
Proyecto Convivencia y Espacios Seguros para los Jóvenes en Honduras (CONVIVIR)	BMZ Nr. 2016 65348	L499,011,128	17/07/2021 - 14/07/2025	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
IV Trimestre 2023	62,408,091	74,388,091	54,684,061	73.5
Acumulado 2023	62,408,091	74,388,091	72,701,682	97.7
Acumulado Vida del Proyecto*/	499,011,128	499,011,128	396,518,373	79.5

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
 Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto
 Tasa de cambio L24.7694x1USD

5. Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras (PRE)

Tiene como objetivo Coordinar, impulsar y fortalecer capacidades para el conocimiento del riesgo, reducción de este y manejo de desastre, como una estrategia para mejorar la eficiencia en la preparación para la respuesta y la recuperación post desastre naturales. Su propósito es la atención de la infraestructura dañada por el Huracán y Tormenta Tropical Eta: rehabilitación de pasos y caminos terciarios, reparación y construcción de cajas puentes rehabilitación y construcción de sistemas de drenaje, puentes (Bailey), construcción de calles terciarias, obras de mitigación entre otras.

Los principales avances físicos al 31 de diciembre de 2023 son los siguientes:

Cantidad	Subproyecto	Intervención	Municipio	Departamento	Empleos	Beneficiarios	Avance
1	Reparación CEB Marcelino Pineda Lopez	Reparación	Comayagua	Comayagua	29	559	100%
1	Reposición Jardín Niños Xiomara de Zelaya	Reposición	Florida	Copan	13	21	100%
1	Ampliación CEPBG Mercedes Enderson	Ampliación	San Pedro Sula	Cortes	9	62	100%
1	Suministro de Mobiliario C.E.B. Alfonso Lacayo	Suministro	San Pedro Sula	Cortes	2	191	100%
1	Reparación CEG Unidad y Cambio	Reparación	Villanueva	Cortes	17	331	100%
1	Reposición CEPB Mis Primeras Letras	Reposición	Villanueva	Cortes	12	8	100%
1	Reparación CEB José Trinidad Reyes	Reparación	Villanueva	Cortes	22	112	100%
1	Reparación Jardín de Niños Rosaura Posas de Navarro	Reparación	Choloma	Cortes	9	27	100%
1	Reparación C.E.B.G. Rodolfo Padilla Sunceri	Reparación	San Pedro Sula	Cortes	22	156	100%
1	Reparación CEBG Republica de Canada	Reparación	San Pedro Sula	Cortes	9	360	100%
1	Reparación CEB José Cecilio del Valle	Reparación	Villanueva	Cortes	24	366	100%
1	Reparación Escuela Juan Lindo	Reparación	Danlí	El Paraíso	24	98	100%
1	Reparación CEBG República de Venezuela	Reparación	Distrito Central	Francisco Mora.	18	140	100%
1	Reparación Jardín de Niños Humberto Rivera Torres	Reparación	Cedros	Francisco Mora.	11	18	100%
1	Reparación C.E.P.B Miriam J. Gallardo	Reparación	Distrito Central	Francisco Mora.	14	64	100%
1	Reposición Escuela Republica de Honduras	Reposición	Ojojona	Francisco Mora.	20	56	100%
1	Reposición CCEPREB Angelitos Sonrientes	Reposición	San Francisco de Intibuca		12	29	100%
1	Reposición CEPB Dr. Andres Arturo Martinez Guillen	Reposición	San José	La Paz	12	27	100%
1	Reposición CEB Marco Tulio Rodríguez	Reposición	San Sebastián	Lempira	15	70	100%
1	Reposición CEB El Adelanto	Reposición	Lepaera	Lempira	14	12	100%
1	Reparación CEPB Luis Sabillón Ortiz	Reparación	Ilama	Santa Barbara	18	64	100%
1	Reparación Jardín de Niños San Francisco de Asis	Reparación	Morazán	Yoro	17	23	100%
1	Reparación CEB. Pedro Nufio	Reparación	Morazán	Yoro	30	157	100%
1	Reposición Escuela Eusebio Fiallos	Reposición	Danlí	El Paraíso	17	29	99%
1	Ampliación Centro de Educación Básica León Alvarado	Ampliación	Distrito Central	Francisco Mora.	18	424	99%
1	Reparación C.E.B. Ruben Martinez Rodas	Reparación	Distrito Central	Francisco Mora.	27	162	99%
1	Reposición Escuela Fausto Castillo Suazo	Reposición	Santiago Puring	La Paz	10	32	90%
1	Reparación CEB Francisco Morazan	Reparación	Ojos de Agua	Comayagua	29	111	76%
1	Reposición Escuela Rural Mixta Dr. Doroteo Varela	Reposición	Guajiquiro	La Paz	10	29	63%
1	Reposición Escuela Pompeyo Bonilla	Reposición	Santiago Puring	La Paz	8	21	44%
1	Reparación Jardín de Niños Ricardo Maduro	Reparación	San Luis	Comayagua	23	23	43%
1	Reposición Jardín de Niños Abraham Raudales	Reposición	Cedros	Francisco Mora.	17	45	39%
1	Reposición CEB Republica de Perú	Reposición	Gracias	Lempira	19	93	35%
1	Reposición PCEPB Profesor Manuel Antonio Mejia	Reposición	Belén Gualcho	Ocotepeque	14	32	33%
1	Rehabilitación Sistema de Agua Potable Ciudad de Yoro	Rehabilitación	Yoro	Yoro	39	18103	33%
1	Reparación CEB Jose Cecilio del Valle	Reparación	Lejamaní	Comayagua	40	593	32%
1	Reposición Escuela Luis Alonzo Suazo	Reposición	San Luis	Comayagua	26	348	31%
1	Construcción de obras de protección Puente Lindo	Construcción	Las Vegas	Santa Barbara	26	2337	25%
1	Reparación Esc. Prevocacional Raúl Zaldívar	Reparación	Distrito Central	Francisco Mora.	20	377	23%
1	Rehabilitación Sistema de Agua Potable Morazán Yoro	Rehabilitación	Morazán	Yoro	39	21052	23%
1	Reparación CEB Real De Suecia.	Reparación	San Pedro Sula	Cortes	24	439	19%
1	Reposición Centro de Educación Basica Presentación Cente	Reposición	San Pedro Sula	Cortes	40	108	18%
1	Reposición CEB Ing. Manuel Zelaya Rosales y Jardín de Niñ	Reposición	San Manuel Col	Lempira	16	40	18%
1	Rehabilitación Sistema de Agua Potable Comayagua	Rehabilitación	Comayagua	Comayagua	62	72000	17%
1	Reposición Caja puente Pacayal	Reposición	San Nicolas	Santa Barbara	24	3500	9%
1	Reposición CEPB Lic. Evaristo Euceda	Reposición	La Lima	Cortes	19	63	8%
1	Reparación CEPB Republica de Honduras	Reparación	La Lima	Cortes	18	34	8%
1	Reposición CEB Gubernamental Ramón Amaya Amador	Reposición	La Lima	Cortes	42	157	7%
1	Reparación Instituto Oficial Jose Manuel Díaz Palma	Reparación	El Porvenir	Atlantida	37	240	6%
1	Reparación CEPB y CEB Nuevo San Juan	Reparación	La Lima	Cortes	38	267	6%
1	Reparación CEPB Gabriela Mistral	Reparación	La Lima	Cortes	38	1010	6%
1	Reposición CEB Oswaldo López Arellano	Reposición	La Lima	Cortes	42	445	6%
1	Reposición Instituto Gubernamental José Dolores Gonzalez	Reposición	La Lima	Cortés	52	226	6%
1	Reposición Instituto Dr. Alfonso Hernandez Cordova	Reposición	La Lima	Cortés	59	1084	6%
1	Reposición CEB Hibueras	Reposición	Comayagua	Comayagua	16	66	5%
1	Reposición Caja puente Joconal	Reposición	San Nicolas	Santa Barbara	22	1250	4%
1	Reposición Puente vehicular sobre el Rio Chamelecon	Reposición	Nueva Arcadia	Copán	33	6370	2%
57					1337	134061	

A continuación, véase la ejecución histórica del Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras (PRE), cuarto trimestre 2023:

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto*/	Inicio-Fin	
Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras (PRE)	6822-HN	L3,715,410,000	25/05/2021 - 31/12/2026	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
IV Trimestre 2023	432,092,852	407,092,852	215,686,459	53.0
Acumulado 2023	432,092,852	407,092,852	345,958,202	85.0
Acumulado Vida del Proyecto*/	3,715,410,000	3,715,410,000	400,102,341	10.8

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tasa de cambio L24.7694x 1USD

6. Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (ICS/USAID)

Tiene como objetivo general incrementar la resiliencia de las comunidades y los individuos a la violencia y al crimen a través de mejoras en la infraestructura pública de pequeña escala. Esto incluye el mejoramiento en las estructuras comunitarias que mitiguen el crimen eliminando o disminuyendo el riesgo de oportunidad, creando espacios comunitarios más seguros, aumento en los servicios de calidad que protejan contra la violencia, mejoramiento en la participación de los sistemas de seguridad y rendimiento de justicia nacional y municipal, mejoramiento en la participación ciudadana con los sectores de justicia y seguridad.

Los principales avances físicos al 31 de diciembre de 2023 se detallan en 13 obras de construcción y reparación:

Cantidad	Subproyecto	Intervención	Municipio	Departamento	Empleos	Beneficiarios	Estado
1	Construcción Techado de Cancha y Obras Varias en CEB Dr. Alfonso Lacayo	Reparación	San Pedro Sula	Cortés	11	169	100%
1	Reparación del CEB Padre Claret y Construcción de Obras Varias	Reparación	San Pedro Sula	Cortés	19	1,368	100%
1	Reparación del Instituto San José de Pedregal y Construcción de Obras Varias, Colonia el Pedregal	Reparación	Distrito Central	Francisco Mora	5	780	100%
1	Suministro e Instalacion Generador y obras varias Clinicas (Reparación)	Reparación	La Ceiba	Atlántida	15	449,822	100%
1	Reparación del Instituto Modesto Rodas Alvarado y construccion de obras varias FASE II	Reparación	San Pedro Sula	Cortés	11	1,098	88%
1	Reparación del CEB Porfirio Ruiz y construccion de obras varias.	Reparación	La Ceiba	Atlántida	13	188	97%
1	Reparación del CEB Ramón Rosa y construccion de obras varias	Reparación	La Ceiba	Atlántida	9	341	85%
1	Reparación del CEB Rafael Pineda Ponce y construccion de obras varias.	Reparación	La Ceiba	Atlántida	9	721	98%
1	Construcción Area Recreativa en CDA Col. Gale.	Construcción	Choloma	Cortés	6	523	60%
1	Chamelecón - Oficina Comité Intersectorial	Construcción	San Pedro Sula	Cortés	8	20,000	45%
1	Rivera Hernández - Oficina Comité Intersectorial	Construcción	San Pedro Sula	Cortés	4	432	34%
1	Reparación de techo y obras complementarias en Anexo SESAL Fase II	Reparación	Distrito Central	Francisco Mora	7	500	90%
1	Reparacion Centro de Salud de la San Miguel, equipamiento y obras varias	Reparación	Distrito Central	Francisco Mora	34	103,365	65%
13					151	579,307	

A continuación, véase la ejecución histórica del Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (ICS/USAID), cuarto trimestre 2023:

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto*/	Inicio-Fin	
Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (USAID/ICS)	522-0501-4 Donación Externa	L362,563,126	19/10/2017 - 30/06/2024	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	
IV Trimestre 2023	70,204,050	80,251,050	29,478,319	36.7
Acumulado 2023	70,204,050	80,251,050	76,368,681	95.2
Acumulado Vida del Proyecto*/	362,563,126	362,563,126	317,409,864	87.5

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tasa de cambio L24.7694x 1USD

7. Programa Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras (USAID/PIOH)

El propósito de esta Actividad es mejorar las pobres condiciones sociales y económicas que son especialmente pronunciadas en el Occidente de Honduras. Extrema pobreza, desnutrición, vulnerabilidad al cambio climático. Bajos niveles educativos, migración, falta de acceso a los servicios básicos y otros retos socioeconómicos son endémicos. La provisión de servicios básicos de educación y nutrición son escasos en la zona de Occidente y es difícil el acceso a los ya existentes, así mismo la gestión de servicios de educación, nutrición y agua y saneamiento son deficientes por lo que los ciudadanos cuentan además con pocos espacios de participación para mejorar sus vidas a nivel de hogar y sus vidas productivas, lo que genera una gran brecha de pobreza.

Los principales avances físicos al 31 de diciembre de 2023 se observan en 4 obras de reparación/ampliación 2 obras finalizadas y 2 iniciando su ejecución según el detalle siguiente:

Cantidad	Subproyecto	Intervención	Municipio	Departamento	Empleos	Beneficiarios	Estado
1	Reparacion CEB Jesus Orlando Guerra y Construccion de Ot	Reparación	San Marcos	Ocotepeque	6	86	100%
1	Ampliacion Centro de Salud Rural (CESAR)	Ampliación	San Marcos de	Lempira	8	1,376	100%
1	Reparacion del CEB Francisco Javier Rápalo y construccion de obras varias	Reparación	Trinidad	Santa Bárbara	15	62	1%
1	Reparacion del CEB Adelina Martínez Ávila y construccion de obras varia	Reparación	La Paz	La Paz	15	176	1%
4					44	1,700	

A continuación, véase la ejecución histórica del Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (PIOH/USAID), cuarto trimestre 2023:

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto*/	Inicio-Fin	
Programa Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras (USAID/PIOH)	522-0502 Cd E No.9 Donación Externa	L211,499,714	01/11/2018 - 30/06/2024	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	
IV Trimestre 2023	52,246,428	42,199,428	11,333,988	26.9
Acumulado 2023	52,246,428	42,199,428	33,930,584	80.4
Acumulado Vida del Proyecto*/	211,499,714	211,499,714	135,907,416	64.3

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
 Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto
 Tasa de cambio L24.7694x1USD

8. Proyecto Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Ciudad de Gracias, Departamento de Lempira

El proyecto tiene como objetivo mejorar el acceso a los servicios de agua potable para la población del municipio de Gracias, Departamento de Lempira, aumentando la cantidad y la calidad del agua suministrada, a través de la ampliación del sistema de abastecimiento, mediante el desarrollo de la infraestructura hidráulica.

Los principales avances físicos al 31 de diciembre de 2023 son los siguientes:

- No se planificaron proyectos finalizados para este trimestre, sin embargo, se realizaron actividades complementarias para comenzar con el proceso de ejecución de fondos del Proyecto de Gracias, Lempira, socializando la disminución del alcance del proyecto "Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable, en la Ciudad de Gracias, Departamento de Lempira" y adicionando "Mejoramiento en la Red de Colectores y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Suroriente de Tegucigalpa".

A continuación, véase la ejecución histórica del Proyecto Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Ciudad de Gracias, Departamento de Lempira, cuarto trimestre 2023:

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto*/	Inicio-Fin	
Proyecto Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Ciudad de Gracias, Departamento de Lempira (BCIE)	BCIE 2261 Crédito Externo	L891,698,400	03/01/2022 - 03/02/2026	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	
IV Trimestre 2023	69,816,382	57,836,382	3,528,651	6.1
Acumulado 2023	69,816,382	57,836,382	6,177,647	10.7
Acumulado Vida del Proyecto*/	891,698,400	891,698,400	34,589,733	3.9

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
 Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto
 Tasa de cambio L24.7694x 1USD

9. Programa de Mejoramiento de la Infraestructura y Desarrollo Social y Comunitario en varios departamentos de Honduras (BCH)

El Programa de Mejoramiento de la Infraestructura de Desarrollo Social y Comunitario en Varios Departamentos de Honduras es el resultado de un proceso de priorización de ocho (8) componentes que tendrán un total de 61 proyectos en 48 municipios del país que aportarán a la reducción de la pobreza y a la mejora del bienestar humano de la población.

Los principales avances físicos al 31 de diciembre de 2023 son los siguientes:

Con base a la enmienda 1 de la Nota de Prioridad se reduce el alcance a 14 escuelas reparadas y cuatro centros educativos equipados en 8 departamentos y 11 municipios. Y el nuevo presupuesto del componente asciende a L33,459,186.90, con dicha enmienda se cierra este componente, debido a que los puentes fueron ejecutados con otra fuente de financiamiento.

Con base a la enmienda 1 de la Nota de prioridad el alcance de esta actividad aumenta a 7 proyectos de construcción de vías pavimentadas con concreto hidráulico.

Con base la enmienda 1 a la Nota de Prioridad se asignaron L150,000,000.00 al proyecto Sostenimiento de Calles, el cual es ejecutado por la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) en el cual se colocarán aproximadamente 14,500 toneladas de carpeta asfáltica.

Con base la enmienda 1 a la Nota de Prioridad se reduce el alcance de esta actividad

Con base a la enmienda 1 de la Nota de prioridad se reduce el alcance de esta actividad al realizar solamente el acompañamiento a los estudios previos del laboratorio nacional de medicamentos.

A continuación, véase la ejecución histórica del Programa de Mejoramiento de la Infraestructura y Desarrollo Social y Comunitario en varios departamentos de Honduras, cuarto trimestre 2023:

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto*/	Inicio-Fin	
Programa de Mejoramiento de la Infraestructura y Desarrollo Social y Comunitario en varios departamentos de Honduras (BCH)	BCH 24798 Crédito Interno	L499,700,000	01/08/2022 - 01/08/2024	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	
IV Trimestre 2023	229,124,372	229,124,372	59,047,471	25.8
Acumulado 2023	229,124,372	229,124,372	218,417,480	95.3
Acumulado Vida del Proyecto*/	499,700,000	499,700,000	488,993,108	97.9

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

4.3.1 PROGRAMAS SOCIALES

La inversión en Formación Bruta de Capital según información reportada en el SIAFI asciende a **L684.8 millones**, y una ejecución 0.00 millones equivalente al **0.0%** en relación con el presupuesto vigente 2023.

4.4 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- En el cuarto trimestre se autorizaron las siguientes modificaciones presupuestarias relevantes:
 1. **Número de Documento FMP05 47:**
 - Justificación Institucional: Traslado dentro del Grupo 20000 y 40000 para proyectos de mejoras en centros educativos.
 - Monto: L 21,919,950.00 (Traslado)
 2. **Número de Documento FMP05 63:**
 - Justificación Institucional: Modificación entre objetos de gastos de convenios.
 - Monto: L 5,040,318.00 (Traslado)
 3. **Número de Documento FMP05 74:**
 - Justificación Institucional: Contratación de personal técnico y gastos operativos.
 - Monto: L 3,197,365.00 (Traslado)
 4. **Número de Documento FMP05 78:**
 - Justificación Institucional: Traslado de fondos entre objetos de gasto.
 - Monto: L 150,000,000.00 (Traslado)
 5. **Número de Documento FMP05 80:**
 - Justificación Institucional: Traslado de fondos dentro de grupos de gasto.
 - Monto: L 5,806,554.00 (Traslado)
 6. **Número de Documento FMP05 81:**
 - Justificación Institucional: Redistribución de recursos dentro del grupo de bienes capitalizables.
 - Monto: L 5,686,511.00 (Traslado)
 7. **Número de Documento FMP05 85:**
 - Justificación Institucional: Adquisición de vehículos, equipamiento de oficina y licencias informáticas.
 - Monto: L 18,268,680.00 (Traslado)
 8. **Número de Documento FMP05 87 y 88:**
 - Justificación Institucional: Modificación presupuestaria por L 11,980,000.00.
 - Monto: L 11,980,000.00 (Traslado)
 9. **Número de Documento FMP05 91:**
 - Justificación Institucional: Adquisición de equipo, mobiliario y herramientas.
 - Monto: L 1,845,000.00 (Traslado)
 10. **Número de Documento FMP05 92:**
 - Justificación Institucional: Pago de varios conceptos.
 - Monto: L 4,778,167.00 (Traslado)
 11. **Número de Documento FMP05 95:**
 - Justificación Institucional: Modificación conforme al Decreto Legislativo 157-2022.
 - Monto: L 25,000,000.00 (Traslado)

12. Número de Documento FMP05 98 y 99:

- Justificación Institucional: Modificación presupuestaria por L 10,047,000.00.
- Monto: L 10,047,000.00 (Traslado)

Conclusiones

- La ejecución presupuestaria al IV Trimestre del año 2023 experimentó una ejecución acumulada del 82% ejecución satisfactoria, equivalente a L1393.6 Millones con respecto al presupuesto vigente de L1,690.3, esta buena ejecución es producto de una gestión eficiente de los recursos, una planificación adecuada de los proyectos que puede mejorar en 2024 y seguimiento constante de los proyectos. Además, se destaca la implementación de medidas de control de costos y la optimización de los procesos administrativos, lo que ha permitido maximizar el rendimiento de cada Unidad Ejecutora.
- Para este trimestre se realizaron modificaciones presupuestarias entre proyectos y entre objetos de gasto con el fin de ir cubriendo las metas establecidas por el ajuste de la programación, POA's y compromisos de acuerdo con cada uno de los proyectos y otras actividades relativas al funcionamiento de las Unidades Ejecutoras.
- El Proyecto de Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Ciudad de Gracias, Lempira finalizó su ejecución presupuestaria 10.7% respecto al presupuesto vigente, esto debido a una falta de planificación adecuada en la formulación del POA 2023 y no conformación oportuna de la Unidad Ejecutora.

Recomendaciones

- Agilizar los procesos de formulación de los nuevos proyectos con el objetivo de entregar oportunamente los beneficios a la población objetivo, básicamente aquellas personas que han sufrido por emergencias naturales y de salud.
- Coordinar gestiones para acelerar la ejecución física y financiera de los proyectos, tomar acciones correctivas, ceder espacio presupuestario a otros proyectos en vista de lo reprogramado con el objetivo de alcanzar las metas establecidas en los Planes Operativos Anuales institucionales.
- Coordinar reuniones de seguimiento en conjunto con la UCP-FHIS, UPEG y Dirección de Control y Seguimiento, Comité Ejecutor de Proyecto (CEP), en conjunto con SEFIN con el fin de apoyar a las Unidades ejecutoras donde se tenga cuellos de botella.
- Actualizar mensualmente en el Sistema de Administración Financiera (SIAFI Ges) la evaluación de metas físicas en el Plan Operativo Anual.
- Realizar una mejor planificación para el año 2024 a nivel de ejecución presupuestaria, debido al exceso de modificaciones realizadas de forma interna y baja ejecución en ciertos proyectos (PRE (85%) MIFE (64%), y AGUAS DE GRACIAS (10%)).

ANEXOS

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE, 2023
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Presupuesto Vigente			Ejecutado (Devengado)			
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Ejecutado/Vigente)
	0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social		543,639,555	1,146,620,089	1,690,259,644	540,550,049	853,021,553	1,393,571,602	82%
	ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS	522-0502 Cd E No.9	7,387,678	34,811,750	42,199,428	6,607,011	27,323,573	33,930,584	80%
	Total ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS		7,387,678	34,811,750	42,199,428	6,607,011	27,323,573	33,930,584	80%
	PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS	BID/4518/BL-HO	-	36,003,735	36,003,735	-	34,955,083	34,955,083	97%
	Total PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS		-	36,003,735	36,003,735	-	34,955,083	34,955,083	97%
	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA	522-0501-4	5,314,200	74,936,850	80,251,050	5,314,200	71,054,481	76,368,681	95%
	Total PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA		5,314,200	74,936,850	80,251,050	5,314,200	71,054,481	76,368,681	95%
	PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)	2014 67 414 (KFW) / FHIS - SE	1,352,112	46,516,606	47,868,718	1,229,248	39,235,034	40,464,283	85%
		BMZ 2016 68 763	3,791,640	76,296,755	80,088,395	2,685,751	69,541,788	72,227,539	90%
		SE/FHIS VIII No.2008-66-178	-	-	-	-	-	-	-
	Total PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)		5,143,752	122,813,361	127,957,113	3,914,999	108,776,822	112,691,822	88%
	Programa de Mejoramiento de la Infraestructura de Desarrollo Social y Comunitario en varios departamentos de Honduras	BCH-24798-1	218,417,489	-	218,417,489	218,417,480	-	218,417,480	100%
	Total Programa de Mejoramiento de la Infraestructura de Desarrollo Social y Comunitario en varios departamentos de Honduras		218,417,489	-	218,417,489	218,417,480	-	218,417,480	100%
	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y FORMACION EDUCATIVA EN HONDURAS	BCIE - 2239	-	297,119,742	297,119,742	-	189,976,909	189,976,909	64%
	Total PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y FORMACION EDUCATIVA EN HONDURAS		-	297,119,742	297,119,742	-	189,976,909	189,976,909	64%
	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS A NIVEL NACIONAL	(en blanco)	303,168,686	45,825,076	348,993,762	302,393,512	-	302,393,512	87%
	Total PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS A NIVEL NACIONAL		303,168,686	45,825,076	348,993,762	302,393,512	-	302,393,512	87%
	PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS	BMZ Nr. 2016 65348	4,207,750	70,180,341	74,388,091	3,902,847	68,798,835	72,701,682	98%
	Total PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS		4,207,750	70,180,341	74,388,091	3,902,847	68,798,835	72,701,682	98%
	PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE GRACIAS	BCIE-2261	-	57,836,382	57,836,382	-	6,177,647	6,177,647	11%
	Total PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE GRACIAS		-	57,836,382	57,836,382	-	6,177,647	6,177,647	11%
	Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras.	6822-HN	-	407,092,852	407,092,852	-	345,958,202	345,958,202	85%
	Total Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras.		-	407,092,852	407,092,852	-	345,958,202	345,958,202	85%

Fuente: SIAFI, 31/12/2023
