



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARIA DE SALUD

(SESAL)

Al Cuarto Trimestre, 2016

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Enero, 2017

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Secretaría de Salud (SESAL) representa el 24.2% de la inversión del Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social, su presupuesto de inversión para el presente año y su ejecución financiera se detalla en el cuadro No. 1.


Cuadro No. 1
Programa de Inversión Pública al IV Trimestre, 2016
 Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	646,306,814.00
Presupuesto Vigente	1,045,498,494.00
Congelamiento	77,533,509.00
Presupuesto Vigente Ajustado	967,964,985.00
Ejecutado IV Trimestre	450,901,670.53
% Ejecución IV Trimestre	47
Total Ejecución Acumulada Anual	879,776,853.00
% Ejecución Anual (Devengado/Vigente)	84
% Ejecución Anual (Devengado/Vigente Ajustado)	91

Fuente: SIAFI, 31/12/2016

Dicho presupuesto es financiado de la siguiente manera el 86% (L.832.4 millones) financiado con fondos externos (crédito y donación), y el 14% (L.135.5 millones) con fondos nacionales, tal y como se muestra en el gráfico No.1.

Gráfico No. 1
Financiamiento de la Inversión Pública por Organismo
 Cifras en Millones de Lempiras

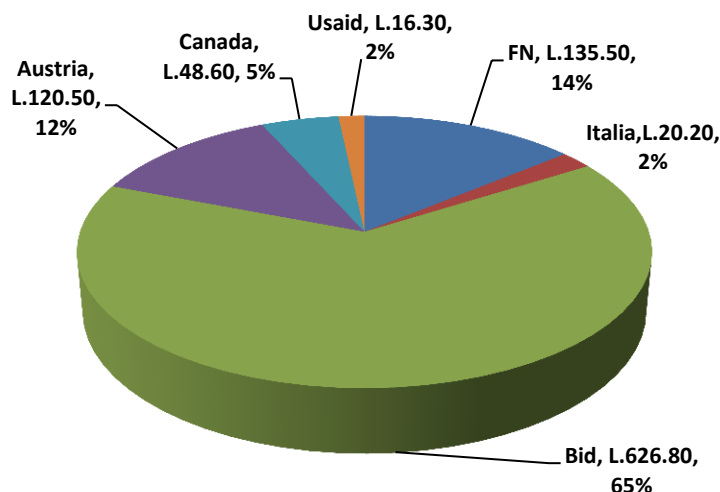

Al Cuarto trimestre La SESAL logró ejecutar L.879,776,853, representando el 91% de ejecución respecto al vigente ajustado, ejecución que se refleja para los programas financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Austria, USAID y programas ejecutados con Fondos Nacionales.

Ver Detalle de Proyectos Ejecución Financiera en Anexo No. 4

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto	Inicio - Fin
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO Y CALIDAD DE SERVICIOS Y REDES DE SALUD	BID 2943/BL-HO	1,156,920	2013-2017
	FINANCIERA		
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado
	% Ejec.		
IV Trimestre 2016	118,892,509	352,686,945	98,886,042
Acumulado 2016	352,686,945	352,686,945	337,945,891
Acumulado Vida del Proyecto	1,156,920,000	1,156,920,000	887,823,373
Observaciones: El programa realizó una ejecución satisfactoria (96%) en relación al presupuesto vigente, asimismo a lo largo del trimestre se mantuvo la cobertura y prestación de servicios a una población de 605,672 personas atendidas en el primer nivel de atención, a través de 17 gestores de salud.			

El objetivo del programa es apoyar a la Secretaría de Salud en la expansión de la cobertura y calidad de servicios a través de la modalidad de gestión descentralizada de dichos servicios, priorizando las poblaciones de los municipios más pobres del país.

A través del componente de fortalecimiento institucional, están en proceso de ejecución varias asistencias técnicas entre estas la evaluación operativa del modelo descentralizado y la adquisición de equipo y mobiliario.

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto	Inicio - Fin
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA RED HOSPITALARIA MATERNO INFANTIL	BID 2743/BL-HO	694,152,000	2014-2017
	FINANCIERA		
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado
	% Ejec.		
IV Trimestre 2016	123,107,492	226,718,572	98,899,479
Acumulado 2016	226,718,572	226,718,572	214,565,540
Acumulado Vida del Proyecto	694,152,000	694,152,000	533,385,554
Observaciones: Durante el trimestre se ha logrado la ejecución de obras de los Hospitales Enrique Aguilar Cerrato en Intibucá, 95% Juan Manuel Gálvez en Lempira para la Construcción del Bloque Materno Infantil, 61% Hospital de San Lorenzo, en Valle para la Construcción de Consulta Externa y Obras Varias 60% , Leonardo Martínez en Cortés 65% , para la Construcción del Bloque Quirúrgico y Mario Catarino Rivas en Cortés 85% , para la Ampliación de la Emergencia Pediátrica. Representando un avance físico promedio de las obras de un 73.2% .			

El objetivo del proyecto es contribuir a la reducción de la mortalidad materno-infantil de los departamentos de Intibucá, Lempira y Valle, a través de la reducción de la mortalidad hospitalaria materno-neonatal de los hospitales de área de esos tres departamentos y de su red de derivación de los casos de mayor complejidad.

Durante el trimestre se ha logrado la ejecución de las cinco obras de los Hospitales Enrique Aguilar Cerrato en Intibucá, Juan Manuel Gálvez en Lempira para la Construcción del Bloque Materno Infantil, Hospital de San Lorenzo, en Valle para la Construcción de Consulta Externa y Obras Varias, Leonardo Martínez en Cortés, para la Construcción del Bloque Quirúrgico y Mario Catarino Rivas en Cortés, para la Ampliación de la Emergencia Pediátrica. Representando un avance físico promedio de las obras de un **73.2%**. A su vez, se realizaron los siguientes procesos: Elaboración de especificaciones técnicas, Términos de Referencia y

procesos de adquisiciones: Los procesos para 5 consultorías para el Departamento de Hospitales, Contratación de firma Auditoría Financiera Externa para el Programa “Mejoramiento del Acceso y Calidad de Servicios y Redes de Salud”, el proceso para la contratación de la auditoría concurrente y de impacto. Por otra parte, está en proceso de contratación la coordinación técnica del proyecto.

Ver Detalle de Proyectos Ejecución Física en Anexo No. 5

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- La DGIP sostuvo reuniones continuas de seguimiento con la Unidad Administradora de Fondos de Cooperación Externa y con la Unidad Técnica de Gestión de la SESAL, a fin de avanzar con los procesos pendientes para lograr la ejecución satisfactoria que ha presentado en este periodo.
- La DGIP ha dado apoyo a la SESAL incorporando recursos mediante traslados presupuestarios de la misma secretaria y del resto del sector público. A fin de que los proyectos ejecuten todas las actividades programadas en sus planes operativos y planes de adquisiciones.

Conclusiones

- Al cuarto trimestre la SESAL logró una ejecución satisfactoria de L.879.8 millones (91%) de L.967.9 millones del presupuesto vigente ajustado.
- El 86% (L.832.4 millones del presupuesto de la SESAL es financiado principalmente con fondos externos y el resto 14% (L.135.5 millones) con fondos nacionales.

Recomendaciones

- Las nuevas autoridades de la SESAL deben apoyar a cada uno de los programas y proyectos ejecutados por esta, para su pronta culminación y entrega de obras a fin de ver los entregables de los proyectos en su tiempo establecido para mayor beneficio de la población.
- La SESAL debe eficientar los procesos de adquisiciones y contrataciones de los proyectos y mejorar los trámites de pago de estos. Se recomienda que se tomen acciones para mejorar el próximo año, con el fin de evitar retrasos en los primeros meses del año.
- La coordinación técnica de monitoreo del proyecto de Equipamiento Biomédico del Hospital María, Especialidades Pediátricas debe dar un seguimiento a los equipos que están pendientes de entregarse por parte de la empresa AGMIN, Asimismo, debe dar un continuo seguimiento al proceso de no objeción y licitación del último equipamiento del Proyecto.

SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION GENERAL DE INVERSION PUBLICA- SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA

ANEXO No. 4

Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al IV Trimestre, 2016

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Intitución /Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Termino	Aprobado	Vigente	Congelamiento	Vigente Ajustado	Trimestre-16	Devengado Anual	
				Total	Total	Total	Total	Total	Total	% Ejec. Dev/Vig. Ajustado
14	0060-Secretaria de Salud			646,306,814	1,045,498,494	77,533,509	967,964,985	450,901,671	879,776,853	91
1	ATENCIÓN INTEGRAL A GRUPOS VULNERABLES	FN-0000017-09	10/02/2012 31/12/2016	3,800,000	9,011,679		9,011,679	2,095,221	7,789,635	86
2	CONSTRUCCION / REMODELACION BODEGA Y OFICINA ADMINISTRATIVA DE REGION DEPARTAMENTAL DE COLON	FN-0000012-09	17/10/2008 31/12/2016		4,667,540		4,667,540	703,649	1,777,159	38
3	CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA DE IMAGENOLOGIA Y EQUIPAMIENTO DE LAS ÁREAS CRÍTICAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO DE JUTICALPA,OLANCHO	Austria No.233.367	22/04/2014 31/12/2016		120,525,000		120,525,000	107,054,124	115,248,747	96
4	CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DEL HOSPITAL REGIONAL DEL SUR EN CHOLUTECA	EDCF-No.HND-4	6/12/2012 28/02/2016	54,993,190	5,003,190		5,003,190			0
5	CONSTRUCCION/REMODELACION BODEGA Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE EL PARAISO	Fondos Nacionales	17/12/2008 31/12/2016		1		1			0
6	CONSTRUCCION/REMODELACION BODEGA Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS SANTA BARBARA	FN-0000062-09	17/12/2008 31/12/2016		6,277,394		6,277,394	4,278,820	5,549,710	88
7	CONSTRUCCIONES, ADICIONES, MEJORAS EN HOSPITALES Y REGIONES SANITARIAS PARA UNA VIDA MEJOR	FN-0000047-11	4/01/2011 31/12/2017	29,365,300	9,799,850		9,799,850	7,409,612	7,409,612	76
8	HONDURAS SALUD MESOAMERICA 2015 (HO-G1003) FASE II	BRT/HE-14661-HO	06/10/2014 21/06/2017	58,250,000	58,250,000	10,830,302	47,419,698	10,738,488	37,322,029	79
9	HOSPITAL MARIA ESPECIALIDADES PEDIATRICAS (HMPEP)	ITALIA- HOS/MARIA	27/02/2007 31/12/2017	25,671,396	20,251,396		20,251,396	19,431,390	19,431,390	96
10	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA RED HOSPITALARIA MATERNO INFANTIL	BID2743/BL-HO	23/06/2012 05/06/2017	123,107,492	226,718,572		226,718,572	98,899,479	214,565,540	95
11	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO Y CALIDAD DE SERVICIOS Y REDES DE SALUD	BID2943/BL-HO	22/08/2013 23/05/2017	118,892,509	352,686,945		352,686,945	98,886,042	337,945,891	96
12	PROGRAMA DE SALUD	SAID No.522-045	6/01/2007 30/06/2016	163,626,611	112,026,611	61,203,207	50,823,404	20,195,725	41,353,948	81
13	PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS Y LEISHMANIASIS (PENCHALE)	Acuerdo de Contrib. A 033640	11/07/2011 31/03/2018	68,600,316	70,280,316	5,500,000	64,780,316	31,209,120	41,383,192	64
14	RECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE SALUD EN HONDURAS PARA UNA VIDA MEJOR	Fondos de Salud 22843-1	6/09/2016 31/12/2016		50,000,000		50,000,000	50,000,000	50,000,000	100

Fuente: SIAFI al 31/12/02016

SECRETARIA DE FINANZAS

Dirección General de Inversión Pública-Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No. 5

Programa de Inversión Pública: Ejecución física al IV Trimestre de 2016

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			4to Trimestre		
			Programación	Ejecución		Programación	Ejecución	
			Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad	Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad
ATENCIÓN INTEGRAL A GRUPOS VULNERABLES	Brindadas las intervenciones integrales para la vigilancia nutricional que determinan una nutrición adecuada.	Informe	4	32,870	821,750	1	16,091	1609100
CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA DE IMAGENOLOGÍA Y EQUIPAMIENTO DE LAS ÁREAS CRÍTICAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO DE JUTICALPA, OLANCHO	Construida El Área de Imagenología y Equipada las Áreas Críticas del Hospital San Francisco de Juticalpa, Olancho	Construcción	1	0	0	0	0	0
CONSTRUCCIONES, ADICIONES, MEJORAS EN HOSPITALES Y REGIONES SANITARIAS PARA UNA VIDA MEJOR	Brindadas las acciones orientadas a la construcción, ampliación y mejora de la infraestructura de las U.S. y oficinas administrativas del I y II nivel de atención.	Informe	1	0	0	0	0	0
CONSTRUCCION / REMODELACION BODEGA Y OFICINA ADMINISTRATIVA DE REGION DEPARTAMENTAL DE COLON	Brindadas las acciones orientadas a la construcción de oficinas administrativas del primer nivel de atención en la región de colon	Informe	1	0	0	0	0	0
CONSTRUCCION/REMODELACION BODEGA Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE EL PARAISO	Brindadas las acciones orientadas a la construcción de oficinas administrativas del primer nivel de atención en la región de el paraíso	Informe	1	0	0	0	0	0
CONSTRUCCION/REMODELACION BODEGA Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS SANTA BARBARA	Brindadas las acciones orientadas a la construcción de oficinas administrativas del primer nivel de atención en la región de santa bárbara	Informe	1	0	0	0	0	0
CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DEL HOSPITAL REGIONAL DEL SUR EN CHOLUTECA	Construido Hospital Regional del Sur.	Informe	4	0	0	1	0	0
HONDURAS SALUD MESOAMERICA 2015 (HO-G1003) FASE II	Brindadas las intervenciones oportunas que mejoren las capacidades institucionales que aumentan la oferta y calidad de los servicios básicos para disminuir la morbilidad materna, neonatal e infantil.	Intervención	12,156	11,623	96	3,039	4,505	148
HOSPITAL MARIA ESPECIALIDADES PEDIATRICAS (HMEP)	Equipamiento medico hospitalario sanitario del Hospital María.	Equipo	1	0	0	1	0	0
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA RED HOSPITALARIA MATERNO INFANTIL	Brindadas las acciones orientadas a la rehabilitación y construcción de la infraestructura y la ampliación y mejora del equipamiento en las áreas materno infantil hospitalarias.	Acción	36	7	19	9	2	22
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO Y CALIDAD DE SERVICIOS Y REDES DE SALUD	Fortalecida la cobertura y calidad de servicios de salud a través de la gestión descentralizada.	Intervención	72	285	396	18	94	522
PROGRAMA DE SALUD	Brindadas las intervenciones necesarias que mejora la capacidad institucional en los temas de reforma y la atención integral materno infantil, PF, VIH/Sida y ITS.	Intervención	310	0	0	60	0	0
PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS Y LEISHMANIASIS (PENCHALE)	Brindadas las atenciones integrales que incrementan la capacidad institucional y comunitaria para la prevención y control de la enfermedad de chagas y leishmaniasis.	Intervención	28,569	1	0	6,351	0	0
RECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE SALUD EN HONDURAS PARA UNA VIDA MEJOR	Reconstrucción Y Construcción De Centros De Salud En Honduras Para Una Vida Mejor	Construcción	75	0	0	75	0	0

Fuente: SIAFI
