



★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE FINANZAS

Dirección General de Inversiones Públicas–
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

Informe de Avance Físico y Financiero

Secretaría de Finanzas
(SEFIN)

Al Cuarto Trimestre, 2017

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Enero 2018

4.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA


La Secretaría de Finanzas (SEFIN), representa el 98.6% de la inversión del Gabinete Sectorial de Conducción y Regulación Económica; al cuarto trimestre representaba el 66%, el incremento porcentual de un trimestre a otro es debido a que fueron trasladados los recursos no utilizados de BANHPROVI casi en su totalidad a otros proyectos con déficit presupuestario. Su presupuesto de inversión para el Año 2017 y su correspondiente ejecución financiera se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro No. 3
Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del 2017
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	282,506,584
Presupuesto Vigente	292,684,968
Congelamiento	-
Presupuesto Vigente Ajustado	292,684,968
Devengado IV Trimestre -17	88,360,117
% Ejecución (Devengado IV Trim. / Vigente Ajustado)	30%
Devengado Anual	242,242,036
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente Ajustado)	83%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	242,242,036
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente Ajustado)	83%

Fuente: SIAFI, 30/09/2017

El presupuesto de la institución, está conformado por 12 proyectos financiados en un 87% (L.255,415,149) con Fondos Externos (Crédito y Donación) distribuidos por Organismos Internacionales de financiamiento de acuerdo al Gráfico No. 6 y el restante 13% (L.37,674,146) con Fondos Nacionales como contraparte nacional y municipal asignada a los diferentes programas y proyectos.

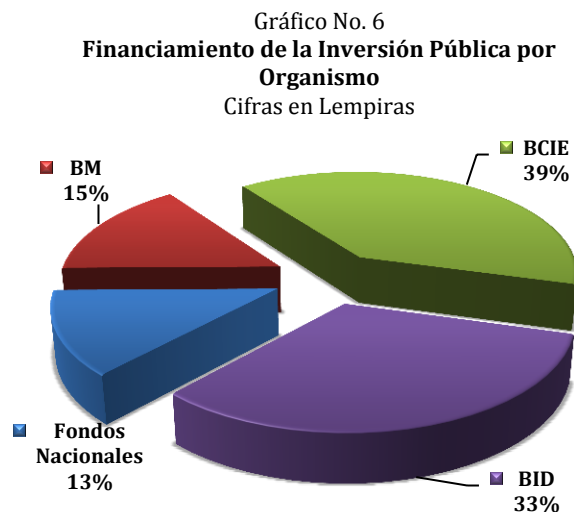

Al cuarto trimestre del 2017, se alcanzó un nivel de ejecución del 83% (L.242,242,036) en relación al presupuesto Vigente Ajustado que totalizó los L.292,684,968; dicha ejecución como resultado de los compromisos contractuales suscritos, pagos realizados, así como las acciones realizadas por la unidades ejecutoras en las actividades de cierre de algunos proyectos.

En relación a la ejecución reportada al termino del ejercicio fiscal 2016 cuyo nivel reflejó el 96% respecto a su presupuesto Vigente ajustado; dicho comportamiento disminuyó el 13 puntos porcentuales lo cual es importante mencionar ya que se contó

con una asignación menor en el ejercicio 2017, así mismo las actividades en los proyectos en cierre han requerido ampliación específicamente para el sostenimiento de los consultores de apoyo a los sistemas informáticos; cabe mencionar los retrasos en la resolución y toma de decisión por parte de las unidades ejecutoras técnicas, así mismo, que al inicio del año 2017 se presentó inconvenientes con los ajustes y modificaciones al Presupuesto Aprobado por el Congreso Nacional, mismo que implicaba cambios en los Planes Operativos Anuales y las dificultades en los Sistemas para poder realizar las gestiones.

Ver Anexo 4: Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al IV Trimestre-2017

4.2 PRINCIPALES PROYECTOS

El Programa de Inversión de la SEFIN, contempla la ejecución de 12 programas y proyectos orientados al fortalecimiento institucional, con el propósito de mejorar la gestión y consolidación de las finanzas públicas; así mismo, se destinan recursos para la modernización del subsector agua y saneamiento, programa de emergencia de agua y la remodelación de edificios en el sistema aduanero nacional.

En ese sentido y considerando que el 83% del presupuesto vigente de la institución para el año 2017, se concentra en 4 programas y proyectos, los mismos se han definido como prioritarios, por lo que un atraso en la ejecución de cualquiera de ellos, repercutirá en los niveles globales de ejecución del Programa de Inversión de la institución. Dichos proyectos se describen a continuación:

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin	
		US\$	Lempiras		
MODERNIZACIÓN DE LA ADUANA EN PUERTO CORTÉS	BID 2467/BL-HO	10,000,000	241,423,000	15/12/2010	
				30/06/2017	
		Financiera			
		Aprobado	Vigente	Devengado	% Ejecución
IV Trimestre 2017		16,213,308	31,274,641	12,172,870	39%
Acumulado 2017		16,213,308	31,274,641	27,378,676	88%
Acumulado Vida del Proyecto */		241,423,000	241,423,000	220,575,927	91%
Observaciones:					
Ejecución Física reportada al IV Trimestre del 2017:					
Entrega de Centro control y monitoreo situado en el Estado Mayor Conjunto					
Instalación y Capacitación de equipo aduanero en los laboratorios de la aduana					
Proyecto finalizado. Pendiente devolución de presupuesto no utilizado al BID					

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

SECRETARÍA DE FINANZAS

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
PROGRAMA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL Y MUNICIPAL	BID-2032/BL-HO	US\$	29,892,615	15/10/2008 30/06/2017
		Lempiras	721,676,479	
	Financiera			
	Aprobado	Vigente	Devengado	% Ejecución
IV Trimestre 2017	131,956,207	46,752,469	3,958,650	8.5%
Acumulado 2017	131,956,207	46,877,343	40,613,425	87%
Acumulado Vida del Proyecto */	661,758,240	721,676,479	576,776,078	80%
Observaciones:				
Ejecución Física reportada al VI Trimestre del 2017: Proyecto Finalizado. Pendiente devolución de presupuesto no utilizado al BID				

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS, (COMRURAL)	BM-4465	US\$	25,500,000	17/09/2008 31/12/2018
		Lempiras	615,628,650	
	Financiera			
	Aprobado	Vigente	Devengado	% Ejecución
IV Trimestre 2017	13,654,346	50,209,259	10,809,206	22%
Acumulado 2017	13,654,346	50,209,259	42,953,362	86%
Acumulado Vida del Proyecto */	615,628,650	615,628,650	560,155,106	91%
Observaciones:				
<ul style="list-style-type: none"> • Se realizaron Consultorías 49 Técnicas y Administrativas sobrepasando en un 96% el total programado • Se realizó la Consultoría de levantamiento de Información • Se firmaron 4 Contratos de Arrendamiento y uno de Seguridad, alcanzando el 100% de lo programado para el cuarto trimestre. 				
Ejecución Física reportada al IV Trimestre del 2017:				
* Informes de administración del proyecto, monitoreo y evaluación (programados 25, ejecutados 26)				

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
PROGRAMA MULTISECTORIAL DE EMERGENCIA:FORTALECIMIENTO FISCAL Y EQUIDAD SOCIAL	2045 BCIE	US\$	280,000,000	27/09/2010 31/12/2017
		Lempiras	6,759,844,000	
	Financiera			
	Aprobado	Vigente	Devengado	% Ejecución
IV Trimestre 2017	110,697,798	115,143,157	62,070,015	54%

SECRETARÍA DE FINANZAS

Acumulado 2017	110,697,798	115,143,157	105,934,003	92%
Acumulado Vida del Proyecto */	6,759,844,000	6,759,844,000	922,361,041.77	14%

Observaciones:

Cifras corresponden al Componente de Emergencia de Agua.

- A la fecha cuenta con 9 contratos de obras en ejecución de los cuales 2 se encuentran en alerta por temas de resolución negociación y pago de servidumbre en el proyecto de Traslase y actualización de garantías y ampliación contratos en el proyecto de Juticalpa.
- En gestión por parte de UAP/SEFIN, para la emisión de una Carta de Crédito por US\$300,000.0 para el proveedor de los equipos, con el compromiso del contratista a la presentación del cronograma de ejecución hasta el 31 de octubre de 2017 (fecha límite de ejecución de la obra).
- Durante el III y IV Trimestre la DGIP, realizó visitas de campo a los Proyectos realizados en Olancho constatando la ejecución de la "Ampliación al Sistema de Bombeo y Capacidad de Almacenamiento para el Abastecimiento de Agua Potable del Acueducto de Juticalpa, Olancho", destacando los siguientes hallazgos:
 - Se definió un cambio al diseño final del proyecto, para hacer un tanque cisterna y un nuevo sistema de distribución que requirió cambio de la tubería a 16" y bombas en los puntos de producción en los distintos tanques (5 pozos propiedad del SANAA).
 - Se encuentra en rehabilitación de las áreas en los 5 pozos de los cuales a la fecha sólo se encuentran en funcionamiento 2 (#3 y #4), mismas que constan de construcción de muro perimetral de bloque visto, maya ciclón, y acondicionamiento de las casetas de control de las bombas sumergibles que formaran parte en cada uno de los pozos.
 - El centro de producción contempla sistemas automatizados, equipos de monitoreo, armarios de control, planta eléctrica (auxiliar de generación automática de energía).
 - El proyecto presenta un avance físico del 60%, actualmente a través de 3 frentes de trabajo para la conexión de 460 lances de tubería hacia el centro de producción.
 - Se expresó por parte de la empresa contratista, que causa de los desfases en la ejecución se originaron por aspectos burocráticos (a cargo del SANAA) de resolución de trámites por dispensas y posteriormente desaduanaje de los insumos.
 - Otro aspecto que se identificó como relevante en el desfase de la ejecución, se ha derivado de cambio de diseño original del proyecto, y el no contar con un proveedor local que suministrase las bombas a medida que se requieren para este tipo de proyectos, teniendo como resultado la espera de al menos 18 semanas para la entrega del equipo en el país, sumando a esta situación que el contratista necesita de al menos 4 semanas adicionales para su instalación y puesta en marcha.
 - Así mismo, es de considerar, que según se manifestó en la entrevista, el pedido de los equipos se retrasó por la tardía decisión por parte del SANAA, considerando que el contrato se encuentra vencido y no se ha renovado, sin embargo el proyecto continúa en ejecución.

Ejecución Física reportada al IV Trimestre del 2017:

- 2 informes de Administración financiera para la construcción de pozos de agua (ejecución 100%).
- 2 informes de Administración financiera en apoyo para el fortalecimiento del subsistema Los Laureles (ejecución 100%).
- 1 informe de Administración financiera para la producción y plantación de árboles en la sub cuenca del Rio Guacerique (ejecución 100%).
- 15 informes de administración técnica UAP del proyecto (ejecución 100%).

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto
 Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

4.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Para el presente año, la Dirección General de Inversión Pública se ha propuesto identificar los retrasos en la ejecución de los Programas y Proyectos con la finalidad de dinamizar, agilizar y apoyar tanto a lo interno de la SEFIN, como con los Organismos Internacionales y demás involucrados en la eficiente ejecución de los recursos.

Al cuarto trimestre se realizaron las siguientes actividades y/o acciones en apoyo a los proyectos de inversión:

Ejecución al IV Trimestre 2017; Secretaría de Finanzas

- Seguimiento a la temática de cierre del Proyecto ComRural y asignación de contraparte nacional adicional.
- Participación en reuniones de seguimiento a los sub proyectos en alerta del Componente Programa de Emergencia de Agua, en el marco del Programa Multisectorial de Emergencia (BCIE 2045).
- Participación en reuniones de seguimiento a las actividades para lograr la elegibilidad y cumplimiento de condicionalidades previas al primer desembolso al Proyecto de Manejo Sostenible de Bosques (BID 3878/BL-HO).
- Giras de Campo a nivel nacional para constatar la ejecución de los Programas y Proyectos adscritos a la Secretaría de Finanzas.
- Se llevó a cabo la II Revisión Técnica de cartera de Proyectos BID.
- Participación en el Taller de Cierre del Programa para la Consolidación de la Gestión Fiscal y Municipal (BID 2032/BL-HO).

Conclusiones

- Al cuarto trimestre, la SEFIN presenta una ejecución financiera aceptable del 83% (L.242,242,036) si se consideran los cuellos de botella que se presentaron en el transcurso del año
- SEFIN muestra deficiencia en mecanismos de mejora en la planificación y ejecución de los proyectos de forma que permita alcanzar mejores resultados en las actividades.
- Unidades ejecutoras realizan procesos lentos relacionados a la ejecución de los proyectos, en algunos casos por la coordinación técnica con otras instituciones co-ejecutoras.

Recomendaciones

- Cumplimiento puntual a los planes de ejecución de los proyectos, prever tiempos para cada proceso y tomar en cuenta los tiempos que estipulan los organismos de financiamiento.
- Implementar mecanismos dinámicos de respuesta a las solicitudes de las unidades ejecutoras, a fin de dinamizar la ejecución de la inversión.

Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
ANEXO No. 4
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE 2017
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Gabinete/ Institución / Proyecto	Convenio	Aprobado			Vigente			Congelamiento			Vigente Ajustado			Devengado IV Trimestre-17			Devengado Anual			
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./ Vig. Ajustado)
12	0100 - Secretaría de Finanzas		8,754,346	273,752,238	282,506,584	37,269,819	255,415,149	292,684,968	-	-	-	37,269,819	255,415,149	292,684,968	5,733,105	82,627,012	88,360,117	31,122,998	211,119,039	242,242,036	83
1	APOYO A LA ESTRATEGIA DE INVERSIÓN PÚBLICA DE MEDIANO PLAZO	BID ATN/OC-15878-HO	-	-	-	-	4,766,678	4,766,678	-	-	-	-	4,766,678	4,766,678	-	2,476,747	2,476,747	-	2,476,747	2,476,747	52
2	APOYO INSTITUCIONAL A COALIANZA Y A LA CONSOLIDACION DE SU CARTERA DE PROYECTOS	BID-ATN/OC-13579-HO	-	8,519,980	8,519,980	-	6,492,653	6,492,653	-	-	-	-	6,492,653	6,492,653	-	1,972,741	1,972,741	-	5,444,567	5,444,567	84
3	FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (PROMOSAS).	IDA- 5270-HN	-	500,000	500,000	1,940,000	1,415,000	3,355,000	-	-	-	1,940,000	1,415,000	3,355,000	376,113	-	376,113	1,856,660	1,111,850	2,968,511	88
4	MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES	BID3878/BL-HO	-	-	-	-	11,126,000	11,126,000	-	-	-	-	11,126,000	11,126,000	-	361,667	361,667	-	361,667	361,667	3
5	MODERNIZACIÓN DE LA ADUANA EN PUERTO CORTÉS (BID 2467/BL-HO)	BID 2467/ BL-HO	-	16,213,308	16,213,308	-	31,274,641	31,274,641	-	-	-	-	31,274,641	31,274,641	-	3,084,913	3,084,913	-	27,378,676	27,378,676	88
6	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE EMERGENCIA:FORTALECIMIENTO FISCAL	2045 BCIE	-	110,697,798	110,697,798	-	115,143,157	115,143,157	-	-	-	-	115,143,157	115,143,157	-	62,070,015	62,070,015	-	105,934,003	105,934,003	92
7	PROGRAMA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL Y MUNICIPAL	BID-2032/BL-HO	-	131,956,207	131,956,207	10,975,126	35,777,343	46,752,469	-	-	-	10,975,126	35,777,343	46,752,469	3,914,650	44,000	3,958,650	10,975,123	29,638,302	40,613,425	87
8	PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ECO-FOGONES, CON ACOMPAÑAMIENTO E INSTALACIÓN DE HORNILLAS	FN-SEFIN-0000011-12	-	-	-	182,183	-	182,183	-	-	-	182,183	-	182,183	-	-	-	182,182	-	182,182	100
9	PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS, (COMRURAL)	BM-4465	8,254,346	5,400,000	13,654,346	7,793,259	42,416,000	50,209,259	-	-	-	7,793,259	42,416,000	50,209,259	68,046	10,741,160	10,809,206	7,793,255	35,160,107	42,953,362	86
10	PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO (IDA)	IDA 4335-HO	500,000	-	500,000	16,379,251	700,000	17,079,251	-	-	-	16,379,251	700,000	17,079,251	1,374,295	-	1,374,295	10,315,776	623,910	10,939,687	64
11	PROYECTO MEJORA DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE LAS FINANZAS PUBLICAS	ATN/OC-15875-HO	-	-	-	-	5,284,911	5,284,911	-	-	-	-	5,284,911	5,284,911	-	1,875,769	1,875,769	-	2,016,409	2,016,409	38
12	PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA: PRESUPUESTO Y CRÉDITO PÚBLICO	ATN/OC-13582-HO	-	464,945	464,945	-	1,018,766	1,018,766	-	-	-	-	1,018,766	1,018,766	-	-	-	-	972,800	972,800	95

Fuente: SIAFI, 31/12/2017

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No. 5

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al IV Trimestre, 2017

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	ANUAL			IV Trimestre		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Secretaría de Finanzas								
021 - PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO (IDA)	03 - APOYO Y CAPACITACIONES REALIZADAS	149 - INFORME	12	0	0	3	0	0
	35 - Apoyo y capacitaciones realizadas	149 - INFORME	12	0	0	3	0	0
	61 - Apoyo financiero y administrativo a la realización de capacitaciones.	149 - INFORME	7	1	14	0	0	0
	93 - APOYO A LA COORDINACION MUNICIPAL DEL PROYECTO	149 - INFORME	1	1	100	0	0	0
022 - PROGRAMA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL Y MUNICIPAL	05 - INGRESOS TRIBUTARIOS MEJORADOS	149 - INFORME	12	0	0	3	0	0
	06 - INFRAESTRUCTURA DE LAS ADUANAS MEJORADA	149 - INFORME	12	0	0	3	0	0
	37 - Ingresos tributarios mejorados	149 - INFORME	12	0	0	3	0	0
	38 - Infraestructura de las aduanas mejorada	149 - INFORME	12	0	0	3	0	0
	63 - Apoyo administrativo para mejorar la gestión fiscal y municipal.	149 - INFORME	4	4	100	0	0	0
	64 - Apoyo administrativo y financiero para mejorar la infraestructura de las aduanas.	149 - INFORME	1	1	100	0	0	0
	94 - Sistema Administracion Financiera Integrada	149 - INFORME	2	8	400	0	7	0
027 - PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS, (COMRURAL)	08 - ADMINISTRACION DEL PROYECTO, MONITOREO Y EVALUACION	149 - INFORME	12	0	0	3	0	0
	40 - Administración del proyecto, monitoreo y evaluación	149 - INFORME	12	0	0	3	0	0
	66 - Administración del proyecto, monitoreo y evaluación	149 - INFORME	25	26	104	0	0	0

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	ANUAL			IV Trimestre		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
031 - PROGRAMA MULTISECTORIAL DE EMERGENCIA:FORTALECIMIENTO FISCAL	10 - POZOS DE AGUA CONSTRUIDOS	149 - INFORME	12	0	0	3	0	0
	11 - SUBSISTEMAS LOS LAURELES FORTALECIDOS	149 - INFORME	12	0	0	3	0	0
	12 - SISTEMA DE CAPTACIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA EN JUTICALPA AMPLIADO Y MEJORADO	149 - INFORME	12	0	0	3	0	0
	13 - ARBOLES EN LA SUBCUENCA DEL RIO GUACERIQUE PRODUCIDOS Y PLANTADOS	149 - INFORME	12	0	0	3	0	0
	14 - ADMINISTRACION DEL PROGRAMA	149 - INFORME	12	0	0	3	0	0
	42 - Pozos de agua construidos	149 - INFORME	12	0	0	3	0	0
	43 - Subsistemas los laureles fortalecidos	149 - INFORME	12	0	0	3	0	0
	44 - Sistema de captación y suministro de agua en juticalpa ampliado y mejorado	149 - INFORME	12	0	0	3	0	0
	45 - Árboles en la sub cuenca del rio guacerique producidos y plantados	149 - INFORME	12	0	0	3	0	0
	46 - Administracion del programa multisectorial	149 - INFORME	12	0	0	3	0	0
	68 - Administración financiera para la construcción de pozos de agua.	149 - INFORME	2	2	100	0	0	0
	69 - Administración financiera en apoyo para el fortalecimiento del <u>subsistema los laureles.</u>	149 - INFORME	2	2	100	0	0	0
	70 - Administración financiera para la ampliación y mejora del sistema de captación y suministro de agua en Juticalpa.	149 - INFORME	2	0	0	0	0	0
	71 - Administración financiera para la producción y plantación de árboles en la sub cuenca del rio Guacerique.	149 - INFORME	1	1	100	0	0	0
72 - administracion del proyecto Multisectorial	149 - INFORME	8	15	188	0	0	0	

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	ANUAL			IV Trimestre		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
036 - MODERNIZACIÓN DE LA ADUANA EN PUERTO CORTÉS (BID 2467/BL-HO)	16 - MODELO DE FISCALIZACIÓN ADUANERA NO INTRUSIVA IMPLANTADO	149 - INFORME	12	0	0	3	0	0
	17 - DATA CENTER DE RESPALDO INSTALADO	149 - INFORME	12	0	0	3	0	0
	18 - AUDITORIA REALIZADA	149 - INFORME	12	0	0	3	0	0
	48 - Modelo de fiscalización aduanera no intrusiva implantado	149 - INFORME	12	0	0	3	0	0
	49 - Data center de respaldo instalado	149 - INFORME	12	0	0	3	0	0
	50 - Auditoria realizada del proyecto	149 - INFORME	12	0	0	3	0	0
	74 - Apoyo a la implementación del modelo de fiscalización aduanera no intrusiva.	149 - INFORME	1	1	100	0	0	0
	75 - Data center de respaldo instalado	149 - INFORME	12	0	0	3	0	0
	76 - Auditoria realizada del proyecto BID-2467	149 - INFORME	1	1	100	0	0	0
92 - APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO AL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE FISCALIZACION Y SEGURIDAD	149 - INFORME	1	0	0	0	0	0	
040 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ECO-FOGONES, CON ACOMPAÑAMIENTO E INSTALACIÓN DE HORNILLAS MEJORADAS, ESTUFAS JUSTAS	10 - FABRICACION E INSTALACION DE ECOFOGONES	149 - INFORME	1	1	100	0	0	0
043 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA: PRESUPUESTO Y CRÉDITO PÚBLICO	20 - AUDITORIA REALIZADA (ATN-13582)	149 - INFORME	12	0	0	3	0	0
	21 - EVALUACION REALIZADA	149 - INFORME	12	0	0	3	0	0
	52 - Auditoria realizada	149 - INFORME	12	0	0	3	0	0
	53 - Evaluación realizada	149 - INFORME	12	0	0	3	0	0
	78 - Auditoria realizada de la ATN	149 - INFORME	1	1	100	0	0	0
	79 - Evaluacion realizada de la ATN	149 - INFORME	1	1	100	0	0	0
	89 - APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA REALIZACION DE CAPACITACIONES PARA LA DGP	149 - INFORME	1	1	100	0	0	0
90 - APOYO FINANCIERO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ÁREA DE INGRESOS DE LA DGP	149 - INFORME	1	1	100	0	0	0	

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	ANUAL			IV Trimestre		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
048 - APOYO INSTITUCIONAL A COALIANZA Y A LA CONSOLIDACION DE SU CARTERA DE PROYECTOS	23 - CARTERA DE PROYECTOS APOYADA	149 - INFORME	12	0	0	3	0	0
	24 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO REALIZADO	149 - INFORME	12	0	0	3	0	0
	55 - Fortalecimiento realizado	149 - INFORME	12	0	0	3	0	0
	56 - Seguimiento y monitoreo realizado	149 - INFORME	12	0	0	3	0	0
	81 - Apoyo administrativo y financiero al fortalecimiento de la unidad ejecutora del proyecto.	149 - INFORME	5	2	40	0	0	0
	82 - Administración y seguimiento del proyecto.	149 - INFORME	1	0	0	0	0	0
050 - FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (PROMOSAS).	58 - Gestion del Proyecto	149 - INFORME	12	0	0	3	0	0
	84 - Apoyo administrativo a la gestión física y financiera del proyecto.	149 - INFORME	3	0	0	0	0	0
	91 - APOYO FINANCIERO A LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS SAS EN LAS MUNICIPALIDADES	149 - INFORME	1	1	100	0	0	0
	95 - APOYO FINANCIERO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS EPS	149 - INFORME	1	0	0	0	0	0
051 - PROYECTO MEJORA DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE LAS FINANZAS PUBLICAS	97 - APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA LA MEJORA CONCEPTUAL DE PROCESOS DEL SIAFI	149 - INFORME	2	3	150	0	2	0
	98 - APOYO FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INVERSION PUBLICA	149 - INFORME	4	1	25	0	0	0
	99 - APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO A LA MEJORA DE LA GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS	149 - INFORME	2	0	0	0	0	0
052 - MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES	10 - APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SANIDAD FORESTAL	149 - INFORME	1	0	0	0	0	0
	10 - APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA MEJORA DEL ACCESO AL FINANCIAMIENTO CLIMATICO	149 - INFORME	1	5	500	1	5	500
	10 - APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA RESTAURACION DE BOSQUES	149 - INFORME	2	0	0	1	0	0

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	ANUAL			IV Trimestre		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
053 - APOYO A LA ESTRATEGIA DE INVERSIÓN PÚBLICA DE MEDIANO PLAZO	10 - APOYO A LA GESTION PUBLICA PARA EL DESARROLLO	149 - INFORME	2	1	50	0	0	0
	10 - APOYO ADMINISTRATIVO PARA INFRAESTRUCTURA, PRODUCTIVIDAD E INNOVACION	149 - INFORME	2	1	50	0	1	0
	11 - APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA REALIZACION DE TALLERES Y LOGISTICA	149 - INFORME	2	0	0	1	0	0
	11 - APOYO AL DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	149 - INFORME	3	1	33	0	1	0

Fuente: SIAFI
