



★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas

Dirección General de inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

**INSTITUTO DE DESARROLLO
COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO
(IDECOAS/FHIS)**

Al Segundo Trimestre, 2018

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A.

Julio, 2018

IV. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

4.1 EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

El Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento (IDECOAS)-Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) al II trimestre del 2018 a través de la ejecución de sus (7) siete proyectos enfocados en Agua y Saneamiento, Educación, Electrificación Rural, Productividad, Infraestructura Social e Infraestructura Rural cuenta con un presupuesto vigente de inversión para el presente año de L.367,670,512.00 y la ejecución financiera del II trimestre asciende a L.47,633,606.00 tal como se detalla en el Cuadro No. 5.


Cuadro No. 05
Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del 2018
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	306,676,775
Presupuesto Vigente	367,670,512
Devengado II Trimestre -18	47,633,606
% Ejecución (Devengado II Trim. / Vigente)	13%
Devengado Anual	70,424,319
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	19%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	74,671,973
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	20%

Fuente: SIAFI, 30/06/2018

Al II trimestre 2018 este presenta un 13% de ejecución con respecto al Presupuesto Vigente, asimismo el compromiso anual asciende a L.74,671,973 lo que representa el 20% con relación al Presupuesto Vigente.

4.2 PRINCIPALES PROYECTOS

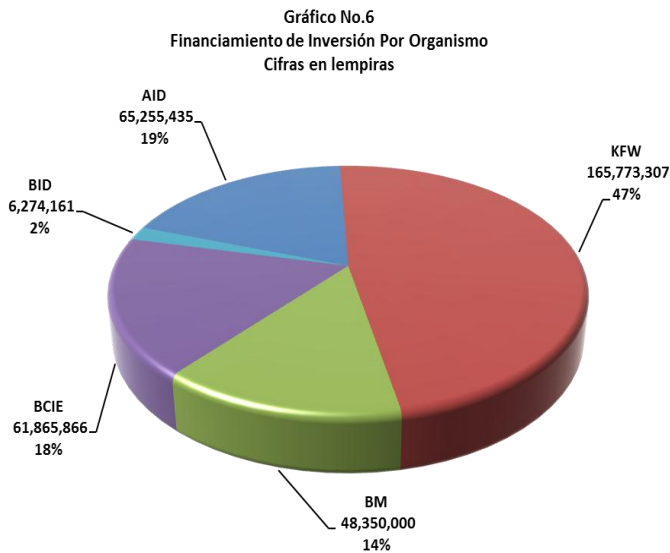

La inversión del año 2018 se concentró en los siguientes proyectos: (1) Productividad y oportunidad para el desarrollo a través de energía renovable, (2) Programa de Pueblos Indígenas Y Afrohondureños Y Cambio Climático, (3) Programa modernización de la infraestructura educativa y su gestión local (PROMINE), (4) Proyecto Convivencia y espacios seguros para los jóvenes en Honduras, (5) Proyecto de Infraestructura Rural (6) Proyecto Municipios Más Seguros y (7) Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana.

A continuación se detallan los avances físicos y financieros de los principales proyectos de acuerdo a su presupuesto vigente:

Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y de su Gestión Local (PROMINE) FASE III

PROMINE tiene por objetivo general fortalecer la rectoría Sectorial en Infraestructura Educativa de la Secretaría de Educación y la gestión local participativa así como mejorar el acceso de los alumnos y alumnas de las comunidades pobres al Centro Educativo de calidad que operan de manera sostenible. De esa manera se pretende contribuir al aumento de la eficiencia y de la calidad del sistema educativo (pre-básico y básico).

El área de intervención del Programa comprende principalmente los departamentos de Copán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque y Santa Bárbara.

Fase III contempla 48 proyectos (incluye un proyecto de equipamiento) los cuales han ingresado al ciclo de proyectos del FHIS. Este número de proyectos que se aprobarán variarán en base al costo de los mismos y la disponibilidad de recursos.

Se han terminado 4 proyectos con los cuales se beneficiaron a 1,084 personas (alumnos y personal administrativo) y se generaron 160 empleos.

A continuación véase la ejecución histórica del Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y de su Gestión Local (PROMINE), II trimestre y acumulado 2018:

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto*/	Inicio-Fin	
Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y de su Gestión Local (PROMINE)	SE/FHIS VIII No.2008-66-178 2014 67 414 (KFW) / FHIS - SE	1,345,320,646	2012-2020	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
II Trimestre 2018	46,197,650	46,197,650	13,928,550	30
Acumulado 2018	46,197,650	46,197,650	22,078,954	48
Acumulado Vida del Proyecto*/	1,345,320,646	1,345,320,646	806,170,726	60

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Ver Detalle de Ejecución Física en Anexo No. 5

Proyecto de Infraestructura Rural (BCIE-1736)

Tiene como objetivo general mejorar el acceso cualitativo y sustancialmente de los servicios de infraestructura (carreteras, agua, saneamiento y energía eléctrica) para la población pobre de zonas rurales en el territorio nacional, desarrollando las capacidades y condiciones adecuadas de prestación de servicios de infraestructura rural y planificación a nivel local.

SECRETARÍA DE FINANZAS

El área de intervención del Programa comprende principalmente los departamentos de Lempira, Intibucá y Francisco Morazán, mediante las mancomunidades de los departamentos de Lempira (CAFEG), Intibucá (AMFI) y Francisco Morazán (MANOFM).

En el sector de Agua y Saneamiento, actualmente se encuentran en ejecución seis (6) subproyectos, los porcentajes de avance de obra y la ubicación de los mismos se detallan a continuación:

No.	Cód de Proyecto	Nombre de Proyecto	Ubicación		Porcentaje de Ejecución
			Municipio	Departamento	
1	103116	Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento del Casco Urbano	San Andrés	Lempira	70%
2	105113	Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento del Casco Urbano	Santa Cruz	Lempira	70%
3	102580	Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento del Casco Urbano de San Antonio	San Antonio	Intibucá	75%
4	106568	Ampliación Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento Casco Urbano de Candelaria	Candelaria	Lempira	72%
5	106915	Construcción de Sistema de Agua Potable y Saneamiento /Micro captación Pluvial Comunidad Masaya, Las Crucitas y Llanitos	Colomoncagua	Intibucá	30%
6	106916	Construcción de Sistema de Agua Potable y Saneamiento/Micro captación Pluvial Comunidad Queserita	San Antonio	Intibucá	20%

Durante el período se reporta la finalización del subproyecto Construcción de Sistema de Agua Potable y Saneamiento en las Comunidades Lomas del Suyate y El Amatillo, ubicadas en el municipio de Valle de Ángeles, Francisco Morazán, inicialmente formulado para dar cobertura a 49 viviendas, y que al final de las obras se logró incorporar 12 nuevas viviendas al sistema de abastecimiento, lo cual incrementa a 61 las conexiones domiciliarias construidas, beneficiando a 366 pobladores. Durante la ejecución se generó empleo para 25 personas de la zona.

En el sector de Caminos Rurales, se encuentran en ejecución dos (2) subproyectos, con código 105610 y 105611 ambos en el municipio de Orica, Francisco Morazán con un avance de obra del 52% y 33% respectivamente, que presentan el caso de los subproyectos de Alcantarillado. La Mancomunidad MANOFM como administrador de los contratos, mediante el Acuerdo No. 1 y No. 2, estableció proceder a la rescisión de los contratos por incumplimiento fundamental del Contratista, considerando que este suspendió las obras sin autorización de la Supervisión. Adicional a los contratos antes mencionados, se inició también la rescisión del contrato de obra del subproyecto Rehabilitación de Caminos Rurales El Roble-Susuma, con modalidad Centralizado. Cabe resaltar que, al momento de liquidar el contrato se han ejecutado un total de 11.67 km, que representan el 81%, mismos que se encuentran en estado transitable, quedando pendiente de ejecución obras menores, es por esta razón se reporta como finalizado.

Durante el II período 2018, se reportan cuatro (4) subproyectos finalizados en el sector: dos tramos de caminos rurales rehabilitados en el municipio de San Francisco, Lempira, con un total de 10.382 km de longitud: Tramo San Francisco Centro – Las Marías (4.67 km) y el tramo San Francisco Centro – El Cutucon Magdalena (5.712 km).

SECRETARÍA DE FINANZAS

El tramo de 11.67 km en las comunidades de El Roble – Susuma, en el municipio de Piraera, Lempira y el tramo Jiquinlaca – Guachipilicito en el municipio de Concepción, Intibucá de 6.85 km de longitud. Conjuntamente se benefician en la zona 4,426 pobladores que ahora cuentan con caminos transitables.

En el sector de Electrificación Rural por extensión de red, finalizó la Construcción del Sistema de la Comunidad RorrUCA Centro ubicado en el municipio de San Francisco, Lempira, con 30 acometidas domiciliarias presupuestadas, beneficiando a 180 pobladores, incluyendo dos Iglesias y una Escuela favorecidas por el proyecto. La Dirección del Fondo Social de Desarrollo y Electrificación Rural (FOSODE) autorizó a la EEH proceder con la energización y atención a los nuevos abonados. El detalle del sector Electrificación y sus subproyectos por ejecutar se presenta a continuación:

No.	Cód de Proyecto	Nombre de Proyecto	Municipio	Depto.	KM línea	Conexiones	Beneficiarios	Estatus
1	106648	Electrificación Rural por extensión de red en El Pedamal y Susuma	Camasca	Intibucá	6.667	65	390	Reunión previa al inicio de las obras realizada el 29/6/2018
2	106649	Electrificación Rural Por Extensión de Red Las Delicias San Cristóbal	Vallecillo	Francisco Morazán	3.34	48	288	Pendiente aprobación de PGA para proceder con el proceso de licitación.
3	106973	Electrificación Rural por Extensión de Red La Sidra Aldea Guaxinlaca	San Andrés	Lempira	2.149	21	126	

A continuación véase la ejecución histórica del Proyecto de Infraestructura Rural, II trimestre y acumulado 2018:

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto*/	Inicio-Fin	
Proyecto de Infraestructura Rural (BCIE)	BCIE-1736	357,285,000	2012-2019	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
II Trimestre 2018	61,865,866	61,865,866	3,364,058	5
Acumulado 2018	61,865,866	61,865,866	8,122,938	13
Acumulado Vida del Proyecto*/	357,285,000	357,285,000	287,732,432	81

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
 Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Ver Detalle de Ejecución Física en Anexo No. 5

4.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- SEFIN aprueba la creación del espacio presupuestario del Programa Modernización de Infraestructura Educativa (PROMINE), financiado según convenio de préstamo No. 2008-66178 del Organismo KFW balanceando con la disminución del espacio presupuestario del Proyecto de Infraestructura Rural (PIR) financiado con recursos del convenio de préstamo BCIE-1736.
- SEFIN recibió la segunda solicitud de ampliación de plazo mediante Oficio No. MD-FHIS-141/2018 para la continuidad del (PROMINE)-Fase III, hasta el 31 de agosto de 2019, dicha solicitud obedece para concluir proyectos que se encuentran en fase de ejecución, procesos de contratación para nuevos proyectos y Cierre Financiero del Programa en todos sus componentes, SEFIN dictamina una ampliación hasta el 31 de mayo de 2019.
- En referencia al nuevo proyecto financiado con fondos de donación de USAID convenio No. 522-0501-4 denominado Proyecto de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (ICS) se realiza modificación presupuestaria de incorporación de fondos por un monto de L.44,435,435.00 para el inicio de las actividades del proyecto.
- IDECOAS/FHIS solicita a la SEFIN en referencia al Proyecto de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (ICS) la incorporación de fondos de contraparte nacional, compromiso del Gobierno de Honduras para el año 2018 un monto de L.11,965,000.00 para dar inicio a la ejecución del proyecto.
- IDECOAS/FHIS solicita a la SEFIN primera ampliación de la fecha de cierre del proyecto pasando del 31 de agosto hasta el 31 de diciembre de 2018 del Proyecto Municipios Más Seguros (PMMS) convenio de crédito 5192-H, debido a los atrasos de implementación en diferentes aristas del proyecto, entre ellas la prevención situacional y las iniciativas de empleabilidad entre otras.
- IDECOAS/FHIS solicita a la SEFIN Traslado de Recursos entre Categorías de Inversión de la Cooperación Técnica no reembolsable ATN/NV-13535-HO-1 en el marco del Programa de Pueblos Indígenas y Afro hondureños y Cambio Climático, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de los productos según las especificaciones técnicas y cumplir las metas propuestas para el cierre del Proyecto.

Conclusiones

- Al II trimestre los proyectos ejecutados bajo el Instituto de Desarrollo Comunitario agua y Saneamiento alcanzan una baja ejecución del 13% que representa en términos monetarios L.70,424,319.00 con relación al presupuesto vigente de L.367,670,512.00, cabe mencionar que para el II trimestre se incorporó al Presupuesto General de la República el Proyecto de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana con un monto de L. 44,435,435.00 de donaciones externas y L.11,965,000.00 de fuente nacional, aporte del Gobierno de Honduras.

Recomendaciones

- Coordinar reuniones de seguimiento en conjunto con la UCP-FHIS, UPEG Organismos Financiadores y Dirección de Control y Seguimiento, Comité Ejecutor de Proyecto (CEP), en conjunto con la Secretaría de Finanzas con el motivo de apoyar a las Unidades ejecutoras de incrementar su ejecución física y financiera de los programas y proyectos.
- Coordinar gestiones para acelerar la ejecución física y financiera de los proyectos, tomar acciones correctivas, con el objetivo de cumplir en tiempo y forma en lo planificado en cada uno de los proyectos.

SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
Dirección General de Inversión Pública
ANEXO No. 06

Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al II Trimestre de 2018
Cifras en Lempiras

No. Proy	Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Devengado II Trimestre			Devengado Anual				Comprometido (Devengado + Comprometido)			
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Devengado / Vigente)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comprometido / Vigente)
7	0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social			8,186,743	298,490,032	306,676,775	20,151,743	347,518,769	367,670,512	1,452,014	46,181,592	47,633,606	3,323,140	67,101,179	70,424,319	19	7,027,440	67,644,533	74,671,973	20
1	PRODUCTIVIDAD Y OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO A TRAVÉS DE ENERGÍA RENOVABLE (PODER)	522-0470	26/06/2014 25/06/2019	-	20,820,000	20,820,000	-	20,820,000	20,820,000	-	12,498,132	12,498,132	-	12,498,132	12,498,132	60	-	12,498,132	12,498,132	60
	Total PRODUCTIVIDAD Y OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO A TRAVÉS DE ENERGÍA RENOVABLE (PODER)			-	20,820,000	20,820,000	-	20,820,000	20,820,000	-	12,498,132	12,498,132	-	12,498,132	12,498,132	60	-	12,498,132	12,498,132	60
2	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA	522-0501-4	19/10/2017 19/10/2021	-	-	-	11,965,000	44,435,435	56,400,435	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA			-	-	-	11,965,000	44,435,435	56,400,435	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)	2014 67 414 (KFW) / FHIS - SE / FHIS VIII No. 2008-66-178	10/07/2012 30/11/2020	5,493,250	19,167,600	24,660,850	5,493,250	19,167,600	24,660,850	720,951	2,612,811	3,333,761	1,610,105	2,612,811	4,222,915	17	4,594,105	2,612,811	7,206,915	29
				-	21,536,800	21,536,800	-	21,536,800	21,536,800	-	10,594,789	10,594,789	-	17,856,039	17,856,039	83	-	17,856,039	17,856,039	83
	Total PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)			5,493,250	40,704,400	46,197,650	5,493,250	40,704,400	46,197,650	720,951	13,207,599	13,928,550	1,610,105	20,468,850	22,078,954	48	4,594,105	20,468,850	25,062,954	54
4	PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO	ATN/NV-13535-HO-1	01/03/2013 31/08/2018	-	1,680,859	1,680,859	-	6,274,161	6,274,161	-	3,771,827	3,771,827	-	4,947,369	4,947,369	79	-	5,490,723	5,490,723	88
	Total PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO			-	1,680,859	1,680,859	-	6,274,161	6,274,161	-	3,771,827	3,771,827	-	4,947,369	4,947,369	79	-	5,490,723	5,490,723	88
5	PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS	KFW-CONVIVIR	06/12/2013 31/03/2019	2,693,493	125,068,907	127,762,400	2,693,493	125,068,907	127,762,400	731,063	9,082,785	9,813,848	1,713,035	10,522,843	12,235,878	10	2,433,335	10,522,843	12,956,178	10
	Total PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS			2,693,493	125,068,907	127,762,400	2,693,493	125,068,907	127,762,400	731,063	9,082,785	9,813,848	1,713,035	10,522,843	12,235,878	10	2,433,335	10,522,843	12,956,178	10
6	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)	BCIE-1736	24/10/2012 24/10/2019	-	61,865,866	61,865,866	-	61,865,866	61,865,866	-	3,364,058	3,364,058	-	8,122,938	8,122,938	13	-	8,122,938	8,122,938	13
	Total PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)			-	61,865,866	61,865,866	-	61,865,866	61,865,866	-	3,364,058	3,364,058	-	8,122,938	8,122,938	13	-	8,122,938	8,122,938	13
7	PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS	BM 5192-HN	15/03/2013 31/12/2018	-	48,350,000	48,350,000	-	48,350,000	48,350,000	-	4,257,191	4,257,191	-	10,541,047	10,541,047	22	-	10,541,047	10,541,047	22
	Total PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS			-	48,350,000	48,350,000	-	48,350,000	48,350,000	-	4,257,191	4,257,191	-	10,541,047	10,541,047	22	-	10,541,047	10,541,047	22

Fuente: SIAFI, 30/06/2018

SECRETARÍA DE FINANZAS

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
ANEXO No. 07
Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al II Trimestre, 2018

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	ANUAL			II Trimestre-18		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Fondo Hondureño de Inversión Social								
001 - PRODUCTIVIDAD Y OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO A TRAVÉS DE ENERGÍA RENOVABLE (PODER)	03 - Capacitación de los comités de ejecución de proyectos de energía renovable.	CAPACITACIÓN	6	2	33%	2	2	100%
001 - PROGRAMA DE PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMÁTICO	03 - Informes de cierre de proyectos.	INFORME	6	5	83%	0	0	0%
	04 - Elaboración de Informes de auditoría.	INFORME	2	1	50%	2	1	50%
	05 - Supervisión de proyectos de adaptación y mitigación al cambio climático.	INFORME	2	2	100%	0	0	0%
008 - PROGRAMA MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SU GESTIÓN LOCAL	01 - Capacitación a los comité ejecutores de proyectos (CEP'S) FASE III	CAPACITACIÓN	9	4	44%	2	2	100%
	02 - Capacitación a los comité ejecutores de proyectos (CEP'S) FASE IV	CAPACITACIÓN	1	0	0%	0	0	0%
	04 - Asistencia técnica para la ejecución del proyecto FASE III	ASISTENCIA TÉCNICA	1	0	0%	0	0	0%
	05 - Acciones para la mejora de la operatividad del Fondo Hondureño de Inversión Social FASE III.	ACTIVIDAD	1	0	0%	0	0	0%
	06 - Asistencia técnica para la ejecución del proyecto Fase IV.	ASISTENCIA TÉCNICA	1	0	0%	0	0	0%
	07 - Acciones para la mejora de la operatividad del Fondo Hondureño de Inversión Social FASE IV.	ACTIVIDAD	1	0	0%	0	0	0%
	008 - PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS	02 - Consultorías Contratadas con actores externos para la prevención de la violencia.	CONSULTORÍA	11	11	100%	0	0
03 - Consultorias Contratadas para la prevención de la violencia Social (Incluye Prevención de Violencia de Género, Arte, Resolución de Conflictos).		CONSULTORÍA	4	4	100%	0	2	0%
009 - PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS	04 - Supervisión de Infraestructura en espacios públicos.	SUPERVISION	15	3	20%	3	3	100%
	05 - Actividades para la formación y equipamiento a funcionarios coejecutores del programa (INJ, Alcaldías, FHIS)	ACTIVIDAD	16	0	0%	0	0	0%
	05 - Asistencia técnica para la ejecución de proyectos de infraestructura y social.	ASISTENCIA TÉCNICA	3	2	67%	2	1	50%
	06 - Actividades para la formación social para jóvenes en los lugares de incidencia del programa.	ACTIVIDAD	21	0	0%	21	0	0%
	06 - Equipamiento de obras de infraestructura.	EQUIPO	15	5	33%	3	0	0%
011 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA	08 - Asistencia técnica para la ejecución de proyectos de infraestructura y social. ICS-FHIS	ASISTENCIA TÉCNICA	10	0	0%	0	0	0%
047 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)	02 - Licitación de obra de proyectos de electrificación por extensión de red.	LICITACION	3	1	33%	1	1	100%
	02 - Licitación de obra de proyectos de rehabilitación de caminos.	LICITACION	4	0	0%	0	0	0%
	02 - Taller de Diseño, Operación Técnica y Mantenimiento de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales.	TALLER	1	0	0%	0	0	0%
	03 - Auditoría Concurrente de Estados Financieros Periodo 2017 para el Proyecto de Infraestructura Rural	AUDITORIA	1	0	0%	0	0	0%
	03 - Licitación de obra de proyectos de pavimentación.	LICITACION	1	0	0%	0	0	0%
	03 - Proyectos de saneamiento formulados	DISEÑO	2	2	100%	2	2	100%
	04 - Licitación de obra de proyectos de agua potable.	LICITACION	3	2	67%	2	2	100%
	04 - Proyectos de rehabilitación de caminos formulados.	DISEÑO	3	1	33%	1	1	100%
	05 - Proyectos de agua potable formulados	DISEÑO	28	7	25%	7	7	100%
	06 - Taller de Operación y Mantenimiento de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento.	TALLER	1	0	0%	0	0	0%

Fuente: SIAFI
