



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Gabinete de la Prevención

Al Segundo Trimestre 2018

Tegucigalpa, M.D.C.

Honduras, C.A.

Julio, 2018

I. GABINETE SECTORIAL DE LA PREVENCIÓN

Este Gabinete tiene entre sus objetivos contribuir a generar las condiciones para la gestión eficiente y eficaz del riesgo de desastres naturales, implementar estrategias que favorezcan el uso apropiado de las capacidades productivas agropecuarias, comerciales (agro negocios) para elevar los niveles de ingreso y mejorar la calidad de la estadística básica requerida por el país para facilitar la toma de decisiones públicas mejor informadas.

El Programa de Inversión Pública del Gabinete de la Prevención para el año 2018 está integrado por el Comité Permanente de Contingencias (COPECO) y el Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación, con un presupuesto vigente de L.84,963,672, cantidad que representa el 0.62% del total del Programa de Inversión Pública vigente (L13,788,167,952), la ejecución financiera de Gabinete al Segundo Trimestre es de L25,883,623, equivalente al 30% del presupuesto vigente, a nivel de compromiso alcanza un 43% (L. 36,822,951), respecto a su presupuesto vigente.

Los recursos asignados están destinados a la ejecución de dos (3) proyectos:

1. Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres (PGRD).
2. Proyecto Prevención y Mitigación del Riesgo de Desastres Naturales (MITIGAR).
3. Apoyo al Fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Honduras.

Gabinete de Prevención - Ejecución Financiera al II Trimestre de 2018

Cifras en Lempiras

No. Proy	Institución / Proyecto	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado II Trimestre	Devengado Anual				Comprometido (Devengado + Comprometido)			
					Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Devengado / Vigente)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comprometido / Vigente)
3	Gabinete de la Prevención	81,509,917	84,963,672	19,314,859	-	25,883,623	25,883,623	30	-	36,822,951	36,822,951	43
2	0041 - Comisión Permanente de Contingencias	81,509,917	81,509,917	19,314,859	-	25,883,623	25,883,623	32	-	36,822,951	36,822,951	45
1	PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	74,475,363	62,026,738	5,410,552	-	9,901,687	9,901,687	16	-	20,122,791	20,122,791	32
2	PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES (2152/BLHO)	7,034,554	19,483,179	13,904,307	-	15,981,936	15,981,936	82	-	16,700,160	16,700,160	86
1	0515 - Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación	-	3,453,755	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Apoyo al Fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Honduras.	-	3,453,755	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: SIAFI, 30/06/2018

II. PRINCIPALES METAS EJECUTADAS AL II TRIMESTRE 2018

A. COMITÉ PERMANENTE DE CONTINGENCIAS (COPECO)

1. Proyecto Prevención y Mitigación del Riesgo de Desastres Naturales (MITIGAR) (2152/BLHO), avances del trimestre:

Dicho proyecto tiene como objetivo la reducción de pérdidas de desastres naturales a través de inversiones de prevención y mitigación, así como el fortalecimiento de instituciones y capacidades para la gestión del riesgo de desastre naturales.

Las actividades más importantes que se han realizado por el Proyecto al primer trimestre de 2018 se detallan a continuación:

Construcción de Puente sobre el Rio Blanco, Aldea El Playón, Municipio de San Luis, Departamento de Santa Bárbara. El 17 de junio se firmó el contrato para la construcción del Puente sobre el Rio Blanco, Aldea El Playón, Municipio de San Luis, Departamento de Santa Bárbara, con la Empresa Suministros, Ingeniería, Tecnología S de R.L (SIT) y la supervisión de la obra esta fue adjudicada y su contrato se encuentra firmado con la empresa SEISA.

Durante el II trimestre 2018 se hicieron los trabajos de tensado de los cables de las vigas y se inyectaron con la lechada de cemento, se izaron las vigas, se fundieron la losa de rodadura, se montaron los muros de gaviones, se construyeron los terraplén a ambos lados, se eliminó el acceso provisional que comunicaban las dos comunidades, se construyeron los bordillos en vado existente y se fundieron los postes de concreto a cada 3 metros lineales como parte del barandal del puente y se colocó la tubería e hicieron los cabezales de la alcantarilla en el lado de Palma real.

El proyecto finalizó el 15 de junio de 2018 y se suscribió una Acta de Recepción Provisional tal como se establece en el contrato de construcción. Al finalizar el mes de junio de 2018 estaba pendiente la firma del Acta de Recepción Final de la obra.

2. Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres (PGRD) (IDA 5190-HN):

El avance físico obtenido al II Trimestre del 2018 ha sido de preparación en el desarrollo de procesos para lograr alcanzar todas las metas planificadas. En resumen, el proyecto ha alcanzado los objetivos en las siguientes áreas: A) Obras: 5 adjudicaciones y un proceso de licitación; B) Bienes: Equipo de cómputo para la UCP, C) Consultorías: Planes de adecuación en un 95% y Auditorias Sociales, D) Servicios de No Consultoría: Sitio Web creación y mantenimiento; y E) Capacitaciones: Taller de Reasentamiento, Taller de Manual del Constructor y Taller Regional de Alcaldes en un 100%.


3. Apoyo al Fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Honduras (ATN/OC-16177-HO)

Durante el trimestre se hicieron las gestiones necesarias para la incorporación de espacio fiscal de fondos de la Donación ATN/OC-116177-HO, por un monto de L3,453,755.00 proveniente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). LA ejecución de actividades del proyecto iniciara a partir del tercer trimestre 2018.

III. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN

Los recursos del presupuesto vigente del Gabinete de la Prevención están constituidos en un 96% (L81,509,917) por fondos externos de préstamo, de los cuales L.74,475,363 provienen del Banco Mundial y L.7,034,554 BID; la diferencia de 4% (L3,453,755) son fondos de donación del BID, ver el siguiente gráfico:

Financiamiento de la Inversión por Fuente de Financiamiento
Cifras en Lempiras

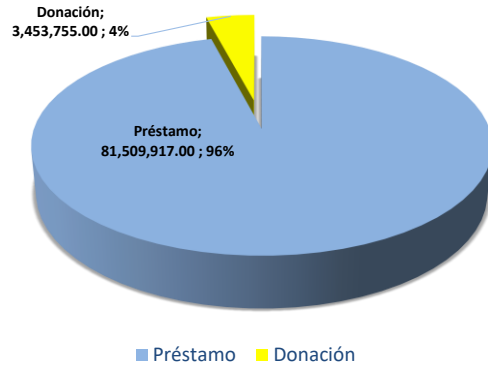

IV. PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL SECTOR

Área	Problemas	Acciones
Financiero	Desfases en el cierre financiero de los proyectos.	Reprogramación de actividades de cierre.
Técnico	Falta de experiencia en la preparación de bases de licitación en procesos de infraestructura.	Posibles alianzas con otras instituciones del Estado que tienen mayor experiencia en la preparación de documentos de licitación.
