



★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas

Dirección General de inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

**SECRETARÍA DE DESARROLLO
COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO
(SEDECOAS/FHIS)**

Al Tercer Trimestre, 2019

Octubre, 2019

IV. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

4.1 EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

La Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS)-Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) al III trimestre del 2019 a través de la ejecución de sus (7) siete proyectos enfocados en Agua y Saneamiento, Educación, Electrificación Rural, Productividad, Infraestructura Social e Infraestructura Rural, cuenta con un presupuesto vigente de inversión para el presente año de L.377,362,063 y la ejecución financiera del III trimestre asciende a L.43,437,926 lo que representa el 12% con relación al presupuesto vigente tal como se detalla en el Cuadro No. 5.


Cuadro No. 05
Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2019
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	461,171,413
Presupuesto Vigente	377,362,063
Devengado III Trimestre-19	43,437,926
% Ejecución (Devengado III Trim. / Vigente)	12%
Devengado Anual	140,984,852
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	37%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	184,006,498
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	49%

Fuente: SIAFI, 30/09/2019

4.2 PRINCIPALES PROYECTOS

Gráfico No.6
Presupuesto Vigente
Financiamiento de Inversión Por Organismo
Cifras en millones de lempiras

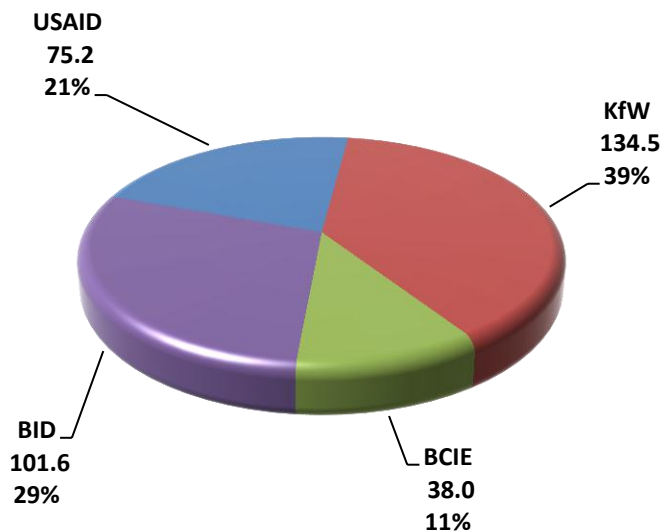

Con relación a las fuentes de financiamiento externas para la ejecución de los proyectos está distribuida por KfW Banco Alemán con 39%, BID con el 29%, USAID con el 21% y BCIE con el 11%.

Del total del financiamiento, el 41.4% corresponde a fondos de donaciones externas expresado en términos monetarios por un monto de L.144,616,271 y el 58.6% a recursos de crédito externo por un monto de L.204,618,072

La contraparte nacional corresponde a gastos operativos, a la fecha cuenta con un presupuesto vigente de L.28,127,720

La inversión del año 2019 se concentró en los siguientes proyectos:

1. Productividad y Oportunidad para el Desarrollo a través de Energía Renovable (PODER).
2. Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y su Gestión Local (PROMINE).
3. Proyecto Convivencia y Espacios Seguros para los Jóvenes en Honduras (CONVIVIR).
4. Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (ICS).
5. Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB).
6. Proyecto de Infraestructura Rural (PIR-BCIE).
7. Proyecto Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras (PIOH).

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros de los principales proyectos de acuerdo a su presupuesto vigente:

Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y de su Gestión Local (PROMINE) FASE III, IV

PROMINE tiene por objetivo general fortalecer la rectoría Sectorial en Infraestructura Educativa de la Secretaría de Educación y la gestión local participativa así como mejorar el acceso de los alumnos y alumnas de las comunidades pobres al Centro Educativo de calidad que operan de manera sostenible. De esa manera se pretende contribuir al aumento de la eficiencia y de la calidad del sistema educativo (pre-básico y básico).

A la fecha, se finalizó 4 proyectos con el cual se beneficiaron 1,933 personas (alumnos y personal administrativo) y se generaron 108 empleos, con lo cual se alcanzó ejecutar el 100% con respecto a lo planificado para el tercer trimestre, de acuerdo a la meta física de PROMINE en su Fase III.

Con relación a la Fase IV, actualmente se encuentran 11 centros educativos en ejecución, se espera que se beneficien 1,758 personas (alumnos y personal administrativo) y se espera generen 294 empleos, se alcanzó a ejecutar el 36% del monto contratado al final del tercer trimestre.

A continuación véase la ejecución histórica del Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y de su Gestión Local (PROMINE), III trimestre 2019:

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto*/	Inicio-Fin	
Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y de su Gestión Local (PROMINE)	SE/FHIS VIII No.2008-66-178 2014 67 414 (KFW) / FHIS - SE	1,345,320,646	2012-2020	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
III Trimestre 2019	123,157,419	83,157,419	12,890,938	16
Acumulado 2019	123,157,419	83,157,419	44,861,442	54
Acumulado Vida del Proyecto*/	1,345,320,646	1,345,320,646	879,904,815	65

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Ver Detalle de Ejecución Física en Anexo No. 5

Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB)

Consisten en contribuir a mejorar la convivencia ciudadana en Honduras a través de la mejora en la calidad de vida en barrios vulnerables y la reducción de la incidencia de delitos violentos. Los objetivos específicos son: (i) mejorar el hábitat de barrios urbanos vulnerables, aumentando el acceso a infraestructura de servicios básicos y de prevención para disminuir delitos de robos y violaciones sexuales; (ii) reducir los niveles de incidencia de homicidios y violencia intrafamiliar (VIF) en los municipios intervenidos mejorando los servicios de prevención y atención a víctimas de la violencia; y (iii) mejorar la efectividad policial en investigación criminal, a través del incremento de la proporción de casos de homicidio con agresor identificado e informe de investigación aceptado por el Ministerio Público.

Producto 1.1 Proyectos Integrales de Mejoramiento de Barrios (red de agua potable, alcantarillado, alumbrado público, equipamiento social y pavimentación), completados y siendo utilizados. Las principales actividades realizadas durante el tercer trimestre 2019:

- Se han diseñado al 100% 4 proyectos integrales de mejoramiento de barrio que incluye: mejora, reparación y/o construcción del sistema de agua potable, alcantarillado sanitario, drenaje pluvial y sistema vial para las colonias: Nueva España, Nueva Australia, Nueva Galilea y 25 de Enero.
- Se tiene la licencia ambiental para 4 proyectos integrales y la aprobación del SANAA y ENEE del diseño de sistemas de agua potable, alcantarillado sanitario y sistema eléctrico de 4 proyectos integrales de mejoramiento de barrio.
- Se ha publicado el documento base de licitación del proyecto: Proyecto de Integración Urbana, incluye: Ampliación, Mejoramiento y/o Construcción de sistemas de alcantarillado sanitario, agua potable, drenaje pluvial, mejoramiento vial y obras de mitigación de riesgos para 1071 predios en las siguientes colonias: Nueva Australia, Nueva Galilea, Nueva España y 25 de Enero; se espera formalizar el contrato de ejecución de obras para el mes de noviembre de 2019; la supervisión del proyecto ya está adjudicada e inicia la ejecución de su contrato en el mes de octubre de 2019 con la revisión de diseños de obras de infraestructura.
- Se ha contratado la ejecución y supervisión de proyecto de 6 obras de equipamiento social Reparación de Cancha Polideportiva, Colonia Nueva Galilea, Construcción de Centro Comunal, Colonia Nueva Galilea, ampliación de Jardín de Niños; Colonia Nueva España, ampliación Escuela David Corea Sánchez, Colonia Australia, construcción Centro Comunal, Colonia Australia, y Construcción Centro Comunal, Colonia 25 de Enero; se espera el inicio de las obras a finales del mes de octubre de 2019.

- Se está ejecutando la consultoría para el diseño de 5 proyectos integrales de mejoramiento de barrio: Proyecto de Integración Urbana Incluye: Ampliación, Mejoramiento y/o Construcción de Sistemas de Alcantarillado Sanitario, Agua Potable, Drenaje Pluvial, Red de Alumbrado Público, Mejoramiento Vial, Espacios de Recreación y Obras de Mitigación de Riesgos para 3035 predios , en las siguientes colonias: Montes de los Olivos, Nueva Jerusalén No. 2, Brisas del Mogote, Altos de la Quezada, La Huerta, Villas San Miguel, Brisas del Roble y Altos del Mirador; ya se ha realizado el informe de diagnóstico de barrios y se están realizando los diseños preliminares de los sistemas de agua potable, alcantarillado sanitario, drenaje pluvial, pavimentación, alumbrado público y equipamiento social.

Producto 1.2 Jóvenes de los barrios intervenidos capacitados:

- Se ha ejecutado el Programa de entrenamiento deportes olímpicos y Valores en las disciplinas de: Taekwondo, Tenis de Mesa, y Levantamiento de pesas, con una participación de 900 niños y jóvenes de las colonias beneficiarias.
- Se ha obtenido la asistencia de 1344 personas capacitadas en el programa de valores y emprendimiento en los siguientes temas:
 - Organización Comunitaria.
 - Normas Parlamentarias.
 - Derechos humanos, derechos del niño y adolescencia.
 - Derechos humanos, derechos de la mujer y adulto mayor.
 - Elaboración y envasado de encurtidos.
 - Elaboración de arroz chino.
 - Elaboración de piñatas.
 - Elaboración de tres leches.
 - Confeción de bisutería.

Producto 1.3 Mujeres de los barrios intervenidos capacitadas en emprendedurismo y empleo:

- 20 mujeres se capacitan a través del programa Empleando Futuros en las siguientes especialidades:
 - Operario Textil (3).
 - Panadería (4).
 - Auxiliar de Bodega (2).
 - Diseño Gráfico (5).
 - Operario de Restaurante (6).

A continuación véase la ejecución histórica del Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios, III trimestre 2019:

SECRETARÍA DE FINANZAS

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto*/	Inicio-Fin	
Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB)	BID/4518/BL-HO	458,703,700	2018-2023	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
III Trimestre 2019	117,716,409	101,558,797	4,029,538	4
Acumulado 2019	117,716,409	101,558,791	14,194,080	14
Acumulado Vida del Proyecto*/	458,703,700	458,703,700	29,153,869	6

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
 Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Ver Detalle de Ejecución Física en Anexo No. 5

Entre otros proyectos que están:

Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (USAID/ICS)

El propósito de esta actividad es incrementar la resiliencia de las comunidades y los individuos a la violencia y al crimen a través de mejoras en la infraestructura pública de pequeña escala. Esto incluye el mejoramiento en las estructuras comunitarias que mitiguen el crimen eliminando o disminuyendo el riesgo de oportunidad, creando espacios comunitarios más seguros, aumento en los servicios de calidad que protejan contra la violencia, mejoramiento en la participación de los sistemas de seguridad y rendimiento de justicia nacional y municipal, mejoramiento en la participación ciudadana con los sectores de justicia y seguridad.

Monto del Convenio es de \$14,637,541.74, de los cuales, fondos de donación de USAID: \$11,710,033.39; fondos de contraparte de Gobierno de Honduras: \$2,927,508.35 (efectivo: \$2,127,508.35 y especies: \$800,000.00).

A la fecha la ejecución acumulada al término del III trimestre corresponde al 14% que representan L.31,414,169.00 con relación al presupuesto vigente de L.60,781,669.00, actualmente finalizaron con cierre financiero 9 proyectos, 5 proyectos está por iniciar y 10 proyectos con % significativo de avance físico.

Proyecto de Infraestructura Rural (PIR-BCIE)

Proyecto que consiste en Mejorar el acceso cualitativo y sustancialmente de los servicios de infraestructura (carreteras, agua, saneamiento y energía eléctrica) para la población pobre de zonas rurales en el territorio nacional, desarrollando las capacidades y condiciones adecuadas de prestación de servicios de infraestructura rural y planificación a nivel local. Los fondos destinados para la ejecución de este Programa son de L. 283 millones aproximadamente.

La ejecución acumulada al III trimestre alcanzó el 48% con relación al presupuesto vigente, lo que en términos absolutos corresponde a L.18,218,153.00 de ejecución con relación L.37,967,252 al presupuesto vigente.

Actualmente se encuentran en ejecución tres (3) subproyectos de construcción de sistemas de agua potable mediante Microcaptación pluvial y saneamiento. En el sector de Caminos Rurales, se encuentran en ejecución dos (2) subproyectos: rehabilitación del tramo Calle Agua Zarca del municipio de Camasca; así como el tramo Azacualpa - Buena Vista del Municipio de Candelaria.

4.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- En atención al Oficio DM-FHIS-263/2019 mediante el cual el SEDECOAS/FHIS solicita a Secretaría de Finanzas (SEFIN) autorización de modificación presupuestaria con el fin de hacer un traslado entre objetos del gasto para poder incrementar el componente de materiales y equipo de computación para cumplir con el equipamiento programado del Proyecto denominado Programa de Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes en Honduras, en el marco del Convenio de Crédito Externo No. KfW 2011 65 364.
- Por otro lado, SEDECOAS/FHIS solicitó mediante Oficio No.MD-FHIS-262/2019 a la SEFIN creación de espacio presupuestario para el Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios Crédito. De igual manera, se atendió la solicitud de disminución de espacio presupuestario del Proyecto de Convivencia y Espacio Seguro para los Jóvenes de Honduras financiado con Crédito Externo, con el fin de ampliar el espacio presupuestario del Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios.
- De fecha 19 de agosto, mediante Oficio DM-FHIS-271/2019 se solicitó la autorización de la SEFIN para modificación presupuestaria con el fin de hacer un traslado entre objetos del gasto para poder continuar con las obras del Proyecto de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (ICS), en el marco del Convenio de Contraparte Nacional No.522-0501-4.
- Finalmente, se atendió solicitud del Oficio MD-FHIS-305/2019 de modificación presupuestaria con el fin de hacer un traslado entre asignaciones que corresponden al Proyecto de Infraestructura Rural (PIR), para la adquisición de equipo para computación, en el marco del Convenio de Crédito Externo BCIE-1736.

Conclusiones

- Al término del III trimestre 2019 la ejecución acumulada alcanzó el 37% con relación a su presupuesto vigente, lo que se traduce en términos absolutos a L.140,984,852 con relación al presupuesto vigente que asciende a L.377,362,063 asimismo, el compromiso acumulado asciende a L.184,006,498 lo que representa el 49% con relación al presupuesto vigente.

- Para este trimestre se ha realizado modificaciones presupuestarias entre proyectos de la misma institución con el fin de ir cubriendo las metas establecidas por la programación de acuerdo a los planes operativos ajustados de cada uno de los proyectos con mayores compromisos reales.

Recomendaciones

- Coordinar reuniones de seguimiento en conjunto con la UCP-FHIS, UPEG Organismos Financiadores y Dirección de Control y Seguimiento, Comité Ejecutor de Proyecto (CEP), en conjunto con la Secretaría de Finanzas a fin de apoyar a las Unidades ejecutoras de incrementar su ejecución física y financiera de los programas y proyectos.
- Coordinar gestiones para acelerar la ejecución física y financiera de los proyectos, tomar acciones correctivas, ceder espacio presupuestario a otros proyectos en vista de lo reprogramado con el objetivo de alcanzar las metas establecidas en los Planes Operativos Anuales.

SECRETARÍA DE FINANZAS

Anexo No. 05
SECRETARÍA DE FINANZAS
 Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE 2019
 Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Aprobado			Vigente			Devengado III Trimestre-19			Devengado Anual				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./ Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comp./ Vig.)
7	0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social			21,937,070	439,234,343	461,171,413	28,127,720	349,234,343	377,362,063	5,481,782	37,956,144	43,437,926	12,717,619	128,267,233	140,984,852	37%	12,717,619	171,288,879	184,006,498	49%
1	001 - PRODUCTIVIDAD Y OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO A TRAVÉS DE ENERGÍA RENOVABLE (PODER)	522-0470	26/06/2014 - 25/06/2019		35,409,703	35,409,703		30,909,703	30,909,703		3,750,953	3,750,953		15,568,441	15,568,441	50%		15,568,441	15,568,441	50%
	Total - 001 - PRODUCTIVIDAD Y OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO A TRAVÉS DE ENERGÍA RENOVABLE (PODER)				35,409,703	35,409,703		30,909,703	30,909,703		3,750,953	3,750,953		15,568,441	15,568,441	50%		15,568,441	15,568,441	50%
2	008 - PROGRAMA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SU GESTION LOCAL	2014 67 414 (KFW) / FHIS - SE	10/07/2012 - 31/07/2023	5,405,750	109,456,219	114,861,969	5,405,750	69,456,219	74,861,969	1,098,738	11,275,747	12,374,485	3,334,575	38,588,193	41,922,768	56%	3,334,575	38,588,193	41,922,768	56%
		SE/FHIS VIII No.2008-66-178	10/07/2012 - 31/07/2023		8,295,450	8,295,450		8,295,450	8,295,450		516,453	516,453		2,938,674	2,938,674	35%		2,938,674	2,938,674	35%
	Total - 008 - PROGRAMA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SU GESTION LOCAL			5,405,750	117,751,669	123,157,419	5,405,750	77,751,669	83,157,419	1,098,738	11,792,200	12,890,938	3,334,575	41,526,867	44,861,442	54%	3,334,575	41,526,867	44,861,442	54%
3	009 - PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS	KFW-CONVIVIR	06/12/2013 - 31/12/2023		62,796,573	62,796,573		56,796,573	56,796,573		5,330,628	5,330,628		16,712,224	16,712,224	29%		50,977,613	50,977,613	90%
	Total - 009 - PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS				62,796,573	62,796,573		56,796,573	56,796,573		5,330,628	5,330,628		16,712,224	16,712,224	29%		50,977,613	50,977,613	90%
4	011 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA	522-0501-4	19/10/2017 - 19/10/2021	16,531,320	89,750,349	106,281,669	16,531,320	44,250,349	60,781,669	4,366,700	6,729,919	11,096,619	9,366,700	22,047,469	31,414,169	52%	9,366,700	22,047,469	31,414,169	52%
	Total - 011 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA			16,531,320	89,750,349	106,281,669	16,531,320	44,250,349	60,781,669	4,366,700	6,729,919	11,096,619	9,366,700	22,047,469	31,414,169	52%	9,366,700	22,047,469	31,414,169	52%
5	012 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS	ATN/OC-17135-HO	01/10/2018 - 01/10/2023		117,716,409	117,716,409		101,558,797	101,558,797		4,029,538	4,029,538		14,194,080	14,194,080	14%		22,950,337	22,950,337	23%
		BID/4518/BL-HO	01/10/2018 - 01/10/2023		-	-		-	-		-	-		-	-	0%		-	-	0%
	Total - 012 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS				117,716,409	117,716,409		101,558,797	101,558,797		4,029,538	4,029,538		14,194,080	14,194,080	14%		22,950,337	22,950,337	23%
6	047 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)	BCIE-1736	24/10/2012 - 31/03/2020		15,809,640	15,809,640		37,967,252	37,967,252		6,322,906	6,322,906		18,218,153	18,218,153	48%		18,218,153	18,218,153	48%
	Total - 047 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)				15,809,640	15,809,640		37,967,252	37,967,252		6,322,906	6,322,906		18,218,153	18,218,153	48%		18,218,153	18,218,153	48%
7	060 - ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS	522-0502 C d E No.9	31/10/2018 - 30/04/2021	-	-	-	6,190,650	-	6,190,650	16,344	-	16,344	16,344	-	16,344	0%	16,344	-	16,344	0%
	Total - 060 - ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS			-	-	-	6,190,650	-	6,190,650	16,344	-	16,344	16,344	-	16,344	0%	16,344	-	16,344	0%

Fuente: SIAFI, 30/09/2019

SECRETARÍA DE FINANZAS

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No. 06

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al III Trimestre, 2019

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre			
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución	
22 - Fondo Hondureño de Inversión Social									
001 - PRODUCTIVIDAD Y OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO A TRAVÉS DE ENERGÍA RENOVABLE (PODER)	03 - Supervisión de Infraestructura productivos de Energía Renovable. PODER	129 - SUPERVISION	15	4	27%	3	-	0%	
	04 - Capacitación de los miembros de comités de ejecución de proyectos PEC de energía renovable. PODER	1009 - CAPACITACIÓN	10	4	40%	-	-	0%	
008 - PROGRAMA MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SU GESTION LOCAL	01 - Capacitación a los miembros de comité ejecutores de proyectos (CEP'S) FASE III. PROMINE	1009 - CAPACITACIÓN	4	3	75%	-	-	0%	
	02 - Capacitación a los miembros de comité ejecutores de proyectos (CEP'S) FASE IV. PROMINE	1009 - CAPACITACIÓN	1	-	0%	-	-	0%	
	03 - Asistencia técnica para la ejecución del proyecto FASE IV. PROMINE	992 - ASISTENCIA TÉCNICA	1	-	0%	-	-	0%	
	04 - Acciones para el fortalecimiento institucional del Fondo Hondureño de Inversión Social FASE IV. PROMINE	131 - ACTIVIDAD	1	-	0%	-	-	0%	
	06 - Acciones para la mejora de la operatividad del Fondo Hondureño de Inversión Social FASE III. PROMINE	131 - ACTIVIDAD	1	-	0%	-	-	0%	
009 - PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS	02 - Actividades para la formación al fortalecimiento institucional y equipamiento a funcionarios coejecutores del programa (INJ, Alcaldías, FHIS). CONVIVIR	131 - ACTIVIDAD	4	-	0%	4	-	0%	
	03 - Talleres para la formación de habilidades sociales y laborales para jóvenes en los lugares de incidencia del programa. CONVIVIR	156 - TALLER	7	4	57%	-	-	0%	
	06 - Supervisión de Infraestructura de recuperación de espacios públicos. CONVIVIR	129 - SUPERVISION	12	-	0%	3	-	0%	
	07 - Asistencia técnica de la Consultoría Internacional para la ejecución de proyectos de infraestructura y social. CONVIVIR	992 - ASISTENCIA TÉCNICA	4	2	50%	1	-	0%	
	08 - Compra de Equipamiento para las obras de infraestructura del programa. CONVIVIR	392 - EQUIPO	12	2	17%	1	-	0%	
011 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA	03 - Conformación y capacitación de los miembros de Comités Ejecutores de Proyectos CEP y líderes comunitarios. ICS	1009 - CAPACITACIÓN	12	8	67%	2	-	0%	
	03 - Supervisión de Proyectos. ICS	129 - SUPERVISION	12	8	67%	2	-	0%	
	04 - Implementación, diseño y formulación de proyectos. ICS	291 - DISEÑO	12	8	67%	2	-	0%	
012 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS	02 - Diseños de Obras de Infraestructura de servicios básicos Formulados. PCCMB	291 - DISEÑO	5	-	0%	-	-	0%	
	03 - Supervisión de Proyectos integrales de servicios básicos en barrios. PCCMB	129 - SUPERVISION	1	-	0%	-	-	0%	
	05 - Consultorías Equipo de Promoción Social ETEC. PCCMB	369 - CONSULTORÍA	17	-	0%	-	-	0%	
	06 - Eventos de Integración y Recreativos. PCCMB	39 - EVENTO	2	1	50%	-	-	0%	
	07 - Convenio para Fortalecimientos a Microemprendimientos. PCCMB	26 - CONVENIO	1	-	0%	-	-	0%	
	08 - Actividades Deportivas del Programa Deportivo y Formación de Valores. PCCMB	131 - ACTIVIDAD	1	-	0%	-	-	0%	
	09 - Talleres de Emprendedurismo y Valores. PCCMB	156 - TALLER	8	11	138%	3	-	0%	
	10 - Talleres de Emprendedurismo y Empleabilidad	156 - TALLER	1	-	0%	-	-	0%	
	11 - Estudio de mercado Laboral. ATN-PCCMB	547 - ESTUDIO	1	-	0%	-	-	0%	
	047 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)	02 - Diseño de Proyectos de electrificación rural PIR	291 - DISEÑO	1	1	100%	-	-	0%
		02 - Diseños de Proyectos de Alcantarillado Sanitario y Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales. PIR	291 - DISEÑO	1	1	100%	-	-	0%
03 - Diseños de Proyectos de Agua Potable. PIR		291 - DISEÑO	17	17	100%	-	-	0%	
03 - Diseños de Proyectos de rehabilitación de caminos formulados, PIR		291 - DISEÑO	9	9	100%	-	-	0%	
03 - Prefactibilidades de proyectos de saneamiento. PIR		149 - INFORME	1	1	100%	-	-	0%	
04 - Diseño de Proyectos de pavimento municipal formulados. PIR		291 - DISEÑO	6	6	100%	-	-	0%	
04 - Pre-factibilidades de proyectos de agua potable. PIR		149 - INFORME	1	1	100%	-	-	0%	
04 - Taller de Operación y Mantenimiento de los sistemas de Agua y Saneamiento		156 - TALLER	1	-	0%	-	-	0%	
05 - Auditoria Concurrente de Estados Financieros Periodo 2018 para el Proyecto de Infraestructura Rural PIR		149 - INFORME	1	-	0%	1	-	0%	
05 - Taller Diseño de Plantas de Tratamiento de aguas residuales		156 - TALLER	1	-	0%	1	-	0%	
06 - Taller de sostenibilidad de la Infraestructura de los Sistemas de Agua y Saneamiento		156 - TALLER	1	-	0%	-	-	0%	
060 - ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS	08 - Acta de recepcion de proyectos entregados PIOH	991 - ACTA	1	-	0%	-	-	0%	
	09 - Supervisión de Proyectos. PIOH	129 - SUPERVISION	1	-	0%	-	-	0%	

Fuente: SIAFI

Ejecución al III Trimestre 2019

Secretaría de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento
