



★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas

Dirección General de inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

**SECRETARÍA DE DESARROLLO
COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO
(SEDECOAS/FHIS)**

Al Cuarto Trimestre, 2019

Enero, 2020

IV. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

4.1 EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

La Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS)-Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) al IV trimestre del 2019 a través de la ejecución (8) ocho proyectos enfocados en Agua y Saneamiento, Educación, Electrificación Rural, Productividad, Infraestructura Social e Infraestructura Rural, cuenta con un presupuesto vigente de inversión para el presente año de L.332,984,686 y la ejecución financiera del IV trimestre asciende a L.320,298,923 lo que representa el 96% con relación al presupuesto vigente tal como se detalla en el Cuadro No. 5.


Cuadro No. 05
Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del 2019
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto ^P
Presupuesto Aprobado	461,171,413
Presupuesto Vigente	332,984,696
Devengado IV Trimestre-19	179,314,071
% Ejecución (Devengado IV Trim. / Vigente)	54%
Devengado Anual	320,298,923
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	96%

Fuente: SIAFI, 30/12/2019

^P Cifras Preliminares

4.2 PRINCIPALES PROYECTOS

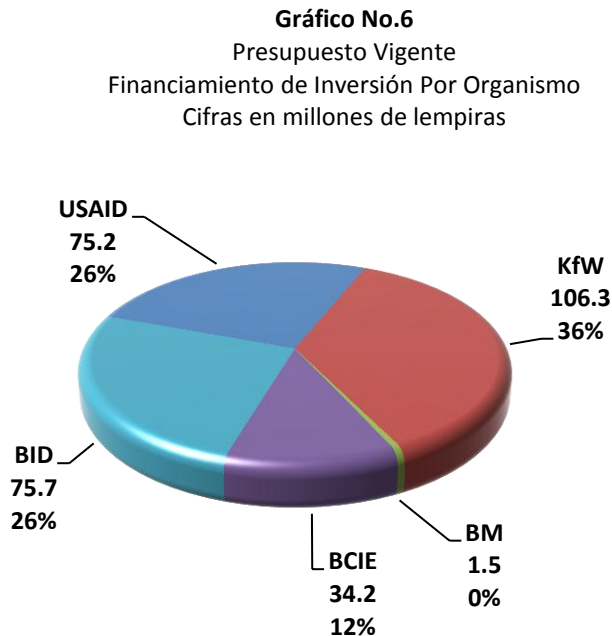

Con relación a la ejecución de las fuentes de financiamiento externas para la ejecución de los proyectos está distribuida por KfW Banco Alemán con 36%, BID con el 26%, USAID con el 26%, BM con el 0.1% y BCIE con el 12%.

Del total del financiamiento, el 43.4% corresponde a fondos de donaciones externas expresado en términos monetarios por un monto de L.144,664,406 y el 48.1% a recursos de crédito externo por un monto de L.160,192,570

La contraparte nacional corresponde a gastos operativos, a la fecha cuenta con un presupuesto vigente de L.28,127,720.

La inversión del año 2019 se concentró en los siguientes proyectos:

1. Productividad y Oportunidad para el Desarrollo a través de Energía Renovable (PODER).
2. Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y su Gestión Local (PROMINE).
3. Proyecto Convivencia y Espacios Seguros para los Jóvenes en Honduras (CONVIVIR).
4. Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (ICS).
5. Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB).
6. Proyecto de Infraestructura Rural (PIR-BCIE).
7. Proyecto Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras (PIOH).
8. Proyecto Municipios Más Seguros (PMMS).

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros de los principales proyectos de acuerdo a su presupuesto vigente:

Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y de su Gestión Local (PROMINE) FASE III, IV

PROMINE tiene por objetivo general fortalecer la rectoría Sectorial en Infraestructura Educativa de la Secretaría de Educación y la gestión local participativa así como mejorar el acceso de los alumnos y alumnas de las comunidades pobres al Centro Educativo de calidad que operan de manera sostenible. De esa manera se pretende contribuir al aumento de la eficiencia y de la calidad del sistema educativo (pre-básico y básico).

Se finalizaron 4 proyectos con el cual se beneficiaron 1,921 personas (alumnos y personal administrativo) y se generaron 107 empleos, con lo cual se alcanzó ejecutar el 100% con respecto a lo planificado para el cuarto trimestre, de acuerdo a la meta física de PROMINE en su Fase III, con un monto ejecutado de L. 68,722,956.11 cerrando esta fase el 31 de diciembre de 2019.

Con relación a la Fase IV, actualmente se ejecutaron obras en 11 centros educativos en ejecución, se beneficiaron 1,758 personas (alumnos y personal administrativo) y se generó 294 empleos, alcanzando una ejecución del 98.39% del monto contratado al final del cuarto trimestre.

A continuación véase la ejecución histórica del Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y de su Gestión Local (PROMINE), IV trimestre 2019:

SECRETARÍA DE FINANZAS

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto*/	Inicio-Fin	
Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y de su Gestión Local (PROMINE)	SE/FHIS VIII No.2008-66-178 2014 67 414 (KFW) / FHIS - SE	1,345,320,646	2012-2020	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
IV Trimestre 2019	123,157,419	81,069,633	34,901,434	43
Acumulado 2019	123,157,419	81,069,633	79,762,876	98
Acumulado Vida del Proyecto*/	1,345,320,646	1,345,320,646	914,806,249	68

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Ver Detalle de Ejecución Física en Anexo No. 5

Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB)

Consisten en contribuir a mejorar la convivencia ciudadana en Honduras a través de la mejora en la calidad de vida en barrios vulnerables y la reducción de la incidencia de delitos violentos. Los objetivos específicos son: (i) mejorar el hábitat de barrios urbanos vulnerables, aumentando el acceso a infraestructura de servicios básicos y de prevención para disminuir delitos de robos y violaciones sexuales; (ii) reducir los niveles de incidencia de homicidios y violencia intrafamiliar (VIF) en los municipios intervenidos mejorando los servicios de prevención y atención a víctimas de la violencia; y (iii) mejorar la efectividad policial en investigación criminal, a través del incremento de la proporción de casos de homicidio con agresor identificado e informe de investigación aceptado por el Ministerio Público.

A continuación, véase los avances por productos al 31 de diciembre de 2019:

Proyectos Integrales de Mejoramiento de Barrios.

- Se han diseñado al 100% 4 proyectos integrales de mejoramiento de barrio que incluye: mejora, reparación y/o construcción del sistema de agua potable, alcantarillado sanitario, drenaje pluvial y sistema vial para las colonias: Nueva España, Nueva Australia, Nueva Galilea y 25 de Enero.
- Se tiene la licencia ambiental para 4 proyectos integrales y la aprobación del SANAA y ENEE del diseño de sistemas de agua potable, alcantarillado sanitario y sistema eléctrico de 4 proyectos integrales de mejoramiento de barrio.
- Se contrató la ejecución y supervisión del Proyecto de Integración Urbana, incluye: Ampliación, Mejoramiento y/o Construcción de sistemas de alcantarillado sanitario, agua potable, drenaje pluvial, mejoramiento vial y obras de mitigación de riesgos para 1071 predios en las siguientes colonias: Nueva Australia, Nueva Galilea, Nueva España y 25 de Enero.
- Se ha contratado la ejecución y supervisión de proyecto de 6 obras de equipamiento social Reparación de Cancha Polideportiva, Colonia Nueva Galilea, Construcción de Centro Comunal, Colonia Nueva Galilea, ampliación de Jardín de Niños; Colonia Nueva España, ampliación Escuela David Corea Sánchez, Colonia Australia, construcción Centro Comunal, Colonia Australia, y Construcción Centro Comunal, Colonia 25 de Enero; se iniciaron las obras a finales del mes de octubre de 2019.
- Se está ejecutando la consultoría para el diseño de 5 proyectos integrales de mejoramiento de barrio: Proyecto de Integración Urbana Incluye: Ampliación,

SECRETARÍA DE FINANZAS

Mejoramiento y/o Construcción de Sistemas de Alcantarillado Sanitario, Agua Potable, Drenaje Pluvial, Red de Alumbrado Público, Mejoramiento Vial, Espacios de Recreación y Obras de Mitigación de Riesgos para 3035 predios , en las siguientes colonias: Montes de los Olivos, Nueva Jerusalén No. 2, Brisas del Mogote, Altos de la Quezada, La Huerta, Villas San Miguel, Brisas del Roble y Altos del Mirador; ya se ha realizado el informe de diagnóstico de barrios y se están realizando los diseños preliminares de los sistemas de agua potable, alcantarillado sanitario, drenaje pluvial, pavimentación, alumbrado público y equipamiento social.

Programa de Deportes y Valores:

- Se ha ejecutado el Programa de entrenamiento deportes olímpicos y Valores en las disciplinas de: Taekwondo, Tenis de Mesa, y Levantamiento de pesas, con una participación de 900 niños y jóvenes de las colonias beneficiarias.
- Se ha obtenido la asistencia de 2015 personas capacitadas en el programa de valores y emprendimiento en los siguientes temas: Organización Comunitaria, Normas Parlamentarias, Derechos humanos, derechos del niño y adolescencia, Derechos humanos, derechos de la mujer y adulto mayor, Prevención en Drogas, Higiene laboral y comunitaria, Elaboración y envasado de encurtidos, Elaboración de arroz chino, Elaboración de piñatas, Elaboración de tres leches, Confección de bisutería, Elaboración de adornos navideños, Elaboración de alimentos para navidad, Elaboración de tortillas de harina, Elaboración de empanadas de jamón y queso.
- Para la ejecución de actividades de capacitación se adjudicó la compra de un bus mediano.

Capacitaciones en empleabilidad.

- 20 mujeres se capacitan a través del programa Empleando Futuros en las siguientes especialidades:
- Operario Textil (3).
- Panadería (4).
- Auxiliar de Bodega (2).
- Diseño Gráfico (5).
- Operario de Restaurante (6).

A continuación véase la ejecución histórica del Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios, IV trimestre 2019:

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto*/	Inicio-Fin	
Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB)	BID/4518/BL-HO	458,703,700	2018-2023	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
IV Trimestre 2019	117,716,409	101,558,797	61,533,448	61
Acumulado 2019	117,716,409	84,562,822	75,727,528	90
Acumulado Vida del Proyecto*/	458,703,700	458,703,700	82,688,223	18

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Ver Detalle de Ejecución Física en Anexo No. 5

Entre otros proyectos ejecutados por la institución están:

Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (USAID/ICS)

El propósito de esta actividad es incrementar la resiliencia de las comunidades y los individuos a la violencia y al crimen a través de mejoras en la infraestructura pública de pequeña escala. Esto incluye el mejoramiento en las estructuras comunitarias que mitiguen el crimen eliminando o disminuyendo el riesgo de oportunidad, creando espacios comunitarios más seguros, aumento en los servicios de calidad que protejan contra la violencia, mejoramiento en la participación de los sistemas de seguridad y rendimiento de justicia nacional y municipal, mejoramiento en la participación ciudadana con los sectores de justicia y seguridad.

Monto del Convenio es de \$14,637,541.74, de los cuales, fondos de donación de USAID: \$11,710,033.39; fondos de contraparte de Gobierno de Honduras: \$2,927,508.35 (efectivo: \$2,127,508.35 y especies: \$800,000.00).

A la fecha la ejecución acumulada al IV trimestre corresponde al 100% con relación al presupuesto vigente de L.60,781,669.00, al cierre del año 2019 se cerraron financieramente 11 proyectos y 13 proyectos continuaran su ejecución para la gestión fiscal 2020.

Proyecto de Infraestructura Rural (PIR-BCIE)

Proyecto que consiste en Mejorar el acceso cualitativo y sustancialmente de los servicios de infraestructura (carreteras, agua, saneamiento y energía eléctrica) para la población pobre de zonas rurales en el territorio nacional, desarrollando las capacidades y condiciones adecuadas de prestación de servicios de infraestructura rural y planificación a nivel local. Los fondos destinados para la ejecución de este Programa son de L. 283 millones aproximadamente.

La ejecución acumulada al IV trimestre alcanzó el 99.8% con relación al presupuesto vigente, lo que en términos absolutos corresponde a L. 34,213,605.05 de ejecución con relación L. 34,274,786.00 al presupuesto vigente.

Actualmente se encuentran en ejecución tres (3) subproyectos de construcción de sistemas de agua potable mediante Microcaptación pluvial y saneamiento con un 65% de avance físico. En el sector de Caminos Rurales, se encuentran en ejecución dos (2) subproyectos: rehabilitación del tramo Calle Agua Zarca del municipio de Camasca; así como el tramo Azacualpa - Buena Vista del Municipio de Candelaria.

4.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- En atención al Oficio No.MD-FHIS-350/2019 de fecha 16 de octubre de 2019 mediante el cual la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento de Honduras/ Fondo Hondureño de Inversión Social (SEDECOAS/FHIS) solicita a la Secretaría de Finanzas (SEFIN) autorización de modificación presupuestaria con el fin de hacer un traslado entre asignaciones que corresponden al Proyecto denominado, Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar (PROMINE), en el marco de los convenios de Crédito Externo No. BMZ 2008-66-178 de la Fase III y Donación Externa No. 2014-67-414 de Fase IV.

- Mediante Oficio No.SE-SEDECOAS-FHIS-356/2019 de fecha 21 de Octubre del presente año, el SEDECOAS/FHIS solicita a la SEFIN autorización de modificación presupuestaria con el fin de hacer un traslado entre objetos del gasto en asignaciones correspondientes al Proyecto denominado Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB), Convenio de Crédito Externo BID 4518/BL-HO bajo el componente 1: Mejoramiento del Hábitat de Barrios Urbanos Vulnerables.
- De fecha 21 de Noviembre de 2019, mediante Oficio No.SE-SEDECOAS-FHIS-396/2019, el SEDECOAS/FHIS solicita a la SEFIN autorización de modificación presupuestaria a fin de trasladar recursos entre objetos del gasto para cumplir con los compromisos de pagos adquiridos durante la gestión 2019, correspondientes al Proyecto denominado al Programa Actividad Piloto de Infraestructura en Occidente de Honduras (PIOH), como parte del convenio de Contraparte Nacional 522-0502 Carta de Ejecución No.9.
- Mediante Oficio No. SE-SEDECOAS-FHIS-394/2019 de fecha 18 de noviembre 2019, el SEDECOAS/FHIS solicita a la SEFIN autorización de disminución de espacio presupuestario del Proyecto Convivencia y Espacios Seguros para los Jóvenes de Honduras a fin de poder crear el espacio presupuestario para el proyecto Municipios Más Seguros necesario para efectuar el pago de compromisos de auditorías de cierre, asimismo se solicita la creación de espacio presupuestario para el Proyecto Municipios Más Seguros en el marco del Convenio de Préstamo No.5192-HO.
- Mediante el Oficio No. SE-SEDECOAS-FHIS-404/2019 de fecha 27 de noviembre de 2019 el SEDECOAS/FHIS solicita a la SEFIN traslado entre el mismo Objeto del Gasto 54200 "Transferencia y Donaciones a Asociaciones sin Fines de Lucro sin Beneficiario" para trasladarlo al Beneficiario de Transferencia Patronato Pro-Mejoramiento de la Colonia Australia; Proyecto "Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB), en el marco del Convenio de Crédito Externo BID 4518/BL-HO.
- En atención al Oficio No.SE-SEDECOAS-FHIS-406/2019 de fecha 27 de noviembre del 2019, mediante el cual el SEDECOAS/FHIS solicita a la SEFIN autorización de modificación de traslado entre objetos del gasto correspondiente a asignaciones del Proyecto Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes en Honduras para poder cumplir con los compromisos de pago por concepto de supervisión del Sub-proyecto Casa de la Cultura de la Ciudad de Siguatepeque.

Conclusiones

- Al termino del IV trimestre de 2019 la ejecución de los programas y proyectos de alcanzaron una ejecución acumulada del 96%, relativo a L 320,298,923.40 con relación al presupuesto vigente.
- Para este trimestre se ha realizado modificaciones presupuestarias entre proyectos de la misma institución con el fin de ir cubriendo las metas establecidas por la programación de acuerdo a los planes operativos ajustados de cada uno de los proyectos con mayores compromisos reales.

Recomendaciones

- Ante las ampliaciones de cierre de los proyectos, se recomienda realizar una ruta crítica, ya que con ella se puede tomar medidas correctivas en tiempo y forma sin ningún problema de retraso, en vista que esto incurre en costos adicionales al Gobierno de Honduras.
- Coordinar gestiones para acelerar la ejecución física y financiera de los proyectos, tomar acciones correctivas, ceder espacio presupuestario a otros proyectos en vista de lo reprogramado con el objetivo de alcanzar las metas establecidas en los Planes Operativos Anuales institucionales.

SECRETARÍA DE FINANZAS

ANEXO No. 04
SECRETARÍA DE FINANZAS
 Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE 2019
 Cifras en Lempiras

No. Proy.	Gabinete / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Aprobado			Vigente			Devengado IV Trimestre-19			Devengado Anual			% Ejecución (Dev / Vig.)
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	
8	0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social			21,937,070	439,234,343	461,171,413	28,127,720	304,856,976	332,984,696	14,033,776	165,280,295	179,314,071	26,751,395	293,547,528	320,298,923	96%
1	001 - PRODUCTIVIDAD Y OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO A TRAVÉS DE ENERGÍA RENOVABLE (PODER)	522-0470	26/06/2014 - 25/06/2019	-	35,409,703	35,409,703	-	30,909,703	30,909,703	-	15,341,262	15,341,262	-	30,909,703	30,909,703	100%
	Total 001 - PRODUCTIVIDAD Y OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO A TRAVÉS DE ENERGÍA RENOVABLE (PODER)			-	35,409,703	35,409,703	-	30,909,703	30,909,703	-	15,341,262	15,341,262	-	30,909,703	30,909,703	100%
2	008 - PROGRAMA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SU GESTION LOCAL	2014 67 414 (KFW) / FHIS - SE	10/07/2012 - 31/07/2023	5,405,750	109,456,219	114,861,969	5,405,750	69,504,354	74,910,104	899,993	30,804,087	31,704,080	4,234,568	69,392,280	73,626,848	98%
		SE/FHIS VIII No.2008-66-178	10/07/2012 - 31/07/2023	-	8,295,450	8,295,450	-	6,159,529	6,159,529	-	3,197,354	3,197,354	-	6,136,028	6,136,028	100%
	Total 008 - PROGRAMA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SU GESTION LOCAL			5,405,750	117,751,669	123,157,419	5,405,750	75,663,883	81,069,633	899,993	34,001,441	34,901,434	4,234,568	75,528,308	79,762,876	98%
3	008 - PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS	BM 5192-HN		-	-	-	-	1,533,789	1,533,789	-	1,512,403	1,512,403	-	1,512,403	1,512,403	99%
	Total 008 - PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS			-	-	-	-	1,533,789	1,533,789	-	1,512,403	1,512,403	-	1,512,403	1,512,403	99%
4	009 - PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS	KFW- CONVIVIR	06/12/2013 - 31/12/2023	-	62,796,573	62,796,573	-	33,661,644	33,661,644	-	14,693,408	14,693,408	-	31,405,632	31,405,632	93%
	Total 009 - PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS			-	62,796,573	62,796,573	-	33,661,644	33,661,644	-	14,693,408	14,693,408	-	31,405,632	31,405,632	93%
5	011 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA	522-0501-4	19/10/2017 - 19/10/2021	16,531,320	89,750,349	106,281,669	16,531,320	44,250,349	60,781,669	7,164,620	22,202,880	29,367,500	16,531,320	44,250,349	60,781,669	100%
	Total 011 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA			16,531,320	89,750,349	106,281,669	16,531,320	44,250,349	60,781,669	7,164,620	22,202,880	29,367,500	16,531,320	44,250,349	60,781,669	100%
6	012 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS	ATN/OC-17135-HO	01/10/2018 - 01/10/2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
		BID/4518/BL-HO	01/10/2018 - 01/10/2023	-	117,716,409	117,716,409	-	84,562,822	84,562,822	-	61,533,448	61,533,448	-	75,727,528	75,727,528	90%
	Total 012 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS			-	117,716,409	117,716,409	-	84,562,822	84,562,822	-	61,533,448	61,533,448	-	75,727,528	75,727,528	90%
7	047 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)	BCIE-1736		-	15,809,640	15,809,640	-	34,274,786	34,274,786	-	15,995,452	15,995,452	-	34,213,605	34,213,605	100%
	Total 047 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)			-	15,809,640	15,809,640	-	34,274,786	34,274,786	-	15,995,452	15,995,452	-	34,213,605	34,213,605	100%
8	060 - ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS	522-0502 Cd E No.9	31/10/2018 - 30/04/2021	-	-	-	6,190,650	-	6,190,650	5,969,163	-	5,969,163	5,985,507	-	5,985,507	97%
	Total 060 - ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS			-	-	-	6,190,650	-	6,190,650	5,969,163	-	5,969,163	5,985,507	-	5,985,507	97%

SECRETARÍA DE FINANZAS

ANEXO No. 05
SECRETARÍA DE FINANZAS
Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al IV Trimestre, 2019

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			IV Trimestre		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Fondo Hondureño de Inversión Social								
001 - PRODUCTIVIDAD Y OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO A TRAVÉS DE ENERGÍA RENOVABLE (PODER)	03 - Supervisión de Infraestructura productivos de Energía Renovable. PODER	129 - SUPERVISION	15	14	93%	7	7	100%
	04 - Capacitación de los miembros de comités de ejecución de proyectos PEC de energía renovable. PODER	1009 - CAPACITACIÓN	10	10	100%	6	6	100%
008 - PROGRAMA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SU GESTION LOCAL	01 - Capacitación a los miembros de comité ejecutores de proyectos (CEP'S) FASE III. PROMINE	1009 - CAPACITACIÓN	4	6	150%	1	1	100%
	02 - Capacitación a los miembros de comité ejecutores de proyectos (CEP'S) FASE IV. PROMINE	1009 - CAPACITACIÓN	1	-	0%	1	-	0%
	03 - Asistencia técnica para la ejecución del proyecto FASE IV. PROMINE	992 - ASISTENCIA TÉCNICA	1	1	100%	1	1	100%
	04 - Acciones para el fortalecimiento institucional del Fondo Hondureño de Inversión Social FASE IV. PROMINE	131 - ACTIVIDAD	1	1	100%	1	1	100%
	06 - Acciones para la mejora de la operatividad del Fondo Hondureño de Inversión Social FASE III. PROMINE	131 - ACTIVIDAD	1	1	100%	1	1	100%
009 - PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS	02 - Actividades para la formación al fortalecimiento institucional y equipamiento a funcionarios coejecutores del programa (INJ, Alcaldías, FHIS). CONVIVIR	131 - ACTIVIDAD	4	-	0%	-	-	0%
	03 - Talleres para la formación de habilidades sociales y laborales para jóvenes en los lugares de incidencia del programa. CONVIVIR	156 - TALLER	7	4	57%	-	-	0%
	06 - Supervisión de Infraestructura de recuperación de espacios públicos. CONVIVIR	129 - SUPERVISION	12	5	42%	8	5	63%
	07 - Asistencia técnica de la Consultoría Internacional para la ejecución de proyectos de infraestructura y social. CONVIVIR	992 - ASISTENCIA TÉCNICA	4	4	100%	1	1	100%
	08 - Compra de Equipamiento para las obras de infraestructura del programa. CONVIVIR	392 - EQUIPO	12	2	17%	11	-	0%
011 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA	03 - Conformación y capacitación de los miembros de Comités Ejecutores de Proyectos CEP y líderes comunitarios. ICS	1009 - CAPACITACIÓN	12	14	117%	4	4	100%
	03 - Supervisión de Proyectos. ICS	129 - SUPERVISION	12	14	117%	4	4	100%
	04 - Implementación, diseño y formulación de proyectos. ICS	291 - DISEÑO	12	14	117%	4	4	100%
012 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS	02 - Diseños de Obras de Infraestructura de servicios básicos Formulados. PCCMB	291 - DISEÑO	5	-	0%	5	-	0%
	03 - Supervisión de Proyectos integrales de servicios básicos en barrios. PCCMB	129 - SUPERVISION	1	-	0%	1	-	0%
	05 - Consultorías Equipo de Promoción Social ETEC. PCCMB	369 - CONSULTORÍA	17	16	94%	17	16	94%
	06 - Eventos de Integración y Recreativos. PCCMB	39 - EVENTO	2	3	150%	2	2	100%
	07 - Convenio para Fortalecimientos a Microemprendimientos. PCCMB	26 - CONVENIO	1	-	0%	1	-	0%
	08 - Actividades Deportivas del Programa Deportivo y Formación de Valores. PCCMB	131 - ACTIVIDAD	1	1	100%	1	1	100%
	09 - Talleres de Emprendedurismo y Valores. PCCMB	156 - TALLER	8	21	263%	3	-	0%
	10 - Talleres de Emprendedurismo y Empleabilidad	156 - TALLER	1	-	0%	1	-	0%
	11 - Estudio de mercado Laboral. ATN-PCCMB	547 - ESTUDIO	1	-	0%	1	-	0%

SECRETARÍA DE FINANZAS

ANEXO No. 05
SECRETARÍA DE FINANZAS
Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al IV Trimestre, 2019

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			IV Trimestre		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Fondo Hondureño de Inversión Social								
047 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)	02 - Diseño de Proyectos de electrificación rural PIR	291 - DISEÑO	1	1	100%	-	-	0%
	02 - Diseños de Proyectos de Alcantarillado Sanitario y Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales. PIR	291 - DISEÑO	1	1	100%	-	-	0%
	03 - Diseños de Proyectos de Agua Potable. PIR	291 - DISEÑO	17	18	106%	-	1	0%
	03 - Diseños de Proyectos de rehabilitación de caminos formulados. PIR	291 - DISEÑO	9	9	100%	-	-	0%
	03 - Prefactibilidades de proyectos de saneamiento. PIR	149 - INFORME	1	1	100%	-	-	0%
	04 - Diseño de Proyectos de pavimento municipal formulados. PIR	291 - DISEÑO	6	6	100%	-	-	0%
	04 - Pre-factibilidades de proyectos de agua potable. PIR	149 - INFORME	1	1	100%	-	-	0%
	04 - Taller de Operación y Mantenimiento de los sistemas de Agua y Saneamiento	156 - TALLER	1	-	0%	-	-	0%
	05 - Auditoria Concurrente de Estados Financieros Periodo 2018 para el Proyecto de Infraestructura Rural PIR	149 - INFORME	1	1	100%	-	-	0%
	05 - Taller Diseño de Plantas de Tratamiento de aguas residuales	156 - TALLER	1	1	100%	-	-	0%
	06 - Taller de sostenibilidad de la Infraestructura de los Sistemas de Agua y Saneamiento	156 - TALLER	1	-	0%	-	-	0%
	08 - Diagnóstico y Análisis Municipal del Sector Agua y Saneamiento	149 - INFORME	1	1	100%	-	-	0%
060 - ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS	08 - Acta de recepción de proyectos entregados PIOH	991 - ACTA	1	-	0%	1	-	0%
	09 - Supervisión de Proyectos. PIOH	129 - SUPERVISION	1	3	300%	1	3	300%

Fuente: SIAFI
