



★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas

Dirección General de inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

**SECRETARÍA DE DESARROLLO
COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO
(SEDECOAS/FHIS)**

Al Primer Trimestre, 2020

Abril, 2020

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A.

IV. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA


4.1 EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

La Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS)-Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) cuya finalidad será la de promover el mejoramiento de las condiciones de vida de los grupos sociales marginados en el área rural y urbana, mediante el otorgamiento de financiamientos para programas y proyectos de desarrollo social o económico, con el propósito de aumentar su productividad, sus niveles de empleo y de ingresos y de contribuir a la satisfacción de sus necesidades básicas.

Al primer trimestre del 2020 cuenta con un presupuesto vigente de inversión para el presente año de **L 504,159,571** y la ejecución financiera del asciende a **L 33,117,374** lo que representa el 7% con relación al presupuesto vigente ajustado tal como se detalla en el Cuadro No. 5.

Dicha ejecución se llevó a cabo a través de (6) seis proyectos enfocados en Agua y Saneamiento, Electrificación Rural y Caminos Rurales, Infraestructura Social, Infraestructura Escolar, Fortalecimiento de Capacidades para Jóvenes, Recuperación de Espacios Públicos y Mejora de la Infraestructura Básica. Ver Detalle de Ejecución Física en Anexo No. 5

4.2 PRINCIPALES PROYECTOS

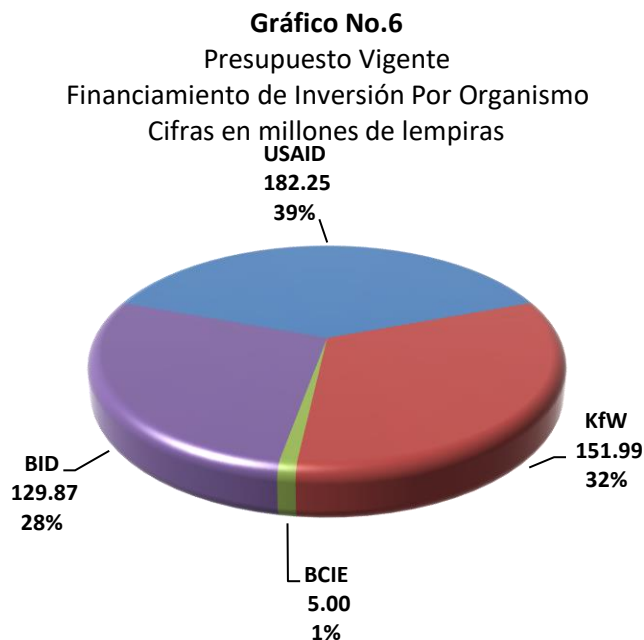

Con relación a la ejecución de las fuentes de financiamiento externas para la ejecución de los proyectos está distribuida por KfW Banco Alemán con 32%, BID con el 28%, USAID con el 39% y BCIE con el 1%.

Del total del financiamiento, el 63% corresponde a fondos de donaciones externas expresado en términos monetarios por un monto de L.318,928,991 y el 30% a recursos de crédito externo por un monto de L.150,188,491, la contraparte nacional corresponde a gastos operativos con un presupuesto vigente de L.35,042,089 equivalente a 7%.

Cuadro No. 05
Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del 2020
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	504,159,571
Presupuesto Vigente Ajustado	504,159,571
Devengado I Trimestre-2020	33,117,374
% Ejecución (Devengado I Trim-2020 / Vigente Ajustado)	7%
Devengado Anual	33,117,374
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente Ajustado)	7%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	49,461,786
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente Ajustado)	10%

Fuente: SIAFI, 31/03/2020

La inversión en el primer trimestre del año 2020 se concentró en los siguientes proyectos:

1. Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y su Gestión Local (PROMINE).
2. Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB).
3. Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (ICS).
4. Proyecto de Infraestructura Rural (PIR-BCIE).
5. Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras (PIOH).
6. Proyecto Convivencia y Espacios Seguros para los Jóvenes en Honduras (CONVIVIR).

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros de los principales proyectos de acuerdo a su presupuesto vigente:

Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y de su Gestión Local (PROMINE) FASE III, IV

PROMINE tiene por objetivo general fortalecer la rectoría Sectorial en Infraestructura Educativa de la Secretaría de Educación y la gestión local participativa, así como mejorar el acceso de los alumnos y alumnas de las comunidades pobres al Centro Educativo de calidad que operan de manera sostenible. De esa manera se pretende contribuir al aumento de la eficiencia y de la calidad del sistema educativo (pre-básico y básico).

Con relación a la Fase IV, actualmente no se ha finalizado la construcción de 11 sub-proyectos que estaban en ejecución debido a la suspensión en campo por la emergencia suscitada por el COVID-19 (Coronavirus), sin embargo, a principios del trimestre se comenzaron actividades de capacitación en el Departamento de Gracias a Dios, asimismo, se finalizó la formulación de seis sub-proyectos de infraestructura en este mismo Departamento, así como desembolsos a los Comités Ejecutores de los Proyectos (CEP).

A continuación, véase la ejecución histórica del Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y de su Gestión Local (PROMINE), primer trimestre 2020:

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto*/	Inicio-Fin	
Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y de su Gestión Local (PROMINE)	SE/FHIS VIII No.2008-66-178 2014 67 414 (KFW) / FHIS - SE	1,345,320,646	2012-2020	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
I Trimestre 2020	135,907,777	135,907,777	22,649,504	17
Acumulado Vida del Proyecto*/	1,345,320,646	1,345,320,646	937,455,753	70

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Ver Detalle de Ejecución Física en Anexo No. 5

Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB)

Consisten en contribuir a mejorar la convivencia ciudadana en Honduras a través de la mejora en la calidad de vida en barrios vulnerables y la reducción de la incidencia de delitos violentos. Los objetivos específicos son: (i) mejorar el hábitat de barrios urbanos vulnerables, aumentando el acceso a infraestructura de servicios básicos y de prevención para disminuir delitos de robos y violaciones sexuales; (ii) reducir los niveles de incidencia de homicidios y violencia intrafamiliar (VIF) en los municipios intervenidos mejorando los servicios de prevención y atención a víctimas de la violencia; y (iii) mejorar la efectividad policial en investigación criminal, a través del incremento de la proporción de casos de homicidio con agresor identificado e informe de investigación aceptado por el Ministerio Público.

A continuación, véase los avances por productos al 31 de marzo de 2020:

Proyectos Integrales de Mejoramiento de Barrios.

- Los Proyectos de integración urbana el cual incluye: Ampliación, Mejoramiento y/o Construcción de sistemas de alcantarillado sanitario, agua potable, drenaje pluvial, mejoramiento vial y obras de mitigación de riesgos, colonias 25 de enero, Australia, Nueva España, Nueva Galilea, a la fecha, las actividades preliminares: entrega de sitio, construcción de bodegas, levantamientos topográficos, toma de muestras para estudios de suelos (calicatas) y capacitación de personal en la aplicación de medidas del PGAS (Plan de Gestión Ambiental y Social) y seguridad en barrios socialmente vulnerables al mes de marzo de 2020 se tiene la instalación de servicios básicos de agua potable, alcantarillado sanitario, drenaje pluvial y pavimentación de calles en sectores de los barrios beneficiados; el porcentaje de avance físico de este producto es de un 14% y tiene un avance financiero de 40% en relación al monto contratado que es de L 128,592,322.09.
- El proyecto de equipamiento social el cual incluye, Reparación de Cancha Polideportiva, Colonia Nueva Galilea, Construcción de Centro Comunal, Colonia Nueva Galilea, Ampliación de Jardín de Niños; Colonia Nueva España, Ampliación Escuela David Corea Sánchez, Colonia Australia, Construcción Centro Comunal, Colonia Australia y Construcción Centro Comunal, Colonia 25 de enero, al mes de marzo de 2020 se tiene un avance físico promedio del 48% y un avance financiero del 28% en relación al monto contratado que es de L 10,967,584.51.
- El Programa de Deportes y Valores consiste en la enseñanza de disciplinas deportivas implementando los valores olímpicos; al trimestre se imparten seis (6) disciplinas olímpicas: taekwondo, levantamiento de Pesas, tenis de Mesa, atletismo, balonmano y lucha olímpica; también, se atiende niños y/o jóvenes con discapacidad y mujeres que practican el baile de Zumba. En el programa participan 1,337 niños y jóvenes en 16 secciones deportivas de 2 horas, impartidas de lunes a viernes.

SECRETARÍA DE FINANZAS

A continuación, véase la ejecución histórica del Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios, I trimestre 2020:

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto*/	Inicio-Fin	
Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB)	BID/4518/BL-HO	458,703,700	2018-2023	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
I Trimestre 2020	134,871,251	129,871,251	4,118,983	3
Acumulado Vida del Proyecto*/	458,703,700	458,703,700	86,807,206	19

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Ver Detalle de Ejecución Física en Anexo No. 5

Entre otros proyectos ejecutados por la institución están:

Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (USAID/ICS)

El propósito de esta actividad es incrementar la resiliencia de las comunidades y los individuos a la violencia y al crimen a través de mejoras en la infraestructura pública de pequeña escala. Esto incluye el mejoramiento en las estructuras comunitarias que mitiguen el crimen eliminando o disminuyendo el riesgo de oportunidad, creando espacios comunitarios más seguros, aumento en los servicios de calidad que protejan contra la violencia, mejoramiento en la participación de los sistemas de seguridad y rendimiento de justicia nacional y municipal, mejoramiento en la participación ciudadana con los sectores de justicia y seguridad.

Monto del Convenio es de \$14,637,541.74, de los cuales, fondos de donación de USAID: \$11,710,033.39; fondos de contraparte de Gobierno de Honduras: \$2,927,508.35 (efectivo: \$2,127,508.35 y especies: \$800,000.00).

Por el estado de emergencia a nivel nacional emitido mediante Decreto, se suspendió la ejecución de proyectos, lo que conllevó a una reprogramación de las actividades. A la fecha se está trabajando en el desarrollo de un plan de contingencia con el organismo financiador con el objetivo de hacer frente a los desafíos en esta etapa de emergencia.

Proyecto de Infraestructura Rural (PIR-BCIE)

Proyecto que consiste en Mejorar el acceso cualitativo y sustancialmente de los servicios de infraestructura (carreteras, agua, saneamiento y energía eléctrica) para la población pobre de zonas rurales en el territorio nacional, desarrollando las capacidades y condiciones adecuadas de prestación de servicios de infraestructura rural y planificación a nivel local. Los fondos destinados para la ejecución de este Programa son de L. 283 millones aproximadamente.

Se solicitó a lo interno del SEDECOAS/FHIS una modificación de aprovechamiento de espacio presupuestario, disminuyendo así el espacio del Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB) y creando espacio para PIR, con el fin de mantener el equilibrio presupuestario a nivel institucional, por la cantidad de L5,000,000.

Actualmente se encuentra en etapa de cierre y en ejecución tres (3) sub-proyectos de construcción de sistemas de agua potable mediante Microcaptación pluvial y saneamiento con un 99% de avance físico. En el sector de Caminos Rurales, se encuentran en ejecución de un (1) sub-proyecto: Pavimentación del Casco Urbano del Municipio de Magdalena.

4.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- De fecha 19 de febrero de 2020 mediante Oficio No. SE-SEDECOAS-FHIS-060/2020 la Secretaría de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento solicita a la Secretaría de Finanzas ampliación de plazo para la liquidación de los Fondos Rotatorios del contrato de préstamo BCIE-1736 y cierre definitivo del proyecto hasta el 15 de junio de 2020.
- La Secretaría de Finanzas (SEFIN) aprueba la presente modificación, en atención a lo solicitado por el FHIS mediante Oficio SE-SEDECOAS-FHIS-009/2020 a fin de aprovechar espacio presupuestario, disminuyendo el Programa Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios financiado a través de Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que permita la creación del espacio presupuestario del Proyecto de Infraestructura Rural financiado por Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Conclusiones

- Al término del I trimestre de 2020 la ejecución de los programas y proyectos de alcanzaron una ejecución acumulada del 7%, relativo a **L 33,117,373.99** con relación al presupuesto vigente.
- Para este trimestre se ha realizado modificaciones presupuestarias entre proyectos de la misma institución con el fin de ir cubriendo las metas establecidas por la programación de acuerdo a los planes operativos ajustados de cada uno de los proyectos con mayores compromisos reales.

Recomendaciones

- Ante las ampliaciones de cierre de los proyectos, se recomienda realizar una ruta crítica, ya que con ella se puede tomar medidas correctivas en tiempo y forma sin ningún problema de retraso, en vista que esto incurre en costos adicionales al Gobierno de Honduras.
- Coordinar gestiones para acelerar la ejecución física y financiera de los proyectos, tomar acciones correctivas, ceder espacio presupuestario a otros proyectos en vista de lo reprogramado con el objetivo de alcanzar las metas establecidas en los Planes Operativos Anuales institucionales.
- Se recomienda actualizar la ejecución de metas físicas en el Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI).
- Los proyectos deberán tomar en consideración el ordenamiento de las finanzas públicas y sujetarse a fin de procurar una gestión eficiente en el uso de los recursos públicos según lo dispuesto en la Circular DGIP-003-2020.

SECRETARÍA DE FINANZAS

ANEXO No. 04

SECRETARÍA DE FINANZAS

Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE 2020

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Gabinete / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente Ajustado			Devengado Anual				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./ Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comp./ Vig.)
6	0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social			35,042,089	469,117,482	504,159,571	35,042,089	469,117,482	504,159,571	5,743,406	27,373,968	33,117,374	7	5,743,406	43,718,381	49,461,786	10
1	ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS	522-0502 Cd E No.9	31/10/2018 - 30/04/2021		65,583,096	65,583,096		65,583,096	65,583,096		-	-	0		-	-	0
	Total - ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS				65,583,096	65,583,096		65,583,096	65,583,096		-	-	0		-	-	0
2	PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS	ATN/OC-17135-HO	01/10/2018 -		4,889,760	4,889,760		4,889,760	4,889,760		-	-	0		-	-	0
		BID/4518/BL-HO	01/10/2023		129,981,491	129,981,491		124,981,491	124,981,491		4,118,983	4,118,983	3		20,463,395	20,463,395	16
	Total - PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS				134,871,251	134,871,251	-	129,871,251	129,871,251	-	4,118,983	4,118,983	3	-	20,463,395	20,463,395	16
3	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA	522-0501-4	19/10/2017 - 19/10/2021	28,651,501	116,670,790	145,322,291	28,651,501	116,670,790	145,322,291	5,461,620	-	5,461,620	4	5,461,620	-	5,461,620	4
	Total - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA			28,651,501	116,670,790	145,322,291	28,651,501	116,670,790	145,322,291	5,461,620	-	5,461,620	4	5,461,620	-	5,461,620	4
4	PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)	2014 67 414 (KFW) / FHIS - SE	10/07/2012 -	2,824,000	9,995,100	12,819,100	2,824,000	9,995,100	12,819,100	-	-	-	0	-	-	-	0
		SE/FHIS VIII No.2008-66-178	31/07/2023		1,298,432	121,790,245	123,088,677	1,298,432	121,790,245	123,088,677	281,785	22,367,719	22,649,504	18	281,785	22,367,719	22,649,504
	Total - PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)			4,122,432	131,785,345	135,907,777	4,122,432	131,785,345	135,907,777	281,785	22,367,719	22,649,504	17	281,785	22,367,719	22,649,504	17
5	PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS	KFW-CONVIVIR	06/12/2013 - 31/12/2023	2,268,156	20,207,000	22,475,156	2,268,156	20,207,000	22,475,156	-	887,266	887,266	4	-	887,266	887,266	4
	Total - PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS			2,268,156	20,207,000	22,475,156	2,268,156	20,207,000	22,475,156	-	887,266	887,266	4	-	887,266	887,266	4
6	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)	BCIE-1736	24/10/2012 - 15/03/2020		-	-		5,000,000	5,000,000		-	-	0		-	-	0
	Total - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)				-	-		5,000,000	5,000,000		-	-	0		-	-	0

Fuente: SIAFI, 31/03/2020

SECRETARÍA DE FINANZAS

ANEXO No. 05

SECRETARÍA DE FINANZAS

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al I Trimestre, 2020

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			I Trimestre 2020		
			Prog.	Ejecución	% Ejecución	Prog.	Ejecución	% Ejecución
22 - Fondo Hondureño de Inversión Social								
ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS	03 - Conformación y capacitación de los miembros de Comités Ejecutores de Proyectos CEP y líderes comunitarios. PIOH	1009 - CAPACITACIÓN	12	-	0%	5	-	0%
	08 - Acta de recepción de proyectos entregados PIOH	991 - ACTA	10	-	0%	5	-	0%
	11 - Supervisión de Proyectos. PIOH	129 - SUPERVISION	12	-	0%	5	-	0%
	13 - Informe con enfoque de género PIOH	149 - INFORME	4	-	0%	1	-	0%
PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS	02 - Diseños de Obras de Infraestructura de servicios básicos Formulados. PCCMB	291 - DISEÑO	1	-	0%	-	-	0%
	03 - Supervisión de Proyectos integrales de servicios básicos en barrios. PCCMB	129 - SUPERVISION	1	-	0%	-	-	0%
	05 - Asistencia Técnica Equipo de Promoción Social ETEC. PCCMB	992 - ASISTENCIA TÉCNICA	10	-	0%	-	-	0%
	05 - Informe con enfoque de género PCCMB	149 - INFORME	4	-	0%	1	-	0%
	06 - Eventos de Integración y Recreativos. PCCMB	39 - EVENTO	2	-	0%	-	-	0%
	07 - Convenio para Fortalecimientos a Microemprendimientos. PCCMB	26 - CONVENIO	1	-	0%	-	-	0%
	08 - Actividades Deportivas del Programa Deportivo y Formación de Valores. PCCMB	131 - ACTIVIDAD	16	-	0%	-	-	0%
	09 - Talleres de Emprendedurismo y Valores. PCCMB	156 - TALLER	27	-	0%	-	-	0%
	10 - Plan de capacitación de emprendimiento laboral. ATN-PCCMB	264 - PLAN	1	-	0%	-	-	0%
	11 - Taller para el fortalecimiento de Comité de Emergencia Local CODEL en barrios ATN-PCCMB	156 - TALLER	1	-	0%	-	-	0%
	12 - Taller de reforestación de la cuenca del río Guacerique ATN-PCCMB	156 - TALLER	1	-	0%	-	-	0%
	13 - Talleres de Emprendedurismo y Empleabilidad ATN-PCCMB	156 - TALLER	1	-	0%	-	-	0%
	14 - Plan estratégico de sostenibilidad y apoyo para la inserción laboral ATN-PCCMB	1083 - PLAN ESTRATÉGICO	1	-	0%	-	-	0%
	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA	04 - Conformación y capacitación de los miembros de Comités Ejecutores de Proyectos CEP y líderes comunitarios. ICS	1009 - CAPACITACIÓN	25	-	0%	5	-
04 - Supervisión de Proyectos. ICS		129 - SUPERVISION	25	-	0%	3	-	0%
06 - Implementación, diseño y formulación de proyectos. ICS		291 - DISEÑO	25	-	0%	5	-	0%
07 - Informe con enfoque de género ICS		149 - INFORME	4	-	0%	1	-	0%

SECRETARÍA DE FINANZAS

ANEXO No. 05

SECRETARÍA DE FINANZAS

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al I Trimestre, 2020

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			I Trimestre 2020		
			Prog.	Ejecución	% Ejecución	Prog.	Ejecución	% Ejecución
22 - Fondo Hondureño de Inversión Social								
PROGRAMA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SU GESTION LOCAL	01 - Capacitación a los miembros de comité ejecutores de proyectos (CEP'S) FASE IV PROMINE	1009 - CAPACITACIÓN	9	-	0%	-	-	0%
	02 - Capacitación a los miembros de comité ejecutores de proyectos (CEP'S) FASE V PROMINE	1009 - CAPACITACIÓN	1	-	0%	-	-	0%
	06 - Asistencia técnica para la ejecución del proyecto FASE IV. PROMINE	992 - ASISTENCIA TÉCNICA	1	-	0%	-	-	0%
	07 - Acciones para el fortalecimiento institucional del Fondo Hondureño de Inversión Social FASE IV. PROMINE	131 - ACTIVIDAD	1	-	0%	-	-	0%
	09 - Asistencia técnica para la ejecución del proyecto FASE V PROMINE	992 - ASISTENCIA TÉCNICA	1	-	0%	-	-	0%
	10 - Acciones para el fortalecimiento institucional del Fondo Hondureño de Inversión Social FASE V. PROMINE	131 - ACTIVIDAD	1	-	0%	-	-	0%
	12 - Informe con enfoque de genero PROMINE	149 - INFORME	4	-	0%	1	-	0%
PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS	02 - Actividades para la formación al fortalecimiento institucional y equipamiento a funcionarios coejecutores del programa (INJ, Alcaldías, FHIS). CONVIVIR	131 - ACTIVIDAD	1	-	0%	-	-	0%
	04 - Talleres para la formación de habilidades sociales y laborales para jóvenes en los lugares de incidencia del programa. CONVIVIR	156 - TALLER	2	-	0%	-	-	0%
	05 - Supervisión de Infraestructura de recuperación de espacios públicos. CONVIVIR	129 - SUPERVISION	2	-	0%	-	-	0%
	08 - Asistencia técnica de la Consultoría Internacional para la ejecución de proyectos de infraestructura y social. CONVIVIR	992 - ASISTENCIA TÉCNICA	1	-	0%	-	-	0%
	09 - Compra de Equipamiento para las obras de infraestructura del programa. CONVIVIR	392 - EQUIPO	1	-	0%	-	-	0%
	10 - Informe con enfoque de genero CONVIVIR	149 - INFORME	4	-	0%	1	-	0%
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)	03 - Diseño de Proyectos de Saneamiento (Alcantarillado Sanitario y Plantas de Tratamiento). PIR	291 - DISEÑO	3	-	0%	3	-	0%
	07 - Diseños de Proyectos de Agua Potable. PIR	291 - DISEÑO	11	-	0%	11	-	0%

Fuente: SIAFI, 31/03/2020
