



★ ★ ★ ★ ★  
SECRETARÍA DE FINANZAS

**Secretaría de Finanzas**

**Dirección General de Inversiones Públicas**

# Informe de Avance Físico y Financiero

**SECRETARÍA DE DESARROLLO  
COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO  
(SEDECOAS/FHIS)**

Primer Trimestre, 2021

Abril, 2021

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A.

## IV. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

### 4.1 EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA


La Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS)-Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) cuya finalidad es la de promover el mejoramiento de las condiciones de vida de los grupos sociales marginados en el área rural y urbana, mediante el otorgamiento de financiamientos para programas y proyectos de desarrollo social o económico, con el propósito de aumentar su productividad, sus niveles de empleo y de ingresos y de contribuir a la satisfacción de sus necesidades básicas.

Cuadro No. 05  
Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del 2021  
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	1,482,326,322
Presupuesto Vigente	1,368,187,906
Devengado I Trimestre-2021	32,529,807
<b>% Ejecución (Devengado I Trim-2021 / Vigente)</b>	<b>2%</b>
Devengado Anual	32,529,807
<b>% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)</b>	<b>2%</b>
Comprometido (Devengado + Compromiso)	76,915,361
<b>% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)</b>	<b>6%</b>

Fuente: SIAFI, 31/03/2021

Gráfica No.6  
Presupuesto Vigente  
Financiamiento por Organismo Financiero  
Cifras en millones de Lempiras

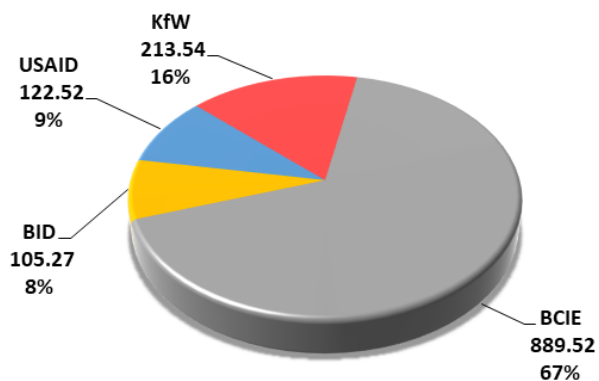

Al primer trimestre del año 2021 la institución reportó un presupuesto vigente de inversión pública de **L 1,368,187,906** y la ejecución presupuestaria del trimestre asciende a un monto de **L 32,529,807** lo que representa el (2%) con relación al presupuesto vigente, de igual forma la ejecución más el compromiso asciende a **L 76,915,361** (6%) tal como se detalla en el Cuadro No. 5.

Del total del financiamiento, el 74.2% corresponde a fondos de crédito externo expresado en términos monetarios por un monto de L 1,014,866,178. y el 23.1% a recursos de donaciones externas por un monto de L 315,976,295. La contraparte nacional corresponde a gastos operativos con un presupuesto vigente de L 37,345,433. equivalente a 2.7%.

Dicha ejecución se llevó a cabo a través de (6) seis proyectos enfocados en Agua y Saneamiento, Electrificación Rural y Caminos Rurales, Infraestructura Social, Infraestructura Escolar, Fortalecimiento de Capacidades para Jóvenes, Recuperación de Espacios Públicos y Mejora de la Infraestructura Básica. Ver Detalle de Ejecución Financiera en Anexo No. 4

Con relación al presupuesto vigente con recursos externos para la ejecución de los proyectos ésta se distribuye por; BCIE con el 67%, KfW Banco Alemán con 16%, USAID con el 9% y BID con el 8%.

## 4.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión en el primer trimestre del año 2021 se concentró en los siguientes proyectos:

1. Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y su Gestión Local (PROMINE).
2. Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB).
3. Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (ICS).
4. Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras (MIFE).
5. Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras (PIOH).
6. Proyecto Convivencia y Espacios Seguros para los Jóvenes en Honduras (CONVIVIR).

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros de los principales proyectos de acuerdo a su presupuesto vigente:

### **Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y de su Gestión Local (PROMINE) FASE IV**

PROMINE tiene por objetivo general fortalecer la rectoría Sectorial en Infraestructura Educativa de la Secretaría de Educación y la gestión local participativa, así como mejorar el acceso de los alumnos y alumnas de las comunidades pobres al Centro Educativo de calidad que operan de manera sostenible. De esa manera se pretende contribuir al aumento de la eficiencia y de la calidad del sistema educativo (prebásico y básico).

Con relación a la Fase IV, actualmente se han considerado 44 proyectos de los cuales, 34 se encuentran formulados (de estos 27 están contratados y el resto en proceso de contratación), 7 en formulación, 2 no factibles y 1 pendiente de formulación.

Los principales avances en este trimestre se describen a continuación:

- Se completó la modificación interna y traslado de recursos al PROMINE en su fase IV al fin de poder iniciar la ejecución financiera de la misma.
- Se logró ejecutar más de lo estimado para el primer trimestre.
- Se completó la contratación de la Consultoría de Apoyo para la Implementación del PROMINE fase V, dando como esto inicio a dicha fase.
- Se finalizó uno de los dos proyectos que se encontraban planificados, en vista que se tuvo un desfase en la ejecución para el segundo proyecto y será finalizado en la tercera semana de abril.

A continuación, véase la ejecución histórica del Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y de su Gestión Local (PROMINE), primer trimestre 2021:

SECRETARÍA DE FINANZAS

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto*/	Inicio-Fin	
Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y de su Gestión Local (PROMINE)	SE/FHIS VIII No.2008-66-178 2014 67 414 (KFW) / FHIS - SE	1,608,626,596	10/07/2012 - 31/07/2023	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
I Trimestre 2021	126,155,838	196,848,639	11,805,046	6
Acumulado Vida del Proyecto*/	1,608,626,596	1,608,626,596	1,049,832,911	65

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

### Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB)

Consisten en contribuir a mejorar la convivencia ciudadana en Honduras a través de la mejora en la calidad de vida en barrios vulnerables y la reducción de la incidencia de delitos violentos. Los objetivos específicos son: (I) mejorar el hábitat de barrios urbanos vulnerables, aumentando el acceso a infraestructura de servicios básicos y de prevención para disminuir delitos de robos y violaciones sexuales; (II) reducir los niveles de incidencia de homicidios y violencia intrafamiliar (VIF) en los municipios intervenidos mejorando los servicios de prevención y atención a víctimas de la violencia; y (III) mejorar la efectividad policial en investigación criminal, a través del incremento de la proporción de casos de homicidio con agresor identificado e informe de investigación aceptado por el Ministerio Público.

A continuación, véase los avances por productos al 31 de marzo de 2021:

#### Proyectos Integrales de Mejoramiento de Barrios.

- Los Proyectos de integración urbana el cual incluye: Ampliación, Mejoramiento y/o Construcción de sistemas de alcantarillado sanitario, agua potable, drenaje pluvial, mejoramiento vial y obras de mitigación de riesgos, al 31 de marzo tienen el siguiente avance:
  - Proyecto de Integración Urbana Colonia 25 de enero 83.44%
  - Proyecto de Integración Urbana Colonia Nueva Australia 66.19%
  - Proyecto de Integración Urbana Colonia Nueva España 52.78%
  - Proyecto de Integración Urbana Colonia Nueva Galilea 56.55%
- El proyecto de equipamiento social el cual incluye las siguientes obras y avance físico:
  - Ampliación de Jardín De Niños Colonia Nueva España. 94.58%
  - Ampliación de La Escuela David Corea Sánchez 87.05%
  - Construcción de Centro Comunal Colonia 25 de enero. 85.44%
  - Construcción de Centro Comunal Colonia Australia. 60.18%
  - Construcción de Centro Comunal Colonia Nueva Galilea. 58.17%
  - Reparación de Cancha Polideportiva Colonia Nueva Galilea.98.59%

Se finalizó el diseño de obras del Proyecto de Integración Urbana en colonias Montes de los Olivos, Nueva Jerusalén No. 2, Brisas del Mogote Altos de la Quezada, La Huerta, Villas San Miguel, Brisas del Roble, y Altos del Mirador para un total de 3,035, predios.

A continuación, véase la ejecución histórica del Programa al primer trimestre 2021:

## SECRETARÍA DE FINANZAS

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto*/	Inicio-Fin	
<b>Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB)</b>	BID/4518/BL-HO ATN/OC-17135-HO	369,377,190	01/10/2018 - 01/10/2023	
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Devengado</b>	<b>% Ejec.</b>
I Trimestre 2021	105,265,786	105,265,786	18,299,090	17
Acumulado Vida del Proyecto*/	369,377,190	369,377,190	180,138,339	49

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

### Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras (MIFE)

Este Programa tiene como objetivo fortalecer la educación en Honduras para que los educandos tengan un acceso eficiente, con la permanencia necesaria en los Centros Educativos Media y sean promovidos con la calidad requerida. El programa estará localizado en los departamentos de: Atlántida, Choluteca, Colon, Comayagua, Copan, Cortes, El Paraíso, Francisco Morazán, Gracias a Dios, Intibucá, Islas de la Bahía, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Santa Bárbara, Valle, Yoro.

El Programa beneficiará 480 niños de Educación prebásica, 40,759 niños de Educación Básica y 43,801 jóvenes de Educación Media, haciendo un total de 85,040 educandos de los tres niveles del sistema educativo, así mismo 3,821 docentes de Educación Prebásica, 3,821 docentes de Educación Básica, 15,285 docentes de educación media, haciendo un total de 22,923 docentes. La duración del programa es de 4 años desde el 2020 hasta el 2023 donde habrá un desarrollo gradual de la infraestructura y la dotación de equipo, así como la formación permanente y la plataforma virtual para emprendimiento, con un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por US\$80,000,000.00

A continuación, véase la ejecución histórica del Programa al primer trimestre 2021:

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto*/	Inicio-Fin	
<b>Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras (MIFE)</b>	BCIE - 2239	1,971,360,000	30/09/2020 - 30/09/2023	
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Devengado</b>	<b>% Ejec.</b>
I Trimestre 2021	973,686,940	889,522,751	-	-
Acumulado Vida del Proyecto*/	1,971,360,000	1,971,360,000	-	-

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

A la fecha, se está gestionando el primer desembolso y se está a la espera de la contratación de los formuladores para los diseños de los centros educativos.

Entre otros proyectos ejecutados por la SEDECOAS/FHIS están:

## Programa de Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes (CONVIVIR)

El programa abarca la construcción, el mejoramiento y el equipamiento de infraestructura social para jóvenes y espacios públicos, financiamiento y/o cofinanciamiento del trabajo con jóvenes y la capacitación de jóvenes, la capacitación de personal de las instituciones involucradas, las municipalidades seleccionadas, las comunidades de barrio y servicios de consultoría.

La ejecución de los proyectos es a través de Municipios Mancomunidades y Comunidades que interactúan en función a la ejecución de los proyectos, bajo la modalidad de Proyectos Ejecutados por la Comunidad (PEC) para lo cual son debidamente asesorados y capacitados. Los fondos destinados para la ejecución de este Programa en su Fase I son €10,000,000.00. El tipo de financiamiento es un contrato de Préstamo.

El Programa contó con un presupuesto vigente al primer trimestre del 2021 de L26,741,004.00 (900,000 de Fase I y 25,841,004 de Fase II) el presupuesto ejecutado de Fase I es de L817,968.51 la Fase II aún no presenta ejecución al tercer trimestre el Programa en ambas fases alcanza un 3.1% de ejecución. Bajo la Fase I del Programa se logró priorizar 37 proyectos de los cuales dos (2) se encuentran en proceso de cierre financiero y administrativo, se logró alcanzar de manera directa 3556 jóvenes, logrando fortalecer sus competencias sociales y laborales, se estima que fueron desarrollados 28 procesos de formación en habilidades sociales y 56 procesos de formación en habilidades laborales con un total de 84 Capacitaciones. En cuanto a los procesos de emprendimiento Juveniles el programa logró identificar y fortalecer la capacidad de 96 jóvenes emprendedores en los 3 municipios.

De igual manera se han logrado identificar jóvenes en actividades con emprendimiento de tiempo completo y de medio tiempo, siendo 57 jóvenes que han logrado mantener su emprendimiento de tiempo completo. Se fortalecieron a 2,115 actores relevantes de los tres municipios y a nivel central institucional, con el propósito de instalar capacidades que mejoraron su intervención en el trabajo con juventud y comunidad, a través de capacitaciones y diplomados, se lograron desarrollar 110 procesos de formación. Cabe mencionar que esta Fase cerró el 31 de marzo de 2021.

A continuación, véase la ejecución histórica del Programa en su Fase I al primer trimestre 2021:

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto*/	Inicio-Fin	
<b>Proyecto Convivencia y Espacios Seguros para los Jóvenes en Honduras (CONVIVIR) Fase I</b>	KFW-CONVIVIR	291,500,000	06/12/2013 - 31/03/2021	
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Devengado</b>	<b>% Ejec.</b>
I Trimestre 2021	-	900,000	817,969	91
Acumulado Vida del Proyecto*/	291,500,000	291,500,000	289,688,149	99

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

### **Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (USAID/ICS)**

El propósito del Programa es incrementar la resiliencia de las comunidades y los individuos a la violencia y al crimen a través de mejoras en la infraestructura pública de pequeña escala. Esto incluye el mejoramiento en las estructuras comunitarias que mitiguen el crimen eliminando o disminuyendo el riesgo de oportunidad, creando espacios comunitarios más seguros, aumento en los servicios de calidad que protejan contra la violencia, mejoramiento en la participación de los sistemas de seguridad y rendimiento de justicia nacional y municipal, mejoramiento en la participación ciudadana con los sectores de justicia y seguridad.

Monto del Convenio actual es de \$9,622,517.75, de los cuales, fondos de donación de USAID: \$7,698,014.20; fondos de contraparte de Gobierno de Honduras: \$1,924,503.55, al 31 de marzo contó con un presupuesto vigente de L98,498,991.00 y una ejecución acumulada de L1,607,702.14 que representó el 1.6%, recursos invertidos para la rehabilitación de seis (6) centros escolares y dos (2) Unidades Departamentales de Prevención y Seguridad Comunitaria de la Policía Nacional y un (1) proyecto para fortalecer el sistema de salud, según Decreto Legislativo No. 77-2020.

A la fecha se reporta la finalización de siete (7) proyectos finalizados en el primer trimestre del 2021, sumando un total de 25 proyectos del plan de trabajo, se están ejecutando dos (2) proyectos, para la educación y la seguridad ciudadana a través de la recuperación de espacios y apoyo a la infraestructura de los operadores de justicia del país. Se llevaron a cabo capacitaciones a los comités y personal de mano de obra en temas de Bioseguridad, también se ha fortalecido a las comunidades beneficiarias en temas de Género, cumpliendo los indicadores del Plan de monitoreo y Plan de Género del programa.

#### **4.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN**

- La SEFIN autorizó modificación presupuestaria en atención a la solicitud presentada por el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), a través del Oficio No. SE-SEDECOAS-FHIS-041/2021 mediante el cual la institución requirió el traslado presupuestario debido que el Proyecto Convivencia y Espacios Seguros para los Jóvenes en Honduras que no pudo pagar el anticipo de la Fase II y el pago final de la Fase I del componente de consultoría Internacional por un monto de L5,122,772.00.
- Mediante Oficio No. Oficio No. PCCMB SEDECOAS-FHIS-029-2021 solicitó autorización a la SEFIN para la Modificación Presupuestaria para realizar pagos relacionados a adquisiciones de materiales y suministros, pago de tasas (matricula de vehículos) y prima de seguro de vehículos del Programa Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios por un monto de L360,000.00
- Mediante Oficio No. SE-SEDECOAS-FHIS-135/2021 de fecha 09 de marzo del 2021 solicitó autorización para la creación de espacio presupuestario para el Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y de su Gestión Local (PROMINE) por un monto L71,692,801.00, cuya disminución de espacio presupuestario provienen de los recursos que le fueron aprobados en su Presupuesto de Egresos, identificados en el Programa de Infraestructura para Seguridad Ciudadana (ICS).

- Se solicitó autorización para la Modificación Presupuestaria tipo traslado entre objetos del gasto del Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y de su Gestión Local (PROMINE) de acuerdo al Oficio No.SE-SEDECOAS-FHIS-135/2021 de fecha 17 de marzo de 2021 en base a la reprogramación de actividades para la implementación del Programa, con un monto redistribuido de L1,988,953.00.
- En atención a los Oficios No. SE-SEDECOAS-FHIS-111/2021 del 25 de febrero de 2021, y SE-SEDECOAS-FHIS-048/2021 del 8 de febrero de 2021 la DGIP/SEFIN realizó la primera Enmienda a la Nota de Prioridad No.23539-1 del Proyecto Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras reduciendo US\$1,250,000 el Costo Total del Proyecto pasando de US\$5,000,000 a US\$3,750,000.
- Mediante Oficios SE-SEDECOAS-FHIS-124/2021, y SE-DECOAS-FHIS-108/2021 la DGIP/SEFIN realizó la primera Enmienda a la Nota de Prioridad No.23156-1 del Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (ICS), para la reducción en US\$5,015,023.99 dejando el costo total ajustado en US\$9,622,517.75 a fin de ajustar la Nota de Prioridad a la Carta de Ejecución No. 22 del Convenio de Donación 522-0501.
- La SEFIN autorizó modificación presupuestaria en atención a la solicitud presentada por el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), mediante Oficio No. SE-SEDECOAS-FHIS-164/2021 conforme a la Nota de Prioridad No. 23539-1, la Secretaría de Finanzas, autorizó al Programa Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras (PIOH) la ejecución de \$750,000.00 distribuyendo el 76.1% en efectivo (\$570,683.00) y el 23.9% (\$179,318.00) en especie. Considerando que actualmente al Programa Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras (PIOH), solo se le han asignado en efectivo un monto de \$251,118.00, quedando pendiente \$319,565.00, equivalentes a L. 7,989,125.00, esto para cumplir con los compromisos adquiridos.

## Conclusiones

- La ejecución presupuestaria al primer trimestre del año 2021 experimentó una ejecución acumulada de solamente 6%, relativo a L32,529,807.00 con respecto al presupuesto vigente de L1,368,187,906.00, cabe mencionar que el presupuesto devengado y comprometido asciende a L76,915,361.00.
- Al 31 de marzo de 2021 se cerró la fase I del Programa de Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes (CONVIVIR).
- Para este trimestre se realizaron modificaciones presupuestarias entre proyectos de la misma institución con el fin de ir cubriendo las metas establecidas por el ajuste de la programación de acuerdo a los planes operativos ajustados de cada uno de los proyectos. Asimismo, se realizaron dos enmiendas al costo de los proyectos Programa Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras (PIOH) y Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (USAID/ICS).



## Recomendaciones

- Agilizar los procesos de formulación de los nuevos proyectos con el objetivo de entregar oportunamente los beneficios a la población objetivo, básicamente aquellas personas que han sufrido por emergencias naturales y de salud.
- Coordinar gestiones para acelerar la ejecución física y financiera de los proyectos, tomar acciones correctivas, ceder espacio presupuestario a otros proyectos en vista de lo reprogramado con el objetivo de alcanzar las metas establecidas en los Planes Operativos Anuales institucionales.
- Para el Proyecto Convivir la institución deberá enviar el informe final de ejecución al cierre de la I etapa.

## SECRETARÍA DE FINANZAS

## ANEXO 4

Secretaría de Finanzas

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública

## PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE, 2021

Cifras en Lempiras

No.	Gabinete / Institución / Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado (Devengado Anual)				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Compr./Vig.)
6	0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social		38,834,433	1,443,491,889	1,482,326,322	37,345,433	1,330,842,473	1,368,187,906	1,699,202	30,830,604	32,529,807	2	1,699,202	75,216,159	76,915,361	6
1	008 - PROGRAMA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SU GESTION LOCAL	2014 67 414 (KFW) / FHIS - SE	-	-	-	1,988,953	81,811,681	83,800,634	91,500	11,713,546	11,805,046	14	91,500	11,713,546	11,805,046	14
		BMZ 2016 68 763	6,962,055	119,193,783	126,155,838	3,973,102	109,074,903	113,048,005	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total 008 - PROGRAMA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SU GESTION LOCAL</b>		<b>6,962,055</b>	<b>119,193,783</b>	<b>126,155,838</b>	<b>5,962,055</b>	<b>190,886,584</b>	<b>196,848,639</b>	<b>91,500</b>	<b>11,713,546</b>	<b>11,805,046</b>	<b>6</b>	<b>91,500</b>	<b>11,713,546</b>	<b>11,805,046</b>	<b>6</b>
2	011 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA	522-0501-4	27,294,374	171,382,645	198,677,019	27,294,374	71,204,617	98,498,991	1,607,702	-	1,607,702	2	1,607,702	-	1,607,702	2
	<b>Total 011 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA</b>		<b>27,294,374</b>	<b>171,382,645</b>	<b>198,677,019</b>	<b>27,294,374</b>	<b>71,204,617</b>	<b>98,498,991</b>	<b>1,607,702</b>	<b>-</b>	<b>1,607,702</b>	<b>2</b>	<b>1,607,702</b>	<b>-</b>	<b>1,607,702</b>	<b>2</b>
3	012 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS	ATN/OC-17135-HO	-	2,574,359	2,574,359	-	2,574,359	2,574,359	-	-	-	-	-	-	-	-
		BID/4518/BL-HO	-	102,691,427	102,691,427	-	102,691,427	102,691,427	-	18,299,090	18,299,090	18	-	62,684,644	62,684,644	61
	<b>Total 012 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS</b>		<b>-</b>	<b>105,265,786</b>	<b>105,265,786</b>	<b>-</b>	<b>105,265,786</b>	<b>105,265,786</b>	<b>-</b>	<b>18,299,090</b>	<b>18,299,090</b>	<b>17</b>	<b>-</b>	<b>62,684,644</b>	<b>62,684,644</b>	<b>60</b>
4	013 - PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y FORMACION EDUCATIVA EN HONDURAS	BCIE - 2239	-	973,686,940	973,686,940	-	889,522,751	889,522,751	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total 013 - PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y FORMACION EDUCATIVA EN HONDURAS</b>		<b>-</b>	<b>973,686,940</b>	<b>973,686,940</b>	<b>-</b>	<b>889,522,751</b>	<b>889,522,751</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5	014 - PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS	BMZ Nr. 2016 65348	4,578,004	22,652,000	27,230,004	4,089,004	22,652,000	26,741,004	-	-	-	-	-	-	-	-
		KFW-CONVIVIR	-	-	-	-	-	-	-	817,969	817,969	-	-	817,969	817,969	-
	<b>Total 014 - PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS</b>		<b>4,578,004</b>	<b>22,652,000</b>	<b>27,230,004</b>	<b>4,089,004</b>	<b>22,652,000</b>	<b>26,741,004</b>	<b>-</b>	<b>817,969</b>	<b>817,969</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>817,969</b>	<b>817,969</b>	<b>3</b>
6	060 - ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS	522-0502 Cd E No.9	-	51,310,735	51,310,735	-	51,310,735	51,310,735	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total 060 - ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS</b>		<b>-</b>	<b>51,310,735</b>	<b>51,310,735</b>	<b>-</b>	<b>51,310,735</b>	<b>51,310,735</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Fuente: SIAFI, al 31 de marzo de 2021
