

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e
Inversión Pública



Informe de Avance Físico y Financiero

AL III TRIMESTRE 2022

***Secretaría de Seguridad
(SESEG)***

Tegucigalpa, Honduras

Octubre, 2022

www.sefin.gob.hn

IV. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

4.1 EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

La Secretaría de Seguridad tiene como misión promover la convivencia, proteger la vida y bienes de las personas, mediante la prevención, disuasión y control del delito, con estricto apego a la ley, respeto y garantía de los Derechos Humanos.

El Gobierno para la Refundación del País

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2022
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	178,491,787
Presupuesto Vigente	252,995,954
Devengado III Trimestre-2022	41,358,222
% Ejecución (Devengado III Trim-2022/ Vigente)	16%
Devengado Anual	125,495,246
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	50%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	174,335,243
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	69%


Fuente: SIAFI, 30/09/2022

tiene como propuestas en materia de seguridad; formar una policía comunitaria y eficaz, despolitizar el sistema de seguridad y justicia, combate frontal e inteligente a la extorsión y al lavado de activos como una actividad que retroalimenta a las organizaciones criminales, recuperar los espacios públicos asaltados y controlados por el crimen organizado, optimizar los sistemas de control y vigilancia territorial en las fronteras terrestres, puertos marítimos y aéreos y desmilitarizar la seguridad ciudadana Y confirmar su permanencia en su rol que ordena la constitución.

Al III trimestre la institución cuenta con un presupuesto vigente de **L252.9 millones** alcanzando una ejecución del trimestre de **L41.6 millones** representando el 16% y **L125.5 millones** de ejecución anual que representa el 50 % con relación al vigente. Con relación al presupuesto comprometido el mismo asciende a **L174.3 millones** lo que en términos porcentuales representa el 69% con relación al presupuesto vigente.

El proyecto cuenta con dos fuentes de financiamiento, en el presupuesto el monto de crédito es de **L240.5 millones** y **L12.5 millones** de donación tal como se muestra en el siguiente gráfico.


Gráfico No. 6
Presupuesto Vigente
Financiamiento por Fuente de Financiamiento
Cifras en Millones de Lempiras

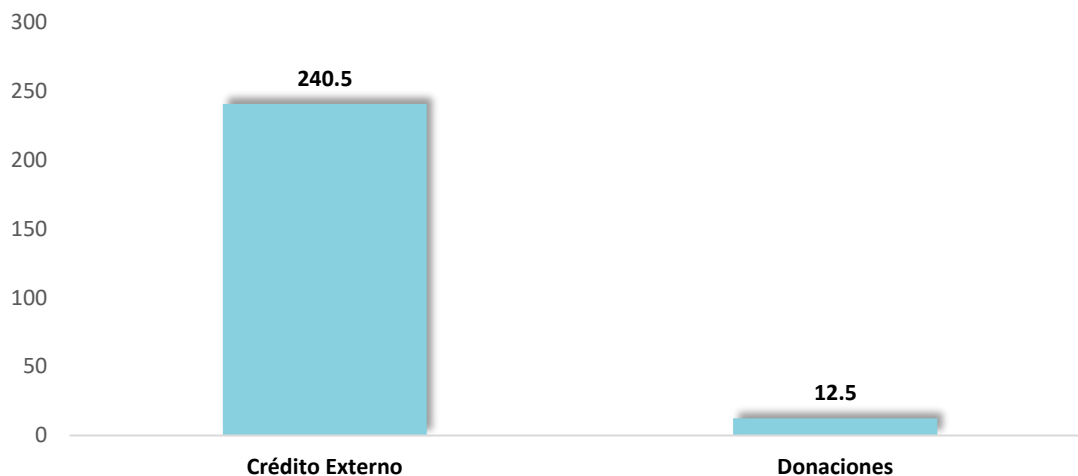

4.2 COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN AL III TRIMESTRE (2018-2022):

En el período comprendido de los años 2018 al 2022, el Programa de Inversión Pública de la Secretaría de Seguridad ha considerado la ejecución de al menos 2 Proyectos de Inversión, de los cuales se han financiado en 87% con recursos de crédito externo, 13% recursos de donaciones externas.

Comportamiento de la Inversión Pública
Secretaría de Seguridad (SDS)
Al 30 de septiembre 2018-2022
Millones de Lempiras

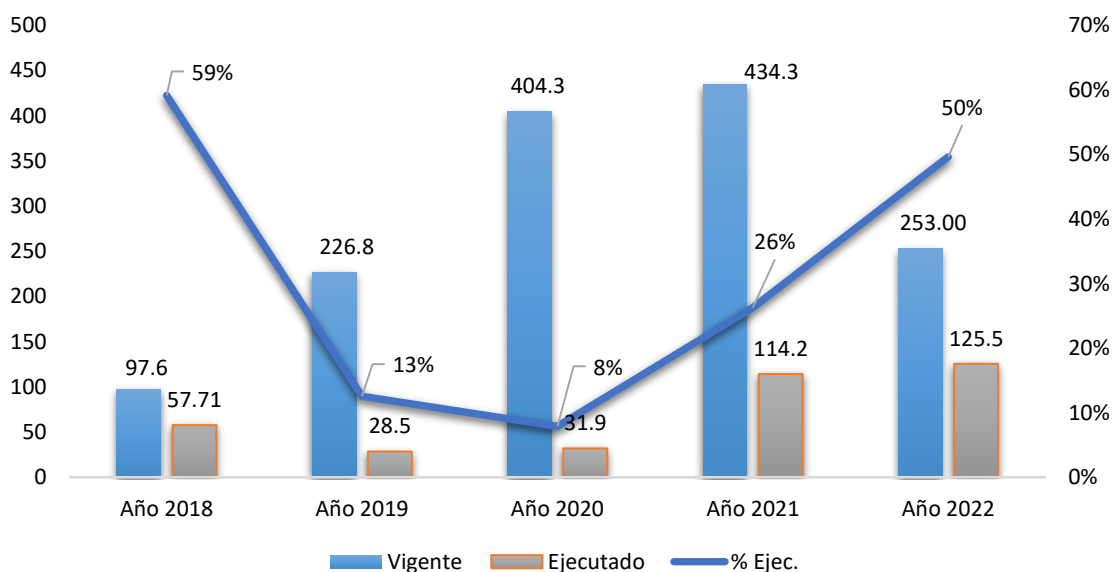

4.3 PRINCIPALES PROYECTOS

Con relación al financiamiento de los proyectos de la institución son financiados con recursos de crédito externo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un monto de US\$45.0 millones de los cuales el SEDECOAS/FHIS ejecuta el 33.3% y la Secretaría de Seguridad el 66.6% del total del convenio.

La inversión en el segundo trimestre del año 2022 se concentró en el siguiente proyecto:

- **Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB).**

El programa tiene como objetivo contribuir a mejorar la convivencia ciudadana en Honduras a través de la mejora en la calidad de vida en barrios vulnerables y la reducción de la incidencia de delitos violentos; Los objetivos específicos son: (i) mejorar el hábitat de barrios urbanos vulnerables, aumentando el acceso a infraestructura de servicios básicos y de prevención para disminuir delitos de robos y violaciones sexuales; (ii) reducir los niveles de incidencia de homicidios y violencia intrafamiliar (VIF) en los municipios intervenidos mejorando los servicios de prevención y atención a víctimas de la violencia; y (iii) mejorar la efectividad policial en investigación criminal, a través del incremento de la proporción de casos de homicidio con agresor identificado e informe de investigación aceptado por el Ministerio Público.

Los principales avances físicos al 30 de septiembre de 2022 son los siguientes:

1. **Infraestructura en Jefaturas Policiales:**

- **Construcción de Jefatura Policial de Olanchito:** Contrato finalizado, pendiente cierre administrativo empresa CACORA, Avance físico: 100%; Avance Financiero: 94.90%, Avance diseño urbanístico: 100%.
- **Construcción de Jefatura Policial de Tela:** Contrato en ejecución empresa GEO-CONSTRUCCIONES, Avance físico: 46.1%; Avance Financiero: 43.50%, Avance diseño urbanístico: 100%.
- **Construcción de Jefatura Policial de Las Vegas, Santa Bárbara:** Contrato finalizado, pendiente cierre administrativo empresa Salvador García; Avance físico: 100%; Avance Financiero: 95%.
- **Construcción de Jefatura Policial de La Puerta, SPS:** Contrato rescindido empresa SIT, Avance físico: 19%; Avance Financiero: 27.19%. Garantías bancarias de anticipo y cumplimiento ejecutadas.

- **Licitación Pública Internacional (LPI);** Adquisición de Mobiliario para cuatro (4) Jefaturas de Policía (San Pedro Sula, Cortés; Las Vegas, Santa Bárbara; Tela, Atlántida; Olanchito, Yoro) y la Unidad de Tutoría y Mentoría de PNH, Estado: Contrato en ejecución empresa IPSA, Avance físico: 90%; Avance Financiero: 100%.
- **Licitación Pública Internacional (LPI);** Adquisición de Equipo Informático para cuatro (4) Jefaturas de Policía (San Pedro Sula, Cortés; Las Vegas, Santa Bárbara; Tela, Atlántida; Olanchito, Yoro) y la Unidad de Tutoría y Mentoría de PNH, Lote #1 – Computadoras, Estado: Contrato terminado empresa LUFERGO, Avance físico: 90%; Avance Financiero: 100%. Lote #2 - Pantallas (Smart TV), Estado: en ejecución empresa COMPUSER, Avance físico: 90%; Avance Financiero: 100%, fueron entregadas el 100% de las computadoras y pantallas contenidas en los contratos de LUFERGO y COMPUSE Pendiente instalación en Jefatura Tela, Atlántida.
- **Compra de radios de comunicación** Contrato terminado empresa AMK TRADING, Avance físico: 100% Avance Financiero: 100%. fortalecimiento del modelo de Patrullaje de la Dirección de operaciones de la Policía Nacional.

2. Efectividad Policial:

- Adquisición de Kits de reactivos para pruebas toxicológicas para aspirantes ITP y ANAPO. Estado: Contrato en ejecución empresa DICOSA, Avance físico: 100.00%; Avance Financiero: 100.00%.
- Contratación para el Mantenimiento y actualización de tres escáneres forenses para laboratorios de investigación criminal y servicios de capacitación. Estado: Contrato en ejecución, suscrito empresa LEICA (Fabricante), Avance físico: 90%; Avance Financiero: 100%.

A continuación, véase la ejecución histórica del Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB), tercer trimestre 2022:

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto*/	Inicio-Fin	
Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB)	BID/4518/BL-HO	\$ 31,800,000	01/10/2018 -	
	GRT/CF-17829-HO	L 767,725,140	01/10/2023	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
III Trimestre 2022	178,491,787	252,995,954	41,358,222	16
Acumulado 2022	178,491,787	252,995,954	125,495,246	50
Acumulado Vida del Proyecto*/	767,725,140	767,725,140	475,124,117	62

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

4.4 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- La Secretaría de Seguridad, mediante Oficio BID-4518-244-2022 remitido a la Secretaría de Finanzas, de fecha 11 de agosto 2022 y documento de Modificación Presupuestaria No.00048 de fecha 24 de agosto 2022, por Cincuenta y Cinco Millones Quinientos Cuarenta Mil Novecientos Catorce Lempiras Exactos (L55,540,914.00), con el objetivo de atender actividades enmarcadas en el Plan de Ejecución Plurianual (PEP) y las tablas de costos del Convenio de préstamo.
- Asimismo, en fecha 31 de agosto de 2022 se solicitó a la Secretaría de Finanzas por parte de la Secretaría de Seguridad modificación presupuestaria enmarcada en el convenio de préstamo, por un monto de L1,491,700.00 con el propósito de atender las diferentes actividades enmarcadas en el Plan de Ejecución Plurianual (PEP) y las tablas de costos del Convenio de Préstamo BID-4518 BL-HO.

Conclusiones

- Al final del III trimestre 2022 la ejecución es satisfactoria para el programa alcanzando el 50% con relación a su presupuesto vigente, lo que se traduce en términos monetarios a L125.5 millones de ejecución, es importante resaltar que el presupuesto comprometido alcanza un monto de L174.3 millones lo que en términos porcentuales equivale al 69% con relación al presupuesto vigente, por lo tanto, la institución alcanza un ritmo de ejecución considerable a la fecha. A pesar de que se cuenta con 20 contratos que trascendieron el período de gobierno y están pendientes de reactivarse, los mismos se encuentran en proceso evaluación de la Presidencia de la República y pendiente de ratificación por parte del Congreso Nacional.
- Para el presente año la institución esta programado ejecutar el 91% en relación con el presupuesto vigente.

Recomendaciones

- Coordinar gestiones para acelerar la ejecución física y financiera del proyecto, tomar acciones correctivas, con el objetivo de alcanzar las metas establecidas en el Plan Operativo Anual.
- Continuar coordinando reuniones con las autoridades de la Secretaría de Seguridad y Finanzas para el seguimiento de las actividades del Programa, con el personal técnico del BID y de la Secretaría de Finanzas para lograr la ejecución financiera y cumplimiento de indicadores de la Matriz de Resultados.

Secretaría de Finanzas
 Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE, 2022
 Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Presupuesto Aprobado		Presupuesto Vigente		Ejecutado (Devengado Anual)		
		Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)
1	0070 - Secretaría de Seguridad	178,491,787	178,491,787	252,995,954	252,995,954	125,495,246	125,495,246	50%
1	PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS	178,491,787	178,491,787	252,995,954	252,995,954	125,495,246	125,495,246	50%

Fuente: SIAFI, 30/09/2022
