

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e
Inversión Pública



Informe de Avance Físico y Financiero

AL I TRIMESTRE 2023

***Secretaría de Seguridad
(SESEG)***

Tegucigalpa, Honduras

Mayo, 2023

www.sefin.gob.hn

IV. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

4.1 EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

La Secretaría de Seguridad tiene como misión promover la convivencia, proteger la vida y bienes de las personas, mediante la prevención, disuasión y control del delito, con estricto apego a la ley, respeto y garantía de los Derechos Humanos.

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del 2023
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	200,359,934
Presupuesto Vigente	200,359,934
Ejecutado (Devengado Anual)	7,039,712
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	4%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	46,046,119
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	23%


Fuente: SIAFI, 31/03/2023

El Gobierno para la Refundación del País tiene como propuestas en materia de seguridad; formar una policía comunitaria y eficaz, despolitizar el sistema de seguridad y justicia, combate frontal e inteligente a la extorsión y al lavado de activos como una actividad que retroalimenta a las organizaciones criminales, recuperar los espacios públicos asaltados y controlados por el crimen organizado, optimizar los sistemas de control y vigilancia territorial en las fronteras terrestres, puertos marítimos y aéreos y desmilitarizar la seguridad ciudadana Y confirmar su permanencia en su rol que ordena la constitución.

Al I Trimestre la institución cuenta con un presupuesto vigente de **L200.4 millones** alcanzando una ejecución del trimestre de **L7.0 millones** representando el 4% con relación al vigente.

El proyecto cuenta con dos fuentes de financiamiento en el presupuesto para el año 2023, el monto de crédito es de **L195.6 millones** y **L4.8 millones** de donación tal como se muestra en el siguiente gráfico.


Gráfico No. 6
Presupuesto Vigente
Financiamiento por Fuente de Financiamiento
Cifras en Millones de Lempiras

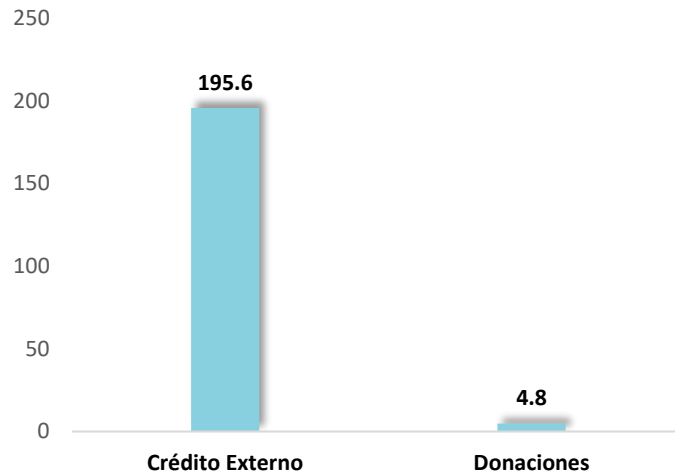

4.2 COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN AL I TRIMESTRE (2019-2023):

En el período comprendido de los años 2019 al 2023, el Programa de Inversión Pública de la Secretaría de Seguridad ha considerado la ejecución de al menos 2 Proyectos de Inversión, de los cuales se han financiado en 80.5% con recursos de crédito externo, 19.5% recursos de donaciones externas.

Gráfico No. 2
Comportamiento de la Inversión Pública
Secretaría de Seguridad (SESEG)
Al 31 de marzo 2019-2023
Millones de Lempiras

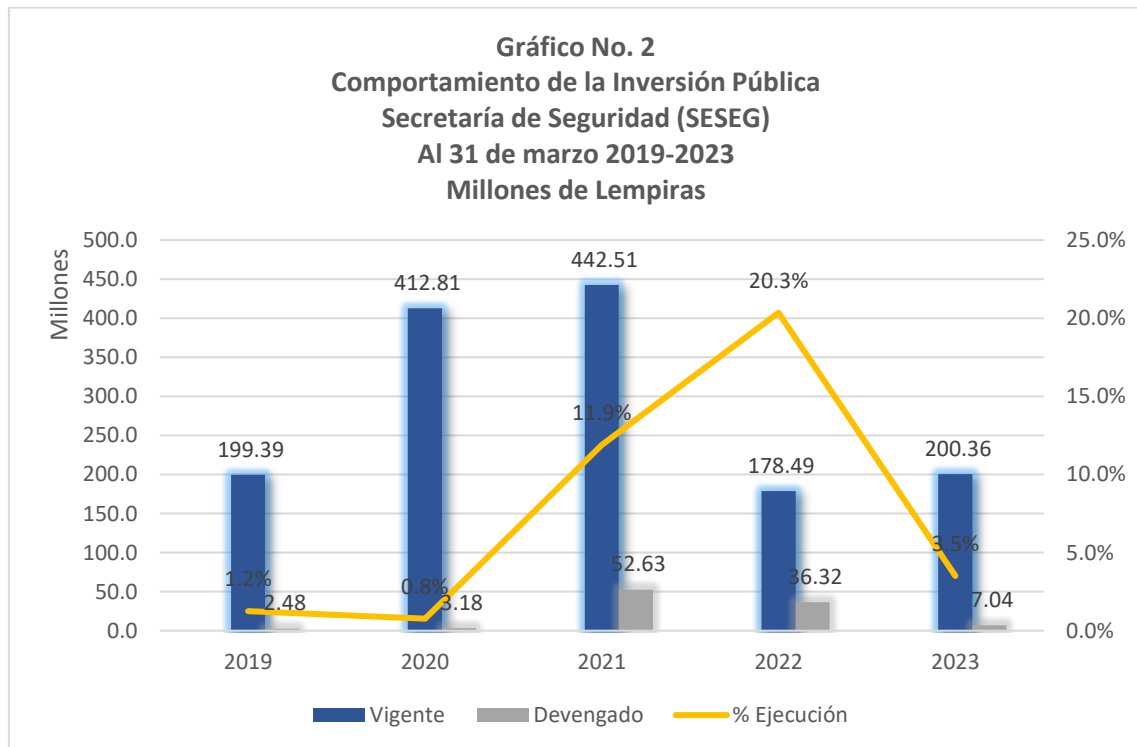

4.3 PRINCIPALES PROYECTOS

Con relación al financiamiento de los proyectos de la institución son financiados con recursos de crédito externo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un monto de US\$45.0 millones de los cuales el SEDECOAS/FHIS ejecuta el 33.3% y la Secretaría de Seguridad el 66.6% del total del convenio.

La inversión en el primer trimestre del año 2023 se concentró en el siguiente proyecto:

- **Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB).**

El programa tiene como objetivo contribuir a mejorar la convivencia ciudadana en Honduras a través de la mejora en la calidad de vida en barrios vulnerables y la reducción de la incidencia de delitos violentos; Los objetivos específicos son: (i) mejorar el hábitat de barrios urbanos vulnerables, aumentando el acceso a infraestructura de servicios básicos y de prevención para disminuir delitos de robos y violaciones sexuales; (ii) reducir los niveles de incidencia de homicidios y violencia intrafamiliar (VIF) en los municipios intervenidos mejorando los servicios de prevención y atención a víctimas de la violencia; y (iii) mejorar la efectividad policial en investigación criminal, a través del incremento de la proporción de casos de homicidio con agresor identificado e informe de investigación aceptado por el Ministerio Público.

Los principales avances físicos al 31 de marzo de 2023 son los siguientes:

1. Construcción de jefaturas policiales en el municipio de Tela, departamento de Atlántida con un avance físico del 75%.
2. En proceso de Contratación de obras de construcción de la Unidad Departamental de Intibucá.
3. En proceso de Contratación de supervisión de obras de construcción de la Unidad Departamental de Intibucá.
4. Construcción de jefaturas policiales en Cortés con un avance físico del 19% y Santa Bárbara con un avance físico del 100%.
5. Contratación de obras complementarias en la vivienda social de la UMEP de San Pedro Sula, Cortés con un avance físico del 100%.
6. Adquisición de mobiliario y equipo para las jefaturas de San Pedro Sula, Cortés, Las Vegas, Santa Bárbara, Tela, Atlántida, Olanchito, Yoro y la Unidad de Tutoría y Mentoría de la Policía Nacional de Honduras con un avance físico del 90%.
7. Adquisición de equipo informático para las jefaturas de San Pedro Sula, Cortés, Las Vegas, Santa Bárbara, Tela, Atlántida, Olanchito, Yoro y la Unidad de Tutoría y Mentoría de la Policía Nacional de Honduras con un avance físico del 90%.

8. Adquisición de menaje para las jefaturas de San Pedro Sula, Cortés, Las Vegas, Santa Bárbara, Tela, Atlántida, Olanchito, Yoro y la Unidad de Tutoría y Mentoría de la Policía Nacional de Honduras con un avance físico del 90%.
9. Mantenimiento y actualización de tres escáneres forenses para laboratorios de investigación criminal y servicios de capacitación con un avance físico del 90%.

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto*/	Inicio-Fin	
Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB)	BID/4518/BL-HO	\$ 31,800,000	01/10/2018 -	
	GRT/CF-17829-HO	L 782,760,180	01/10/2023	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
I Trimestre 2023	200,359,934	200,359,934	7,039,712	3.5
Acumulado 2023	200,359,934	200,359,934	7,039,712	3.5
Acumulado Vida del Proyecto*/	782,760,180	782,760,180	668,009,099	85.3

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

4.4 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- No se realizaron modificaciones presupuestarias a la Dirección General de Inversiones Públicas de la Secretaría de Finanzas en el último trimestre 2023.
- Se llevó a cabo Revisión de cartera con el Banco Interamericano de Desarrollo

Conclusiones

- Al final del I Trimestre 2023 la ejecución es baja para el programa alcanzando el 4% con relación a su presupuesto vigente, lo que se traduce en términos monetarios a L7.0 millones de ejecución, la institución mantiene un ritmo bajo de ejecución a la fecha, esperando para los próximos trimestres aumente el nivel de ejecución debido a que actualmente se encuentran en proceso de contratación las obras del Departamento de Intibucá.

Recomendaciones

- Coordinar gestiones para acelerar la ejecución física y financiera del proyecto, tomar acciones correctivas, con el objetivo de alcanzar las metas establecidas en el Plan Operativo Anual.
- Continuar coordinando reuniones con las autoridades de la Secretaría de Seguridad y Finanzas para el seguimiento de las actividades del Programa, con el personal técnico del BID y de la Secretaría de Finanzas para lograr la ejecución financiera y cumplimiento de indicadores de la Matriz de Resultados.
- Realizar enmiendas a la Nota de Prioridad en cuanto a intervenciones de obras en nuevos departamentos del país, como ser: La Paz e Intibucá.

- Actualizar mensualmente en el Sistema de Administración Financiera (SIAFI Ges) la evaluación de metas físicas en el Plan Operativo Anual.

ANEXOS

SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE, 2023
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado (Devengado)			
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Ejecutado/Vigente)
1	0070 - Secretaría de Seguridad		-	200,359,934	200,359,934	-	200,359,934	200,359,934	-	7,039,712	7,039,712	4%
1	004 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS	BID/4518/BL-HO	-	195,593,002	195,593,002	-	195,593,002	195,593,002	-	7,039,712	7,039,712	4%
		GRT/CF-17829-HO	-	4,766,932	4,766,932	-	4,766,932	4,766,932	-	-	-	0%

Fuente: SIAFI, 31/03/2023
