

INFORME GENERAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

II Trimestre, 2023



Gobierno de la República

www.sefin.gob.hn



UTM: 16P
568154mE 1554473mN
Elevación: 448.09+3.00 m
Precisión: 16.00 m
Tiempo: 31-05-2023 09:43:54



UTM: 16P
568154mE 1554473mN
Elevación: 448.09+3.00 m
Precisión: 16.00 m
Tiempo: 27-05-2023 09:43:54



UTM: 16P
568154mE 1554473mN
Elevación: 448.09+3.00 m
Precisión: 16.00 m
Tiempo: 27-05-2023 09:43:54



UTM: 16P
568154mE 1554473mN
Elevación: 448.09+3.00 m
Precisión: 16.00 m
Tiempo: 26-05-2023 09:43:54



UTM: 16P
568154mE 1554473mN
Elevación: 448.09+3.00 m
Precisión: 16.00 m
Tiempo: 26-05-2023 09:27:35



UTM: 16P
568154mE 1554473mN
Elevación: 448.09+3.00 m
Precisión: 16.00 m
Tiempo: 25-04-2023 4:34:04 p.m.
Nota: Las Lomas - Jicarito - Bahía Izq entre 25+300 - 25+400 lado derecho capa sub base



UTM: 16P
568154mE 1554473mN
Elevación: 448.09+3.00 m
Precisión: 16.00 m
Tiempo: 29-04-2023 3:44:22 p.m.
Nota: Las Lomas - Jicarito - sub excavación lado izq 27+540

Proyecto: Construcción y Pavimentación con Concreto Hidráulico del Corredor de Oriente, Tramo Carretero: "Las Lomas - Terrero Blanco, Ruta 53

Contenido

INVERSIÓN PÚBLICA AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2023	3
PRESENTACIÓN.....	3
I. ANALISIS GLOBAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA AL SEGUNDO TRIMESTRE 2023	4
1.1 INVERSIÓN PÚBLICA GLOBAL 2023	4
1.2 INVERSIÓN INSTITUCIONAL.....	5
1.3 PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA POR ESTRUCTURA DEL SECTOR PÚBLICO, (SIAFI)	7
1.4 LA INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL DE SECTOR (PRODUCTIVA Y SOCIAL)	8
1.5 FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PUBLICA GLOBAL.....	9
1.6 PROGRAMAS SOCIALES.....	10
1.7 EJECUCIÓN HISTÓRICA PERÍODO 2019 - 2023:.....	11
1.8 EJECUCIÓN FÍSICA A NIVEL DE SECTORES:	11
1.8.1 Sector Carreteras:.....	12
1.8.2 Sector De Protección Social:.....	15
1.8.3 Sector Energía:	17
1.8.4 Sector Educación:.....	19
1.8.5 Sector Salud:.....	21
1.8.6 Sector Seguridad Alimentaria	22
1.8.7 Sector Recursos Forestales y Ambiente:	24
1.8.8 Transporte y Obras Públicas:.....	25
1.9 FACTORES QUE HAN INCIDIDO EN LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA, PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023	26

INVERSIÓN PÚBLICA AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2023

PRESENTACIÓN

El presente informe, muestra el análisis del comportamiento de la ejecución física y financiera de la Inversión Pública correspondiente al Segundo Trimestre del ejercicio fiscal 2023. Este documento es elaborado por la Dirección General de Inversiones Públicas (DGIP) en el marco de sus competencias como ente técnico coordinador del Programa de Inversión Pública (PIP).

En el Plan de Inversión Pública aprobado para el año 2023 se prioriza un monto de **L71,847.0 millones**, representando el **8.7%** respecto al PIB para el año 2023 (L827,618.4 millones), dicha inversión está orientada a la ejecución de programas y proyectos en los sectores prioritarios de Energía para la recuperación de las empresas públicas, Carreteras, para el incremento de la productividad, conectividad y competitividad y Desarrollo Productivo como apoyo a la Seguridad Alimentaria y protección social que permita fomentar el trabajo local a través de la generación de empleo, contribuir con el mejoramiento de caminos de acceso con el fin de facilitar la comercialización del sector productivo.

Del monto Global de la Inversión Pública aprobado para el año 2023, **L71,847.0 millones** el **67.1%** **L48,233.1 millones**, corresponden a Programas Sociales, para el beneficio social y desarrollo humano, las cuales no requieren notas de prioridad en el Sistema Nacional de Inversión Pública de Honduras (SNIPH); el restante **33.9%** **L23,613.9 millones**, pertenecen a los Proyectos de Inversión Productiva, que cuentan con la respectiva nota de prioridad en el SNIPH, para la ejecución de **125 proyectos** de Inversión Pública, de los cuales 57 son nuevos proyectos y 68 proyectos de arrastre.

I. ANALISIS GLOBAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA AL SEGUNDO TRIMESTRE 2023

1.1 INVERSIÓN PÚBLICA GLOBAL 2023

El monto Global de la Inversión Pública aprobado para el año 2023, asciende a **L71,847.0** millones de los cuales el 67.1% **L48,233.1** millones, corresponden a Inversiones Sociales, las cuales no requieren notas de prioridad en el Sistema Nacional de Inversión Pública de Honduras (SNIPH); el restante 33.9% **L23,613.9** millones, corresponden a los Proyectos para Inversiones Productivas, que cuentan con nota de prioridad registrados en el Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIPH), para la ejecución de **125 proyectos** de Inversión Pública.

La Inversión Publica Global al segundo trimestre 2023 contó con un presupuesto vigente de **L60,415.4** millones, y una ejecución de **L17,604.2** millones, **(29.1%)**.

Del total de la Inversión Pública, **La Inversión Productiva** para el año 2023 según lo reportado en el Sistema de Administración Financiera Integrado (SIAFI) muestra una Inversión vigente al segundo trimestre de **L13,652.5** millones y una ejecución de **L2,741.6** millones, **(20.1%)**, para la ejecución de 71 proyectos en los diferentes sectores prioritarios del país.

Respecto al presupuesto vigente para la **Inversión Social** cuenta con un monto de L46,762.9 millones, y un ejecutado de L14,862.63millones, **(31.8%)**. Ver cuadro No.1.

Cuadro No.1
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE, 2023
 Cifras en Millones de Lempiras

No. Proy.	Detalle Inversión	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado/Devengado	%
125	Inversión Productiva	23,613.80	13,652.50	2,741.60	20.1%
71	Registrados en SIAFI	5,455.00	13,652.50	2,741.60	20.1%
54	Pendiente de Incorporación	18,158.80	-	-	-
-	Inversión Social	48,233.10	46,762.90	14,862.60	31.8%
	Total, Inversión Global	71,846.90	60,415.40	17,604.20	29.1%

* Del Presupuesto vigente/ L13,652.502 millones, se encuentran pendientes de incorporar al PIP L9,961.30 millones, los cuales se incorporarán una vez cumplan los requerimientos técnicos, legales y administrativos

Fuente: SIAFI al 30/06/2023

1.2 INVERSIÓN INSTITUCIONAL

Cuadro No.2
Plan de Inversión Pública, Ejecución al II Trimestre, 2023
Cifras en Millones de Lempiras

Institución	Vigente	Ejecutado/Devengado	%/Ejecución
0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social	1,377.0	236.8	17.2%
0028 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal	125.1	16.4	13.1%
0037 - Servicio de Administración de Rentas	173.4	50.0	28.8%
0044 - Instituto Nacional Penitenciario	-	-	-
0050 - Secretaría de Educación	483.9	23.6	4.9%
0060 - Secretaría de Salud	746.9	159.6	21.4%
0070 - Secretaría de Seguridad	200.4	19.2	9.6%
0091 - Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil	-	-	-
0100 - Secretaría de Finanzas	115.8	85.7	74.0%
0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería	1,552.1	61.5	4.0%
0144 - Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible	75.4	61.4	81.5%
0150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente	725.0	305.6	42.2%
0244 - Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer	22.0	6.2	28.2%
0411 - Secretaría de Infraestructura y Transporte	2,052.5	352.1	17.2%
0412 - Secretaría de Desarrollo Social	12.8	3.8	29.8%
0413 - Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación	495.0	88.1	17.8%
0414 - Dirección de Gestión por Resultados	207.5	3.2	1.5%
0415 - Programa de la Red Solidaria	2,493.8	119.4	4.8%
0503 - Instituto Nacional de Formación Profesional	69.9	-	0.0%
0505 - Instituto Hondureño de Antropología e Historia	5.2	0.2	3.9%
0511 - Universidad de Ciencias Forestales	30.0	-	0.0%
0703 - Universidad Nacional de Agricultura	37.5	-	0.0%
0708 - Hospital Escuela Universitario	127.1	-	0.0%
0801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica	2,172.8	1,121.9	51.6%
0806 - Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola	8.9	0.5	5.5%
0807 - Suplidora Nacional de Productos Básicos	29.7	0.0	0.1%
0809 - Empresa de Correos de Honduras	3.1	2.4	75.5%
1801 - Alcaldía Municipal del Distrito Central	309.9	23.9	7.7%
Total Inversión Productiva	13,652.5	2,741.6	20.1%
0003 - Comisionado Nacional de Derechos Humanos	0.2	0.1	37.1%
0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social	350.3	116.5	33.3%
0028 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal	100.2	0.0	0.0%
0033 - Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos	300.0	110.0	36.7%
0039 - Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios	25.0	-	0.0%
0040 - Secretaría de Justicia, Gobernación y Descentralización	79.0	33.9	42.8%
0045 - Instituto Nacional de Migración	0.7	-	0.0%
0050 - Secretaría de Educación	1,060.1	58.0	5.5%
0060 - Secretaría de Salud	9,154.0	1,533.8	16.8%
0070 - Secretaría de Seguridad	153.0	73.6	48.1%
0080 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.	132.6	62.2	46.9%
0090 - Secretaría de Defensa	150.7	56.8	37.7%
0101 - Comisión Nacional de Telecomunicaciones	200.0	49.3	24.6%
0130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social	3.0	0.9	29.9%
0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería	1,300.0	700.0	53.8%
0141 - Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria	0.1	-	0.0%
0180 - Registro Nacional de las Personas	1.4	0.4	31.0%
0242 - Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia	104.2	26.3	25.2%
0243 - Dirección Nacional de Parques y Recreación	18.2	10.2	55.9%
0300 - Secretaría de Derechos Humanos	2.3	-	0.0%
0301 - Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Tr	3.8	-	0.0%
0310 - Secretaría de Energía	14,768.2	3,330.0	22.5%
0406 - Secretaría de Asuntos de la Mujer	66.8	10.7	16.1%
0410 - Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de	32.2	6.7	20.7%
0411 - Secretaría de Infraestructura y Transporte	596.0	537.3	90.1%
0412 - Secretaría de Desarrollo Social	102.8	94.6	92.1%
0415 - Programa de la Red Solidaria	749.2	-	0.0%
0416 - Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento	596.3	119.6	20.1%
0417 - Programa de Acción Solidaria	1,411.8	567.3	40.2%
0500 - Instituto Nacional Agrario	7.2	4.3	59.3%
0501 - Instituto Hondureño de Turismo	0.7	0.0	0.8%
0505 - Instituto Hondureño de Antropología e Historia	0.0	-	0.0%
0506 - Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas	0.1	0.1	78.3%
0507 - Inst. Hondureño para Prev. y Trat. del Alcohol.,Drog.y Farm.	1.2	1.2	100.0%
0511 - Universidad de Ciencias Forestales	17.5	5.4	30.9%
0601 - Instituto Hondureño de Seguridad Social	8.1	-	0.0%
0602 - Inst. Nal. de Judi.y Pen. de los Emp. y Fun. del Poder Ejec.	5,930.5	2,882.5	48.6%
0603 - Instituto Nacional de Previsión del Magisterio	6,994.4	3,426.8	49.0%
0604 - Instituto de Previsión Militar	2,127.7	1,030.1	48.4%
0708 - Hospital Escuela Universitario	185.3	0.5	0.3%
0803 - Empresa Nacional Portuaria	28.4	13.8	48.6%
Total Inversión Social	46,762.9	14,862.6	31.8%
Total General	60,415.4	17,604.2	29.1%

* Del Presupuesto vigente/ L13,652.502 millones, se encuentran pendientes de incorporar al PIP L9,961.30 millones, los cuales se incorporarán una vez cumplan los requerimientos técnicos, legales y administrativos

Fuente: SIAFI al 30/06/2023

Dirección General de Inversiones Públicas

A nivel institucional la Ejecución de la **Inversión Productiva** ha sido de **L2,741.6 millones (20.1%)**, en donde las instituciones con mayor ejecución al II trimestre del 2023 son: La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) L1,121.9(51.6%), La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) L352.1 (17.2%), Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente L305.6 (42.2%) y el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) L236.8 (17.2%) lo anterior en relación con el presupuesto vigente. Ver detalle en el cuadro No.2.

En cambio, la ejecución de la **Inversión Social** corresponde a **L14,862.6 millones (31.8%)** la cual está concentrada en siete instituciones como ser: Instituto Nacional de Previsión del Magisterio L3,426.8(49.0%); Secretaría de Energía L3,330.0 (22.5%); Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y funcionarios del Poder Ejecutivo L2,882.5(48.6%); la Secretaría de Salud L1,533.8 (16.8%) y Secretaría de Agricultura y Ganadería L700.0(53.8%). Ver detalle en el cuadro No.2.

Asimismo, dentro de la ejecución presupuestaria se incluyen proyectos financiados con Fondos del Banco Central de Honduras (BCH), dicha ejecución asciende a **L850.6 millones**, de L4,235.2 millones al segundo trimestre, con un **20.1%** de ejecución respecto a su presupuesto asignado. Ver detalle de proyectos en el cuadro No. 3.


Cuadro No.3
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA (BCH), AÑO 2023
Cifras en Millones de Lempiras

Institución	Vigente	Ejecutado/Devengado	%/Ejecución
0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social	229.1	2.0	1%
001 - Programa de Mejoramiento de la Infraestructura de Desarrollo Social y Comunitario en varios departamentos de Honduras	229.1	2.0	1%
0044 - Instituto Nacional Penitenciario	-	-	-
001 - Ampliación y Mejoramiento de los Centros Penitenciarios de Honduras	-	-	-
0050 - Secretaría de Educación	298.7	10.5	4%
011 - PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E IMPLEMENTACIÓN DE HUERTOS ESCOLARES PRODUCTIVOS EN CENTROS EDUCATIVOS DE HONDURAS, FASE I.	298.7	10.5	4%
0091 - Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil	-	-	-
001 - Desarrollo del Sistema de Saneamiento de la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (AHAC).	-	-	-
0100 - Secretaría de Finanzas	115.8	85.7	74%
001 - Modernización Integral de la Gestión de las Finanzas Públicas	115.8	85.7	74%
0150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente	725.0	305.6	42%
001 - PROGRAMA DE REFORESTACIÓN NACIONAL Y PROTECCIÓN DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS "PADRE ANDRÉS TAMAYO"	725.0	305.6	42%
0411 - Secretaría de Infraestructura y Transporte	2,052.5	352.1	17%
001 - Construcción y Pavimentación Con Concreto Hidráulico del Tramo Carretero: La ENA - San José de Río Tinto - Dulce Nombre de Culmí, Sub Tramo: "Puente Río El Pataste - Dulce Nombre de Culmí", Ruta N-83,	51.7	1.5	3%
001 - Proyecto Obras de Mitigación para el Control de Riesgos Geotécnicos y Geológicos, por Deslizamientos y Desprendimientos de Roca de Taludes de Corte en la Carretera CA5-Sur Tramo "Moramulca", Fase I	27.8	22.5	81%
001 - Reconstrucción del Puente en Carretera Nacional No.1 Puente Guacirope, Localizado en el municipio de Nacaome, Valle.	17.0	13.2	78%
002 - Construcción y Rehabilitación Vial con Concreto Hidráulico del Corredor de Occidente, Tramo Carretero: "Naco - La Entrada" (79.1 Km), Localizado en los Departamentos de Santa Bárbara y Copán.	507.8	15.9	3%
002 - Rehabilitación con Concreto Hidráulico sobre la Carpeta Asfáltica existente del tramo carretero: Tegucigalpa - El Guanábano (RN15), Longitud 7.22 KM (Salida a Olancho), ubicado en el departamento de F	107.2	3.0	3%
003 - Construcción y Pavimentación con Concreto Hidráulico del Corredor de Oriente, Tramo Carretero: "Las Lomas - Terrero Blanco, Ruta 53" y Elaboración del Estudio y Diseño del Tramo Carretero: Ruta 119, "	401.6	46.9	12%
003 - Rehabilitación del Tramo Carretero: "Siguatepeque - La Esperanza" (67.00 Km), Localizado en los Departamentos de Comayagua e Intibucá.	455.4	133.1	29%
004 - Construcción y Pavimentación con Concreto Hidráulico del Tramo Carretero: "Portillo del Lobo-Reitoca - Curarén" (39.54 KM), Localizado en los Departamentos de Francisco Morazán y Choluteca.	98.6	12.2	12%
005 - Construcción y Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Carretera Central, Tramo: "Marale - Empalme Carretera Yoro" (53.31 km), localizado en el Departamento de Francisco Morazán y Yoro.	236.6	59.0	25%
006 - Pavimentación con Concreto Hidráulico del tramo Carretero Amapa - San Antonio de Cortés (R90) con una Longitud de 9.645 Km, ubicado en el Municipio de San Antonio de Cortés, Departamento de Cortés.	112.1	36.3	32%
007 - Pavimentación con Concreto Hidráulico del tramo Carretero Peña Blanca - Los Naranjos (R72) con una Longitud de 2.872KM, ubicado en el Municipio de Santa Cruz de Yojoa, Departamento de Cortés.	36.8	8.5	23%
0412 - Secretaría de Desarrollo Social	12.8	3.8	30%
001 - Fortalecimiento en el Sistema de Extracción, Almacenamiento y Distribución del Servicio de Agua Potable y afianzamiento de la Seguridad Alimentaria para mejorar las condiciones de salud y bienestar en	12.8	3.8	30%
0413 - Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación	495.0	88.1	18%
001 - DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE INSTALACIONES Y ESPACIOS FISICOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, PARA USO DE LA POBLACIÓN A NIVEL NACIONAL.	495.0	88.1	18%
0503 - Instituto Nacional de Formación Profesional	69.9	-	0%
001 - EQUIPAMIENTO DE TALLERES EN LAS CINCO REGIONALES DEL INFOP Y CAPACITACIÓN DE INSTRUCTORES	69.9	-	0%
0511 - Universidad de Ciencias Forestales	30.0	-	0%
001 - Remodelación de obras de infraestructura y equipamiento para el campus central de la UNACIFOR e instalación de fibra óptica en el Centro de Investigación y Jardín Botánico Lancetilla y UNACIFOR	30.0	-	0%
0703 - Universidad Nacional de Agricultura	37.5	-	0%
006 - Proyecto Fortalecimiento de las Capacidades Educativas, Productivas y Sociales de la Universidad Nacional de Agricultura, Catacamas, Olancho. PROFORCEPS	37.5	-	0%
0708 - Hospital Escuela Universitario	127.1	-	0%
001 - Fortalecimiento de infraestructura y equipamiento tecnológico en el Hospital Escuela ubicado en la ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazán	127.1	-	0%
0806 - Instituto Hondureño de Mercado Agrícola	8.9	0.5	5%
001 - Fortalecimiento y Mantenimiento de la Reserva Estratégica de granos básicos a través de la Comercialización y Rehabilitación de Bodegas y Silos en San Pedro Sula, Danlí y Tegucigalpa.	8.9	0.5	5%
0807 - Suplidora Nacional de Productos Básicos	29.7	0.0	0%
001 - Proyecto de Abastecimiento de Centros de Venta de Honduras y Fortalecimiento al BANASUPRO	29.7	0.0	0%
0809 - Empresa de Correos de Honduras	3.1	2.4	75%
001 - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO POSTAL HONDUREÑO, en las oficinas postales, Centro -Tegucigalpa, Toncontín, Nacaome, San Pedro Sula, La Entrada, Comayagua, La Ceiba, Danlí, Juticalpa, Choluteca, Santa Bá	3.1	2.4	75%
Total general	4,235.2	850.6	20.1%

Fuente: SIAFI al 30/06/2023

El desempeño de la ejecución de la Inversión Pública al segundo trimestre del 2023 a nivel de devengando (ejecutado) muestra un incremento de 19 puntos porcentuales en comparación con el segundo trimestre del año 2022 que fue de 10.1, lo cual impacta directamente en la ejecución de los programas sociales y proyectos productivos, que en su mayoría los proyectos están orientados a generar un beneficio económico en el país, que contribuyen al incremento de los activos no financieros de las entidades que integran el Sector Público y los bienes y servicios de dominio público, con el fin de iniciar, ampliar, mejorar, modernizar, reponer o reconstruir la capacidad productiva de bienes y la prestación de servicios nacionales.


Grafico No.1
Comparativo Inversión Pública
al Segundo Trimestre 2022-2023 Vigente/Devengado
Cifra en millones de Lempiras

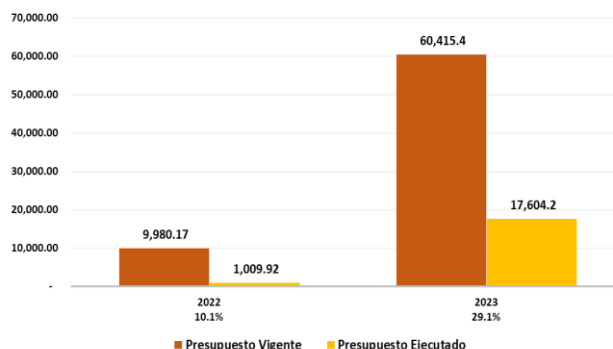

Asimismo, se observa que el presupuesto vigente para el año 2023 de L60,415.4 millones tiene un incremento del 83.5% en relación con el presupuesto vigente 2022 de L9,980.2 millones. Incremento considerable debido a que el actual gobierno está realizando una gran apuesta a la Inversión Pública en proyectos enfocados en el Plan de Gobierno para Refundar Honduras.

1.3 PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA POR ESTRUCTURA DEL SECTOR PÚBLICO, (SIAFI)

Gráfico No. 2
Inversión Pública por Estructura del Sector Público
al 30 de Junio 2023
Cifras en Millones de Lempiras

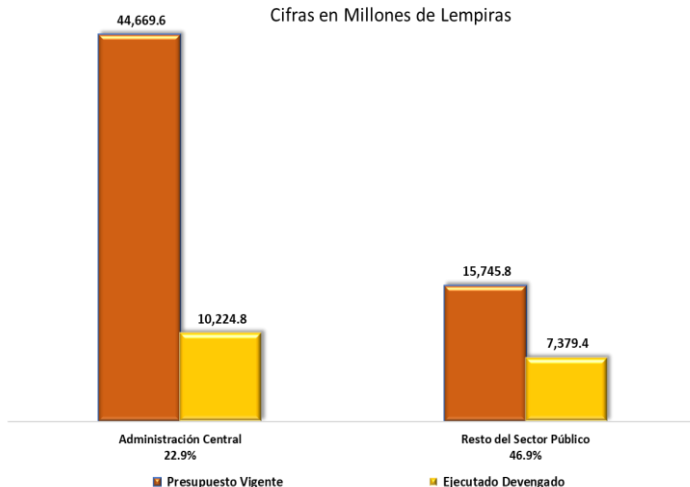

La distribución del PIP para el II trimestre 2023 de acuerdo con la Clasificación del Sector Público, muestra un Presupuesto vigente de **L60,415.4 millones** reportado en el SIAFI, reflejando una ejecución de **L17,604.2 millones; 29.1%** respecto al presupuesto vigente.

L44,669.6 millones, corresponden a la Administración Central, y para el Resto del Sector Público **L15,745.8 millones**, con ejecución de (**L10,224.8 millones AC, 22.9%**); **L7,379.4 millones RSP 46.9%**). Ver Gráfico No.2 y Cuadro No. 4.

Fuente: SIAFI 30/06/2023


Cuadro No. 4
 Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del 2023
SECTOR PÚBLICO
 Cifras en Millones de Lempiras

Sector Público	Presupuesto Vigente	Devengado Aprobado	% Ejecución (Ejecutado/Vigente)
Administración Central	13,207.6	2,726.8	20.6%
Resto del Sector Público	444.9	14.7	3.3%
Total, Inversión Productiva	13,652.5	2,741.6	20.1%
Administración Central	31,462.0	7,498.0	23.8%
Resto del Sector Público	15,300.9	7,364.6	48.1%
Total, Inversión Social	46,762.9	14,862.6	31.8%
Total, General Inversión	60,415.4	17,604.2	29.1%

Fuente: SIAFI al 30/06/2023

1.4 LA INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL DE SECTOR (PRODUCTIVA Y SOCIAL)

Gráfico No. 3 Inversión Pública: Distribución Sectorial
 Presupuesto Vigente L60,415.4 millones al 30 de junio de 2023
 Cifras en Millones de Lempiras

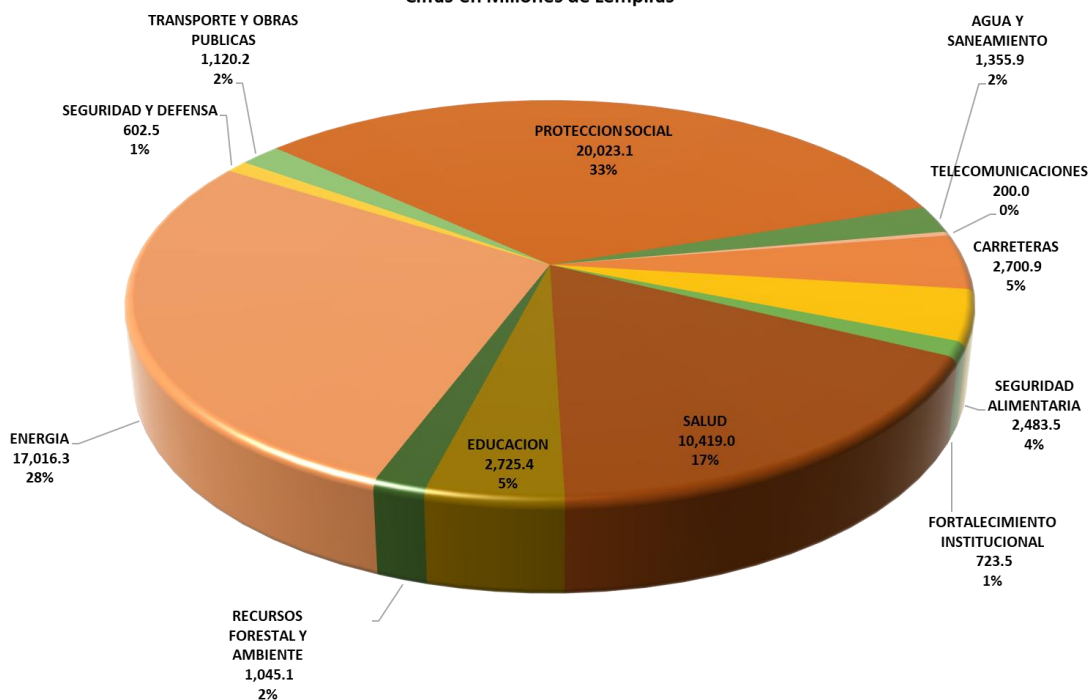

En cuanto a la inversión Sectorial, El Sector **Protección Social** con **L20,023.1 millones (33.1%)**, incluye los aportes en Transferencias Monetarias de la Red Solidaria, así como programas sociales, que incluye; merienda escolar, otras inversiones con la intervención en Acceso y mejoramiento de vivienda, Generación de Empleo, acceso a créditos a emprendedores, ayuda a grupos vulnerables,

Dirección General de Inversiones Públicas

apoyo a los centros de atención a adultos mayores y algunos proyectos ejecutados por el Fondo Hondureño de Inversión Social.

El **Sector Energía** cuenta con un monto de inversión **L17,016.3 millones (28.2%) de los cuales se ha ejecutado L4,513.3 millones (26.5%)**; para la ejecución de los proyectos de: Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral-Río Lindo, Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Regional (MER). Electrificación Rural en Lugares Aislados y Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica, así como, Subsidios focalizado hasta 75 y 150 KW, Subsidio de Combustibles e Inversión en generación de energía.

Seguido el **Sector Salud** con una inversión de **L10,419.0 millones (17.2%) y una ejecución de L1,720.7 millones (16.5%)**, para la cobertura de los servicios de salud y la red hospitalaria del País, a través de la contratación de gestores en el Primer Nivel y Segundo Nivel de atención y para la ejecución de los proyectos como la iniciativa regional de eliminación de la malaria, y la continuidad de los proyectos de respuesta a emergencia Honduras por el Covid 19, así como respuesta inmediata de salud pública para contener y controlar el coronavirus, el diseño y construcción de hospitales, además de la Red hospitalaria del País y la Adquisición de Medicamentos.

Seguido el **Seguridad Alimentaria** con una inversión de **L2,483.5 millones (4.1%) y un ejecutado de L2,165.8 millones (87.2%)**, en apoyo a la población más vulnerable, beneficiando a los agricultores mediante la cadena agrícola, a través de la ejecución de los principales proyectos: Proyecto COMRURAL, Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad, Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur Occidental Pro-Lenca y el Proyecto de inclusión económica y social de pequeños productores rurales en la región noreste de Honduras (PROINORTE). Asimismo, una inversión de L1000.0 millones, para el Bono Tecnológico Productivo con el propósito de garantizar la seguridad alimentaria, para beneficiar a 300,000 productores, en 17 departamentos (Priorizados Olancho y el Paraíso).

Seguido el **Sector Educación** con una inversión de **L2,725.4 millones (4.5%) con una ejecución de L262.2 millones (9.6%)**; ejecutando el Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y su Gestion Local (PROMINE), Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo (Proyecto Joven), asimismo, incluye Becas y Matrícula gratis.


El **Sector Carretero** con una inversión **L2,700.9 millones (4.5%) y una ejecución de L905.2 millones (33.5%)**, para la Construcción y Pavimentación con Concreto Hidráulico para varios Tramos Carreteros del país como ser: Siguatepeque - La Esperanza, Peña Blanca - Los Naranjos, Amapala - San Antonio de Cortés, la Carretera Central, Tramo: "Marale - Empalme Carretera Yoro; así como Obras de Mitigación para el Control de Riesgos Geotécnicos y Geológicos, y la reconstrucción del Puente Guacirope.

1.5 FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA GLOBAL

El 64.5% de la **Inversión Pública Global** del Presupuesto Vigente es financiado por fondos nacionales (Fuentes 11 Tesoro Nacional y 12 Recursos Propios) y el 35.5% por fondos externos; de estos el 97.1% es financiado por Crédito Externo (Fuente 21) y el 2.9% por Donaciones (Fuentes 22 Donaciones Externas, 23 Apoyo Presupuestario y 27 Alivio de la Deuda). Principalmente con recursos provenientes del BID, BCIE, BM, JICA, el Gobierno de España y el Gobierno Alemán.

En cuanto a la ejecución presupuestaria por fuente 30.6% corresponde a Fondos Nacionales, 26.7% a crédito Externo y 22.0% a Donaciones Ver Gráfico No. 4 y Cuadro No.5

Gráfico No.4
Inversión Pública por Fuente de Financiamiento
al 30 de junio de 2023
 Cifras en Millones de Lempiras

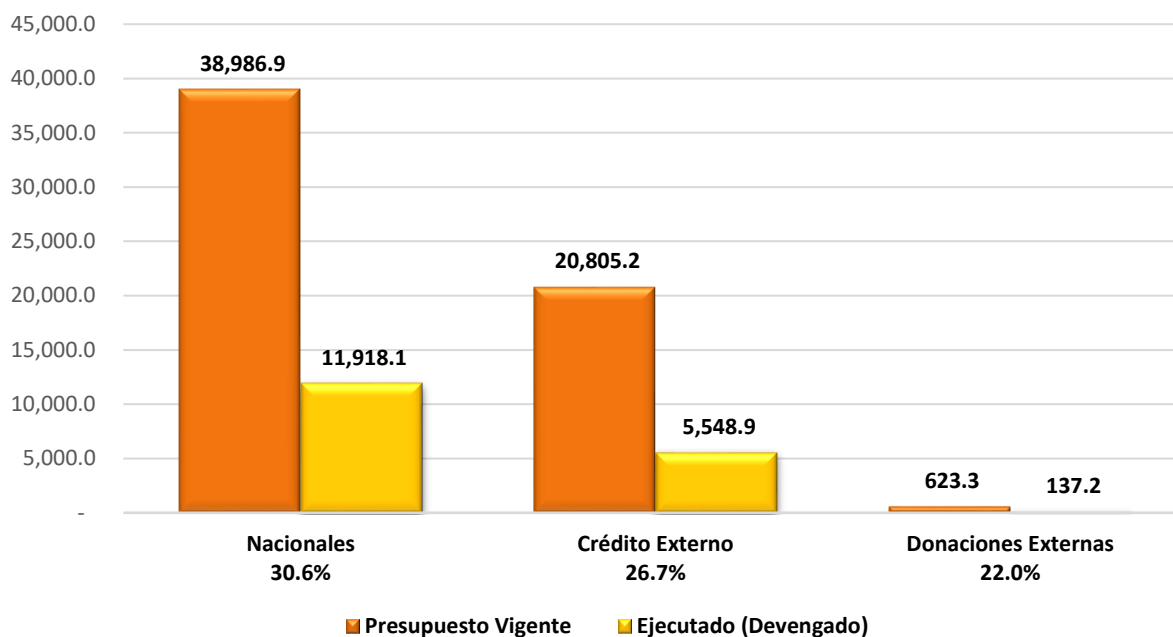

Cuadro No.05
Inversión Pública Global por Fuente de Financiamiento al 30 de junio de 2023
 Cifras en Millones de Lempiras

Fuente de Financiamiento	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución (Ejec./Vig.)
Nacionales	38,986.9	11,918.1	30.6
Crédito Externo	20,805.2	5,548.9	26.7
Donaciones Externas	623.3	137.2	22.0
Total, Plan de Inversión	60,415.4	17,604.2	29.1

Fuente: SIAFI, 30/06/2023

1.6 PROGRAMAS SOCIALES

Son aquellas intervenciones orientadas al Desarrollo Humano que están formuladas en programas institucionales y no están registradas en el SNIPH, y corresponden a Programas Sociales en beneficio de la población beneficiada. (no cuentan con un código BIP).

Al II trimestre de 2023, dichas inversiones han ejecutado L14,862.6 millones correspondientes al 31.8% de los recursos asignados. Dicha ejecución se concentra un 96.6% (L14,353.9 millones) en once instituciones como ser: el Fondo Hondureño de Inversión Social para la construcción y supervisión de obras de infraestructura escolar, el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal para la conservación de áreas protegidas y vida silvestre, la Secretaría de Salud para la provisión de servicios de salud de primer y segundo nivel de atención (Servicios Hospitalarios), la Secretaría de Agricultura y Ganadería para la ejecución de los Bonos Productivo, Cafetalero y

Dirección General de Inversiones Públicas

Ganadero en apoyo a la seguridad alimentaria, la Secretaría de Energía a través de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica para el otorgamiento de subsidios de energía de 75 y 150 Kwh; la Secretaría de Infraestructura y Transporte para la intervención de caminos productivos, la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento para la construcción y supervisión de nuevos proyectos, el Programa de Acción Solidaria para la entrega de la merienda escolar, el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo, el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio y el Instituto de Previsión Militar para el otorgamiento de beneficios de previsión y servicios sociales. Ver Cuadro No 2.

1.7 EJECUCIÓN HISTÓRICA PERÍODO 2019 - 2023:

Gráfico No.5
Inversión Pública, Ejecución Histórica
al 30 de junio / Período 2019-2023
Cifras en Millones de Lempiras



La ejecución total acumulada al 30 de junio fue de 2023 L17,604.2 millones (29.1%), respecto al presupuesto vigente L60,415.4 millones, registra una ejecución satisfactoria en comparación al año 2022, evidenciando para el año 2023, 19.1 puntos porcentuales arriba del 2022 (10.1). Esta ejecución se debe a que en algunas unidades ejecutoras sus presupuestos ya se encuentran alineados con las prioridades del Gobierno.

Por otra parte, para los años del 2019 al 2021 la ejecución porcentual promedio fue de 21.6% estando 7.5% debajo de la ejecución con relación al año 2023 que es de 29.1%.

1.8 EJECUCIÓN FÍSICA A NIVEL DE SECTORES:

Los avances al Segundo Trimestre de la ejecución física respecto al PIP y a Nivel de Sector se muestran a continuación:

1.8.1 Sector Carreteras:

Al Segundo Trimestre se registraron diferentes avances de ejecución de sus proyectos de construcción de carreteras ejecutados a través de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).

Proyectos ejecutados por la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT):

Al segundo trimestre de 2023, se detallan los avances físicos de los principales proyectos:

- ✓ **Construcción y Pavimentación de 15.33 KM con Concreto Hidráulico del Tramo Carretero: la Ena - San José de Río Tinto - Dulce Nombre de Culmí, subtramo: "Puente Río el Pataste - Dulce Nombre de Culmí" en el Departamento de Olancho. Fondos Nacionales.**

Durante el segundo trimestre, el proyecto realizó las siguientes actividades:

- Sub excavaciones a nivel de subrasante entre las estaciones 13+296 – 13+680 lado izquierdo y derecho con material de préstamo del banco localizado aproximadamente a 3.43 km de la estación 12+730 lado izquierdo
- Zanjeado y reubicación de agua potable de la zona de Dulce Nombre de Culmí, trabajos ordenados por administración delegada entre las estaciones 15+060 -15+336.60

El proyecto presenta un avance físico del 4.75% correspondiente a 0.73 kilómetros de carretera construidos y pavimentados.

- ✓ **Construcción y Rehabilitación Vial con Concreto Hidráulico del Corredor de Occidente, Tramo Carretero: "Naco - La Entrada" (79.1 km), Localizado en los Departamentos de Santa Bárbara y Copán; Fondos Nacionales.**

La ejecución física del proyecto es a través de tres sub tramos ubicados en el corredor de occidente, los cuales al 30 de junio de 2023 presentan el siguiente avance físico:

- Sub tramo Quimistan – Sula: Cuenta con una ejecución física de 0.12 km de carretera rehabilitada con un avance del 0.53% de la meta esperada en este sub tramo (23.0 km).
- Sub tramo Naco - Quimistan: Cuenta con una ejecución física de 0.82 km de carretera rehabilitada con un avance del 2.92% de la meta esperada en este sub tramo (28.2 km).
- Sub tramo Sula – La Entrada: Cuenta con una ejecución física de 0.39 km de carretera rehabilitada con un avance del 1.40% de la meta esperada en este sub tramo (29.9 km).

Por medio de este proyecto se espera la Construcción y rehabilitación de 81.1 km, de los cuales, al 30 de junio de 2023, se cuenta con 1.33 km rehabilitados, representando un avance físico del 1.64%.

- ✓ **Proyecto Obras de Mitigación para el Control de Riesgos Geotécnicos y Geológicos, por Deslizamientos y Desprendimientos de Roca de Taludes de corte en la Carretera CA5-Sur, Tramo "Moramulca", fase I; Fondos Nacionales.**

Durante el II trimestre de 2023, la empresa constructora realizó las siguientes actividades:

- Inicio de perforaciones en barreras.
- Perforación de anclajes de barreras.

Dirección General de Inversiones Públicas

- Preparación e Instalación de cable para anclaje pasivo.
- Anclajes D1 y D2 de barrera 5 del sitio 9.
- Instalación de los cables inferior e intermedio de las barreras 3 y 2 en la zona de impacto del proyecto.

Este proyecto es ejecutado por la empresa ICA INVERSIONES.

- ✓ **Rehabilitación con Concreto Hidráulico Sobre la Carpeta Asfáltica Existente del Tramo Carretero: Tegucigalpa - El Guanábano (RN15), Longitud 7.22 km (Salida a Olancho); Fondos Nacionales.**

El proyecto al cierre del II Trimestre de 2023 presenta un avance físico del 5.58% que corresponde a trabajos de terracería, drenaje transversal, excavación estructural, remoción de alcantarillas, muros de mampostería, mampostería para obras de drenaje, demoliciones, imprimación asfáltica, bacheo superficial, reciclado de estructura existente, rigidización de base y administración delegada.

Principales atrasos en la ejecución del proyecto:

- El tráfico que se genera por la ejecución de trabajos está dificultando las actividades de obra, esto ocasiona retrasos considerables, por lo que es necesario el apoyo oficial por parte de la policía de tránsito a tiempo completo para colaborar en el control vehicular.
- Es necesario efectuar la reubicación del sistema de fibra óptica de HONDUTEL y el sistema de agua potable de la UMAPS que afecta el avance de la ampliación a cuatro carriles.
- La instalación de nueva posteria para la reubicación del tendido eléctrico.

El Proyecto es ejecutado por empresa constructora William y Molina.

- ✓ **Construcción y Pavimentación con Concreto Hidráulico del Tramo Carretero: "Portillo del Lobo-Reitoca - Curarén" (39.54 km), Localizado en los Departamentos de Francisco Morazán y Choluteca; Fondos Nacionales.**

Durante el segundo trimestre, el proyecto realizó las siguientes actividades:

- Corte para el mejoramiento de pendiente y visibilidad de curva vertical en Km 4+300
- Excavación para instalación de postes de concreto línea primaria y secundaria entre Km 3 y Km 5.
- Instalación de retenidas en postes de concreto para la reubicación de las líneas primarias y secundarias del sistema eléctrico.
- Construcción de muro de concreto ciclópeo entre estaciones 0+618 a 0+625 lado derecho y construcción de muro entre estaciones 2+345 a 2+375.
- Instalación de alcantarilla de TCR de 30" en estación 3+420.
- Construcción de cunetas y acabado final de subrasante de estación 0+000 a 0+300.

El proyecto presenta un avance físico del 7.75% correspondiente a 0.99 kilómetros de carretera construidos y pavimentados.

El Proyecto es ejecutado por empresa constructora Cordon's Heavy Equipment.

Construcción y Pavimentación de 79.1 km con Concreto Hidráulico del Corredor de Oriente, Tramo Carretero: "Las Lomas - Terrero Blanco, Ruta 53" y Elaboración del Estudio y Diseño del Tramo Carretero: Ruta 119"; para la: Fondos Nacionales.

La etapa 1 del proyecto es ejecutada por la empresa SERMACO y a la fecha presenta una ejecución física del 12.63% que representa 3.0 kilómetros de carretera construida en el tramo Las Lomas – El Jicarito.

La etapa 2 del proyecto es ejecutada por la empresa COSCO y a la fecha presenta una ejecución física del 5.22% que representa 1.6 kilómetros de carretera construida en el tramo El Jicarito – Terrero Blanco.

✓ **Rehabilitación del Tramo Carretero: "Siguatepeque - La Esperanza" (67.00 Km), Localizado en los Departamentos de Comayagua e Intibucá; Fondos Nacionales.**

El proyecto se ejecutará por tramos a través de la contratación de la empresa PRODECON para el tramo Jesús de Otoro – La Esperanza (L 331,742,705.81) y la empresa SERMACO para el tramo Siguatepeque - Jesús de Otoro (L 320,574,128.50).

Tramo Carretero Siguatepeque – Jesús de Otoro: Presenta un avance físico del 0.85% que representa 0.27 kilómetros de carretera rehabilitada. Este tramo es ejecutado por la empresa SERMACO.

Tramo Carretero Jesús de Otoro – La Esperanza: Este tramo no presenta ejecución física debido a la falta de licencia ambiental. Sin embargo, se han realizado actividades como ser: levantamiento de secciones transversales, generación de curvas de nivel, generación de los peraltes existentes, entre otras actividades. Este tramo es ejecutado por la empresa PRODECON.

✓ **Programa Caminos Productivos**

El Programa Nacional de Intervención en Caminos Productivos, es una iniciativa del Gobierno de la República ejecutado por la SIT en respuesta a la necesidad de proyectos de infraestructura en los municipios del país, orientada al mejoramiento, fortalecimiento y construcción de infraestructura vial terciaria y vecinal a través de la ejecución de 4 tipos de proyectos: conectividad de caminos, cajas puentes, vados y alcantarillados, que permitan optimizar los procesos de distribución por parte de los sectores productivos del país.

Una vez firmado el Convenio Marco, La AMHON y SGJD por medio de las y los gobernadores, realizarán una socialización del Programa de Caminos Productivos. Las gobernaciones en conjunto con las municipalidades identificarán y priorizarán los proyectos para ejecutar en sus respectivos municipios para dar uso a los fondos disponibles de la SIT.

Tipos de proyectos a ejecutar por medio del programa Caminos Productivos:

- Caminos: Huellas de concreto, adoquinado, pavimento con empedrado
- Cajas Puente
- Vado
- Alcantarillado: Drenaje pluvial, Cunetas, Tubería para drenaje

Dirección General de Inversiones Públicas

Bajo este programa, la SIT ha realizado transferencias a 271 municipalidades con un monto devengado de L 537.3 millones al 30 de junio de 2023. Con lo cual impulsaran la economía de las comunidades mejorando el acceso a las zonas productivas del país.

1.8.2 Sector De Protección Social:

Los principales rubros de inversión están destinadas a inversión en desarrollo humano en las poblaciones más vulnerables. Al segundo trimestre las distintas Instituciones del Sector, registran los siguientes avances físicos:

Proyecto Ejecutado por la Red Solidaria

- ✓ **Proyecto de Apoyo a Poblaciones Vulnerables Afectadas por el Coronavirus (BID 5289/BL-HN) (organismo)**

Avance físico:

El proyecto al II trimestre de 2023 realizo las siguientes actividades.

- Se efectuaron 10,183 transferencias monetarias condicionadas (TMC) a hogares beneficiados de diversos municipios del departamento de Francisco Morazán. Actualmente en gestión de liquidación de estas por parte de BANADESA.
- Fortalecimiento técnico de seis (6) unidades ejecutoras del Programa de la Red Solidaria por medio de la contratación de personal.

Proyecto Ejecutado Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL):

- ✓ **Proyecto Fortalecimiento en el Sistema de Extracción, Almacenamiento y Distribución del Servicio de Agua Potable y afianzamiento de la Seguridad Alimentaria para mejorar las condiciones de salud y bienestar en los municipios de San Francisco de Becerra y Dulce Nombre de Culmí en el Departamento de Olancho, Fondos Nacionales.**

Avances físicos:

- El estudio, diseño y construcción de la planta potabilizadora de agua, en el casco urbano de San Francisco de Becerra, Olancho; la obra presenta un avance físico del 60%.
- Construcción de 1 tanque de almacenamiento de agua potable con capacidad de 50,000 galones, en el municipio de San Francisco de Becerra, Olancho; la obra presenta un avance físico del 54%.

Proyectos ejecutados por el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS):

- ✓ **Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB), (BID 4518/BL-HO):**

Los principales avances físicos al 30 de junio de 2023 son los siguientes:

- Mejoramiento de Barrios: Ejecución de obras del Proyecto de Integración Urbana en colonias Altos de la Quezada, La Huerta, Villas San Miguel, Brisas del Roble, y Altos del Mirador para un total de 633 predios; el monto del contrato es de L. 55,100,000.000 se tiene un avance físico del 81.50% que corresponde a la construcción de pozos e instalación de

Dirección General de Inversiones Públicas

tuberías del sistema de alcantarillado sanitario, instalación de tubería para el sistema de agua potable, construcción de cunetas y pavimentación de calles con un avance financiero del 74.4%.

- Programa de Deportes y Valores: en ejecución continua y participan aproximadamente 700 jóvenes de las colonias intervenidas por el programa.
 - Durante el trimestre, la joven Giselle Roque (19 años) beneficiaria del Programa, participó en las olimpiadas especiales en Berlín, obteniendo la medalla de Bronce en el salto largo sin impulso y 4to lugar en la carrera de 50 metros.
 - Capacitación y Empleabilidad: Al mes de junio de 2022 inició el curso de diseño gráfico a través de la fundación CADERH, donde finalizaron 15 participantes graduados en marzo del año 2023, al mes de junio del año 2023 a través de convenios con CADERH se están capacitando 17 personas en alfabetización digital.
- ✓ **Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras (PRE); IDA 6822-HN**

Los principales avances físicos al 30 de junio de 2023 son los siguientes:

- **Infraestructura Educativa:**

Al cierre del segundo trimestre, el proyecto ha realizado las siguientes intervenciones en el área de infraestructura educativa:

Tipo de Proyecto	Cantidad de Centros educativos	Monto de Inversión Cifras en Lempiras	Monto ejecutado Cifras en Lempiras
Reposición, reparación y ampliación	25	95,067,766.68	25,230,389.89
Proyectos nuevos (adjudicados)	11	74,308,862.15	9,852,297.81
Proyectos en reformulación	33	124,900,000.00	0.0
Proyectos próximos para reformular	41	134,503,621.56	0.0
Total Inversión		428,780,250.39	35,082,687.7

Según el criterio técnico de los especialistas asignados al proyecto, 74 proyectos serán reformulados según nuevos requerimientos y necesidades reales de los centros de educación.

- **Agua y Saneamiento:**
 - subproyectos de agua y saneamiento han sido evaluados y adjudicados en el segundo trimestre el año. El monto de contrato es de L80,013,832.68. Al cierre del segundo semestre se han ejecutado los anticipos, por un monto total de L16,694,229.82
 - 9 subproyectos de agua y saneamiento se encuentran en reformulación con un monto presupuestado de L. 274,282,300.00.
- **Infraestructura Vial:**
 - 8 subproyectos viales se encuentran en proceso de reformulación para incluir actividades de medidas ambientales y de mitigación. El monto de presupuesto es de L95,996,000.00.

-
- **Infraestructura en Salud:**
 - Un subproyecto de salud se encuentra en proceso de reformulación. El monto de presupuesto es de L. 5,500,000.00. indicar en que consiste ese subproyecto??

1.8.3 Sector Energía:

El Sector destina su inversión a la construcción, operación y mantenimiento de las centrales hidroeléctricas, inversión en obras relacionadas con la integración de Honduras al SIEPAC, electrificación de viviendas y transmisión eléctrica teniendo como propósito mejorar y ampliar la cobertura del servicio eléctrico para contribuir al crecimiento y desarrollo económico y social del país, mediante los Proyectos de Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral-Río Lindo, Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional (MER), Apoyo al Desarrollo Sostenible de las Energías Renovables, Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica, Electrificación Rural en Lugares Aislados y Sistemas Fotovoltaicos de la Red. Los avances al segundo trimestre se presentan a continuación.

Proyectos ejecutados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE):

- ✓ **Programa de Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional (MER), (BID 3103/BL-HO y GRT/SX-16864-HO):**

Durante este período se gestionó y obtuvo el último desembolso de la operación, previo a la fecha máxima establecida que era el 06 de julio de 2023.

Al finalizar el Segundo Trimestre de 2023, se recibió el último Informe de los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2022; mismo que fue remitido al BID mediante Oficio No.UCP-598-IV-2023 y atendido a través de documento O-CID/CHO-408/2023 que se recibió el 11 de mayo de 2023 sin observaciones al respecto; por lo que se da por cumplido el Artículo 5.03 de las Normas Generales del Convenio de Préstamo en referencia.

Asimismo, se culminó la consultoría para la elaboración del Informe de Evaluación Final de la operación, el cual se recibió en el mes de mayo de 2023 concluyendo que la clasificación de la eficiencia para el programa sería Excelente.

La operación tuvo precios bastantes competitivos que les permitió financiar actividades adicionales que son parte de la operación.

- ✓ **Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral - Río Lindo, (BID 3435/BL-HO y JICA HO-P6):**

Bajo el Convenio de Préstamo JICA HO-P6

- Se inició la ejecución de los trabajos para la Rehabilitación y Repotenciación de la Central Hidroeléctrica Río Lindo correspondientes al Lote 2 para la adquisición e instalación de los equipos Principales y Auxiliares, según Contrato No.77/2022 a ejecutarse en un periodo de 48 meses.
- Se continúa avanzando en los trabajos para la Rehabilitación y Repotenciación de la Central Hidroeléctrica Cañaveral correspondientes al Lote 1 para la adquisición e instalación de los equipos Principales y Auxiliares, según Contrato No.122/2021; logrando un avance físico

Dirección General de Inversiones Públicas

acumulado del 15% que incluye avances en las actividades de ingeniería de detalle y avance de suministros.

- Se inició el proceso Licitación Pública Internacional para la Contratación de las Obras Civiles de las Centrales Hidroeléctricas de Cañaverall y Río Lindo (Lote III-Paquete 1), actualmente en etapa de evaluación de ofertas.

Bajo el Convenio de Préstamo BID 3435/BL-HO

- Durante este período se recibió el último Informe de los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2022, mismo que fue remitido al BID mediante Oficio No.UCP-621-IV-2023 y atendido a través del documento O-CID/CHO-411/2023, el cual se recibió el 11 de mayo de 2023 sin observaciones al respecto; por lo que se da por cumplido el Artículo 7.04 de las Normas Generales del Convenio de Préstamo en referencia.
- Se concluyó el Informe de Evaluación Final de la operación, el cual se remitió al BID mediante Oficio UCP-340-II-2023 el día 27 de febrero de 2023.
- La ejecución de la operación fue exitosa y mantuvo una calificación satisfactoria durante la vida del proyecto, generando incluso ahorros que permitieron realizar inversiones complementarias.
- ✓ **Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica (BID 4598/BL-HO 4599/SX-HO):**

Por medio del proyecto, al segundo trimestre de 2023 se han ejecutado las siguientes actividades:

- Inicio de ejecución de obras para la Construcción de las Subestaciones Eléctricas:
 - La Victoria y Calpules
 - El Sitio
- Inicio de ejecución de obras para la ampliación de las siguientes Subestaciones Eléctricas:
 - San Pedro Sula Sur
 - Santa Marta
 - El Progreso
 - Bermejo
 - La Puerta
 - Circunvalación
 - Comayagua
 - Villanueva
 - Zamorano
 - San Buenaventura
 - Miraflores
 - Laínez
 - Bella Vista
 - Toncontín
 - Siguatepeque
 - Choloma
 - San Pedro Sula Sur

- Inicio de ejecución de obras para la Construcción de la línea de transmisión doble terna en 230 kV entre las Subestaciones San Pedro Sula Sur-Progreso según Contrato 125/2022 (Lote 2-Paquete 3).
- Construcción de Línea de Transmisión Terna Sencilla en 138 kV entre las Subestaciones Eléctricas Miraflores-Laínez.
- Construcción de Línea de Transmisión Terna Sencilla en 138kV entre las Subestaciones Eléctricas Bellavista y El Centro
- Durante este periodo, se concluyó la auditoria a los estados financieros de los Prestamos 4598/BL-HO y 4599/SX-HO correspondientes a la gestión 2022, cuyo informe fue remitido al BID en cumplimiento a lo establecido en las Normas Generales de ambos Convenios.

1.8.4 Sector Educación:

Este sector apoya la mejora de la calidad educativa a través de la capacitación a docentes, construcción de Aulas mediante los proyectos de Infraestructura escolar y Proyecto de Mejora de la Calidad educativa (proyecto Joven), Proyecto: “Mejoramiento de la Calidad de la Educación Prebásica en Honduras. Los avances al segundo trimestre en los proyectos son los siguientes:

Proyecto Ejecutado por Secretaría de Educación:

- ✓ **Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y de su Gestión Local (PROMINE) FASE IV y V:**

Para el segundo trimestre, se realizaron las siguientes actividades en la gira de supervisión:

- Visitas de supervisión, verificación de calidad de materiales, Calidad de Obra, Porcentajes de avance, verificación de Normativa, verificación de actividades de proyectos, construcción de huertos educativos y productivos.
- Recepción y seguimiento de expedientes de Legalización correspondientes a Centros Educativos del Programa PROMINE.
- Visitas de Pre-Factibilidad Técnica y Social de proyectos priorizados de la Fase V.

Proyecto Ejecutado por el Fondo Hondureño de Inversión Social:

- ✓ **Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar” (PROMINE KFW Fase II):**

Al cierre del segundo trimestre de 2023, se finalizó la ampliación y rehabilitación de los siguientes Centros de Educación Básica:

No.	Centro de Educación Básica	Actividad realizada	Municipio	Departamento
1.	Jesus María Rodriguez	Ampliación	San José	Copán
2.	La Independencia	Ampliación	San José	Copán
3.	Pedro Nufio	Ampliación	Intibucá	Intibucá
4.	Lucila Perez Estrada	Rehabilitación	La Unión	Lempira
5.	Hector Juárez	Rehabilitación	La Unión	Lempira

Estas intervenciones generaron 89 empleos y beneficiaran 709 estudiantes.

✓ **Proyecto: “Mejoramiento de la Calidad de la Educación Prebásica en Honduras” (IDA 6560-HN):**

Al segundo trimestre de presentan las siguientes actividades realizadas por el proyecto:

- Se ha continuado desarrollando talleres bajo la modalidad virtual en el marco de las sesiones Introductorias de las Mesas de Trabajo denominadas: “Avanzando por la Calidad de la Educación Prebásica en Honduras”, donde han seguido participando las unidades de líneas de la Secretaría Educación que están involucradas con el proyecto
 - Se ha tomado a bien crear alianzas estratégicas con actores claves comunitarios con el propósito de priorizar acciones dirigidas para el fortalecimiento de la educación prebásica en cada municipio focalizado por el proyecto.
 - En proceso de contratación 20 ingenieros supervisores, mismos que darán seguimiento a la ejecución de la construcción, rehabilitación y/o ampliación de las 52 aulas.
 - Contratados los cuatro Consultores Especialistas en Verificación y Cumplimiento de Estándares Técnicos de Obras, estos consultores garantizarán el cumplimiento de la normativa establecida en el manual para la planificación y diseño de centros educativos (MPDCE).
- ✓ **Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras (MIFE); BCIE 2239:**

Los principales avances físicos al 30 de junio de 2023 son los siguientes:

Por medio del proyecto, se están ejecutando 25 reparaciones en centros de educación básica en los departamentos de Olancho, Santa Bárbara y Comayagua, generando 308 empleos.

Proyecto Ejecutado por el Programa de la Red Solidaria:

- ✓ **Proyecto Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven, (BID 4449/BL-HO):**

Avance Físico:

- Suscripción del Convenio interinstitucional con el Instituto Hondureño de Educación por Radio (IHER), para la modalidad flexible presencial, con el cual se da continuidad de atención en el tercer ciclo para el año 2023. dicho convenio beneficiará un máximo de 5,008 estudiantes pertenecientes al octavo y noveno grado. Los estudiantes contarán con la dotación de un paquete didáctico, el convenio contempla el pago a 200 docentes en promedio.
- La ampliación de cobertura educativa del tercer ciclo de Educación Básica en el occidente del país avanzó con la construcción de módulos de 3 aulas para la atención de tercer ciclo de Educación Básica, concluyendo 15 Centros de Educación Básica ubicados en diferentes municipios de los Departamentos de Santa Bárbara, Lempira, Intibucá, Ocotepeque y Copán, las obras fueron supervisadas directamente por personal de la UPE de PRS.
- En preparación nueva propuesta técnica de documento de licitación para el lanzamiento de la implementación de 35 Centros de Educación Básica la (CEB) y la Rehabilitación de 09

centros educativos, la adjudicación del contrato de las obras se programa para noviembre 2023 y pago del anticipo para diciembre 2023.

- Avances en la actualización de los términos de referencia para el proceso de contratación de 18 consultores individuales cuya función principal será la supervisión en la construcción de 35 Centros de Educación Básica (CEB) y la Rehabilitación de 09 Centros Educativos (CE).
- En el marco del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Secretaría de Educación y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) se ha iniciado con la implementación del Programa de Formación Docente para la Innovación en el Tercer Ciclo de la Educación Básica dirigido a 2,708 docentes, directores, supervisores, gestores educativos, tutores y facilitadores que laboran en el tercer ciclo de la educación básica del área de influencia del proyecto. A la fecha se concluyó con la formación de 224 docentes, directores, supervisores y gestores educativos.
- Como parte de la capacitación a los docentes, la Secretaría de Educación ha definido que se utilizará y fortalecerá la plataforma IBERTEL, para lo cual se logró incluir el “Diplomado en Innovación Educativa para el Tercer Ciclo de Educación Básica” diseñado con la UPNFM.

1.8.5 Sector Salud:

Sus intervenciones van orientadas al mejoramiento y cobertura de los servicios de salud y la red hospitalaria del País, a través de la contratación de gestores en el Primer Nivel y Segundo Nivel de atención mediante el proyecto de Mejora de la Gestión y Calidad de los servicios de salud materno-neonatal, Proyecto Respuesta Inmediata de Salud (RISP) para Contener y Controlar El Coronavirus (COVID – 19) y Mitigar su Efecto en la Prestación del Servicio, en Honduras.

Proyectos Ejecutados por Secretaría de Salud (SESAL):

- ✓ **Proyecto de Respuesta a Emergencia Honduras COVID-19 (IDA 6626-HN / IDA 6868-HN):**

Por parte de la Unidad Ejecutora Protección de la Salud Honduras (PROSALH), se reporta avances físicos en función de la matriz de resultados del proyecto, descritos a continuación:

- 92% camas de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) prioritarias totalmente equipadas y operando.
- 60% de la población vacunada contra la COVID-19 por grupo priorizado definido en el Plan Nacional de Introducción de la Vacuna contra el COVID-19 (Población 1ra dosis: 6,502,601; Población 2da dosis: 5,760,184).
- Laboratorio designado con equipos de diagnóstico, kits de pruebas y reactivos de COVID-19 (meta 1 laboratorio)
- 100% de centros de salud prioritarios que reciben el volumen completo de equipos de protección personal (EPPs) previsto en el proyecto.
- 63.9% de mujeres contratadas en puestos de liderazgo relacionados con la vacunación que han sido creados con financiamiento del proyecto.
- Actualmente se encuentra en proceso de implementación de la Tecnología de Papel Inteligente (SPT) en la Región Metropolitana del Distrito Central.

Dirección General de Inversiones Públicas

- Actualmente se encuentra en funcionamiento el formulario de Quejas, Reclamos y Sugerencias en línea <https://prosalh.hn/quejas-y-reclamos/>
- ✓ **Programa Respuesta Inmediata de Salud para Contener y Controlar El Coronavirus (COVID-19) y Mitigar su Efecto en la Prestación del Servicio, en Honduras (RISP-HO-2):**

Al II Trimestre, la Unidad Ejecutora de Proyectos BID (GESALUD), reporta una ejecución física del 51% y financiero del 54% (con relación al monto contratado de US\$53.82 millones) los avances por componentes se describen a continuación:

- Componente 1: Conducción de la respuesta a nivel del país: consultorías en apoyo a las intervenciones del programa, para apoyo financiero y monitoreo.
- Componente 2: Detección y seguimiento de casos: Se inició el proceso de adquisición de reactivos para el Laboratorio Nacional a través de una licitación pública internacional (LPI).
- Componente 3: Interrupción de la Cadena de transmisión: En proceso la adquisición de plantas eléctricas y Banco de Transformadores para almacenes de biológicos.
- Componente 4: Mejoramiento a la capacidad de provisión de servicios: Pagos del personal médico contratado (176 contratos firmados) a nivel nacional en la atención Hospitalaria: 16 ayudantes de enfermería, 41 Auxiliares de enfermería, 3 microbiólogos, 55 licenciados en enfermería, 1 médico anesthesiologo, 1 médico cirujano, 3 médicos internistas, 2 médicos pediatras, 2 médicos Gineco obstetra, 45 médicos generales, 2 técnicos de Laboratorio Clínico, 1 técnico en anestesia y 4 técnicos en radiología; 1 especialista en infraestructura hospitalaria.

1.8.6 Sector Seguridad Alimentaria

Los principales rubros de inversión están enfocados en la ejecución de Planes de Negocios, implementación de Sistemas de Riego, el incremento de los ingresos de las poblaciones rurales en el Corredor Seco a fin de prepararse para los efectos del cambio climático y abordar la inseguridad alimentaria. Al segundo trimestre del año 2023 las distintas Instituciones del Sector, registran los siguientes avances físicos:

Proyectos Ejecutados por Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG):

- ✓ **Proyecto de Inclusión Económica y Social de Pequeños Productores Rurales en la Región Noreste de Honduras (PROINORTE), FIDA-No.2000002595, OPEC- No. 13754P.**

En el segundo trimestre de 2023 se contrató a la empresa CADERH para llevar a cabo el proceso de reclutamiento y selección del personal técnico de la Unidad Gerencial del Proyecto (UGP), en el mes de junio se realizó el taller de arranque del proyecto con el objetivo de realizar la inducción al equipo de la UGP y UAP/SAG, sobre los aspectos estratégicos, técnicos, operativos, administrativos y fiduciarios para el cumplimiento de los objetivos y resultados del proyecto.

✓ **Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur Occidental Pro-Lenca (FIDA-I-899-HN)**

En cuanto al Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones Rurales las intervenciones del proyecto al segundo trimestre del 2023 se creó la implementación en campo de 60 planes de inversión; las inversiones están orientadas en los rubros de hortalizas, avicultura, granos básicos, café, papa, MiPymes.

En cuanto a los convenios suscritos con las organizaciones (hombres, mujeres, jóvenes y etnias) beneficiadas para el financiamiento de sus planes de inversión, se firmaron 25 convenios por parte de la organización beneficiaria y la máxima autoridad de la SAG. Para el Desarrollo Productivo y de Negocios se generaron 50 procesos de desembolsos para 25 organizaciones, así como el seguimiento en campo de las organizaciones que están en proceso de ejecución de su plan de inversión y en proceso de cierre técnico. Se sigue de la mano con 100 asistencias técnicas en temas administrativos y financieros brindadas a familias productoras agremiadas en Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (FIDA II).

Se realizó una consultoría para la elaboración del informe de cierre de proyecto. Este informe es realizado mediante un enfoque participativo. Representará una síntesis de hechos, opiniones y puntos de vista recopilados por la firma consultora e identificará sus hallazgos a través de la triangulación de la información obtenida de las diferentes fuentes de información, que también representarán los medios de verificación.

✓ **Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad 4940/BL-HO (HO-L1211) y 4936/BL-HO (HO-L1201).**

Se dio continuidad al proceso de negociación con la firma mejor puntuada para concretar el contrato de implementación. En el componente 2, se solicitó 1) la rescisión y liquidación del contrato de fondos de fideicomiso suscrito entre INVEST-H y BANHPROVI. 2) la presentación por parte de BANHPROVI de la propuesta de la nueva figura del fondo de crédito y garantía, 3) la identificación del mecanismo administrativo para que los fondos pasen directamente del fideicomiso actual a la nueva figura acordada con la SAG, y 4) la definición conjunta de los mecanismos y procedimientos operativos del fondo de crédito y garantías, los cuales se reflejarán en el reglamento operativo del proyecto.

En el tema de comunicaciones, la SAG aprobó una propuesta de marca para el mercadeo social del proyecto acordando el nombre de “Pro-Occidente”, con los lineamientos de comunicación y visibilidad del Gobierno de la República. Se elaboró y publicó en el sitio WEB y redes sociales del proyecto, 21 buenas prácticas que se promoverán entre los productores beneficiarios.

Se brindó asistencia técnica a 97 productores para la elaboración de planes con adopción de tecnologías CI, en los 6 departamentos cobertura del proyecto, 10 municipios y 22 aldeas. Se identificó a 18 MIPYMEs de los que 07 son lideradas por mujeres y 2 como iniciativas de jóvenes productores.

✓ **Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II) IDA-6448-HN.**

Durante el II trimestre de 2023, el proyecto realizó las siguientes actividades:

- Registro en el SIG el seguimiento operativo y financiero de los 52 planes de negocios ratificados y desembolsados a la fecha.
- Se diseñó e implementó con éxito los formularios para el levantamiento móvil utilizando la aplicación ODK Collect alojando los datos en el servidor de KoboToolBox.

Dirección General de Inversiones Públicas

- Al tercer trimestre se espera registrar los informes trimestrales presentados por los PSDEs, de acuerdo con los contratos tripartitos, una vez que se logre el desembolso por cada producto dando cumplimiento en el marco de los indicadores establecidos en el proyecto.

1.8.7 Sector Recursos Forestales y Ambiente:

Proyectos Ejecutados por el Programa de la Red Solidaria

- ✓ **Proyecto Manejo Sostenible de Bosques Crédito BID 3878/BL-HO:**

Avance Físico:

- Implementación de los Planes de Restauración-PR en bosques públicos es: 38 planes de restauración (PR) aprobados, equivalentes a 32,475.25 hectáreas, lo que representa un 95.5% con relación a la meta del proyecto (34,000 has).
- Cargadas en la plataforma del SIGMOF-ICF la cantidad de 32,000 ha en proceso de restauración.
- Entregadas la totalidad de la segunda compra de herramientas y equipo para la protección forestal a 10 organizaciones beneficiarias.
- Finalizado el Diseño Operativo del Banco de Semillas de Honduras (BANSEFOR) del ICF.
- Aprobación por el Comité de Gestión de las Investigaciones presentadas por FHIA, UNAH y CURLA/FUCSA estudios sobre especies que afectan a mayor escala en viveros y plantaciones forestales.
- Firmada Carta Acuerdo entre PRS, ICF y ZAMORANO para el desarrollo de la investigación resiliencia del ecosistema de Pinus al ataque del gorgojo descortezador en función de la densidad y su correlación con otras variables biofisiográficas.
- Recepción de equipo médico y de laboratorio para fortalecer la capacidad operativa del SAT.
- En ejecución el III Semestre de la Maestría en investigación en ciencias forestales con la participación de 4 funcionarios del ICF.

Proyectos Ejecutados por el Programa Secretaría de Recursos Naturales y Ambientes

- ✓ **Programa Nacional de Reforestación y Protección de Cuencas Hidrográficas “Padre Andrés Tamayo”**

Avance Financiero:

- Al II Trimestre del año 2023 fueron ejecutados L144,689,518.03, cumpliendo con un 57% de lo programado a ejecutar que eran L252,531,754.

II-TRIMESTRE ABRIL-JUNIO DEL AÑO 2023			
INSTITUCIÓN	TOTAL, A EJECUTAR	EJECUCIÓN	PORCENTAJE
SERNA	L18,089,824.91	L10,283,622.03	57%
ICF	L67,286,034	L0.00	0%
SEDENA	L33,221,063.00	L33,221,063.00	100%
FEMA	L33,934,833.00	L33,934,833.00	100%
ALCALDIAS	L100,000,000.00	L67,250,000.00	67%
	L252,531,754.91	L144,689,518.03	57%

Avance Físico:

- Inicio a los procesos de adaptación de familias taxonómicas en el Jardín Botánico, se programó una gira que se realizó del 02 al 05 de mayo del año en curso, en el departamento de Olancho en el municipio de Gualaco, como resultado de esta actividad se logró recolectar 6 familias que incluye 15 especies diferentes.
- El PPAT, a través del encargado del Proyecto Flor Nacional Rhyncholaelia, colectó (3) tres especímenes y (1) una cápsula, superando la meta de dos especímenes, propuestos en el segundo trimestre.
- Se realizaron inspecciones de reconocimiento de nuevos sitios e inventario de poblaciones de Rhyncholaelia, cumpliendo con los requisitos solicitados por el Departamento de Vida Silvestre del ICF para la colecta de especímenes y cápsulas.
- El equipo técnico alcanzó una ejecución del 100% en la adquisición de semillas para la producción de viveros de Teosinte.
- 226 personas sensibilizadas distribuidas entre la Secretaría de Finanzas (90 empleados de dicha Secretaría) y el Instituto Nacional de la Juventud en compañía de los estudiantes del Instituto Técnico Santa Cruz (136 estudiantes)
- Remoción de 204,900 libras de especies vegetales acuáticas mediante contrato de 20 jornales en los meses de abril y mayo, superándose la meta programada.
- 193,500 libras de especies vegetales acuáticas removidas mediante voluntarios gestionados por el despacho ministerial de la SERNA y el PPAT.

1.8.8 Transporte y Obras Públicas:

Proyecto Ejecutado por la Comisión Nacional del Deporte Honduras (CONDEPOR):

- ✓ **Proyecto: Diseño, Construcción y Remodelación de Instalaciones y Espacios físicos de Actividades Deportivas y Recreativas, para uso de la Población a Nivel Nacional.**

Al segundo trimestre 2023 se cuenta con una ejecución física global del 34% en donde por componte se ha ejecutado el 75% en el Fortalecimiento Institucional; 60% Construcción de 13 Canchas Deportivas de futbol 11, 2 canchas de futbol 7 con grama sintética y 15 canchas de polideportivos bajo techo (multiuso) de las cuales se finalizaron 5 canchas y se están construyendo 24 canchas, se espera que 12 de ellas sean recepcionadas a inicios del tercer trimestre del año; 14% en Mejoras y Remodelación de Estadios a Nivel Nacional que corresponden a la instalación de la

grama corresponden a un 99.28% asimismo; está pendiente la ejecución del Acondicionamiento y Equipamiento de Local Dentro del Estadio Nacional para la implementación de una Maquila para Confección de Uniformes Deportivos Escolares, en el Estadio Francisco Morazán, se ha realizado la ejecución (34%) de obra correspondiente a la instalación de la grama.

1.9 FACTORES QUE HAN INCIDIDO EN LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA, PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Durante la ejecución de programas y proyectos, se presenta una serie de obstáculos que limitan la normal ejecución de estos, en términos físicos y financieros, sin cumplir el objetivo esperado, y por ende la ausencia de impacto en la población meta. Entre los problemas relevantes sobresalen:

Área	Problemas	Acciones
Técnica	La inadecuada planificación por parte de las unidades ejecutoras de proyectos, ocasiona reprogramación de metas, lo que implica solicitar al Organismo Financiado No Objeción (en caso de los fondos externos), ocasionando retrasos en la ejecución.	Brindar por parte de la DGIP, asistencia técnica a las instituciones gubernamentales en la identificación, formulación y evaluación de proyectos.
	Lentos procesos de adquisiciones y contrataciones, en la mayoría de las unidades ejecutoras, desfasando la ejecución oportuna de los proyectos.	Realizar una revisión de los posibles puntos débiles en los procesos de adquisiciones, prever tiempos para cada proceso y tomar en cuenta los tiempos que estipulan los organismos de financiamiento.
Administrativa-Financiera	Falta de un mecanismo para acelerar las exoneraciones de impuestos que están sujetos los proyectos de inversión.	Implementar acciones con la Dirección General de Franquicias Aduaneras, para mejorar la atención a las gestiones de proyectos y otorgar una respuesta oportuna a las unidades ejecutoras.
	Algunos proyectos del FHIS que incluyen componentes relacionados a centros educativos no se han atendido debido a que las Unidades Ejecutoras de los Proyectos expresan que la Secretaría de Educación (SEDUC) no permite intervenir centros educativos que no se encuentren debidamente legalizados a nombre de la SEDUC, lo cual ha generado un retraso significativo en la ejecución de estas obras en el área educativa.	Proponer y remitir al Soberano Congreso Nacional la legalización automática de terrenos en donación, a nombre de las Alcaldías, entre otros casos, que cuentan con un centro educativo dentro del predio para que sea legalmente reconocidos a nombre de la SEDUC, o en su defecto llegar a un acuerdo con SEDUC para intervenir centros educativos que no estén legalizados sus terrenos.

Área	Problemas	Acciones
Legal	El cambio de Autoridades en las Unidades Ejecutoras de proyectos genera lentos procesos como ser: delegación de firmas, solicitudes de desembolsos, pagos a Proveedores, y falta de aprobaciones de Cuotas de Compromiso para efectuar pagos. Caso Proyectos de la Red Solidaria.	La Unidad Ejecutora tendrá que agilizar los trámites de delegación de firmas antes los organismos y la SEFIN, así como revisar su programación de pagos, relacionados a sus planes de adquisiciones y presupuestos.
	Los proyectos de construcción y rehabilitación de carreteras requieren de la emisión de licencias ambientales para el inicio de obras la cual ha generado atrasos por su tardía aprobación.	La Unidad ejecutora deberá revisar cuales han sido los puntos críticos para que las licencias no sean aprobadas a la brevedad posible, con ello abordar las debilidades en la documentación presentada. Así mismo, se deberá tener un acercamiento con la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA)

Asimismo, se detallan otras circunstancias referentes a la baja ejecución del año 2023,

Falta de incorporar la totalidad de los fondos aprobados debido a:

- Convenios de préstamo de Proyectos en etapa de negociación ante organismos financieros internacionales y fuentes de financiamiento internas.
- Algunas propuestas de proyectos no cumplen de acuerdo con la normativa SNIPH siendo estas actividades recurrentes de la institución por lo que serán ejecutados dentro de programas institucionales.
- El cambio de prioridades por las autoridades de cada institución para ejecutar los recursos inicialmente formulados / aprobados para el PIP 2023.
