

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e
Inversión Pública



Informe de Avance Físico y Financiero

AL III TRIMESTRE 2023

**Secretaría de Desarrollo Comunitario
Agua y Saneamiento
(SEDECOAS/FHIS)**

Tegucigalpa, Honduras

Octubre, 2023

Ejecución al III Trimestre 2023
Secretaría de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento



DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

IV. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

4.1 EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

La Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS) - Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), cuya finalidad es la de promover el mejoramiento de las condiciones de vida de los grupos sociales marginados en el área rural y urbana, mediante el otorgamiento de financiamientos para programas y proyectos de desarrollo social o económico, con el propósito de aumentar su productividad, sus niveles de empleo y de ingresos y de contribuir a la satisfacción de sus necesidades básicas.

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2023
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	1,147,848,393
Presupuesto Vigente	1,727,250,664
Ejecutado III Trimestre	385,188,788
% Ejecución (Devengado III Trim-2023/Vigente)	22%
Ejecutado (Devengado Anual)	738,526,762
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	43%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	882,398,739
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	51%

Fuente: SIAFI, 30/09/2023


El “Plan de Gobierno para la Refundación de la Patria y Construcción del Estado Socialista y Democrático (2022 – 2026)”, ha considerado dentro de sus prioridades atender proyectos enfocados a programas sociales y apuntar a los siguientes objetivos; En materia de Educación lo siguiente: un Sistema capaz de brindar educación gratuita y universal, reinstaurando la Matrícula Gratis y una merienda idónea, rehabilitar y repotenciar al menos el 50% de la infraestructura escolar durante el segundo año de gobierno, llegando al 100% en el tercer año de gobierno, mediante mecanismos de participación comunitaria apoyada desde el municipio y el gobierno central entre otros.

En materia de Protección Social se ampliará y fortalecerá programas de asistencia como las transferencias en efectivo que se focalizarán mejor a fin de que realmente lleguen a sectores de la población en extrema pobreza, sin corrupción ni manipulación.

Al tercer trimestre del año 2023, la institución contó con un presupuesto vigente de inversión pública de **L1,727.3 millones** y la ejecución presupuestaria del trimestre asciende a un monto de **L385.2 millones** lo que representa el 22% con relación al presupuesto vigente, tal como se detalla en el Cuadro No. 1.

Dicha ejecución se llevó a cabo a través de (9) nueve proyectos enfocados en Agua y Saneamiento, Electrificación Rural y Caminos Rurales, Infraestructura Social, Infraestructura Escolar, Fortalecimiento de Capacidades para Jóvenes, Recuperación de Espacios Públicos y Mejora de la Infraestructura Básica. Ver Detalle de Ejecución Financiera en Anexo No. 4.

Gráfico No. 1
Presupuesto Vigente
SEDECOAS/FHIS: Financiamiento por Organismo
 Cifras en millones de Lempiras

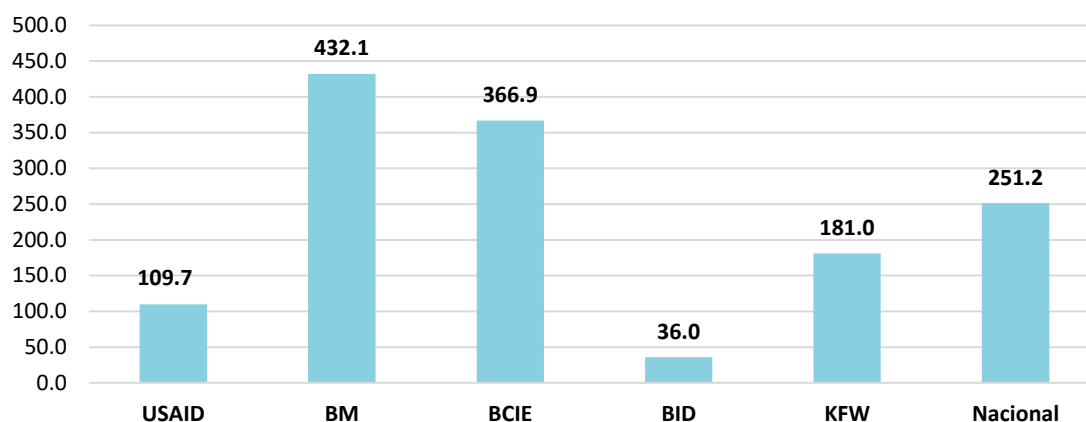


En referencia al financiamiento de Inversión Pública, el 64.9% corresponde a fondos provenientes de crédito externo expresado en términos monetarios con un monto de **L893.2 millones**, el 16.9% a recursos de donaciones externas con un monto de **L232.6 millones**; y 18.2% con fondos nacionales con un monto de **L251.2 millones**, incluye contraparte nacional que corresponde a gastos operativos de proyectos, sumando un monto total en el presupuesto vigente de **L22.1 millones** equivalente a 1.6% del presupuesto vigente. Dicha inversión es financiada por el BCIE con el **26.6%**, Banco Mundial con **31.4%**, KfW |Banco Alemán con **13.1%**, BID con el **2.6%**, USAID con el **8.0%** y Tesoro Nacional con el **18.2%**.

4.2 COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN AL III TRIMESTRE (2019-2023):

En los años 2019 al 2023, los proyectos de Inversión Pública de la SEDECOAS/FHIS ha considerado la ejecución de al menos 12 Proyectos de Inversión, de los cuales se han financiado el 68% con recursos de crédito externo, 28% recursos de donación externa y el 4% restante con recursos del Tesoro Nacional como contraparte de dichos Proyectos.

Gráfico No. 2
Comportamiento de la Inversión Pública
Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)
Al 30 de Septiembre 2019-2023
 Cifras en Millones de Lempiras

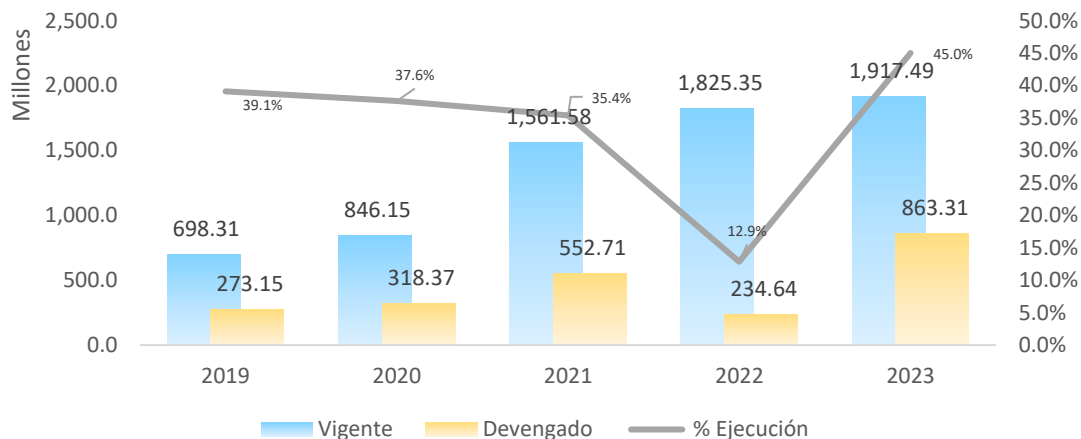

La Gráfica No.2 muestra la ejecución porcentual comparativa de los últimos años al 30 de Septiembre, el pico más alto se registra en el presente ejercicio fiscal, para el año 2021 se incorporaron al presupuesto nuevos programas entre ellos para atender la reparación y rehabilitación de escuelas y para proyectos de infraestructura en las zonas afectadas por Eta e Iota, sin embargo, pese a tener suficientes recursos la ejecución para los años 2021 y 2022 se vio mermada por la crisis ocasionada durante y post pandemia del COVID-19, en el 2021, así como cambio de nuevo gobierno en el 2022, entre otras. Cabe mencionar que la baja ejecución en los meses anteriores del 2023 se debe en parte a procesos engorrosos de los organismos financiadores y falta de planificación, así como la falta de personal esencial en las unidades ejecutoras.

4.3 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión en el tercer trimestre del año 2023 se concentró en los siguientes proyectos:

- 1 Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y su Gestión Local (PROMINE).
- 2 Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB).
- 3 Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras (MIFE).
- 4 Proyecto Convivencia y Espacios Seguros para los Jóvenes en Honduras (CONVIVIR).
- 5 Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras (PRE).
- 6 Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (ICS).
- 7 Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras (PIOH).
- 8 Proyecto Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Ciudad de Gracias, Departamento de Lempira

9 Programa de Mejoramiento de la Infraestructura de Desarrollo Social y Comunitario en Varios Departamentos de Honduras.

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros de los principales proyectos de acuerdo con su presupuesto vigente:

1. Programa Modernización de la Infraestructura Educativa (PROMINE)

PROMINE tiene por objetivo general fortalecer la rectoría Sectorial en Infraestructura Educativa de la Secretaría de Educación y la gestión local participativa, así como mejorar el acceso de los alumnos de las comunidades pobres al Centro Educativo de calidad que operan de manera sostenible. De esa manera se pretende contribuir al aumento de la eficiencia y de la calidad del sistema educativo (pre-básico y básico).

Los principales avances físicos al 30 de Septiembre de 2023 son los siguientes:

Cantidad	Subproyecto	Intervención	Municipio	Departamento	Empleos	Beneficiarios	Estado
1	CEB JESUS MARIA RODRIGUEZ Y CEPB LA INDEPENDENCIA	Ampliación	San José	Copán	29	223	Finalizado
1	CEB CRUTA Y JN EN MARCHA	Ampliación	Jesús de Otoro	Intibucá	33	244	Finalizado
1	CEB LUCILA PEREZ ESTRADA Y CEPB HECTOR JUAREZ	Reparación	La Unión	Lempira	28	188	Finalizado
1	CEB FRANCISCO MORAZAN	Reparación	Colomoncagua	Intibucá	30	240	Finalizado
4					120	895	

A continuación, véase la ejecución histórica del Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y de su Gestión Local (PROMINE), tercer trimestre 2023:

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto*/	Inicio-Fin	
Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y de su Gestión Local (PROMINE)	SE/FHIS VIII No.2008-66-178 2014 67 414 (KFW) / FHIS - SE Fondos de Donación	L1,668,181,102	10/07/2012 - 31/07/2024	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	
III Trimestre 2023	127,957,113	127,957,113	7,400,136	5.8
Acumulado 2023	127,957,113	127,957,113	39,810,405	31.1
Acumulado Vida del Proyecto*/	1,668,181,102	1,668,181,102	1,264,332,588	75.8

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tasa de cambio L24.6422 x 1USD

2. Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB)

Consisten en contribuir a mejorar la convivencia ciudadana en Honduras a través de la mejora en la calidad de vida en barrios vulnerables y la reducción de la incidencia de delitos violentos. Los objetivos específicos son: (I) mejorar el hábitat de barrios urbanos vulnerables, aumentando el acceso a infraestructura de servicios básicos y de prevención para disminuir delitos de robos y violaciones sexuales; (II) reducir los niveles de incidencia de homicidios y violencia intrafamiliar (VIF) en los municipios intervenidos mejorando los servicios de prevención y atención a víctimas de la violencia; y (III) mejorar la efectividad policial en investigación criminal, a través del incremento de la proporción de casos de homicidio con agresor identificado e informe de investigación aceptado por el Ministerio Público. Proyecto co-ejecutado con la Secretaría de Seguridad.

Los principales avances físicos al 30 de Septiembre de 2023 son los siguientes:

- **Mejoramiento de Barrios:** Ejecución de obras del Proyecto de Integración Urbana en colonias Altos de la Quezada, La Huerta, Villas San Miguel, Brisas del Roble, y Altos del Mirador para un total de 633 predios; el monto del contrato es de L. 55,100,000.000 se tiene un **avance físico del 100%** que corresponde a la construcción de pozos e instalación de tuberías del sistema de alcantarillado sanitario, instalación de tubería para el sistema de agua potable, construcción de cunetas y pavimentación de calles con un avance financiero del 88.4%.
- **Programa de Deportes y Valores:** en ejecución continua y participan aproximadamente **700 jóvenes** de las colonias intervenidas por el programa. Durante el trimestre, se han ejecutado capacitaciones para jóvenes en temas de salud y se registran 702 asistencias; teniendo un avance financiero del 72%.
- **Capacitación y Empleabilidad:** Al mes de junio de 2022 inició el curso de diseño gráfico a través de la fundación CADERH, donde finalizaron 15 participantes (8 mujeres) graduados en marzo del año 2023, al mes de Septiembre del año 2023 a través de convenios con CADERH se realizaron tres talleres de capacitación donde participaron: 15 jóvenes (9 mujeres) en alfabetización digital, 11 personas (2 mujeres) en Ilustrador para publicistas y 21 (10 mujeres) personas en serigrafía.

A continuación, véase la ejecución histórica del **Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB)**, tercer trimestre 2023:

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto*/	Inicio-Fin	
PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS	BID/4518/BL-HO	497,000,000	28/11/2018-31/12/2023	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
III Trimestre 2023	36,003,735	36,003,735	6,841,645	19.0
Acumulado 2023	36,003,735	36,003,735	26,332,006	73.1
Acumulado Vida del Proyecto*/	497,000,000	497,000,000	357,922,422	72.0

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
 Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto
 Tasa de cambio L24.6422x 1USD

3. Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras (MIFE)

Este Programa tiene como objetivo fortalecer la educación en Honduras para que los educandos tengan un acceso eficiente, con la permanencia necesaria en los Centros de Educación Media y sean promovidos con la calidad requerida. El programa estará localizado en los departamentos de: Atlántida, Choluteca, Colón, Comayagua, Copán, Cortés, El Paraíso, Francisco Morazán, Gracias a Dios, Intibucá, Islas de la Bahía, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Santa Bárbara, Valle, Yoro.

El Programa tiene como objetivo de entregable 105 centros de educación (Pre-básica, básica y Media) ampliados, mejorados y equipados, beneficiando a 480 niños de Educación prebásica, 40,759 niños de Educación Básica y 43,801 jóvenes de Educación

SECRETARÍA DE FINANZAS

Media, haciendo un total de 85,040 educandos de los tres niveles del sistema educativo, así mismo 3,821 docentes de Educación Pre-básica, 3,821 docentes de Educación Básica, 15,285 docentes de educación media, haciendo un total de 22,923 docentes. La duración del programa es de 5 años desde el 2021 hasta el 2026 donde habrá un desarrollo gradual de la infraestructura y la dotación de equipo, así como la formación permanente y la plataforma virtual para emprendimiento.

Actualmente, se tienen 25 de proyectos en ejecución y 27 para orden de inicio, 18 proyectos aprobados, 13 están en revisión de control de calidad y el resto de los 113 están en proyección de ser intervenidos por parte del programa.

Los principales avances físicos al 30 de Septiembre de 2023 de Centros Escolares son los siguientes:

Cantidad	Nombre de la Obra	Intervención	Municipio	Departamento	Empleos	Beneficiarios	Estado
1	ESCUELA RURAL MIXTA MIGUEL MORAZAN	Reposición	Manto	Olancho	11	61	Ejecución
1	ESCUELA REPUBLICA DE HONDURAS	Reposición	Salama	Olancho	11	61	Ejecución
1	CEB DIONISIO DE HERRERA	Reposición	San Fco. de la Paz	Olancho	11	61	Ejecución
1	ESCUELA GENARO MADRID PAZ	Reposición	Concepcion del Norte	Santa Bárbara	10	98	Ejecución
1	ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS	Reposición	Concepcion del Norte	Santa Bárbara	10	98	Ejecución
1	ESCUELA RURAL MIXTA MISAEL ARLANDO BUESO M.	Reposición	Concepcion del Norte	Santa Bárbara	10	98	Ejecución
1	CEB JOSE CECILIO DEL VALLE	Reposición	Ilama	Santa Bárbara	10	98	Ejecución
1	ESCUELA URBANA MIXTA LEONIDAS RIVERA M.	Reposición	Ilama	Santa Bárbara	10	98	Ejecución
1	ESCUELA RURAL MIXTA ESTEBAN GUARDIOLA	Reposición	Campamento	Olancho	11	61	Ejecución
1	ESCUELA JUAN J. CASTRO	Reposición	Campamento	Olancho	11	61	Ejecución
1	ESCUELA CRISTOBAL COLON	Reposición	Guayape	Olancho	11	61	Ejecución
1	C.E.B ANGEL G. HERNANDEZ	Reposición	Salama	Olancho	11	61	Ejecución
1	CEB MANUEL J. VARGAS	Reposición	La Union	Olancho	11	61	Ejecución
1	ESCUELA EFRAIN CRUZ	Reposición	Juticalpa	Olancho	11	61	Ejecución
1	ESCUELA RURAL MIXTA ALEJANDRO AGUILAR	Reposición	San Fco. de la Paz	Olancho	11	61	Ejecución
1	ESCUELA BENIGNO RAMON IRIAS	Reposición	Santa María del Real	Olancho	11	61	Ejecución
1	ESCUELA MIGUEL PAZ BARAHONA	Reposición	Arada	Santa Bárbara	10	98	Ejecución
1	CEB DIONISIO DE HERRERA	Reposición	Atima	Santa Bárbara	10	98	Ejecución
1	ESCUELA JOSE ROSENDO MUÑOZ TROCHEZ	Reposición	Concepcion Del Sur	Santa Bárbara	10	98	Ejecución
1	ESCUELA RURAL MIXTA JUAN LINDO	Reposición	Azacualpa	Santa Bárbara	10	98	Ejecución
1	CENTRO EDUCACION BASICA EL PROGRESO	Reposición	Nueva Frontera	Santa Bárbara	10	98	Ejecución
1	ESCUELA JOSE ANIBAL RAPALO	Reposición	Protección	Santa Bárbara	10	98	Ejecución
1	ESCUELA URBANA MIXTA MANUEL F. RODRIGUEZ	Reposición	Petoa	Santa Bárbara	10	98	Ejecución
1	CEMG ENMANUEL	Reposición	Petoa	Santa Bárbara	10	98	Ejecución
1	JARDIN DE NIÑOS SAGRADO CORAZON	Reposición	Comayagua	Comayagua	24	128	Ejecución
1	ESCUELA NOHEMI FERRERA DE GARCIA	Reposición	Choloma	Cortés	6	85	Pendiente O/I
1	CEPB MANUEL DE JESUS VALENCIA	Reposición	LA LIMA	Cortés	6	85	Pendiente O/I
1	CEPB ESTEBAN GUARDIOLA	Reposición	LA LIMA	Cortés	6	85	Pendiente O/I
1	CEB GUBERNAMENTAL MODESTO RODAS ALVARADO	Reposición	LA LIMA	Cortés	6	85	Pendiente O/I
1	CEB MERCEDES FLORES CASTILLO	Reposición	Potrerillos	Cortés	6	85	Pendiente O/I
1	CEB MIGUEL PAZ BARAHONA	Reposición	Potrerillos	Cortés	6	85	Pendiente O/I
1	CEB PROF. RAFAEL PINEDA PONCE	Reposición	San Pedro Sula	Cortés	6	85	Pendiente O/I
1	CEB FERNANDO NARANJO	Reposición	San Pedro Sula	Cortés	6	85	Pendiente O/I
1	CEB HÉCTOR GUILLERMO GUILLEN	Reposición	San Pedro Sula	Cortés	6	85	Pendiente O/I
1	CEB ING. ROBERTO LARIOS SILVA	Reposición	San Pedro Sula	Cortés	6	85	Pendiente O/I
1	ESCUELA RAMON ROSA	Reposición	Puerto Cortés	Cortés	6	85	Pendiente O/I
1	CEB GUBERNAMENTAL JOHN F. KENNEDY #1	Reposición	San Pedro Sula	Cortés	6	85	Pendiente O/I
1	CEB JUAN LINDO	Reposición	San Pedro Sula	Cortés	6	85	Pendiente O/I
1	ESCUELA SUPERACION	Reposición	Villa Nueva	Cortés	6	85	Pendiente O/I
1	CEB PETRONILA BARRIOS CABAÑAS	Reposición	Villanueva	Cortés	6	85	Pendiente O/I
1	ESCUELA RURAL NUEVA ESPERANZA	Reposición	Juticalpa	Olancho	11	61	Pendiente O/I
1	ESCUELA LUIS LANDA	Reposición	San Fco. de Becerra	Olancho	11	61	Pendiente O/I
1	ESCUELA RURAL ALVARO CONTRERAS	Reposición	Manto	Olancho	11	61	Pendiente O/I
1	ESCUELA RURAL MIXTA UNION Y FUERZA	Reposición	Mangulile	Olancho	11	61	Pendiente O/I
1	CEB 1 DE MAYO	Reposición	Mangulile	Olancho	11	61	Pendiente O/I
1	ESCUELA URBANA MIGUEL ANGEL BUESO	Reposición	CONCEPCIÓN DEL NORTE	SANTA BÁRBARA	10	98	Pendiente O/I
1	CEB FRANCISCO MORAZAN	Reposición	Chinda	Santa Bárbara	10	98	Pendiente O/I
1	ESCUELA JUAN LINDO	Reposición	Arada	Santa Bárbara	10	98	Pendiente O/I
1	ESC. MANUEL BONILLA	Reposición	Protección	Santa Bárbara	10	98	Pendiente O/I
1	CEMG SUPERACIÓN	Reposición	Quimistán	Santa Bárbara	10	98	Pendiente O/I
1	ESCUELA VICTORIANO PERDOMO	Reposición	Azacualpa	Santa Bárbara	10	98	Pendiente O/I
1	ESCUELA OSCAR MEJIA URQUIA	Reposición	Nueva Frontera	Santa Bárbara	10	98	Pendiente O/I
1	ESCUELA RURAL MIXTA 18 DE NOVIEMBRE	Reposición	Quimistán	Santa Bárbara	10	98	Prep Doc Base
1	ESCUELA RURAL MIXTA CARLOS RIVERA	Reposición	Quimistán	Santa Bárbara	10	98	Prep Doc Base
1	ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE	Reposición	Protección	Santa Bárbara	10	98	Prep Doc Base
1	CEB JOSE SANTOS GUARDIOLA + CCEPREBB MUNDO	Reposición	Quimistán	Santa Bárbara	10	98	Prep Doc Base

SECRETARÍA DE FINANZAS

Cantidad	Nombre de la Obra	Intervención	Municipio	Departamento	Empleos	Beneficiarios	Estado
1	MARIA AUXILIADORA	Reposición	Manto	Olancho	11	61	Prep Doc Base
1	ESCUELA PRESENTACION CENTENO	Reposición	La Union	Olancho	11	61	Prep Doc Base
1	UNION Y FUERZA	Reposición	Guayape	Olancho	11	61	Prep Doc Base
1	CEB CORONEL HERNAN ACOSTA MEJIA	Reposición	Santa María del Real	Olancho	11	61	Prep Doc Base
1	CEBG Esmeralda Quiroz de Madrid	Reposición	San Pedro Sula	Cortés	6	85	Prep Doc Base
1	CEB GUBERNAMENTAL DARIO DE TURCIOS	Reposición	LA LIMA	Cortés	6	85	Prep Doc Base
1	CEB GUBERNAMENTAL MANUEL DE JESUS VALENCIA	Reposición	LA LIMA	Cortés	6	85	Prep Doc Base
1	PATRIA	Reposición	Villa Nueva	Cortés	6	85	NO
1	JOHN ARNOL COOK PROHECO	Reposición	Villa Nueva	Cortés	6	85	NO
1	INSTITUTO FROYLAN TURCIOS	Reposición	San Fco. de Becerra	Olancho	11	61	NO
1	OSWALDO LOPEZ ARELLANO	Reposición	San Fco. de Becerra	Olancho	11	61	NO
1	PROFA. GLADYS EMERITHA MUÑOZ	Reposición	Santa María del Real	Olancho	11	61	NO
1	PEDRO NUÑO	Reposición	Manto	Olancho	11	61	NO
1	ESCUELA FLORENCIO MARTINEZ	Reposición	Protección	Santa Bárbara	10	98	NO
1	ESCUELA 3 DE OCTUBRE	Reposición	Omoa	Cortés	6	85	Comité
1	RAMON ROSA	Reposición	Omoa	Cortés	6	85	Comité
1	MARCO AURELIO SOTO	Reposición	Manto	Olancho	11	61	Comité
1	ESCUELA TIMOTEO SABILLON RIVERA	Reposición	Protección	Santa Bárbara	10	98	Comité
1	REPUBLICA DE HONDURAS	Reposición	Omoa	Cortés	6	85	Revi di
1	SAN JOSE DE LAS BRISAS	Reposición	Puerto Cortés	Cortés	6	85	Revi di
1	JOSE MELITON SARMIENTO	Reposición	Mangulile	Olancho	11	61	Revi di
1	DOMINGA CHIRINOS DE BONILLA	Reposición	San Fco. de Becerra	Olancho	11	61	Revi di
1	DIONISIO DE HERRERA	Reposición	San Fco. de Becerra	Olancho	11	61	Revi di
1	RAMONA TEJEDA	Reposición	Santa María del Real	Olancho	11	61	Revi di
1	CEB GILBERTO ORLANDO LANZA	Reposición	San José de Colinas	Santa Bárbara	10	98	Revi di
1	LUIS BOGRAN	Reposición	Santa Barbara	Santa Bárbara	10	98	Revi di
1	PERFECTO H BOBADILLA	Reposición	Santa Barbara	Santa Bárbara	10	98	Revi di
1	REPARACION CEB JOSE TRINIDAD REYES	Reposición	LA LIMA	Cortés	6	85	Revi di
1	CEBG MARCO AURELIO SOTO	Reposición	Omoa	Cortés	6	85	Revi di
1	CEB MARIO ENRIQUE PRIETO	Reposición	Omoa	Cortés	6	85	Revi di
1	CEB GUBERNAMENTAL EL BUEN	Reposición	LA LIMA	Cortés	6	85	Revi di
1	NOHEMI FERRERA DE GARCIA	Reposición	Choloma	Cortés	6	85	PD
1	ESCUELA EL ESFUERZO	Reposición	Omoa	Cortés	6	85	PD
1	FRANCISCO MORAZAN	Reposición	Omoa	Cortés	6	85	PD
1	ARGENTINA REYES	Reposición	Omoa	Cortés	6	85	PD
1	REPUBLICA DE HONDURAS	Reposición	Omoa	Cortés	6	85	PD
1	CEB JOSE TRINIDAD REYES	Reposición	San Manuel	Cortés	6	85	PD
1	JULIO REYES CABALLERO	Reposición	San Manuel	Cortés	6	85	PD
1	CAZANAVE	Reposición	San Manuel	Cortés	6	85	PD
1	ESCUELA RODOLFO PADILLA SUNCERI	Reposición	San Pedro Sula	Cortés	6	85	PD
1	GUSTAVO ADOLFO CASTAÑEDA	Reposición	San Pedro Sula	Cortés	6	85	PD
1	BERLIN 2	Reposición	San Pedro Sula	Cortés	6	85	PD
1	JOSE CECILIO DEL VALLE	Reposición	Villa Nueva	Cortés	6	85	PD
1	FRANCISCO MORAZAN	Reposición	Villa Nueva	Cortés	6	85	PD
1	ARMANDO MUNGUÍA GOMEZ	Reposición	Villa Nueva	Cortés	6	85	PD
1	ANEXO ESCUELA JUAN J. CASTRO	Reposición	Campamento	Olancho	11	61	PD
1	LUZ OSORIO CASCO	Reposición	Campamento	Olancho	11	61	PD
1	RENACER	Reposición	Catacamas	Olancho	11	61	PD
1	RAMON BREVE VARGAS	Reposición	Juticalpa	Olancho	11	61	PD
1	ESC. TOMAS BARDALES CASTRO	Reposición	Mangulile	Olancho	11	61	PD
1	CEB GUBERNAMENTAL ALEJANDRINA MEZA	Reposición	LA LIMA	Cortés	6	85	PD
1	CEB GUBERNAMENTAL ESTEBAN GUARDIOLA	Reposición	LA LIMA	Cortés	6	85	PD
1	CEB GUBERNAMENTAL CARLOS ROBERTO FLORES	Reposición	LA LIMA	Cortés	6	85	PD
1	Inst. Polivalente Brisas del Valle	Reposición	San Pedro Sula	Cortés	6	85	PD
1	CEB Independencia	Reposición	San Pedro Sula	Cortés	6	85	PD
1	CEB José Castro López	Reposición	San Pedro Sula	Cortés	6	85	PD
1	CEB JOSÉ TRINIDAD REYES	Reposición	Villanueva	Cortés	6	85	PD
113					982	9209	

A continuación, véase la ejecución histórica del Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras (MIFE), tercer trimestre 2023:

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto*/	Inicio-Fin	
Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras (MIFE)	BCIE - 2239	L1,971,360,000	30/03/2021 - 30/03/2026	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
III Trimestre 2023	297,119,742	297,119,742	41,698,874	14.03
Acumulado 2023	297,119,742	297,119,742	95,789,810	32.24
Acumulado Vida del Proyecto*/	1,971,360,000	1,971,360,000	211,108,767	10.71

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
 Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto
 Tasa de cambio L24.6422x 1USD

4. Proyecto Convivencia y Espacios Seguros para los Jóvenes en Honduras (CONVIVIR)

El programa abarca la construcción, el mejoramiento y el equipamiento de infraestructura social para jóvenes y espacios públicos, financiamiento y/o cofinanciamiento del trabajo con jóvenes y la capacitación de jóvenes, la capacitación de personal de las instituciones involucradas, las municipalidades seleccionadas, las comunidades de barrio y servicios de consultoría.

Los principales avances físicos al 30 de Septiembre de 2023 son los siguientes:

Cantidad	Subproyecto	Intervención	Municipio	Departamento	Empleos	Beneficiarios	Estado
1	Plaza Juvenil Brisas de Copán (Obra de Confianza)	Construcción	Santa Rosa	Copán	7	11,500	50%
1	Casa de la Juventud	Construcción	Santa Rosa	Copán	7	11,500	10%
1	Plaza El Mirador – Santa Teresa	Construcción	Santa Rosa	Copán	6	11,500	75%
1	Parque La Pirámide (Obra de Confianza)	Construcción	Intibucá	Intibucá	5	240	75%
1	THAU MISHU (Casa de La Juventud)	Construcción	Intibucá	Intibucá	5	7,933	10%
1	Ruta Lenca de la Juventud	Construcción	Intibucá	Intibucá	5	7,933	75%
1	Paseo Cultural Lenca (Obra de Confianza)	Construcción	La Esperanza	Intibucá	5	7,933	75%
1	Plaza de La Juventud Buenos Aires	Construcción	La Esperanza	Intibucá	5	7,933	10%
1	Centro Deportivo Integral San Carlos	Construcción	La Esperanza	Intibucá	5	7,933	10%
1	Cancha ABE y BEN (Obra de Confianza)	Construcción	Juticalpa	Olancho	7	8,600	75%
1	Centro de Formación Integral Juvenil	Construcción	Juticalpa	Olancho	7	8,600	10%
1	Parque Recreativo de La Juventud	Construcción	Juticalpa	Olancho	7	8,600	50%
12					71	100,205	

A continuación, véase la ejecución histórica del Proyecto Convivencia y Espacios Seguros para los Jóvenes en Honduras (CONVIVIR), tercer trimestre 2023:

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto*/	Inicio-Fin	
Proyecto Convivencia y Espacios Seguros para los Jóvenes en Honduras (CONVIVIR)	BMZ Nr. 2016 65348	L499,011,128	17/07/2021 - 14/07/2025	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
III Trimestre 2023	62,408,091	62,408,091	11,751,123	18.8
Acumulado 2023	62,408,091	62,408,091	18,017,621	28.9
Acumulado Vida del Proyecto*/	499,011,128	499,011,128	341,839,399	68.5

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
 Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto
 Tasa de cambio L24.6422x 1 €

5. Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras (PRE)

Tiene como objetivo Coordinar, impulsar y fortalecer capacidades para el conocimiento del riesgo, reducción de este y manejo de desastre, como una estrategia para mejorar la eficiencia en la preparación para la respuesta y la recuperación post desastre naturales. Su propósito es la atención de la infraestructura dañada por el Huracán y Tormenta Tropical Eta: rehabilitación de pasos y caminos terciarios, reparación y construcción de cajas puentes rehabilitación y construcción de sistemas de drenaje, puentes (Bailey), construcción de calles terciarias, obras de mitigación entre otras.

Los principales avances físicos al 30 de Septiembre de 2023 son los siguientes:

Infraestructura Educativa:

- 25 subproyectos de reposición, reparación y ampliación de centros educativos adjudicados por un monto de L88,133,682.603 y para la supervisión L9,862,732.25. Las obras han dado inicio en noviembre de 2022. La ejecución al cierre del 3er trimestre 2023 es de L 60,518,268.31.
- Un segundo paquete consta de 17 subproyectos los cuales iniciaron su ejecución en el presente trimestre por un monto de L127,025,993.67 y para la supervisión L17,661,922.00. La ejecución al cierre del 3er trimestre 2023 es de L26,306,113.92.
- Un tercer paquete de 23 subproyectos se encuentra en reformulación por los técnicos del proyecto.
- Un cuarto paquete de 39 subproyectos se encuentra pendiente de reformulación próximos a ser abordados por los técnicos del proyecto por un monto aproximado de L134,503,621.56.

Agua y Saneamiento:

- 3 subproyectos de agua y saneamiento han iniciado ejecución en el tercer trimestre del año. El monto de contrato es de L80,013,832.68 y para la supervisión L9,862,732.25. Al cierre del tercer trimestre se han ejecutado un monto total de L22,135,956.22.
- 9 subproyectos de agua y saneamiento se encuentran en reformulación con un monto presupuestado de L274,282,300.00.

Infraestructura Vial:

- Un total de 4 subproyectos se encuentran en evaluación y proceso de adjudicación, el monto presupuestado es de L43,855,886.41.
- 4 subproyectos viales se encuentran en proceso de reformulación para incluir actividades de medidas ambientales y de mitigación. El monto de presupuesto es de L42,996,000.00.

Infraestructura en Salud:

- 1 subproyecto de salud se encuentra en proceso de reformulación. El monto de presupuesto es de L13,849,204.38.

A continuación, véase la ejecución histórica del Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras (PRE), tercer trimestre 2023:

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto*/	Inicio-Fin	
Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras (PRE)	6822-HN	L1,960,432,000	25/05/2021 - 31/12/2026	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
III Trimestre 2023	432,092,852	432,092,852	55,601,533	12.9
Acumulado 2023	432,092,852	432,092,852	130,271,743	30.1
Acumulado Vida del Proyecto*/	1,960,432,000	1,960,432,000	184,493,490	9.4

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tasa de cambio L24.6422x 1USD

6. Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (ICS/USAID)

Tiene como objetivo general incrementar la resiliencia de las comunidades y los individuos a la violencia y al crimen a través de mejoras en la infraestructura pública de pequeña escala. Esto incluye el mejoramiento en las estructuras comunitarias que mitiguen el crimen eliminando o disminuyendo el riesgo de oportunidad, creando espacios comunitarios más seguros, aumento en los servicios de calidad que protejan contra la violencia, mejoramiento en la participación de los sistemas de seguridad y rendimiento de justicia nacional y municipal, mejoramiento en la participación ciudadana con los sectores de justicia y seguridad.

Los principales avances físicos al 30 de Septiembre de 2023 son los siguientes:

Cantidad	Subproyecto	Intervención	Municipio	Departamento	Empleos	Beneficiarios	Estado %
1	Reparación del Instituto Modesto Rodas Alvarado	Construcción	San Pedro Sula	Cortés	12	1,098	68
1	Chamelecón - Oficina Comité Intersectorial	Construcción	San Pedro Sula	Cortés	10	20,000	22
1	Reparación CEB Padre Claret	Construcción	San Pedro Sula	Cortés	19	1,368	93
1	Construcción Techado de Cancha y Obras Varias en CEB Dr. Alfonso Lacayo	Construcción	San Pedro Sula	Cortés	11	169	72
1	Rivera Hernández - Oficina Comité Intersectorial	Construcción	San Pedro Sula	Cortés	4	432	29
1	Suministro e Instalación Generador y Obras Varias en Clínicas COVID19 Hospital Atlántida	Construcción	La Ceiba	Cortés	10	537	25
1	Reparación del CEB Rafael Pineda Ponce y Construcción de Obras Varias	Construcción	La Ceiba	Atlántida	9	692	26
1	Reparación del CEB Ramón Rosa y Construcción de Obras Varias	Construcción	La Ceiba	Atlántida	9	486	40
1	Reparación del Instituto San José del Pedregal y Construcción de Obras Varias	Construcción	MDC	Atlántida	5	780	22
1	Reparación del CEB Rafaela Huete de Rodríguez y Construcción de Obras Varias	Construcción	La Ceiba	Atlántida	9	525	2
1	Reparación Centro de Salud de la San Miguel, Equipamiento y Obras Varias	Construcción	MDC	rancisco Morazá	34	103,655	5
1	Construcción Área Recreativa CDA Col. Gale Cortés	Construcción	Choloma	Cortés	6	523	23

A continuación, véase la ejecución histórica del Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (ICS/USAID), tercer trimestre 2023:

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto*/	Inicio-Fin	
Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (USAID/ICS)	522-0501-4 Donación Externa	L348,006,068	19/10/2017 - 30/06/2024	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	
III Trimestre 2023	70,204,050	70,204,050	13,660,351	19.5
Acumulado 2023	70,204,050	70,204,050	46,890,362	66.8
Acumulado Vida del Proyecto*/	348,006,068	348,006,068	287,931,546	82.7

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tasa de cambio L24.6422x 1USD

7. Programa Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras (USAID/PIOH)

El propósito de esta Actividad es mejorar las pobres condiciones sociales y económicas son especialmente pronunciadas en el Occidente de Honduras. Extrema pobreza, desnutrición, vulnerabilidad al cambio climático. Bajos niveles educativos, migración, falta de acceso a los servicios básicos y otros retos socioeconómicos son endémicos. La provisión de servicios básicos de educación y nutrición son escasos en la zona de Occidente y es difícil el acceso a los ya existentes, así mismo la gestión de servicios de educación, nutrición y agua y saneamiento son deficientes por lo que los ciudadanos cuentan además con pocos espacios de participación para mejorar sus vidas a nivel de hogar y sus vidas productivas, lo que genera una gran brecha de pobreza.

Los principales avances físicos al 30 de Septiembre de 2023 son los siguientes:

Cantidad	Subproyecto	Intervención	Municipio	Departamento	Empleos	Beneficiarios	Estado
1	Reparación del CEB Jesús Orlando Guerra y Construcción de obras varias	Construcción	San Marcos de Calquín	Ocotepeque	6	92	96%
1	Ampliación Centro de Salud Rural (CESAR) ARCAMON	Construcción	San Marcos	Lempira	8	1,371	100%

A continuación, véase la ejecución histórica del Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (PIOH/USAID), tercer trimestre 2023:

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto*/	Inicio-Fin	
Programa Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras (USAID/PIOH)	522-0502 Cd E No.9 Donación Externa	L210,053,250	01/11/2018 - 30/06/2024	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	
III Trimestre 2023	52,246,428	52,246,428	9,561,488	18.3
Acumulado 2023	52,246,428	52,246,428	22,596,596	43.3
Acumulado Vida del Proyecto*/	210,053,250	210,053,250	124,573,427	59.3

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tasa de cambio L24.6422x 1USD

8. Proyecto Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Ciudad de Gracias, Departamento de Lempira

El proyecto tiene como objetivo mejorar el acceso a los servicios de agua potable para la población del municipio de Gracias, Departamento de Lempira, aumentando la cantidad y la calidad del agua suministrada, a través de la ampliación del sistema de abastecimiento, mediante el desarrollo de la infraestructura hidráulica.

Los principales avances físicos al 30 de Septiembre de 2023 son los siguientes:

- No se planificaron proyectos finalizados para este trimestre, sin embargo, se realizaron actividades complementarias para comenzar con el proceso de ejecución de fondos del Proyecto de Gracias, Lempira, socializando la disminución del alcance del proyecto "Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable, en la Ciudad de Gracias, Departamento de Lempira" y adicionando "Mejoramiento en la Red de Colectores y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Suroriente de Tegucigalpa".

A continuación, véase la ejecución histórica del Proyecto Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Ciudad de Gracias, Departamento de Lempira, tercer trimestre 2023:

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto*/	Inicio-Fin	
Proyecto Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Ciudad de Gracias, Departamento de Lempira (BCIE)	BCIE 2261 Crédito Externo	L884,322,000	03/01/2022 - 03/02/2026	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	
III Trimestre 2023	69,816,382	69,816,382	1,002,080	1.4
Acumulado 2023	69,816,382	69,816,382	2,648,996	3.8
Acumulado Vida del Proyecto*/	884,322,000	884,322,000	31,061,082	3.5

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tasa de cambio L24.6422x 1USD

9. Programa de Mejoramiento de la Infraestructura y Desarrollo Social y Comunitario en varios departamentos de Honduras (BCH)

El Programa de Mejoramiento de la Infraestructura de Desarrollo Social y Comunitario en Varios Departamentos de Honduras es el resultado de un proceso de priorización de ocho (8) componentes que tendrán un total de 61 proyectos en 48 municipios del país que aportarán a la reducción de la pobreza y a la mejora del bienestar humano de la población.

Los principales avances físicos al 30 de Septiembre de 2023 son los siguientes:

14 proyectos de infraestructura construcción y supervisión de obra en etapa de adjudicación y contratación de obra, distribuidos en varios componentes del programa 18; así como 2 proyectos de prefactibilidad y factibilidad de proyectos de impacto nacional por un monto global del programa por L229,124,372.00.

A continuación, véase la ejecución histórica del Programa de Mejoramiento de la Infraestructura y Desarrollo Social y Comunitario en varios departamentos de Honduras, tercer trimestre 2023:

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto*/	Inicio-Fin	
Programa de Mejoramiento de la Infraestructura y Desarrollo Social y Comunitario en varios departamentos de Honduras (BCH)	BCH 24798 Crédito Interno	L499,700,000	01/08/2022 - 01/08/2024	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	
III Trimestre 2023	229,124,372	229,124,372	157,406,527	68.7
Acumulado 2023	229,124,372	229,124,372	159,370,009	69.6
Acumulado Vida del Proyecto*/	499,700,000	499,700,000	429,952,261	86.0

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

4.3.1 PROGRAMAS SOCIALES

La inversión en programas sociales según información reportada en el SIAFI asciende a **L350.3 millones**, y una ejecución L197.1 millones equivalente al **56.2%** en relación con el presupuesto vigente 2023.

4.4 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- En el tercer trimestre se autorizaron las siguientes modificaciones presupuestarias relevantes:

- **PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y FORMACIÓN EDUCATIVA EN HONDURAS (MIFE) (FMP05 No. 47 – L21.9 Millones):**

El FHIS solicitó una modificación presupuestaria de tipo traslado dentro del Grupo 20000 y 40000 para fondos requeridos en un lote de 27 proyectos de mejoras en centros educativos que se están adjudicando y están ubicados en.

- **PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS (PCCMB) (FMP05 No. 53 – L1.9 Millones):**

El FHIS solicitó una modificación presupuestaria de tipo traslado dentro del Grupo del Gasto 20000 Servicios No Personales y 40000 Bienes Capitalizables, dentro del Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento. También, se realizó una modificación entre objetos de gastos de un mismo programa del Convenio PCCMB, organismo internacional BID, para ajustar la estructura del presupuesto del 2023.

- **PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA (ICS) (FMP05 No. 62, 60 – L3.7):**

Se llevó a cabo una modificación presupuestaria entre objetos de gastos del Convenio de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (ICS) Convenio 522-0501 y el Programa Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras (PIOH) Convenio 522-0502, según el Memorándum No. SED. Además, se realizó una modificación entre objetos de gastos del mismo convenio para ajustar la estructura del presupuesto del 2023.

- **PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE HONDURAS (BCH) (FMP05 No. 78 – L150.0 Millones):**

El FHIS solicitó una modificación presupuestaria con el objetivo de disminuir fondos en el objeto de gasto 47110 (Construcción y Mejoras de Bienes en Dominio Privado) y trasladarlos al objeto de gasto 55170 (Transferencias) para atender Convenio firmado entre el FHIS y la AMDC para atender obras viales en el Distrito Central.

Conclusiones

- La ejecución presupuestaria al III Trimestre del año 2023 experimentó una ejecución acumulada del 17.2% ejecución insatisfactoria, relativo a L165.5 millones con respecto al vigente de L1,377.0, esta baja

ejecución es producto principalmente de los procesos engorrosos de los organismos financiadores en el cual destaca Banco Mundial.

- Para este trimestre se realizaron modificaciones presupuestarias entre proyectos y entre objetos de gasto con el fin de ir cubriendo las metas establecidas por el ajuste de la programación, POA's y compromisos de acuerdo con cada uno de los proyectos y otras actividades relativas al funcionamiento de las Unidades Ejecutoras.
- La infraestructura escolar ha recibido atención únicamente en los centros debidamente registrados legalmente bajo el nombre de la Secretaría de Educación, por falta de legalización de terrenos que se encuentran a nombre de terceros.

Recomendaciones

- Agilizar los procesos de formulación de los nuevos proyectos con el objetivo de entregar oportunamente los beneficios a la población objetivo, básicamente aquellas personas que han sufrido por emergencias naturales y de salud.
- Coordinar gestiones para acelerar la ejecución física y financiera de los proyectos, tomar acciones correctivas, ceder espacio presupuestario a otros proyectos en vista de lo reprogramado con el objetivo de alcanzar las metas establecidas en los Planes Operativos Anuales institucionales.
- Coordinar reuniones de seguimiento en conjunto con la UCP-FHIS, UPEG y Dirección de Control y Seguimiento, Comité Ejecutor de Proyecto (CEP), en conjunto con SEFIN con el fin de apoyar a las Unidades ejecutoras donde se tenga cuellos de botella.
- Proponer y remitir al Soberano Congreso Nacional borrador de legalización automática de terrenos en donación, a nombre de las Alcaldías, entre otros casos, que cuentan con un centro educativo dentro del predio para que sea legalmente reconocidos a nombre de la SEDUC, o en su defecto llegar a un acuerdo con SEDUC para intervenir centros educativos que no estén legalizados sus terrenos.
- Actualizar mensualmente en el Sistema de Administración Financiera (SIAFI Ges) la evaluación de metas físicas en el Plan Operativo Anual.
- Realizar una mejor planificación a nivel de ejecución presupuestaria, debido al exceso de modificaciones realizadas de forma interna.

ANEXOS

SECRETARÍA DE FINANZAS
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE, 2023
Cifras en Lempiras

No. Proy.	INSTITUCIÓN / PROYECTO	Convenio	Presupuesto Vigente			Ejecutado (Devengado) Anual			
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total general	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total general	% Ejecución (Ejec./Vigte.)
10	0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social		555,630,575	1,171,620,089	1,727,250,664	371,946,096	366,580,666	738,526,762	43%
1	ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS	522-0502 Cd E No.9	7,387,678	44,858,750	52,246,428	5,244,457	17,352,139	22,596,596	43%
2	PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS	BID/4518/BL-HO	-	36,003,735	36,003,735	-	26,332,006	26,332,006	73%
3	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA	522-0501-4	5,314,200	64,889,850	70,204,050	5,314,200	41,576,162	46,890,362	67%
4	PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)	2014 67 414 (KFW) / FHIS - SE	1,352,112	44,099,693	45,451,805	1,151,710	14,637,229	15,788,939	35%
		BMZ 2016 68 763 SE/FHIS VIII No.2008-66-178	3,791,640	78,713,668	82,505,308	1,639,046	22,382,420	24,021,466	29%
5	Programa de Mejoramiento de la Infraestructura de Desarrollo Social y Comunitario en varios departamentos de Honduras	BCH-24798-1	229,124,372	-	229,124,372	159,370,009	-	159,370,009	70%
6	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y FORMACION EDUCATIVA EN HONDURAS	BCIE - 2239	-	297,119,742	297,119,742	-	95,789,810	95,789,810	32%
7	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS A NIVEL NACIONAL	0	304,452,823	45,825,076	350,277,899	196,799,214	-	196,799,214	56%
8	PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS	BMZ Nr. 2016 65348	4,207,750	58,200,341	62,408,091	2,427,460	15,590,161	18,017,621	29%
9	PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE GRACIAS	BCIE-2261	-	69,816,382	69,816,382	-	2,648,996	2,648,996	4%
10	Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras.	6822-HN	-	432,092,852	432,092,852	-	130,271,743	130,271,743	30%

SIAFI, 30/09/2023
