



Secretaría de  
**Finanzas**  
Gobierno de la República

# Informe de Avance Físico y Financiero

## PLAN DE INVERSION PÚBLICA

### *Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)*

Tegucigalpa, Honduras

Abril, 2024



## IV. PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA

## 4.1 EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

El Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), cuya finalidad es la de promover el mejoramiento de las condiciones de vida de los grupos sociales marginados en el área rural y urbana, mediante el otorgamiento de financiamientos para programas y proyectos de desarrollo social o económico, con el propósito de aumentar su productividad, sus niveles de empleo y de ingresos y de contribuir a la satisfacción de sus necesidades básicas.

Cuadro No. 01  
Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del 2024  
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
<b>Presupuesto Aprobado</b>	-
Inversión Productiva	1,592,549,267
Formación Bruta de Capital	-
<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>2,018,311,767</b>
Inversión Productiva	1,918,311,767
Formación Bruta de Capital	100,000,000
<b>Ejecutado I Trimestre</b>	<b>75,378,935</b>
Inversión Productiva	75,378,935
Formación Bruta de Capital	-
<b>% Ejecución (Devengado I Trim-2024/Vigente)</b>	<b>3.7%</b>
Comprometido (Devengado + Compromiso)	202,616,867
<b>% Ejecución Comprometido (Comprometido/Vigente)</b>	<b>10.0%</b>

Nota: SIAFI, 31/03/2024

El Gobierno actual ha considerado dentro de sus prioridades atender proyectos enfocados a programas sociales y apuntar a los siguientes objetivos; En materia de Educación lo siguiente: un Sistema capaz de brindar educación gratuita y universal, reinstaurando la Matrícula Gratis y una merienda idónea, rehabilitar y repotenciar al menos el 50% de la infraestructura escolar durante el primer año de gobierno, llegando al 100% en el tercer año de gobierno, mediante mecanismos de participación comunitaria apoyada desde el municipio y el gobierno central entre otros.

En materia de Protección Social se ampliará y fortalecerá programas de asistencia como las transferencias en efectivo que se focalizarán mejor a fin de que realmente lleguen a sectores de la población en extrema pobreza, sin corrupción ni manipulación.

Al primer trimestre del año 2024, la institución contó con un presupuesto vigente de inversión pública de **L2,018.3 millones** detallado para la Inversión productiva **L1,918.3** inversión social **L0.0** y Formación Bruta de Capital de **L100.0** millones; y la ejecución presupuestaria del trimestre asciende a un monto de **L75.4 millones** lo que representa el (3.7%) con relación al presupuesto vigente, tal como se detalla en el Cuadro No. 1.

Dicha ejecución se llevó a cabo a través de (7) siete proyectos enfocados en Agua y Saneamiento, Educación, Protección Social, Seguridad, Transporte y Obras Públicas. Ver Detalle de Ejecución Financiera en Anexo No. 4.

## 4.2 FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

**Gráfico No. 1**  
**Fuente de Financiamiento**  
**Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS )**  
 Al 31 de marzo 2022-2024  
**Millones de Lempiras**




En referencia al financiamiento de Inversión Pública, el 67.0% corresponde a fondos provenientes de crédito externo expresado en términos monetarios con un monto de **L1,351.6 millones**, el 22.4% a recursos de recursos nacionales con un monto de **L213.8 millones**; y las contrapartes de donaciones externas que ascienden a **L12.1 millones** equivalente a 10.6%, sumando un monto total en el presupuesto vigente de **L2,018.3** Dicha inversión es financiada Recursos Nacionales **22.4%**, USAID **4.2%**, KfW **9.5%**, Banco Mundial **14.8%** y BCIE **49.1%**.

### 4.2 COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN AL I TRIMESTRE (2022-2024):

En los años 2022 al 2024, los proyectos de Inversión Pública del FHIS ha considerado la ejecución de al menos 12 Proyectos de Inversión, de los cuales se han financiado el 68% con recursos de crédito externo, 28% recursos de donación externa y el 4% restante con recursos del Tesoro Nacional como contraparte de dichos Proyectos.

**Gráfico No. 2**  
**Comportamiento de la Inversión Pública**  
**Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)**  
 Al 31 de marzo 2022-2024  
 Millones de Lempiras

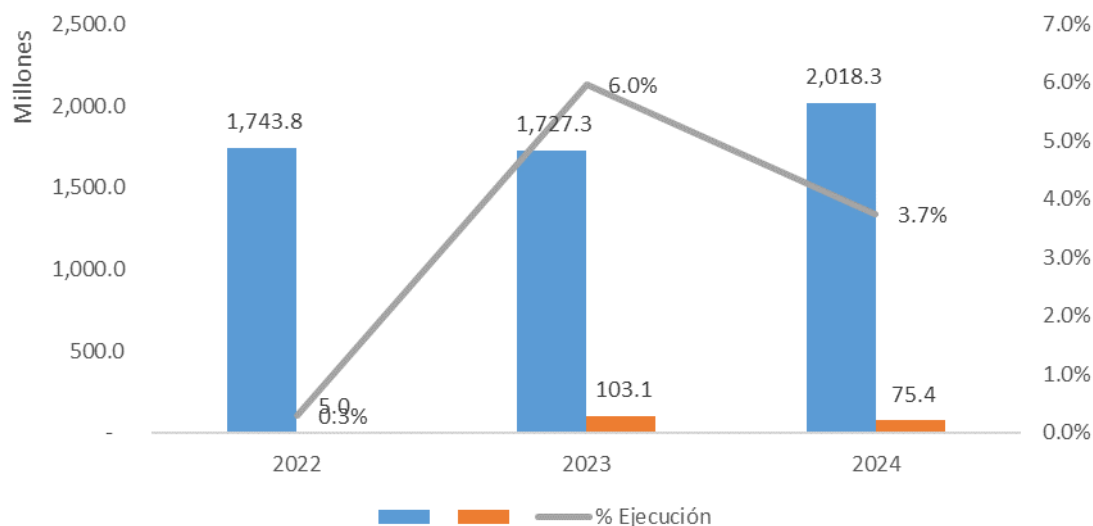

La Gráfica No.2 muestra la ejecución porcentual comparativa de los últimos años al 31 de marzo, el pico más alto se registra en el año 2023, para el año 2023 se incorporaron al presupuesto nuevos programas entre ellos para atender la reparación y rehabilitación de escuelas denominado “Programa de Rehabilitación de Centros Educativos a Nivel Nacional”. Cabe mencionar que la baja ejecución en el 2024 se debe a los cambios de personal a nivel interno de la Institución, así como la falta de personal esencial en las unidades ejecutoras.

#### 4.3 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión en el primer trimestre del año 2024 se concentró en los siguientes proyectos:

1. Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras (PIOH)
2. Programa de Infraestructura Para la Seguridad Ciudadana (ICS)
3. Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar (PROMINE)
4. Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras (MIFE)
5. Proyecto Convivencia y Espacios Seguros Para Los Jóvenes en Honduras (CONVIVENCIA)
6. Proyecto de Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Ciudad de Gracias (AGUAS DE GRACIAS)

7. Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta E Iota en Honduras (PRE).

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros de los principales proyectos de acuerdo con su presupuesto vigente:

**1. Programa Modernización de la Infraestructura Educativa (PROMINE)**

PROMINE tiene por objetivo general fortalecer la rectoría Sectorial en Infraestructura Educativa de la Secretaría de Educación y la gestión local participativa, así como mejorar el acceso de los alumnos de las comunidades pobres al Centro Educativo de calidad que operan de manera sostenible. De esa manera se pretende contribuir al aumento de la eficiencia y de la calidad del sistema educativo (Pre-Básico y básico).

Los principales avances físicos al 31 de marzo de 2024 son los siguientes:

Principales Metas Físicas, I Trimestre-2024							
Meta Física	Unidad de Medida	Anual 2024			I Trimestre 2024		
		Programación	Ejecución	% Ejecución.	Programación	Ejecución	% Ejecución
Centro educativos construidos, reparados y/o ampliados.	Centro Escolar	7	0	0%	0	0	0%

Fuente: Unidad Ejecutora al 31/03/2024

Durante el primer trimestre de 2024, no se registraron progresos físicos en el proyecto. Es relevante destacar que para este periodo no se contemplaron entregas de unidades físicas.

A continuación, véase la ejecución financiera histórica del Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y de su Gestión Local (PROMINE), primer trimestre 2024:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y de su Gestión Local (PROMINE)	SE/FHIS VIII No.2008-66-178; 2014 67 414 (KFW) / FHIS - SE	US\$	69,545,886.68	10/07/2012
		Lempiras	1,723,910,393	18/04/2024
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Ejecutado (Devengado)</b>	
I Trimestre 2024	134,601,641	134,601,641	2,685,797	2%
Acumulado 2024	-	134,601,641	2,685,797	2%

Acumulado Vida del Proyecto **	1,723,910,393	1,723,910,393	442,863,521	25%
--------------------------------	---------------	---------------	-------------	-----

\*\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 31/03/2024 (BCH): L24.7881 por US\$1.00

## 2. Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras (MIFE)

Este Programa tiene como objetivo fortalecer la educación en Honduras para que los educandos tengan un acceso eficiente, con la permanencia necesaria en los Centros de Educación Media y sean promovidos con la calidad requerida. El programa está localizado en los departamentos de: Atlántida, Choluteca, Colón, Comayagua, Copán, Cortés, El Paraíso, Francisco Morazán, Gracias a Dios, Intibucá, Islas de la Bahía, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Santa Bárbara, Valle, Yoro.

El Programa tiene como objetivo de entregable 105 centros de educación (Pre-básica, básica y Media) ampliados, mejorados y equipados, beneficiando a 480 niños de Educación prebásica, 40,759 niños de Educación Básica y 43,801 jóvenes de Educación Media, haciendo un total de 85,040 educandos de los tres niveles del sistema educativo, así mismo 3,821 docentes de Educación Pre-básica, 3,821 docentes de Educación Básica, 15,285 docentes de educación media, haciendo un total de 22,923 docentes. La duración del programa es de 5 años desde el 2021 hasta el 2026 donde habrá un desarrollo gradual de la infraestructura y la dotación de equipo, así como la formación permanente y la plataforma virtual para emprendimiento.

Los principales avances físicos al 31 de marzo de 2024 son los siguientes:

Principales Metas Físicas, I Trimestre-2024							
Meta Física	Unidad de Medida	Anual 2024			I Trimestre 2024		
		Programación	Ejecución	% Ejecución.	Programación	Ejecución	% Ejecución
Centro educativos construidos, reparados y/o ampliados.	Centro Escolar	42	7	17%	7	7	100%

Fuente: Unidad Ejecutora al 31/03/2024

Los principales logros físicos en el primer trimestre son:

- ✓ 11 proyectos para firma de contrato
- ✓ 7 proyectos finalizados físicamente

- ✓ 3 proyecto formulados.

A continuación, véase la ejecución financiera histórica del Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras (MIFE), primer trimestre 2024:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras (MIFE)	BCIE-2239	US\$	80,000,000	30/03/2021
		Lempiras	1,983,048,000	30/03/2026
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Ejecutado (Devengado)</b>	
I Trimestre 2024	306,585,912	306,585,912	10,064,889	3%
Acumulado 2024	-	306,585,912	10,064,889	3%
Acumulado Vida del Proyecto **	<b>1,983,048,000</b>	<b>1,983,048,000</b>	<b>200,041,798</b>	<b>27%</b>

\*\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto  
 Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto  
 Tipo de Cambio al 31/03/2024 (BCH): L24.7881 por US\$1.00

### 3. Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras (PRE)

Tiene como objetivo Coordinar, impulsar y fortalecer capacidades para el conocimiento del riesgo, reducción de este y manejo de desastre, como una estrategia para mejorar la eficiencia en la preparación para la respuesta y la recuperación post desastre naturales. Su propósito es la atención de la infraestructura dañada por el Huracán y Tormenta Tropical Eta: rehabilitación de pasos y caminos terciarios, reparación y construcción de cajas puentes rehabilitación y construcción de sistemas de drenaje, puentes (Bailey), construcción de calles terciarias, obras de mitigación entre otras.

Los principales avances físicos al 31 de marzo de 2024 son los siguientes:

Principales Metas Físicas, I Trimestre-2024							
Meta Física	Unidad de Medida	Anual 2024			I Trimestre 2024		
		Programación	Ejecución	% Ejecución.	Programación	Ejecución	% Ejecución
Centros educativos rehabilitados y/o	Centro Escolar	20	4	20%	4	4	100%

Principales Metas Físicas, I Trimestre-2024							
Meta Física	Unidad de Medida	Anual 2024			I Trimestre 2024		
		Programación	Ejecución	% Ejecución.	Programación	Ejecución	% Ejecución
reconstruidos afectados por ciclones Eta e Iota en beneficio de la población afectada por los fenómenos naturales. PRE							
Sistemas de agua rehabilitados y/o reconstruidos afectados por ciclones Eta e Iota. PRE	Sistema de Agua	3	0	0%	0	0	0%
Infraestructura vial rehabilitada y reconstruida afectados por ciclones Eta e Iota. PRE	Kilometro	5	1	20%	1	1	100%
Infraestructura en centros de salud pública rehabilitados y/o reconstruidos afectados por ciclones Eta e Iota en beneficio de la población afectada por los fenómenos naturales. PRE	Unidad de Salud	1	0	0%	0	0	0%

Fuente: Unidad Ejecutora al 31/03/2024

Los principales logros físicos en el primer trimestre son:

- ✓ Un primer lote de 25 subproyectos de infraestructura educativa en ejecución, 11 subproyectos culminados físicamente, y 14 ya han sido cerrados financieramente.
- ✓ 25 nuevos subproyectos de infraestructura educativa han iniciado su ejecución en el segundo semestre del año 2023 junto con la supervisión respectiva. De estos, 4 subproyectos han terminado físicamente.
- ✓ La supervisión de los 25 subproyectos se desarrolla a la par de la ejecución.
- ✓ 4 subproyectos de agua y saneamiento han iniciado ejecución junto a la supervisión respectiva.



- ✓ 5 subproyectos viales han iniciado ejecución junto a la supervisión respectiva, de los cuales 1 ha finalizado físicamente.

A continuación, véase la ejecución financiera histórica del Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y de su Gestión Local (PROMINE), primer trimestre 2024:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras (PRE)	IDA 6822	US\$	150,000,000	25/05/2021
		Lempiras	3,718,215,000	31/12/2026
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Ejecutado (Devengado)</b>	
I Trimestre 2024	298,426,045	298,426,045	44,588,283	14%
Acumulado 2024	-	298,426,045	44,588,283	14%
Acumulado Vida del Proyecto **	<b>3,718,215,000</b>	<b>3,718,215,000</b>	<b>390,546,485</b>	<b>10%</b>

\*\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 31/03/2024 (BCH): L24.7881 por US\$1.00

### 1. Programa de Infraestructura Para la Seguridad Ciudadana (ICS)

Tiene como objetivo general incrementar la resiliencia de las comunidades y los individuos a la violencia y al crimen a través de mejoras en la infraestructura pública de pequeña escala. Esto incluye el mejoramiento en las estructuras comunitarias que mitiguen el crimen eliminando o disminuyendo el riesgo de oportunidad, creando espacios comunitarios más seguros, aumento en los servicios de calidad que protejan contra la violencia, mejoramiento en la participación de los sistemas de seguridad y rendimiento de justicia nacional y municipal, mejoramiento en la participación ciudadana con los sectores de justicia y seguridad.

Los principales avances físicos al 31 de marzo de 2024 son los siguientes:

Principales Metas Físicas, I Trimestre-2024							
Meta Física	Unidad de Medida	Anual 2024			I Trimestre 2024		
		Programación	Ejecución	% Ejecución.	Programación	Ejecución	% Ejecución
Espacios públicos recuperados y entregados para la seguridad ciudadana a	Obra	3	0	0%	0	0	0%

Principales Metas Físicas, I Trimestre-2024							
Meta Física	Unidad de Medida	Anual 2024			I Trimestre 2024		
		Programación	Ejecución	% Ejecución.	Programación	Ejecución	% Ejecución
las colonias, alcaldías y patronatos en beneficio de la población hondureña ICS							
Centros educativos construidos, reparados y/o ampliados ubicados en Choloma, San Pedro Sula, Chamelecón, La Lima, Tela y en Tegucigalpa en beneficio de niños de la zona urbana y rural de Honduras. ICS	Centro Educativo	3	1	33%	1	1	100%
Obras complementarias reparados y/o ampliados en los servicios de salud ubicados en La Ceiba, Sps y Tegucigalpa. ICS	Obra	1	1	100%	1	1	100%

Fuente: Unidad Ejecutora al 31/03/2024

Durante el primer trimestre de 2024, se registraron avances físicos en el proyecto a nivel de educación y salud, cumpliendo con la meta programada para el primer trimestre del año 2024 de 1 unidad física para centros educativos y una obra de salud.

Al cierre del I Trimestre del 2024 bajo el programa ICS se encuentran 7 proyectos en ejecución, presentando un avance promedio de 75%.

Los 7 proyectos que se encuentran en ejecución al final del I Trimestre del 2024 bajo el programa ICS representan un monto total de L28,167,866.74 del cual se ha ejecutado financieramente un promedio del 80%.

A continuación, véase la ejecución financiera histórica del Programa de Infraestructura Para la Seguridad Ciudadana (ICS) al primer trimestre 2024:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
Programa de Infraestructura Para la Seguridad Ciudadana (ICS)	522-0501-4	US\$	14,848,966	25/10/2017
		Lempiras	368,077,654	- 25/06/2024
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Ejecutado (Devengado)</b>	
I Trimestre 2024	41,564,993	41,564,993	8,503,368	20%
Acumulado 2024	-	41,564,993	8,503,368	20%
Acumulado Vida del Proyecto **	<b>368,077,654</b>	<b>368,077,654</b>	<b>325,913,232</b>	<b>88%</b>

\*\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 31/03/2024 (BCH): L24.7881 por US\$1.00

#### 4.3.1 PRINCIPALES ADQUISICIONES I TRIMESTRE 2024

- ✓ Firma de Contratos de Proceso COT-FHIS-050-2023 y CPN-FHIS-044-2023 (11 proyectos)
- ✓ Contratación de la Firma Formuladora de Proyectos (2 Lotes Desiertos).
- ✓ Un primer lote de 25 subproyectos de reposición, reparación y ampliación de centros educativos adjudicados por un monto de L88,289,931.04. La ejecución al cierre del 1er trimestre del año 2024 es de L85,028,647.85 equivalente al 97% para obras y de L5,904,228.64 equivalente al 59%.
- ✓ Un tercer grupo de 8 subproyectos dieron inicio en el último trimestre del año por un monto de L175,302,970.39 y para la supervisión L24,306,748.00. La ejecución al cierre del 1er trimestre del año 2024 es de L52,195,951.44 equivalente al 30% para obras y de L. 6,694,048.26 equivalente al 27% para la supervisión.

#### 4.3.2 PROGRAMAS SOCIALES

En el primer trimestre de 2024, no se registraron resultados físicos en cuanto a la ejecución de programas sociales, principalmente debido a la falta de ejecución presupuestaria en dicho periodo.

#### 4.4 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

En el primer trimestre se autorizaron las siguientes modificaciones presupuestarias:

- ✓ Traslado presupuestario para adquirir nueve (9) vehículos para uso institucional, en línea con la estrategia de gestión financiera del riesgo de desastres ejecutada por la SEFIN y para fortalecer la capacidad institucional del FHIS. Asimismo, se contempla la compra de 35 computadoras de escritorio, 15 computadoras

portátiles de gama media, 3 monitores, 5 discos duros externos, 1 data switch y 3 servidores para el uso del proyecto PRE. – **L15.8 millones.**

#### 4.5 PROBLEMÁTICA Y ACCIONES DURANTE EL I TRIMESTRE-2024

Durante el primer trimestre de 2024, el Fondo Hondureño de Inversión Social enfrentó varios desafíos en la ejecución de sus programas:

- ✓ En la formulación de subproyectos, se observó una falta de análisis de gestión de riesgos y la necesidad de actualizar costos y cantidades de obra.
- ✓ Además, la ejecución presupuestaria se vio impactada por el cambio de autoridades, lo que generó retrasos en la firma de documentos de pago y en el inicio de obras según lo planificado.
- ✓ La coordinación externa también presentó dificultades, con cambios solicitados por donantes que alteraron la planificación original y requerimientos de reprogramación de actividades para cumplir con los plazos establecidos. Estos problemas han puesto de manifiesto la necesidad de implementar medidas para mejorar la eficiencia y efectividad en la gestión de los recursos y proyectos del Fondo Hondureño de Inversión Social.

Para abordar los desafíos en la ejecución de los programas del Fondo Hondureño de Inversión Social en el primer trimestre de 2024, se proponen soluciones integrales. Estas incluyen la implementación de capacitación en gestión de riesgos para formuladores y personal interno, establecimiento de un sistema de revisión y actualización de costos, optimización de procesos de firma de documentos mediante flujos de trabajo electrónicos, fortalecimiento de la coordinación con donantes y socios externos, y desarrollo de planes de contingencia detallados. Estas medidas mejorarán la eficiencia y efectividad de los programas, asegurando un uso óptimo de recursos y contribuyendo al desarrollo social y económico de Honduras.

#### Conclusiones

- ✓ La ejecución presupuestaria durante el primer trimestre de 2024 resultó insatisfactoria, con una ejecución acumulada del 3.7%, lo que representa un desafío significativo para alcanzar las metas establecidas.
- ✓ Las modificaciones presupuestarias entre proyectos y objetos de gasto fueron necesarias para ajustarse a los cambios en la programación, los Planes Operativos Anuales (POA) y los compromisos específicos de cada proyecto, lo que evidencia la importancia de la flexibilidad en la gestión presupuestaria.

- ✓ La falta de análisis de gestión de riesgos en las formulaciones recibidas revela una brecha en la planificación, lo que podría dar lugar a una ejecución ineficiente y a la aparición de imprevistos durante la implementación de los proyectos.
- ✓ La necesidad de actualizar los costos y cantidades de obra indica la importancia de contar con información precisa y actualizada para una planificación efectiva y una asignación adecuada de recursos.
- ✓ El cambio de autoridades afectó la firma de documentos de pago, lo que contribuyó a retrasos en el inicio de obras y a una ejecución menos eficiente en comparación con el plan establecido.
- ✓ Los cambios solicitados por donantes generaron interrupciones en la planificación y la necesidad de reprogramar actividades, lo que subraya la importancia de una coordinación estrecha y una comunicación efectiva con las partes interesadas externas.

### Recomendaciones

- ✓ Brindar capacitación a los formuladores externos y al equipo del proyecto PRE en la identificación y gestión de riesgos en proyectos de infraestructura. Esto ayudará a integrar análisis de riesgos completos en las formulaciones de subproyectos, reduciendo la necesidad de reformulaciones y agilizando el proceso de preparación de expedientes.
- ✓ Establecer un sistema periódico de revisión y actualización de costos y cantidades de obra, en colaboración con expertos en construcción y economía. Esto garantizará que las formulaciones de subproyectos estén alineadas con los costos y recursos actuales, evitando retrasos por discrepancias en la planificación.
- ✓ Evaluar y optimizar los procesos internos de aprobación y firma de documentos de pago, para minimizar los retrasos causados por cambios en las autoridades institucionales. Esto puede incluir la implementación de flujos de trabajo electrónicos y la designación de firmantes alternativos en caso de ausencia de las autoridades principales.
- ✓ Mejorar la comunicación y coordinación con donantes y socios externos, como la USAID, para garantizar una planificación más precisa y evitar cambios de última hora en la ejecución de proyectos. Establecer mecanismos de consulta y aprobación previa para cambios significativos en la planificación.
- ✓ Desarrollar planes de contingencia para anticipar posibles retrasos y contratiempos en la ejecución de proyectos. Estos planes pueden incluir medidas específicas para mitigar riesgos y reprogramar actividades en caso de desviaciones del cronograma previsto.

# ANEXOS

SECRETARÍA DE FINANZAS

ANEXO No 1

SECRETARÍA DE FINANZAS

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE, 2024

Cifras en Lempiras

No. Proy.	INSTITUCIÓN / PROYECTO	Presupuesto Vigente		Ejecutado (Devengado) al I Trimestre			% Ejecución (Ejec./Vigte.)
		Fondos Externos	Total General	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total General	
9	<b>0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social</b>	<b>1,565,363,694</b>	<b>1,918,311,767</b>	<b>5,655,860</b>	<b>69,723,075</b>	<b>75,378,935</b>	<b>3.9%</b>
1	ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS	45,099,086	56,710,336	1,989,000	3,633,587	5,622,587	9.9%
	<b>Total ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS</b>	<b>45,099,086</b>	<b>56,710,336</b>	<b>1,989,000</b>	<b>3,633,587</b>	<b>5,622,587</b>	<b>9.9%</b>
2	Ampliación Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Ciudad De Gracias, Departamento De Lempira	51,626,065	51,626,065	-	1,281,866	1,281,866	2.5%
	<b>Total Ampliación Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Ciudad De Gracias,</b>	<b>51,626,065</b>	<b>51,626,065</b>	<b>-</b>	<b>1,281,866</b>	<b>1,281,866</b>	<b>2.5%</b>
3	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA	39,425,832	41,564,993	2,139,000	6,364,369	8,503,369	20.5%
	<b>Total PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA</b>	<b>39,425,832</b>	<b>41,564,993</b>	<b>2,139,000</b>	<b>6,364,369</b>	<b>8,503,369</b>	<b>20.5%</b>
4	PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)	11,064,897	11,064,897	-	-	-	0.0%
		118,213,576	123,536,744	573,587	2,112,211	2,685,797	2.2%
	<b>Total PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)</b>	<b>129,278,473</b>	<b>134,601,641</b>	<b>573,587</b>	<b>2,112,211</b>	<b>2,685,797</b>	<b>2.0%</b>
5	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y FORMACION EDUCATIVA EN HONDURAS	306,585,912	306,585,912	-	10,064,889	10,064,889	3.3%
	<b>Total PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y FORMACION E</b>	<b>306,585,912</b>	<b>306,585,912</b>	<b>-</b>	<b>10,064,889</b>	<b>10,064,889</b>	<b>3.3%</b>
6	Programa del Laboratorio Nacional de Moléculas Biológicas, Genética y Prototipos de Salud de la República Honduras	-	-	-	-	-	0.0%
	<b>Total Programa del Laboratorio Nacional de Moléculas Biológicas, Genética y Prototipos de</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>
7	PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS	62,478,553	70,590,547	954,273	1,677,871	2,632,144	3.7%
	<b>Total PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS</b>	<b>62,478,553</b>	<b>70,590,547</b>	<b>954,273</b>	<b>1,677,871</b>	<b>2,632,144</b>	<b>3.7%</b>
8	Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras.	298,426,045	298,426,045	-	44,588,283	44,588,283	14.9%
	<b>Total Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Ho</b>	<b>298,426,045</b>	<b>298,426,045</b>	<b>-</b>	<b>44,588,283</b>	<b>44,588,283</b>	<b>14.9%</b>
9	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS A NIVEL NACIONAL	632,443,728	958,206,228	-	-	-	0.0%
	<b>Total Rehabilitación de Centro Educativos, Construcción de Centro Educativos.</b>	<b>632,443,728</b>	<b>958,206,228</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>

Nota: SIAFI, 31/03/2024

## ANEXO No 2

## SECRETARÍA DE FINANZAS

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública

## PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL I TRIMESTRE, 2024

Institución/Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			I Trimestre 2024		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
<b>0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social</b>								
Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Ciudad de Gracias, Departamento de Lempira	Diseño de los sistemas de agua potable realizado.	Diseño	1	0	0%	0	0	0%
Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras.	Centros educativos rehabilitados y/o reconstruidos afectados por ciclones Eta e Iota en beneficio de la población afectada por los fenómenos naturales. PRE	Centro Educativo	20	4	20%	4	4	100%
	Sistemas de agua rehabilitados y/o reconstruidos afectados por ciclones Eta e Iota. PRE	Sistema de Agua	3	0	0%	0	0	0%
	Infraestructura vial rehabilitada y reconstruida afectados por ciclones Eta e Iota. PRE	Kilometro	5	1	20%	1	1	100%



SECRETARÍA DE FINANZAS

	Infraestructura en centros de salud pública rehabilitados y/o reconstruidos afectados por ciclones Eta e Iota en beneficio de la población afectada por los fenómenos naturales. PRE	Unidad de Salud	1	0	0%	0	0	0%
PROGRAMA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SU GESTION LOCAL	Centro educativos construidos, reparados y/o ampliados. PROMINE	Centro Educativo	7	0	0%	0	0	0%
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA	Espacios públicos recuperados y entregados para la seguridad ciudadana a las colonias, alcaldías y patronatos en beneficio de la población hondureña ICS	Obra	3	0	0%	0	0	0%
	Centros educativos construidos, reparados y/o ampliados ubicados en Choloma, San Pedro Sula, Chamelecón, La Lima, Tela y en Tegucigalpa en beneficio de niños y niñas de las zonas urbana y rural de Honduras. ICS	Centro Educativo	3	1	33%	1	1	100%
	Obras complementarias reparados y/o ampliados en los servicios de salud ubicados en La Ceiba, Sps y Tegucigalpa. ICS	Obra	1	1	100%	1	1	100%

SECRETARÍA DE FINANZAS

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y FORMACION EDUCATIVA EN HONDURAS	Centro educativos construidos, reparados y/o ampliados.	Centro Educativo	42	7	17%	7	7	100%
PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS	Espacios públicos recuperados y entregados para la seguridad ciudadana a las colonias, alcaldías y patronatos en beneficio de la población hondureña CONVIVIR II	Obra	7	0	0%	1	0	0%
	Jóvenes capacitados en habilidades sociales y laborales para personas jóvenes de entre las edades de 12-30 años en los municipios de Santa Rosa de Copán, Intibucá, La Esperanza y Juticalpa. CONVIVIR Fase II	Capacitado	810	0	0%	202	0	0%
ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS	Centros educativos construidos, reparados y/o ampliados en beneficio de niños y niñas de las zonas rural y urbanas en Honduras. PIOH	Centro Educativo	1	0	0%	0	0	0%

## SECRETARÍA DE FINANZAS

	Infraestructura social (puentes y caja puente), rehabilitada y reconstruida en beneficio de la población a nivel Nacional PIOH	Obra de Infraestructura	1	0	0%	0	0	0%
--	--	-------------------------	---	---	----	---	---	----

Fuente: Unidad Ejecutora al 31/03/2024

