



Secretaría de  
**Finanzas**  
Gobierno de la República



Secretaría de  
**Finanzas**  
Gobierno de la República

# Informe de Avance Físico y Financiero

## PLAN DE INVERSION PÚBLICA AL III TRIMESTRE 2024

**El Instituto Hondureño para la Prevención y  
Tratamiento del Alcoholismo, Drogadicción y  
Farmacodependencia (IHADFA)**

Tegucigalpa, Honduras

Octubre, 2024

[www.sefin.gob.hn](http://www.sefin.gob.hn)



**DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS**



## IV. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

### a. Ejecución Física-Financiera de la Inversión Pública

El Instituto Hondureño para la Prevención y Tratamiento del Alcoholismo, Drogadicción y Farmacodependencia (IHADFA), tiene a su cargo la investigación, prevención, tratamiento y rehabilitación de las enfermedades del alcoholismo, tabaquismo, drogadicción y farmacodependencia, promoviendo de esta manera una salud mental positiva en la población hondureña.

El “Plan de Gobierno Bicentenario para la Refundación de la Patria y Construcción del Estado Socialista y Democrático (2022-2026)”, considera la promoción de la salud mental positiva en la población hondureña, sin discriminación de género, raza o religión, a través de la prevención, tratamiento y rehabilitación del consumo de drogas lícitas e ilícitas que impacten en la disminución del consumo de sustancias psicoactivas.

Cuadro No. 01  
Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2024  
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>109,946,221.0</b>
Inversión Productiva	105,739,351.0
Inversión Social	835,049.0
Formación Bruta de Capital	3,371,821.0
<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>109,902,151.0</b>
Inversión Productiva	105,695,281.0
Inversión Social	835,049.0
Formación Bruta de Capital	3,371,821.0
<b>Ejecutado III Trimestre</b>	<b>20,749,855.0</b>
Inversión Productiva	20,749,855.0
Inversión Social	-
Formación Bruta de Capital	-
<b>% Ejecución (Devengado III Trim-2024/Vigente)</b>	<b>18.9%</b>
<b>Ejecutado Anual</b>	<b>24,956,725.0</b>
Inversión Productiva	20,749,855.0
Inversión Social	835,049.0
Formación Bruta de Capital	3,371,821.0
<b>% Ejecución (Devengado anual/Vigente)</b>	<b>22.7%</b>
<b>Comprometido (Devengado + Compromiso)</b>	<b>24,956,725.0</b>
Inversión Productiva	20,749,855.0
Inversión Social	835,049.0
Formación Bruta de Capital	3,371,821.0
<b>% Ejecución Comprometido (Comprometido/Vigente)</b>	<b>22.7%</b>

*Nota:* SIAFI, 30/09/2024


Al finalizar el tercer trimestre del 2024, la institución contó con un presupuesto vigente para la inversión pública de L109.9 millones, desglosados en L105.7



millones para inversión productiva, L0.8 millones para inversión social y L3.4 millones en formación bruta de capital; al término del trimestre se registró ejecución presupuestaria L20.8 inversión productiva que representan el 18.9% con relación al presupuesto vigente, tal como se detalla en el Cuadro No. 1.

La ejecución de la inversión productiva se mostrará a partir del tercer trimestre a través del Proyecto de Construcción y equipamiento del edificio del Primer Centro Nacional de Tratamiento de las Adicciones en Honduras (CENATRAH) en el Municipio de Orica, Francisco Morazán.

### b. Financiamiento de la Inversión Pública

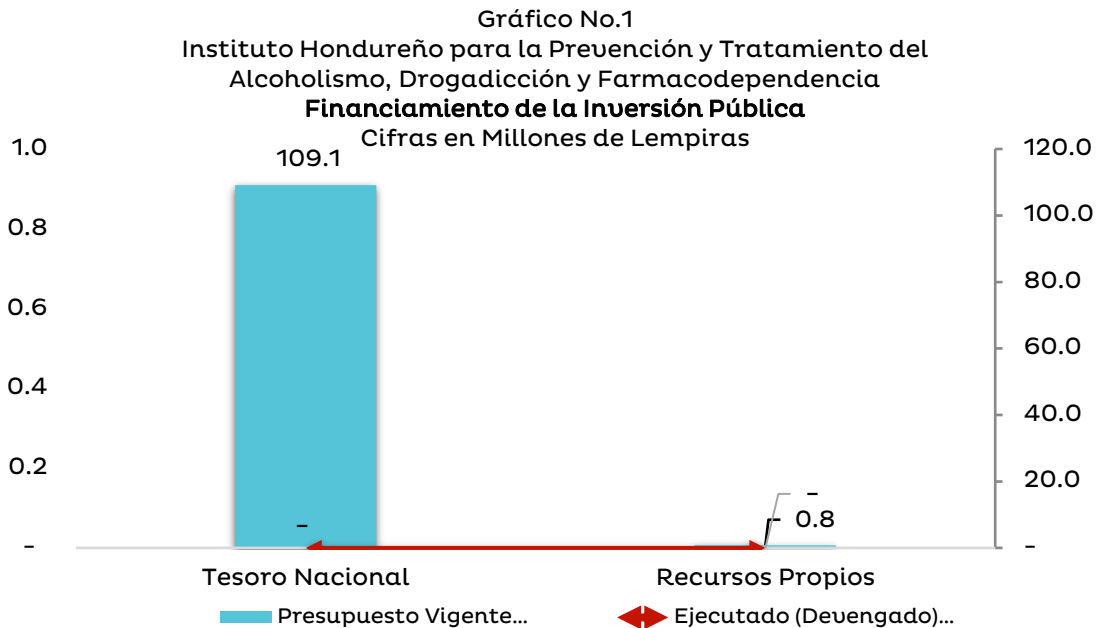


Respecto al financiamiento de la Inversión Pública, el 99.2% del presupuesto vigente corresponde a recursos provenientes del Tesoro Nacional destinados a la ejecución del Proyecto de Construcción y equipamiento del edificio del Primer Centro Nacional de Tratamiento de las Adicciones en Honduras (CENATRAH) en el Municipio de Orica, Francisco Morazán asimismo para el equipamiento del Programa de Prevención Educativa encauzado a la capacitación de jóvenes (mujeres y hombres) en temas de prevención del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas; mientras que el restante 0.8% a Recursos Propios generados por el mismo instituto obedecen a la compra de productos farmacéuticos y medicinales para la atención médica especializada a personas que sufren adicciones.



### c. Comportamiento de la Ejecución al III Trimestre (2020-2024)

En el periodo comprendido entre el 2020 y el 2024, la Inversión Pública del IHADFA se ha concentrado básicamente en la inversión social y la formación bruta de capital; para el 2024 se incluye la ejecución de un proyecto de inversión.

Las actividades y obras de ese proyecto están orientadas a la construcción, supervisión, equipamiento y fortalecimiento tecnológico del CENATRAH.

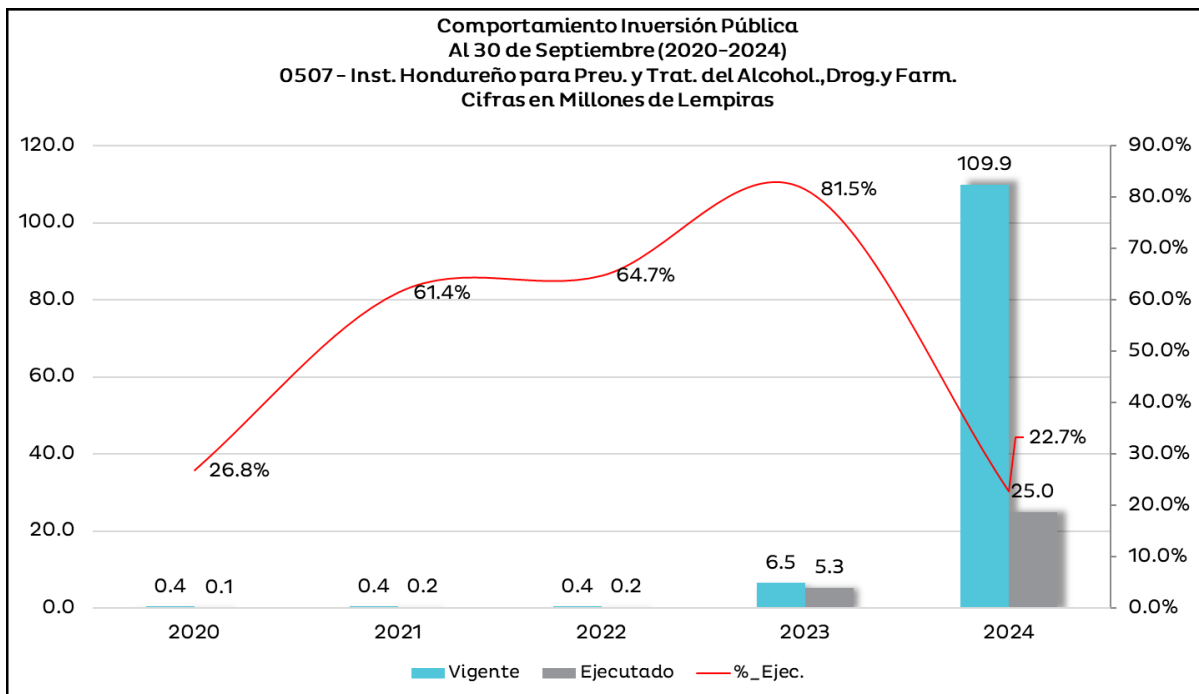

El Gráfico No.2 muestra la ejecución porcentual comparativa de los últimos 3 años al 30 de septiembre, para el año 2020 se muestra cero ejecuciones, producto de la transición del Gobierno de la República, incrementándose para el año 2023 donde se alcanzó una ejecución del 81.5% respecto a su presupuesto vigente específicamente en inversión social y formación bruta de capital; para el año 2024 se denota una ejecución de inversión productiva L25.0 de los recursos del proyecto CENATRAH.

### d. Principales Proyectos

La inversión productiva del IHADFA contempla la ejecución del Proyecto de Construcción y equipamiento del edificio del Primer Centro Nacional de Tratamiento de las Adicciones en Honduras (CENATRAH) en el Municipio de Orica, Francisco Morazán; sin embargo, al finalizar el tercer trimestre de 2024 se ha



efectuado el traslado presupuestario de los recursos para su ejecución, a continuación, se detallan los principales avances físicos al 30 septiembre del 2024:

### Principales Metas Físicas, III- Trimestre-2024

Meta Física	Unidad de Medida	Anual 2024			III-Trimestre 2024		
		Programación	Ejecución	% Ejecución.	Programación	Ejecución	% Ejecución
Elaboración del diseño, construcción y supervisión del CE NATRAH	Diseño	1	0	0%	1	0	0%

Fuente: Unidad Ejecutora al 30/09/2024

Como se pudo apreciar, no se presenta ejecución en estas actividades debido que la Nota de Prioridad fue emitida finales abril y los recursos fueron incorporados al presupuesto de la institución en el mes de julio del 2024. El proyecto está avanzado en los procesos de adjudicación de los diseños de acuerdo con la ley Contratación de Estado y cumplir con los entregables del proyecto.

Con el proyecto, se beneficiarán 5,000 personas por año.

A continuación, se presenta la ejecución financiera histórica del Proyecto de la referencia al tercer trimestre 2024:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de
		US\$		Inicio - Fin
Construcción y Equipamiento del Edificio del primer Centro Nacional de Tratamiento de las Adicciones en Honduras	FN-25591-1	US\$	0	01/04/2024-01/07/2025
		Lempiras	L105,739,351.0	
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Ejecutado (Devengado)</b>	<b>% Ejecución</b>
III-Trimestre 2024	105,739,351.0	105,739,351.0	20,749,855.01	20%
Acumulado 2024	105,739,351.00	105,739,351.0	20,749,855.01	20%
Acumulado Vida del Proyecto **	<b>105,739,351</b>	<b>105,739,351</b>	<b>20,749,855.01</b>	<b>20%</b>

#### d.1. Principales Adquisiciones III Trimestre 2024

La Unidad Ejecutora del proyecto de acuerdo con sus PAC's y PEP's han efectuado los procesos siguientes:

- Elaboración del diseño, construcción y supervisión del CENATRAH
- Equipamiento del edificio CENATRAH
- Fortalecimiento tecnológico del edificio CENATRAH

#### **d.2. Programas Sociales**

Al tercer trimestre de 2024, el presupuesto vigente asciende a L835,049.0 de lo cual se ejecutó la totalidad.

#### **e. Gestión de la Inversión**

Para el tercer trimestre de 2024, se realizaron las siguientes gestiones:

- Seguimiento de la ejecución física y financiera de la inversión productiva que conlleva el traslado presupuestario de los recursos hacia el proyecto de inversión, programas sociales y formación bruta de capital.
- Reuniones técnicas con personal de IHADFA y SEFIN, para análisis y seguimiento de las gestiones que obstaculizan la ejecución del proyecto CENATRAH.

#### **f. Problemática y Acciones Durante el III Trimestre-2024**

##### **Problemática**

Desfase en la ejecución del proyecto, producto de los atrasos en las gestiones administrativas para el traslado presupuestario de los recursos hacia el proyecto de inversión.

##### **Acciones**

Realizar las gestiones necesarias para el adecuado cierre del proyecto en el 2025.



## **V. CONCLUSIONES**

- Los avances físicos y financieros que se muestran al tercer trimestre del 2024 corresponden a la ejecución conjunta de la inversión de la institución (Productiva, Formación Bruta de Capital e Inversión Social).
- Atrasos en las gestiones administrativas que denotan incongruencia en lo ejecutado versus lo programado por el instituto.

## **VI. RECOMENDACIONES**

- Mantener reuniones constantes entre la Unidad Ejecutora del proyecto, Gerencia Administrativa y la UPEG de IHADFA para establecer los medios de comunicación más efectivos que den celeridad a la ejecución del proyecto para el 2025.
- Acelerar el ritmo de ejecución del proyecto.



Secretaría de  
**Finanzas**  
Gobierno de la República

# ANEXOS





Secretaría de  
**Finanzas**  
Gobierno de la República

## ANEXO 1

SECRETARÍA DE FINANZAS  
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública  
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE, 2024  
Cifras en Lempiras

No. Proy.	NOMBRE PROYECTO / PROGRAMA	Convenio	Presupuesto Aprobado		Presupuesto Vigente		Ejecutado (Devengado III Trimestre)			Ejecutado (Devengado Anual)		
			Fondos Nacionales	Total	Fondos Nacionales	Total	Fondos Nacionales	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)
1	0507 - Inst. Hondureño para Prev. y Trat. del Alcohol, Drog. y Farm.		105,739,351	105,739,351	105,695,281	105,695,281	20,749,855	20,749,855	19.6%	20,749,855	20,749,855	19.6%
1	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO DEL PRIMER CENTRO NACIONAL DE TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES EN HONDURAS	FN-25591-1	105,739,351	105,739,351	105,695,281	105,695,281	20,749,855	20,749,855	19.6%	20,749,855	20,749,855	19.6%
	<b>Total CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO DEL PRIMER CENTRO NACIONAL DE TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES EN HONDURAS</b>		<b>105,739,351</b>	<b>105,739,351</b>	<b>105,695,281</b>	<b>105,695,281</b>	<b>20,749,855</b>	<b>20,749,855</b>	<b>19.6%</b>	<b>20,749,855</b>	<b>20,749,855</b>	<b>19.6%</b>
	0507 - Inst. Hondureño para Prev. y Trat. del Alcohol, Drog. y Farm.		835,049	835,049	835,049	835,049	-	-	0.0%	835,049	835,049	100.0%
	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA A PERSONAS QUE SUFREN ADICCIONES		835,049	835,049	835,049	835,049	-	-	0.0%	835,049	835,049	100.0%
	<b>Total ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA A PERSONAS QUE SUFREN ADICCIONES</b>		<b>835,049</b>	<b>835,049</b>	<b>835,049</b>	<b>835,049</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>	<b>835,049</b>	<b>835,049</b>	<b>100.0%</b>
	0507 - Inst. Hondureño para Prev. y Trat. del Alcohol, Drog. y Farm.		3,371,821	3,371,821	3,371,821	3,371,821	-	-	0.0%	3,371,821	3,371,821	100.0%
	JÓVENES (MUJERES Y HOMBRES) CAPACITADOS EN TEMA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO Y OTRAS DROGAS		3,371,821	3,371,821	3,371,821	3,371,821	-	-	0.0%	3,371,821	3,371,821	100.0%
	<b>Total JÓVENES (MUJERES Y HOMBRES) CAPACITADOS EN TEMA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO Y OTRAS DROGAS</b>		<b>3,371,821</b>	<b>3,371,821</b>	<b>3,371,821</b>	<b>3,371,821</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>	<b>3,371,821</b>	<b>3,371,821</b>	<b>100.0%</b>

Fuente: SIAFI, 30/09/2024



Secretaría de  
**Finanzas**  
Gobierno de la República

## ANEXO 2

Secretaría de Finanzas

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública

### PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2024

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2024		
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Inst. Hondureño para Prev. y Trat. del Alcohol., Drogo y Farm.	001 - CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO DEL PRIMER CENTRO NACIONAL DE TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES EN HONDURAS (CENATRAH) EN EL MUNICIPIO DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN.	04 - ELABORACION DEL DISEÑO, CONSTRUCCION Y SUPERVISION DEL CENATRAH	291 - DISEÑO	2	0	-	1	0	-
		05 - EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO CENATRAH	392 - EQUIPO	2	0	-	1	0	-
		06 - FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DEL EDIFICIO CENATRAH	392 - EQUIPO	2	0	-	1	0	-

Fuente: SIAFI, 30/09/2024
