



Secretaría de
Finanzas
Gobierno de la República

Informe de Avance Físico y Financiero

PLAN DE INVERSION PÚBLICA AL III TRIMESTRE 2024

Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR)

Tegucigalpa, Honduras

Octubre, 2024

www.sefin.gob.hn



**DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES
PÚBLICAS**

IV. PLAN DE INVERSION PÚBLICA

a. Ejecución Física-Financiera de la Inversión Pública

La Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR) es la institución rectora del deporte, educación física y recreación, encargada de la construcción, mantenimiento y conservación de la infraestructura deportiva. Con la finalidad de incentivar la práctica del deporte de toda la población sin discriminación de ninguna naturaleza y promover un estado de vida saludable.

En el Plan de Gobierno de Honduras se contempla la inversión para la construcción de infraestructura para la práctica deportiva de acceso público y gratuito. En estas obras se vela por el diseño incluyente de múltiples prácticas deportivas, incluidas las populares tradicionales y el acceso para personas con discapacidad.

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2024
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	1,063,092,404.0
Inversión Productiva	826,384,404.0
Inversión Social	16,000,000.0
Formación Bruta de Capital	220,708,000.0
Presupuesto Vigente	1,781,742,849.0
Inversión Productiva	1,104,620,295.0
Inversión Social	33,530,150.0
Formación Bruta de Capital	643,592,404.0
Ejecutado III Trimestre	88,269,931.1
Inversión Productiva	86,229,223.6
Inversión Social	1,652,283.5
Formación Bruta de Capital	388,424.0
% Ejecución (Devengado III Trim-2024/Vigente)	5%
Ejecutado Anual	158,767,607.7
Inversión Productiva	156,229,223.6
Inversión Social	1,952,135.3
Formación Bruta de Capital	586,248.8
% Ejecución (Devengado anual/Vigente)	9%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	159,785,195.8
Inversión Productiva	156,229,223.6
Inversión Social	2,188,535.3
Formación Bruta de Capital	1,367,437.0
% Ejecución Comprometido (Comprometido/Vigente)	9%

Nota: SIAFI, 30/09/2024

Al Tercer Trimestre del año 2024, la institución contó con un presupuesto de inversión pública vigente de L1,781.7 millones; de los cuales L1,104.6 millones,

corresponden a Inversión productiva, L33.5 millones a la inversión social y **L643.5 millones** a la formación bruta capital. En cuanto a la ejecución presupuestaria al cierre del trimestre, se reporta una ejecución de L86.2 millones en la inversión productiva, L1.65 millones en la Inversión Social y L0.39 millones de la formación bruta de capital lo que representa el 5.0% en relación con el presupuesto vigente, tal como se detalla en el Cuadro No. 1.


Dicha inversión se llevó a cabo a través de la ejecución de dos proyectos enfocados en la construcción, mejoras y rehabilitación de espacios físicos deportivos, recreativos y administrativos con acceso inclusivo para uso de la población en general a nivel nacional, también programas sociales deportivos y la formación bruta de capital. Ver Detalle de Ejecución Financiera en Anexo No. 1.

b. Financiamiento de la Inversión Pública

En referencia al financiamiento de Inversión Pública, el 100% corresponde a fondos provenientes de fondos nacionales expresado en términos monetarios con un monto de **L1,781.7 millones**, Dicha inversión es financiada por la Tesorería General de la República y el Banco Central de Honduras con recursos de fuente 11 y 14.

c. Comportamiento de la Ejecución al III Trimestre (2020-2024):

En el periodo comprendido entre el 2020 y el 2024, los proyectos de Inversión Pública de CONDEPOR han considerado la ejecución de 2 Proyectos de Inversión, financiados en su totalidad con recursos fondos nacionales (Fuentes 11 y 14).

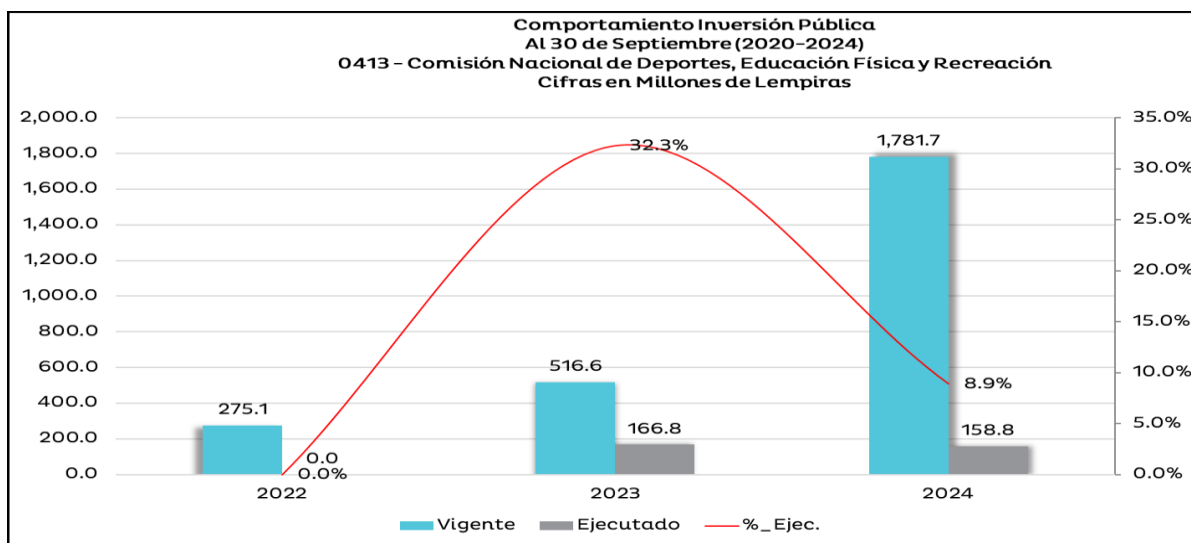

La Gráfica No.1 muestra la ejecución porcentual comparativa al 30 septiembre de los años 2020-2024, en donde se aprecia una disminución de los niveles de ejecución, aunque el presupuesto vigente para el 2024 aumentó respecto al 2023, con una inversión ejecutada de L158.8 millones, que representan el 8.9%. en el 2024 la baja ejecución se debe a que los recursos fueron incorporados hasta el mes de junio y los procesos de adquisiciones obras comenzaron tarde.

d. Principales Proyectos

En el tercer trimestre del año 2024, la inversión se concentró en los proyectos para Diseño, Construcción, Mejoras y Rehabilitación de Espacios Físicos Deportivos, Recreativos y Administrativos con Acceso Inclusivo para uso de la población en general a Nivel Nacional:

1. Construcción, Mejoras y Rehabilitación de Espacios Físicos Deportivos, Recreativos y Administrativos con Acceso Inclusivo para Uso de la Población en General a Nivel Nacional:

El Proyecto se enfoca para contrarrestar la disminución del bienestar físico, mental y valores humanos en niños, niñas, jóvenes y adultos, además, el retraso cultural, social y deportivo, CONDEPOR implementa la construcción de 25 canchas deportivas (16 Canchas Sintéticas Tipo 11, 8 Canchas Polideportivas Bajo Techo y 1 Cancha Sintética Tipo 9) y la rehabilitación y equipamiento de espacios físicos Administrativos dentro de las Instalaciones del Complejo deportivo José Simón Azcona.

Los principales avances físicos al 30 de septiembre de 2024 son los siguientes:

Principales Metas Físicas, - III Trimestre-2024							
Meta Física	Unidad de Medida	Anual 2024			III - Trimestre 2024		
		Programación	Ejecución	% Ejecución.	Programación	Ejecución	% Ejecución.
Construcción de canchas deportivas y recreativas	Canchas	25	25	100%	25	25	100%
Realizar los Estudios y Diseños de las Obras de Infraestructura Deportiva	Diseño	1	0	0%	1	0	0%

Principales Metas Físicas, - III Trimestre-2024							
Meta Física	Unidad de Medida	Anual 2024			III - Trimestre 2024		
		Programación	Ejecución	% Ejecución.	Programación	Ejecución	% Ejecución
Rehabilitar espacios físicos administrativos y físicos Complejo Deportivo "José Simón Azcona Hoyo", Villa Olímpica	Obras	2	0	0%	2	0	0%

Fuente: Unidad Ejecutora al 30/09/2024

Como se detalla en el cuadro anterior, de acuerdo con lo reportado por la Unidad Ejecutora de CONDEPOR, el avance físico acumulado 100% las 25 canchas están en ejecución y están por ser entregadas 7 canchas; el resto será entregado en el último trimestre del 2024. Los estudios y diseños están en proceso de finalización de diseños. Además, se encuentra en ejecución rehabilitación de espacios físicos administrativos y físicos como el Complejo Deportivo "José Simón Azcona Hoyo", Villa Olímpica.

Con el proyecto, se beneficiarán 765,000 habitantes de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, Olancho, La Paz, Comayagua, Lempira, Santa Barbara, Yoro, Colon Cortes, Choluteca y El Paraíso.

A continuación, se presenta la ejecución financiera histórica del Proyecto, tercer trimestre 2024:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de
		US\$		Inicio - Fin
Construcción, Mejoras y Rehabilitación de Espacios Físicos Deportivos, Recreativos y Administrativos con Acceso Inclusivo para uso de la población en general a Nivel Nacional	FN-25332	US\$		20/9/2023
		Lempiras	L402,000,000.00	31/12/2024
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
III -Trimestre 2024		354,862,182.0	86,004,851.2	24.2%
Acumulado 2024		354,862,182.0	156,004,851.2	44.0%
Acumulado Vida del Proyecto **	402,000,000.0	402,000,000.0	203,142,669.2	50.5%

**/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 30/09/2024 (BCH): L24.9115 por US\$1.00

2. Diseño, Construcción y Remodelación de Instalaciones y Espacios Físicos de Actividades Deportivas y Recreativas, para Uso de la Población a Nivel Nacional

Para contrarrestar la disminución del bienestar físico, mental y valores humanos en niños (as), jóvenes y adultos, además del retraso cultural, social y deportivo, CONDEPOR implementa la construcción de 32 canchas deportivas; las cuales se dividen en 15 canchas sintéticas de futbol 11, 4 canchas sintéticas de futbol 7 y 13 canchas multiusos; todas estarán ubicadas a lo largo del territorio nacional. Así mismo, la remodelación y mejora en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera; la remodelación de la grama de cancha, construcción de museo de historia del deporte, remodelación de palcos, construcción de maquila, construcción de Plaza Gastro Wanagia y reestructuración de la conectividad.

Al 30 de septiembre de 2024, los principales avances físicos son los siguientes:

Principales Metas Físicas, III- Trimestre-2024							
Meta Física	Unidad de Medida	Anual 2024			III -Trimestre 2024		
		Programación	Ejecución	% Ejecución.	Programación	Ejecución	% Ejecución
Canchas deportivas	Canchas	5	5	100%	5	5	100%
Remodelaciones en estadios nacionales	Estadio	3	2	67.3%	3	2	67.3%

Fuente: Unidad Ejecutora al 30/09/2024

La Construcción de 5 Canchas Deportivas, se encuentra en proceso de ejecución para poder ser terminadas en el IV- trimestre debido que este trimestre no se pudo finalizar debido que se tuvo que buscar fuente de financiamiento para a la incorporación de los recursos presupuestarios del proyecto y fueron incorporados en el presupuesto en el mes de junio.

en cuanto a la remodelación del estadio José de la Paz Herrera, se está trabajando en el armado y encofrado de las vigas escalonadas y se están instalando las graderías, todos los procesos estarían terminados para IV- Trimestre y se estaría instalando el techado y las butacas, las cuales fueron importadas de Italia.

Se han tenido atrasos debido a la temporada de invierno y el uso de las instalaciones para eventos deportivos nacionales e internacionales. La instalación de la grama híbrida para la cancha del estadio Francisco Morazán de, San Pedro Sula fue concluida y se espera que la grama del estadio Chochi Sosa estaría terminada en el IV trimestre 2024.

Los aspectos financieros del proyecto se presentan a continuación:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de
		US\$		Inicio - Fin
Diseño, construcción y remodelación de instalaciones y espacios físicos de actividades deportivas y recreativas, para uso de la población a nivel nacional	BCH-24789-1	US\$		28/8/2022
		Lempiras	L552,700,000.0	31/12/2024
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
III- Trimestre 2024		109,401,709.0	224,372.4	0.2%
Acumulado 2024		109,401,709.0	224,372.4	0.2%
Acumulado Vida del Proyecto **	552,700,000.0	552,700,000.0	88,322,509.0	16.0%

**/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 30/09/2024 (BCH): L24.9115 por US\$1.00

d.1. Principales Adquisiciones al III Trimestre 2024

- Estudios y Diseños de las Obras de Infraestructura Deportiva.
- Construcción de Canchas Deportivas a Nivel Nacional.
- Mejoras y Remodelaciones de Estadios a Nivel Nacional.
- Rehabilitación de espacios físicos administrativos y físicos Complejo Deportivo "José Simón Azcona Hoyo", Villa Olímpica

d.2. Programas Sociales

Referente al presupuesto asignado (L 33,530,150.0) se alcanzó una ejecución de L1,952,135.3 que representan el 5.8% del presupuesto vigente al tercer trimestre; este monto fue utilizado en el manejo, mejoramiento y conservación de instalaciones deportivas a nivel nacional.

e. Gestión de la Inversión

- Proyecciones mensuales de ejecución financiera.
- Reuniones de seguimiento y ejecución física y financiera entre la DGIP-SEFIN-DGP y CONDEPOR.
- Dictámenes de Ampliación Plazo y Categorías
- Modificaciones Presupuestarias

f. Problemática y acciones durante el III trimestre-2024

- Se ha tenido atrasos en la adjudicación de tres lotes, no fue posible la adjudicación de las obras contempladas en los mismos, se espera que dichas adjudicaciones se completen en el IV Trimestre estaría adjudicadas.
- Las 25 canchas en ejecución no se han podido ser entregadas en su totalidad, debido a atrasos por la temporada lluviosa, se espera que en el IV trimestre sean recepcionadas.
Como se ha mencionado las condiciones climatológicas se han retrasado las obras en varias instalaciones deportivas a nivel nacional.

V. Conclusiones

- Las reuniones de ejecución Financiera y Física con la Unidad Ejecutora de Proyectos de la CONDEPOR han permitido conocer de cerca varias problemáticas de los proyectos y poder tomar soluciones para mejorar la ejecución Financiera y Física de los proyectos.
- La construcción y mantenimiento de canchas deportivas requiere de una planificación adecuada, considerando aspectos como el tipo de superficie, dimensiones, iluminación y accesibilidad para garantizar su funcionamiento óptimo y seguro a nivel nacional.

VI. Recomendaciones

- Agilizar los procesos pendientes de adjudicación de obras de los proyectos para que dichas actividades estén concluidas al término del IV Trimestre dando cumplimiento a la Ley de Contratación de Estado.
- Mantener Reuniones de Seguimiento y Monitoreo Constante de los proyectos para cumplimiento de las metas Físicas y Financiera.



Secretaría de
Finanzas
Gobierno de la República

ANEXOS

ANEXO No 1

SECRETARÍA DE FINANZAS
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE, 2024
Cifras en Lempiras

No. Proy.	NOMBRE PROYECTO / PROGRAMA	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado (Devengado III Trimestre)				Ejecutado (Devengado Anual)			
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)
4	0413 - Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación		200,000,000	626,384,404	826,384,404	478,235,891	626,384,404	1,104,620,295	86,229,224	-	86,229,224	7.8%	156,229,224	-	156,229,224	14.1%
1	Construcción, Mejoras y Rehabilitación de Espacios Físicos Deportivos, Recreativos y Administrativos con Acceso Inclusivo para uso de la población en general a Nivel Nacional	FN-25332	-	-	-	354,862,182	-	354,862,182	86,004,851	-	86,004,851	24.2%	156,004,851	-	156,004,851	44.0%
	Total Construcción, Mejoras y Rehabilitación de Espacios Físicos Deportivos, Recre:		-	-	-	354,862,182	-	354,862,182	86,004,851	-	86,004,851	24.2%	156,004,851	-	156,004,851	44.0%
2	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE INSTALACIONES Y ESPACIOS FISICOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, PARA USO DE LA POBLACIÓN A NIVEL NACIONAL	BCH - 24789-1	-	-	-	109,401,709	-	109,401,709	224,372	-	224,372	0.2%	224,372	-	224,372	0.2%
	Total DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE INSTALACIONES Y ESPACIOS		-	-	-	109,401,709	-	109,401,709	224,372	-	224,372	0.2%	224,372	-	224,372	0.2%
3	PROGRAMA DE MANEJO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS		-	626,384,404	626,384,404	13,972,000	626,384,404	640,356,404	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
	Total PROGRAMA DE MANEJO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS		-	626,384,404	626,384,404	13,972,000	626,384,404	640,356,404	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
4	CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO DEPORTIVO MULTIDICIPLINARIO Y CANCHAS DEPORTIVAS A NIVEL NACIONAL		200,000,000	-	200,000,000	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
	Total CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO DEPORTIVO MULTIDICIPLINARIO Y CANCHAS		200,000,000	-	200,000,000	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
	0413 - Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación		16,000,000	-	16,000,000	33,530,150	-	33,530,150	1,652,284	-	1,652,284	4.9%	1,952,135	-	1,952,135	5.8%
	PROGRAMA DE MANEJO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS		16,000,000	-	16,000,000	33,530,150.0	-	33,530,150	1,652,284	-	1,652,284	4.9%	1,952,135	-	1,952,135.3	5.8%
	0413 - Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación		220,708,000	-	220,708,000	17,208,000	626,384,404	643,592,404	388,424	-	388,424	0.1%	586,249	-	586,249	0.1%
	PROGRAMA DE MANEJO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS		220,708,000	-	220,708,000	17,208,000	626,384,404	643,592,404	388,424	-	388,424	0.1%	586,249	-	586,249	0.1%
	Total PROGRAMA DE MANEJO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS		220,708,000	-	220,708,000	17,208,000	626,384,404	643,592,404	388,424	-	388,424	0.1%	586,249	-	586,249	0.1%

Fuente: SIAFI, 30/09/2024

ANEXO No 2

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2024

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2024		
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación	001 - DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE INSTALACIONES Y ESPACIOS FISICOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, PARA USO DE LA POBLACIÓN A NIVEL NACIONAL.	11 - Actas de Recepción de obra de infraestructura construida proyecto 24789-1-8-2022	349 - CANCHA DEPORTIVA	3	0	-	0	0	-
		12 - Actas de Recepción de obra por infraestructura rehabilitada y/o ampliada Proyecto 24789-1-8-2022	986 - OBRA MEJORADA	1	0	-	0	0	-
	002 - Construcción, Mejoras y Rehabilitación de Espacios Físicos Deportivos, Recreativos y Administrativos con Acceso Inclusivo para uso de la población en general a Nivel Nacional	06 - Actas de Recepción de obra de infraestructura construida (proyecto No. 25332-1-8-2023 25 canchas de fútbol)	1086 - ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA	25	0	-	10	0	-
		07 - Monto de inversión financiera en construcción de infraestructura deportiva y de recreación (proyecto 25332-1-8-2023)	75 - PORCENTAJE	100	0	-	39	0	-
		09 - Actas de Recepción de obra por infraestructura rehabilitada y/o ampliada (Proyecto 25332-1-8-2023)	1086 - ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA	2	0	-	0	0	-
		17 - Administración y gestión del proyecto	459 - OPERATIVO	1	0	-	0	0	-

Fuente: SIAFI, 30/09/2024
