



Informe de Avance Físico y Financiero

PLAN DE INVERSION PÚBLICA AL II TRIMESTRE 2025

Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR)

Tegucigalpa, Honduras

Julio, 2025

IV. PLAN DE INVERSION PÚBLICA

a. Ejecución Física-Financiera de la Inversión Pública

La Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR) es la institución rectora del deporte, educación física y recreación, encargada de la construcción, mantenimiento y conservación de la infraestructura deportiva. Con la finalidad de incentivar la práctica del deporte de toda la población sin discriminación de ninguna naturaleza y promover un estado de vida saludable.

En el Plan de Gobierno de Honduras se contempla la inversión para la construcción de infraestructura para la práctica deportiva de acceso público y gratuito. En estas obras se vela por el diseño incluyente de múltiples prácticas deportivas, incluidas las populares tradicionales y el acceso para personas con discapacidad.

Al segundo Trimestre del año 2025, la institución contó con un presupuesto de inversión

pública vigente de **L1,053.9 millones**; de los cuales **L464.1 millones**, corresponden a Inversión productiva, y **L589.9 millones** a la formación bruta capital. En cuanto a la ejecución presupuestaria al cierre del trimestre, se reporta una ejecución de L232.2 millones en la inversión productiva, L13.1 millones de la formación bruta de capital lo que representa el 23.3% en relación con el presupuesto vigente, tal como se detalla en el Cuadro No. 1.

Dicha inversión se llevó a cabo a través de la ejecución de tres proyectos enfocados en la construcción, mejoras y rehabilitación de espacios físicos deportivos, recreativos y administrativos con acceso inclusivo para uso de

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al II Trimestre
del 2025
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	1,133,885,040
Inversión Productiva	913,177,040
Formación Bruta de Capital	220,708,000
Presupuesto Vigente	1,053,921,884
Inversión Productiva	464,064,612
Formación Bruta de Capital	589,857,272
Ejecutado II Trimestre	245,271,996
Inversión Productiva	232,197,831
Formación Bruta de Capital	13,074,165
% Ejecución (Devengado II Trim- 2025/Vigente)	23.3%
Ejecutado Anual	245,523,924
Inversión Productiva	232,197,831
Formación Bruta de Capital	13,326,093
% Ejecución (Devengado anual/Vigente)	23.3%

Nota: SIAFI, 30/06/2025


la población en general a nivel nacional y la formación bruta de capital. Ver Detalle de Ejecución Financiera en Anexo No. 1.

b. Financiamiento de la Inversión Pública

En referencia al financiamiento de Inversión Pública, el 100% corresponde a fondos provenientes de fondos nacionales provenientes de Tesorería General de la Republica.

c. Comportamiento de la Ejecución al II Trimestre (2023-2025):

En el periodo comprendido entre el 2023 y el 2025, los proyectos de Inversión Pública de CONDEPOR han considerado la ejecución de 3 Proyectos de Inversión, financiados en su totalidad con recursos fondos nacionales. (Fuentes 11).

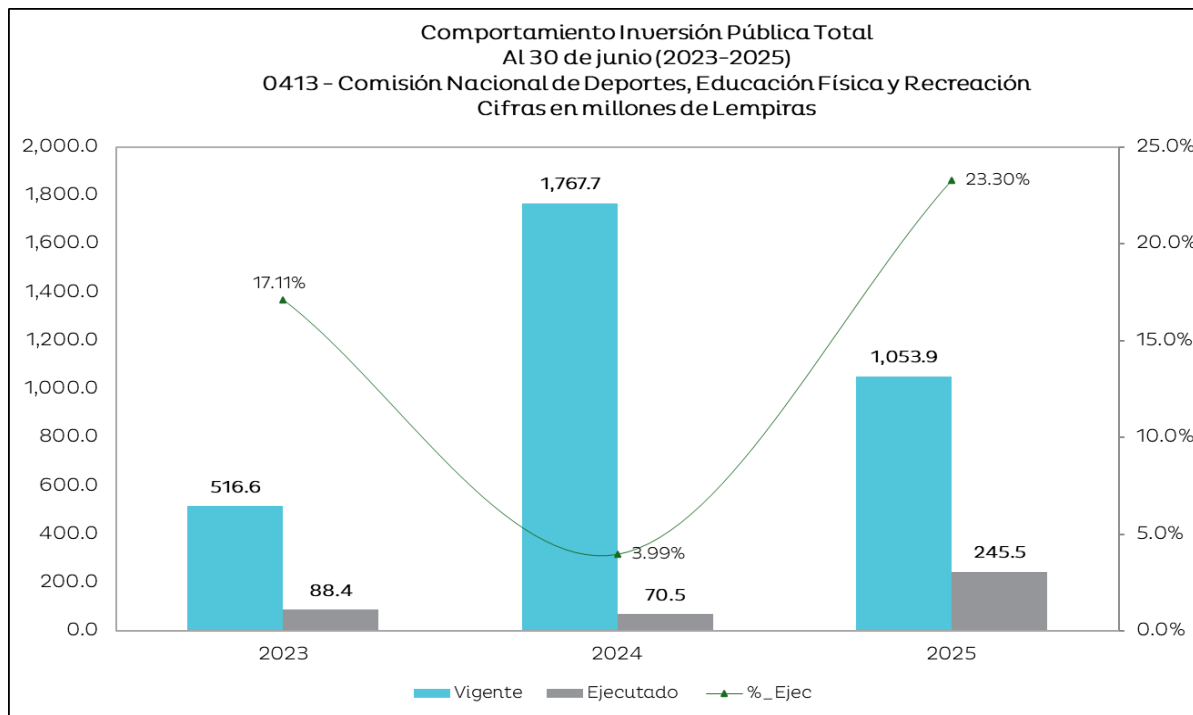

La Gráfica No.1 muestra la ejecución porcentual comparativa al 30 junio de en el año 2025, apreciando un aumento de los niveles de ejecución, aunque el presupuesto vigente para el 2024 aumentó respecto al 2023, año en el que se registró una disminución de la ejecución, con una inversión ejecutada de L70.5 millones, que representa el 4% en el 2024; la baja ejecución se debe

a que los recursos fueron incorporados hasta el mes de junio y otro septiembre y los procesos de adquisiciones obras comenzaron tarde.

d. Principales Proyectos

En el segundo trimestre del año 2025, la inversión se concentró en los proyectos para Diseño, Construcción, Mejoras y Rehabilitación de Espacios Físicos Deportivos, Recreativos y Administrativos con Acceso Inclusivo para uso de la población en general a Nivel Nacional y Construcción y Mejoramiento de Instalaciones Deportivas y Recreativas para uso de la población a Nivel Nacional:

1. Construcción, Mejoras y Rehabilitación de Espacios Físicos Deportivos, Recreativos y Administrativos con Acceso Inclusivo para Uso de la Población en General a Nivel Nacional:

El Proyecto se enfoca para contrarrestar la disminución del bienestar físico, mental y valores humanos en niños, niñas, jóvenes y adultos, además, el retraso cultural, social y deportivo, CONDEPOR implementa la construcción de 25 canchas deportivas (16 Canchas Sintéticas Tipo 11, 8 Canchas Polideportivas Bajo Techo y 1 Cancha Sintética Tipo 9) y la rehabilitación y equipamiento de espacios físicos Administrativos dentro de las Instalaciones del Complejo deportivo José Simón Azcona.

Los principales avances físicos al 30 de junio de 2025 son los siguientes:

Principales Metas Físicas, - II Trimestre-2025							
Meta Física	Unidad de Medida	Anual 2025			II - Trimestre 2025		
		Programación	Ejecución	% Ejecución.	Programación	Ejecución	% Ejecución
Construcción de canchas deportivas y recreativas	Canchas	25	25	100%	9	9	100%

Fuente: Unidad Ejecutora al 30/6/2025

Con el proyecto, se beneficiarán 765,000 habitantes de los departamentos de Francisco Morazán, Olancho, La Paz, Comayagua, Lempira, Santa Barbara, Yoro, Colon Cortes, Choluteca y El Paraíso.

A continuación, se presenta la ejecución financiera histórica del Proyecto al segundo trimestre 2025:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio – Fin
		US\$		20/9/2023
Construcción, Mejoras y Rehabilitación de Espacios Físicos Deportivos, Recreativos y Administrativos con Acceso Inclusivo para uso de la población en general a Nivel Nacional	FN-25332	Lempiras	L402,000,000.00	30/11/2025
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
II-Trimestre 2025	20,142,623.00	99,057,157.0	24,072,761.4	24.3%
Acumulado 2025	20,142,623.00	99,057,157.0	24,072,761.4	24.3%
Acumulado Vida del Proyecto **	402,000,000.0	402,000,000.0	326,903,180.4	81.3%

**/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

2. Diseño, Construcción y Remodelación de Instalaciones y Espacios Físicos de Actividades Deportivas y Recreativas, para Uso de la Población a Nivel Nacional

Para contrarrestar la disminución del bienestar físico, mental y valores humanos en niños (as), jóvenes y adultos, además del retraso cultural, social y deportivo, CONDEPOR implementa la construcción de 32 canchas deportivas; las cuales se dividen en 15 canchas sintéticas de fútbol 11, 4 canchas sintéticas de fútbol 7 y 13 canchas multiusos; todas estarán ubicadas a lo largo del territorio nacional. Así mismo, la remodelación y mejora en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera; la remodelación de la grama de cancha.

Al 30 de junio de 2025, los principales avances físicos son los siguientes:

Principales Metas Físicas, II - Trimestre-2025							
Meta Física	Unidad de Medida	Anual 2024			II -Trimestre 2025		
		Programación	Ejecución	% Ejecución.	Programación	Ejecución	% Ejecución
Remodelaciones en estadios nacionales	Estadio	3	3	100%	1	0.85	85%

Fuente: Unidad Ejecutora al 30/06/2025

- ✓ En cuanto a la remodelación del estadio José de la Paz Herrera, se finalizó la fundición de viga serruchos del estadio nacional Chelato Uclés y la instalación de vigas para gradería sol centro. Pendiente la Instalación de butacas y techado, estas actividades están previstas a ser finalizadas en el mes de septiembre del presente año.

Los aspectos financieros del proyecto se presentan a continuación:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de
		US\$		Inicio - Fin
Diseño, construcción y remodelación de instalaciones y espacios físicos de actividades deportivas y recreativas, para uso de la población a nivel nacional	BCH-24789-1	US\$		28/8/2022
		Lempiras	L552,700,000.0	30/11/2025
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
II-Trimestre 2025	444,034,417.00	90,331,028.0	5,766,803.3	6.4%
Acumulado 2025	444,034,417.00	90,331,028.0	5,766,803.3	6.4%
Acumulado Vida del Proyecto **	552,700,000.0	552,700,000.0	468,135,775.5	84.7%

**/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

3. Construcción y Mejoramiento de Instalaciones Deportivas y Recreativas para uso de la población a Nivel Nacional.

El proyecto consiste implementar la Construcción y Mejoramiento de 26 instalaciones deportivas y recreativas en 9 departamentos y 16 municipios; además, se realiza un estudio para establecer el diagnóstico actualizado del sistema estructural del Estadio Roberto Suazo Córdoba en La Paz.

Al segundo trimestre del 2025, los principales avances físicos son los siguientes:

Principales Metas Físicas, II - Trimestre-2025							
Meta Física	Unidad de Medida	Anual 2025			II -Trimestre 2025		
		Programación	Ejecución	% Ejecución.	Programación	Ejecución	% Ejecución
Canchas deportivas	Canchas	26	26	100%	2	2	100%
Estudio sistema estructural del Estadio Roberto Suazo Córdoba en La Paz.	Estudio	1	0	0%	1	0	0%

Fuente: Unidad Ejecutora al 30/06/2025

Actualmente se encuentran en ejecución 26 canchas deportivas distribuidas en nueve departamentos del país. Durante el segundo trimestre de 2025, se recepcionaron dos de estas canchas. El proyecto contempla la construcción de campos deportivos con césped sintético para fútbol en diferentes modalidades: tipo 11, 9, 7 y 5.

Asimismo, se adjudicó el estudio para establecer un diagnóstico actualizado del sistema estructural del Estadio Roberto Suazo Córdoba, ubicado en La Paz, el cual permitirá su posterior intervención.

Los aspectos financieros del proyecto se presentan a continuación:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de
		US\$		Inicio – Fin
Construcción y Mejoramiento de Instalaciones Deportivas y Recreativas para uso de la población a Nivel Nacional	DI-25813	US\$		30/9/2024
		Lempiras	689,964,404.00	31/12/2025
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
II-Trimestre 2024	449,000,000.00	274,676,427.0	202,358,266.0	73.7%
Acumulado 2024	449,000,000.00	274,676,427.0	202,358,266.0	73.7%
Acumulado Vida del Proyecto **	689,964,404.00	689,964,404.00	300,281,558.1	43.5%

d.1. Principales Adquisiciones al II Trimestre 2025

- Estudios y Diseños de las Obras de Infraestructura Deportiva.
- Construcción de Canchas Deportivas a Nivel Nacional.
- Mejoras y Remodelaciones de Estadios a Nivel Nacional.
- Rehabilitación de espacios físicos administrativos y físicos Complejo Deportivo "José Simón Azcona Hoyo", Villa Olímpica.
- EL Estudio para establecer el diagnostico actualizado del sistema estructural del Estadio Roberto Suazo Córdoba en La Paz.

d.2. Formación Bruta Capital

Referente al presupuesto asignado al cierre del trimestre (L 589,857,272), se alcanzó una ejecución de L13,326,093 que representan el 2.2% del presupuesto vigente al trimestre; este monto fue utilizado en el manejo, mejoramiento y conservación de instalaciones deportivas a nivel nacional, en el Estadio Olímpico y los Gimnasios ubicados en el Complejo Deportivo "José Simón Azcona Hoyo" en la Villa Olímpica.

e. Gestión de la Inversión

- Proyecciones mensuales de ejecución financiera.
- Reuniones de seguimiento y ejecución física y financiera
- Modificaciones Presupuestarias.
- Acompañamiento constante a la institución durante la ejecución del proyecto.

f. Problemática y acciones durante el II Trimestre-2025

- Se han registrado retrasos en la entrega del área de Sol-Centro del Estadio José de la Paz Herrera, debido a la incorporación de requerimientos adicionales durante la ejecución del proyecto, específicamente la instalación de butacas y la construcción de la cubierta (techado). Actualmente, el proceso de contratación para estas obras complementarias ya fue adjudicado, y se estima que la entrega se realizará en el mes de septiembre. No obstante, los retrasos se originaron debido a los tiempos y procedimientos establecidos en la Ley de Contratación del Estado de Honduras, los cuales prolongaron la fase de adjudicación.
- Los proyectos en ejecución han enfrentado retrasos debido a la escasez a nivel nacional de agregado tipo grava de $\frac{3}{4}$ " , un insumo fundamental para la ejecución de actividades estructurales críticas que demandan mayor tiempo y coordinación. Ante esta situación, se implementaron medidas correctivas, entre ellas la búsqueda activa de nuevos proveedores en el mercado nacional, con el objetivo de asegurar el suministro constante de grava de $\frac{3}{4}$ " y así evitar mayores retrasos en la ejecución de las obras.

V. Conclusiones

- La ejecución de 26 canchas deportivas en nueve departamentos del país avanza conforme al cronograma, con dos de ellas ya recepcionadas durante el segundo trimestre de 2025. Estas obras contemplan la construcción de campos con césped sintético para fútbol en diferentes modalidades (tipo 11, 9, 7 y 5), lo que permitirá ampliar la cobertura y el acceso al deporte en diversas comunidades.
- La adjudicación del estudio técnico para el diagnóstico estructural del Estadio Roberto Suazo Córdoba en La Paz representa un paso clave para su futura rehabilitación. Este diagnóstico servirá como

base para tomar decisiones informadas sobre intervenciones necesarias que garanticen la seguridad y funcionalidad del estadio.

VI. Recomendaciones

- Desarrollar un mapeo de proveedores alternativos a nivel regional para contar con opciones viables en caso de desabastecimiento.
- Establecer acuerdos marco o contratos de suministro anticipado, especialmente para materiales críticos del proyecto.
- Implementar mecanismos de control más estrictos para asegurar el cumplimiento de los cronogramas y la calidad de las construcciones en ejecución.
- Incluir desde el diseño inicial todos los elementos necesarios del proyecto (como butacas, techado, iluminación, etc.) para evitar modificaciones que generen retrasos y costos adicionales.



Secretaría de
Finanzas
Gobierno de la República

ANEXOS



ANEXO No 1

SECRETARÍA DE FINANZAS
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE, 2025

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución/ Programa o Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado		Presupuesto Vigente		Ejecutado II Trimestre			Ejecutado Anual (Devengado)		
			Fondos Nacionales	Total	Fondos Nacionales	Total	Fondos Nacionales	Total	% Ejecución (Dev./Vig)	Fondos Nacionales	Total	% Ejecución (Dev./Vig)
4	0413 - Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación		913,177,040.0	913,177,040.0	464,064,612.0	464,064,612.0	232,197,830.8	232,197,830.8	50.0	232,197,830.8	232,197,830.8	50.0
1	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA USO DE LA POBLACIÓN A NIVEL NACIONAL	FN-25813	449,000,000.0	449,000,000.0	274,676,427.0	274,676,427.0	202,358,266.0	202,358,266.0	73.7	202,358,266.0	202,358,266.0	73.7
	Total CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA USO DE LA POBLACIÓN A NIVEL NACIONAL		449,000,000.0	449,000,000.0	274,676,427.0	274,676,427.0	202,358,266.0	202,358,266.0	73.7	202,358,266.0	202,358,266.0	73.7
2	CONSTRUCCIÓN DE 2 COMPLEJOS DEPORTIVOS	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total - CONSTRUCCIÓN DE 2 COMPLEJOS DEPORTIVOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Construcción, Mejoras y Rehabilitación de Espacios Físicos Deportivos, Recreativos y Administrativos con Acceso Inclusivo para uso de la población en general a Nivel Nacional	FN-25332	20,142,623.0	20,142,623.0	99,057,157.0	99,057,157.0	24,072,761.4	24,072,761.4	24.3	24,072,761.4	24,072,761.4	24.3
	Total Construcción, Mejoras y Rehabilitación de Espacios Físicos Deportivos, Recreativos y Administrativos con Acceso Inclusivo para uso de la población en general a Nivel Nacional		20,142,623.0	20,142,623.0	99,057,157.0	99,057,157.0	24,072,761.4	24,072,761.4	24.3	24,072,761.4	24,072,761.4	24.3
4	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE INSTALACIONES Y ESPACIOS FÍSICOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, PARA USO DE LA POBLACIÓN A NIVEL NACIONAL	BCH - 24789-1	444,034,417.0	444,034,417.0	90,331,028.0	90,331,028.0	5,766,803.3	5,766,803.3	6.4	5,766,803.3	5,766,803.3	6.4
	Total DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE INSTALACIONES Y ESPACIOS FÍSICOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, PARA USO DE LA POBLACIÓN A NIVEL NACIONAL		444,034,417.0	444,034,417.0	90,331,028.0	90,331,028.0	5,766,803.3	5,766,803.3	6.4	5,766,803.3	5,766,803.3	6.4
	Formación Bruta de Capital		9,988,385,573.0	10,003,138,940.0	13,148,454,219.0	19,241,500,682.0	2,433,052,524.7	2,537,203,864.2	13.2	3,488,708,837.3	3,596,399,830.8	18.7
	0413 - Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación		220,708,000.0	220,708,000.0	589,857,272.0	589,857,272.0	13,074,165.4	13,074,165.4	2.2	13,326,092.9	13,326,092.9	2.3
	PROGRAMA DE MANEJO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS		210,972,000.0	210,972,000.0	589,857,272.0	589,857,272.0	13,074,165.4	13,074,165.4	2.2	13,326,092.9	13,326,092.9	2.3
	Total PROGRAMA DE MANEJO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS		210,972,000.0	210,972,000.0	589,857,272.0	589,857,272.0	13,074,165.4	13,074,165.4	2.2	13,326,092.9	13,326,092.9	2.3
	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		4,596,000.0	4,596,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		4,596,000.0	4,596,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	FORMACIÓN DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO		5,050,000.0	5,050,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total - FORMACIÓN DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO		5,050,000.0	5,050,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	FORMACIÓN DEPORTIVA NO FEDERADOS		90,000.0	90,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total - FORMACIÓN DEPORTIVA NO FEDERADOS		90,000.0	90,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: SIAFI, 30/06/2025

ANEXO No 2

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL II TRIMESTRE, 2025

Institución/Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre 2025		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
0413 - Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación								
Diseño, construcción y remodelación de instalaciones y espacios físicos de actividades deportivas y recreativas, para uso de la población a nivel nacional	Remodelaciones en estadios nacionales	Estadio	3	3	100%	1	1	85%
Construcción y Mejoramiento de Instalaciones Deportivas y Recreativas para uso de la población a Nivel Nacional.	Canchas deportivas	Canchas	26	26	100%	2	2	100%
	Estudio sistema estructural del Estadio Roberto Suazo Córdoba en La Paz.	Estudio	1	0	0%	1	0	0%
Construcción, Mejoras y Rehabilitación de Espacios Físicos Deportivos, Recreativos y Administrativos con Acceso Inclusivo para Uso de la Población en General a Nivel Nacional:	Construcción de canchas deportivas y recreativas	Canchas	25	25	100%	9	9	100%

