

Informe de Avance Físico y Financiero

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA AL III TRIMESTRE 2025

Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)

Tegucigalpa, Honduras

Octubre, 2025

www.sefin.gob.hn





IV. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

a. Ejecución Física-Financiera de la Inversión Pública

El Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) adscrito a la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS), tiene como finalidad promover el mejoramiento de las condiciones de vida de los grupos sociales marginados en el área rural y urbana, mediante el otorgamiento de financiamientos para programas y proyectos de desarrollo social o económico,

con el propósito de aumentar su productividad, sus niveles de empleo y de ingresos y de contribuir a la satisfacción de sus necesidades básicas.

Al tercer trimestre del 2025 la institución cuenta con un presupuesto vigente de **L1,690.7 millones** y una ejecución de **L 310.5 millones** que representa **18.1%**, tal como se detalla en el Cuadro No. 01.

Dicha ejecución se llevó a cabo con un presupuesto vigente para inversión productiva de **L 1,506.4 millones** y formación bruta de capital de **L 184.3 millones**, a través de proyectos enfocados en Electrificación Rural; infraestructura Social, Escolar y Caminos Rurales; Fortalecimiento de

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2025
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	1,657,049,331
Inversión Productiva	1,657,049,331
Formación Bruta de Capital	-
Presupuesto Vigente	1,690,724,268
Inversión Productiva	1,506,412,812
Formación Bruta de Capital	184,311,456
Ejecutado III Trimestre	310,474,361
Inversión Productiva	277,021,575
Formación Bruta de Capital	33,452,787
% Ejecución (Devengado III Trim-	18.4%
Ejecutado Anual	738,847,991
Inversión Productiva	657,795,782
Formación Bruta de Capital	81,052,209
% Ejecución (Devengado Anual/Vigente)	43.7%

Nota: SIAFI, 30/09/2025



Capacidades para Jóvenes; Recuperación de Espacios Públicos y Mejora de la Infraestructura Básica.


b. Financiamiento de la Inversión Pública

La mayor parte de los proyectos que ejecuta el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) provienen de financiamiento externo proveniente del Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y el Kreditanstalt für Wiederaufbau de Alemania KFW); mismos que en su conjunto alcanzan el 93%; mientras que el 7% se financia con fondos nacionales.

Del total del financiamiento del presupuesto vigente (L1,506.4 millones), el 80% corresponde a fondos provenientes de crédito externo con un monto de L1,210.8 millones y fondos nacionales que corresponden a contrapartes para gastos operativos de proyectos con un monto vigente de L97.4 millones equivalente a 6.5%. Los fondos de donaciones (L198.2 millones) equivalen al 13% tal como se muestra en el gráfico No 1.



Gráfico No. 01
FHIS: Financiamiento de la Inversión por Fuente
Cifras en Millones de Lempiras

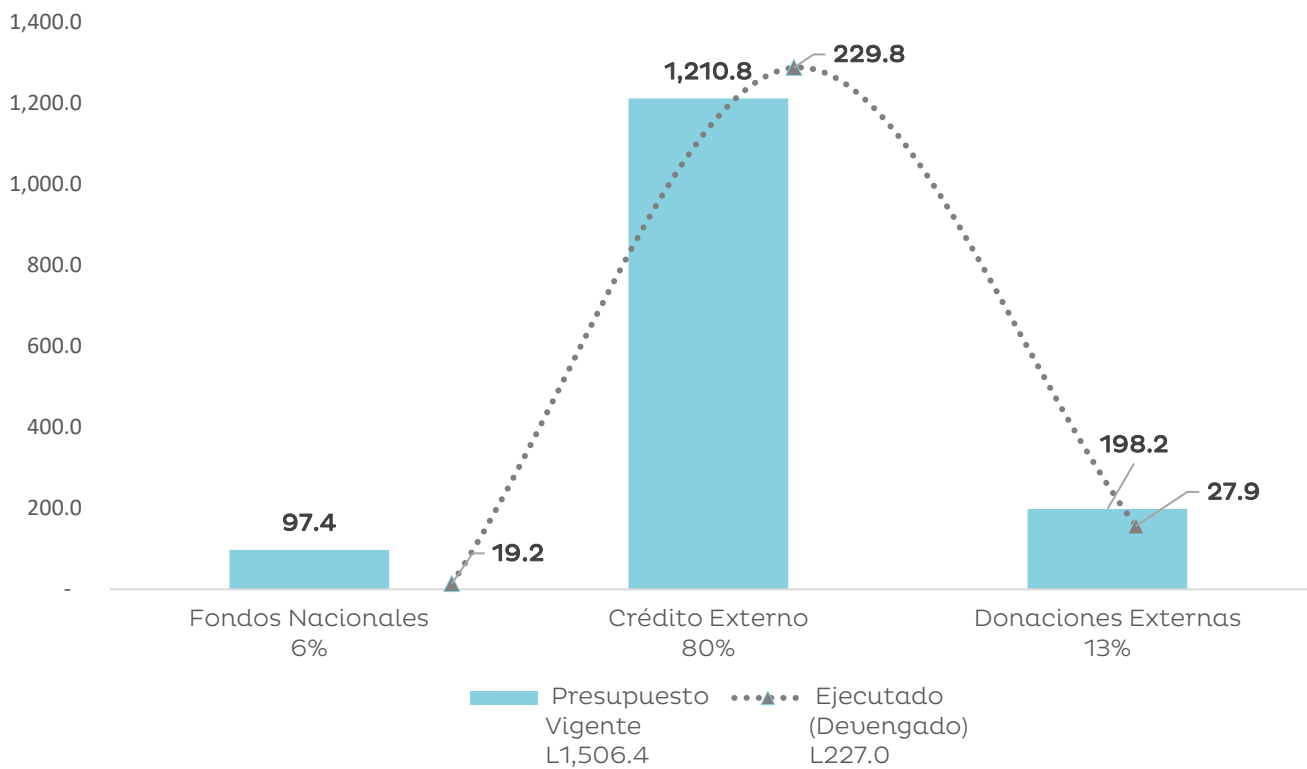

Fuente SIAFI

c. Comportamiento de la Ejecución al III Trimestre (2023-2025)


A continuación, se presenta un análisis del comportamiento histórico de la inversión en proyectos del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) en el periodo comprendido entre 2023 y 2025, basado en los montos vigentes y ejecutados.



La inversión registrada en el año 2023 ascendió a L 1,727.3 millones; disminuyendo el presupuesto vigente a L1,376.9 millones en el año 2024, año en el que se incorporaron al presupuesto, nuevos programas para atender la reparación y rehabilitación de escuelas y para proyectos de infraestructura con un presupuesto vigente de L1,376.9 millones. En el año 2025 cuenta con un presupuesto vigente de L1,690.7 millones, mostrando una mejora significativa en la capacidad de ejecución de proyectos e incrementando proyectos como el Hospital del garífuna y el Polideportivo en el Departamento de Olancho.

Fuente SIAFI

Gráfico No. 2
Comportamiento de la Inversión Pública
(FHIS)
Al 30 de septiembre (2023-2025)
Millones de Lempiras

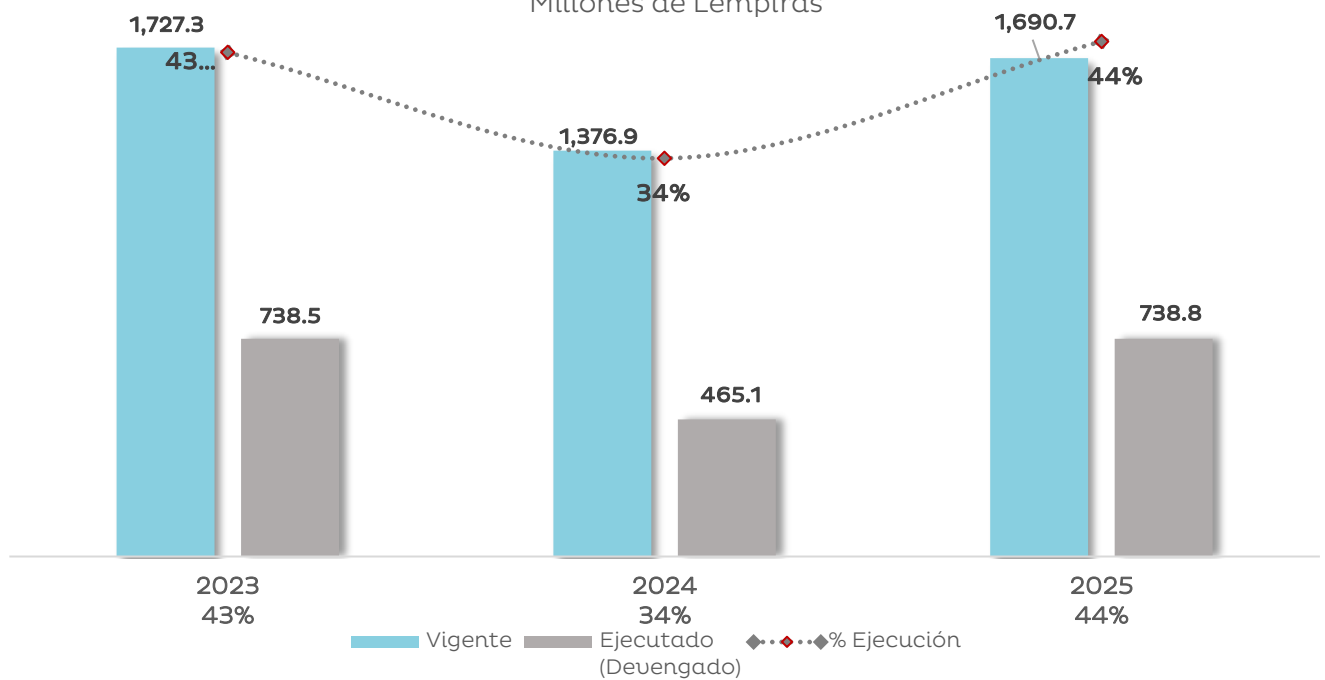



d. Principales Proyectos

La mayor parte de la inversión acumulada al III trimestre de 2025 se concentra en los siguientes proyectos:

1. Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar (PROMINE/KFW, FASE IV y FASE V)
2. Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras (MIFE)
3. Proyecto Convivencia y Espacios Seguros para los Jóvenes en Honduras (CONVIVIR)
4. Proyecto Recuperación de Emergencia a causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras (PRE).

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros de los principales proyectos de acuerdo con su presupuesto vigente:

1. Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar (PROMINE/KFW, FASE IV y V) (KFW)

El PROMINE tiene por objetivo general fortalecer la rectoría Sectorial en Infraestructura Educativa de la Secretaría de Educación y la gestión local participativa, así como mejorar el acceso de los alumnos de las comunidades pobres al Centro Educativo de calidad que operan de manera sostenible. De esa manera se pretende contribuir al aumento de la eficiencia y de la calidad del sistema educativo (prebásico y básico).



Secretaría de
Finanzas
Gobierno de la República

Los principales avances físicos al 30 de septiembre de 2025 son los siguientes:

Principales Metas Físicas al III trimestre 2025

Metas Física	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre de 2025		
		Programación	Ejecución	% EJEC.	Programación	Ejecución	% EJEC.
Infraestructura Escolar	Centro Educativo	1	1	100%	0	0	0%

Fuente: FHIS, al 30 de septiembre de 2025

Proyectos en Ejecución 2025/ PROMINE

No. Sub-Proyecto	Descripción subproyecto	Departamento	Municipio	% avance
109112	AMPLIACION CEB SAT AMERICA Y CEPB ROSA CANELO	GRACIAS A DIOS	JUAN FCO. BULNES	29.09%
109115	REPOSICION CEB COYOCUTENA	LEMPIRA	PIRAERA	100.00%
109116	REPARACION CEB FRANCISCO MORAZAN	COPAN	SAN ANTONIO	100.00%
109211	REPOSICION CEB LEONCIO VALLE	COMAYAGUA	COMAYAGUA	100.00%
109483	AMPLIACION INSTITUTO GUBERNAMENTAL TECNICO FRANCISCO MORAZAN	FRANCISCO MORAZAN	SABANAGRANDE	66.16%
110192	REPOSICION CEB JOSE TRINIDAD REYES	OLANCHO	DULCE NOMBRE DE CULMI	91.00%
109243	REPOSICION CEB CERRO GRANDE ZONA 2	FRANCISCO MORAZAN	DISTRITO CENTRAL	29.14%
109111	REPOSICION ESCUELA Y JARDIN DE NIÑOS JESUS MEJIA PAZ	GRACIAS A DIOS	WAMPUSIRPI	19.00%
109113	REPOSICION CEB REPUBLICA DE COSTA RICA Y JN STANLEY GOFF	GRACIAS A DIOS	BRUS LAGUNA	8.00%

Fuente FHIS



A continuación, se observa la ejecución financiera histórica del Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar (PROMINE/KFW, FASE V) al III trimestre de 2025:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de
				Inicio - Fin
Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar (PROMINE/KFW, FASE V)	2016 68 763	€ 26,387,000	L810,650,859	02/04/2018-18/4/2025
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
III Trimestre 2025	78425042	78425042	25,004,764.28	32%
Acumulado 2025	78425042	78425042	34,435,726.67	44%
Acumulado Vida del Proyecto *	810,650,859	810,650,859	144,715,625	18%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto
Tipo de Cambio al 30/09/2025, L30.7216 por €1.00

La ejecución financiera al III trimestre se cumplió en un 32%, para la mejora de la infraestructura Escolar desarrollado en 9 proyectos en los departamentos de Gracias a Dios, Lempira, Olancho y Francisco Morazán.

2. Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras (MIFE) (BCIE)

Consiste en la implementación de metodología de formación permanente de docentes y estudiantes, la mejora de la infraestructura escolar de centros de educación pública en todo el territorio nacional con énfasis en las zonas de mayor pobreza urbana y rural. El mejoramiento de la infraestructura incluye la ampliación y/o reparación de infraestructura educativa, dotación de mobiliario y equipamiento técnico educativo especializado; y el fortalecimiento de habilidades de los docentes de educación sobre



Secretaría de
Finanzas
Gobierno de la República

metodologías de enseñanza basadas en competencias y las capacidades de los estudiantes y docentes de bachillerato en temas relacionados al emprendedurismo.

Los principales avances físicos al 30 de septiembre de 2025 son los siguientes:

Principales Metas Físicas al III trimestre 2025

Metas Física	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre de 2025		
		Programación	Ejecución	% EJEC.	Programación	Ejecución	% EJEC.
Infraestructura Escolar	Centro Educativo	35	22	62.85%	13	9	69.2%

Fuente: FHIS, al 30 de septiembre de 2025

De las obras en ejecución se finalizaron nueve (9) obras de trece (13) programas (69.2% de cumplimiento) en el III Trimestre 2025, las cuales se detallan a continuación:

Detalle de Centros Educativos finalizados en el III trimestre/2025

CÓDIGO PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO
108887	JUAN LINDO	CORTES	San Pedro Sula
108908	ALEJANDRO FLORES	El Paraíso	El Paraíso
108909	PEDRO NUFIO	El Paraíso	Danlí
107844	ESCUELA URBANA MIGUEL ANGEL BUESO	Santa Bárbara	Concepción del Norte
109011	OSCAR MEJIA URQUIA	Santa Bárbara	Nueva Frontera
108956	MERCEDES FLORES CASTILLO	Cortés	Potrerrillos
107479	INSTITUTO OFICIAL LA CEIBA	Atlántida	La Ceiba
108899	JUVENTUD OCCIDENTAL	Copán	Florida
109020	PERFECTO H BOBADILLA	Santa Bárbara	Santa Bárbara

Fuente FHIS



A continuación, véase la ejecución financiera histórica del Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en

Honduras (MIFE) al III trimestre de 2025:

3. Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de
				Inicio - Fin
Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras (MIFE)	BCIE - 2239	US\$80,000,000	L2,096,704,000.0	30/03/2021-
				30/3/2026
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
III Trimestre 2025	447,765,063	315,765,093	92,911,358.05	29%
Acumulado 2025	447,765,063	315,765,093	170,770,528.78	54%
Acumulado Vida del Proyecto *	2,096,704,000	2,096,704,000	643,781,955	31%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 31/9/2025 (BCH): L26.2088 por US\$1.00

La ejecución financiera del proyecto al tercer trimestre acumulada es de L92.9 MM de un presupuesto vigente de L 315.7 MM, representando un 29%, dado que existen proyectos restantes en su etapa de ejecución final.

4. Proyecto Convivencia y Espacios Seguros para los Jóvenes en Honduras (CONVIVIR) (KFW)

El programa abarca la construcción, el mejoramiento y el equipamiento de infraestructura social para jóvenes y espacios públicos, financiamiento y/o cofinanciamiento del trabajo con jóvenes y la capacitación de jóvenes, la capacitación de personal de las instituciones involucradas, las municipalidades seleccionadas, las comunidades de barrio y servicios de consultoría.



Los principales avances físicos al 30 de septiembre de 2025 son los siguientes:

Principales Metas Físicas al III trimestre 2025

Metas Física	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre de 2025		
		Programación	Ejecución	% EJEC.	Programación	Ejecución	% EJEC.
Espacios Públicos recuperados	Obra	5	2	40%	0	0	100%
Jóvenes Capacitados	Capacitación	960	960	100%	900	900	100%

Fuente: FHIS, al 30 septiembre de 2025

Para el año 2025, se tiene programado 5 espacios públicos recuperados, de los cuales **se encuentran en ejecución los siguientes:**

Detalle de proyectos de Espacios Públicos Recuperados en Ejecución.

Código del Sub-Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance
109611	Casa de la Juventud	85%
109612	Plaza la Juventud	92%
109613	Centro Deportivo Integral San Carlos	90%
109614	THAU MISHU (Casa de La Juventud)	93%
109615	Centro Formación Integral Juvenil	85%

FUENTE FHIS



A continuación, véase la ejecución financiera histórica del Proyecto Convivencia y Espacios Seguros para los Jóvenes en Honduras (CONVIVIR) al III trimestre de 2025:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de
				Inicio - Fin
Proyecto Convivencia y Espacios Seguros para los Jóvenes en Honduras (CONVIVIR Fase II y Fase III)	2016 65348 2018 67563	6,000,000.00	491,545,600	06/12/2013- 6/4/2028
		10,000,000.00		
		600,000.00	49,154,560	
		1,000,000.00		
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
III Trimestre 2025	112,236,375	112,236,375	6720330.84	6%
Acumulado 2025	112,236,375	112,236,375	21836050.35	19%
Acumulado Vida del Proyecto *	540,700,160	540,700,160	182,905,081	34%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 30/09/2025, L30.7216 por €1.00

Durante el tercer trimestre del 2025, no se han realizado contratos de bienes, servicios u obras, ya que el proyecto se encuentra en su fase final.

5. Proyecto Recuperación de Emergencia a causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras (PRE) (Banco Mundial)

El Proyecto se enfoca en la rehabilitación y reconstrucción de la infraestructura pública en salud, educación, agua y saneamiento, vial, comunitaria y vivienda en las zonas geográficas del país afectadas por los ciclones tropicales Eta e Iota.

El PRE tiene por objetivo atender las necesidades identificadas como prioritarias para reactivar la economía y apoyar las más urgentes necesidades de la población afectada por los fenómenos naturales ETA e IOTA, como respuesta de emergencia y recuperación de Honduras, y, en esta perspectiva,



Secretaría de
Finanzas
Gobierno de la República

fortalecer la capacidad institucional del Estado para gestionar una ejecución eficaz, eficiente y transparente.

Los principales avances físicos al 30 de septiembre de 2025 son los siguientes:

Principales Metas Físicas al III trimestre 2025

Metas Física	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre de 2025		
		Programación	Ejecución	% EJE.	Programación	Ejecución	% EJE.
Centros educativos rehabilitados	Centro Educativo	14	3	21.3%	1	1	100%
Sistemas de agua rehabilitados	Sistema de Agua	4	1	25%	1	1	100%
Infraestructura vial rehabilitada y reconstruida	Kilometro	4	2	50%	0	0	0%
Centros de salud pública rehabilitados	Unidad de Salud	1	0.5	50%	0	0	0%

Fuente: FHIS, al 30 de septiembre de 2025

Al cierre del III Trimestre de 2025 están programados como parte de la estrategia de contratación por lotes los siguientes proyectos:

Código del Sub-Proyecto	Nombre del Proyecto	Departamento
108310	Reposición Escuela Lempira y JN Elvis Omar Isaula	Yoro
108376	Reparación CEBG Éxitos de ANACH y CEPB Eugenia Madrid de Badia	Cortés
110176	Reposición CEPB Argelia Barrientos	Colón
110182	Reposición CEB Perla del Aguán	Colón
110906	Reposición Instituto José Simón Azcona Hoyo	Yoro
S/C	Reposición CEB Francisco Morazán	Cortes
S/C	Reparación CEB Miguel Paz Barahona	Cortes



Secretaría de
Finanzas
Gobierno de la República

A continuación, véase la ejecución financiera histórica del Proyecto Recuperación de Emergencia a causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras (PRE) al III trimestre de 2025:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de
				Inicio - Fin
Proyecto Recuperación de Emergencia a causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras (PRE)	BCIE - 2261	US\$124,211,000	3,255,421,256.80	25/05/2021-31/12/2026
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
III Trimestre 2025	391,435,689	450,811,199	133,700,568.07	30%
Acumulado 2025	391,435,689	450,811,199	382,320,815.30	85%
Acumulado Vida del Proyecto *	3,255,421,257	3,255,421,257	1,215,176,693	37%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 31/09/2025 (BCH): L26.2088 por US\$1.00

De manera acumulada los proyectos ejecutados por el FHIS reportan los siguientes avances en construcción de fondos nacionales:

Número de Centros Escolares Programados y Finalizados por Proyectos
CENTROS ESCOLARES 2025
III TRIMESTRE FHIS

Proyecto	Programados	Ejecutados	Porcentaje
MIFE	35	22	62%
PROMINE	2	0	0%
PRE	16	5	31%
TOTAL	53	27	51%

Fuente FHIS

Asimismo, el resto de los proyectos ejecutados por el FHIS, reportan los siguientes avances relevantes:



1. Proyectos Financiados por USAID

Los proyectos bajo el Proyecto Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras USAID/PIOH y el Proyecto Infraestructura de la Seguridad Ciudadana USAID/ICS no han registrado avances en su ejecución. Lo anterior como resultado del cese de la cooperación por parte del Gobierno de los Estados Unidos a través de USAID, conforme a disposiciones emitidas por la Presidencia de dicho país. Esta suspensión ha generado un impacto crítico en la ejecución programática, y actualmente estos proyectos se encuentran en proceso de cancelación y análisis para determinar su viabilidad de implementación futura.

2. Proyecto “Agua de Gracias” – Fondos BCIE

El proyecto "Agua de Gracias", financiado con recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), permanece sin ejecución. A la fecha, no se han registrado avances físicos ni financieros significativos en su desarrollo ya que presenta diversos problemas ambientales, sociales y de operación.

Los principales avances físicos al 30 de septiembre de 2025 son los siguientes:

Principales Metas Físicas al III trimestre 2025

Metas Física	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre de 2025		
		Programación	Ejecución	% EJEC.	Programación	Ejecución	% EJEC.
acceso a servicio de agua potable en beneficio de la población hondureña	obra	1	0	0%	0	0	0%

Fuente: FHIS, al 30 de septiembre de 2025



3. Proyectos de Reciente incorporación en el PIP:

- **Ampliación del Polideportivo Ramón Díaz López – Etapa II**, ubicado en el municipio de Catacamas, Departamento de Olancho.
- **Construcción del Primer Hospital Garífuna**, localizado en el municipio de Irina, Departamento de Colón.

Los Proyectos en mención se encuentran en su etapa inicial.

d.1. Principales Adquisiciones al III Trimestre 2025

Al III trimestre del 2025, la adquisición de bienes incluyó Equipo informático, y contrataciones de obras y consultorías, los cuales se describen a continuación:



Contratos Firmados III Trimestre 2025

Proyecto

Proyecto Recuperación de Emergencia a causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras (PRE)

NO.	NOMBRE	EMPRESA ADJUDICADA	MONTO DEL CONTRATO L.	NO. DE CONTRATO	FECHA DE FIRMA DE CONTRATO
1	Lote No. 2 Rehabilitación de tramos Carreteros del Municipio de Cedros, Francisco Morazán	R&M y Asociados S. de R.L. de C.V.	33,249,123.67	SDO-O-FHIS- 14-2025	6/8/2025
2	"Reposición Sistema Agua Potable en el Marañón, Municipio de Villanueva en el Departamento de Cortés	Lempira S. de R.L.	23,437,072.56	SDO-O-FHIS- 16-2025	13/8/2025
3	Rehabilitación de tramos Carreteros del Municipio de Protección, Santa Bárbara	Compañía de Infraestructura e Inversiones Nacionales S.A. de C.V. (CIIN S.A. de C.V.)	32,083,612.14	SDO-O-FHIS- 17-2025	27/8/2025
4	Rehabilitación de tramos Carreteros del Municipio de El Naranjito, Santa Bárbara		29,606,545.21	SDO-O-FHIS- 18-2025	27/8/2025
1	Adquisición de Licencias de Antivirus para UEP-PRE	NAVEGA, S.A DE C.V.	56,599.21	SDC-B-FHIS- 01-2025	22/8/2025

Estas adquisiciones forman parte de los esfuerzos para mejorar la infraestructura y los servicios públicos, asegurando que se disponga de los recursos necesarios para el desarrollo y el mantenimiento de proyectos Educativos.



e. Gestión de la Inversión

- En atención al Oficio DSM-0664-2025 del 3 de septiembre de 2025, se autoriza modificación presupuestaria y traslado del espacio, por un monto de L200,982,000.00 de fuente 21 (Crédito Externo), recursos que serán destinados para financiar el "Proyecto de Recuperación de Emergencia a Causa de los Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras (PRE)", para su ejecución en el presente año fiscal.
- En atención OFICIO DSM-0568-2025, de fecha 30 de julio de 2025 MIFE solicita el traslado a objetos, la solicitud se realiza para cubrir pagos de honorarios profesionales y gastos operativos de la Unidad Ejecutora del Programa, asimismo cubrir el total de los contratos de las empresas formuladoras de proyectos por un valor de L12,000,000.00.
- En seguimiento a Circular DGIP No. 01-2025, se actualiza la Proyección de ejecución Mensual para el Año 2025 (septiembre - diciembre).
- Durante el tercer trimestre del año 2025, se realizó, la solicitud de cuota trimestral de fondos externos a la SEFIN para garantizar la disponibilidad de recursos financieros de los proyectos de inversión pública.
- Acompañamiento constate a los diferentes proyectos ejecutados por FHIS.



f. Problemática y Acciones al III Trimestre-2025 en los proyectos del FHIS

- En empresas contratistas y de supervisión, se detectan debilidades técnicas, administrativas y de personal especializado. Estas limitaciones afectan la revisión, validación y tramitación de documentación esencial para la ejecución.
- Procesos internos lentos debido a restricciones con el pago en moneda extranjera, retrasan el flujo financiero requerido para ejecutar las obras.
- Algunos proyectos dependen de la voluntad operativa de municipalidades, que en muchos casos no cumplen con requisitos básicos como disponibilidad de terrenos, regulación de recursos hídricos o aceptación comunitaria, generando conflictos sociales o afectaciones a la viabilidad de largo plazo.
- Los programas financiados por USAID (ICS y PIOH) fueron cancelados tras una decisión oficial del Gobierno de Estados Unidos, comunicada el 13 de junio de 2025. La falta de planificación del cierre a nivel nacional provocó retrasos operativos, incluyendo la no renovación de contratos técnicos, lo que paralizó actividades clave durante más de un mes.



V. CONCLUSIONES

- Durante el III Trimestre de 2025, Las experiencias recientes han puesto en evidencia aspectos clave a mejorar en los procesos de formulación, supervisión y ejecución de obras. Estos retos no deben verse como fallas estructurales, sino como oportunidades para consolidar aprendizajes, actualizar metodologías y promover la profesionalización continua del personal técnico y administrativo involucrado en la ejecución de proyectos de alto impacto social.
- El desarrollo de infraestructura social y comunitaria depende en gran medida del trabajo conjunto entre el nivel central, las municipalidades, las comunidades y los socios de cooperación. Los obstáculos encontrados en algunos proyectos muestran la importancia de reforzar mecanismos de coordinación, comunicación y corresponsabilidad, con el fin de asegurar que los proyectos respondan de forma integral a las necesidades locales y perduren en el tiempo para la debida sostenibilidad.



VI. RECOMENDACIONES

- A partir de los aprendizajes acumulados, es conveniente continuar invirtiendo en la formación especializada del personal en áreas clave como formulación de proyectos, análisis de riesgos, supervisión de obras y gestión presupuestaria. Esto permitirá contar con expedientes más robustos, promover la eficiencia operativa y anticiparse a desafíos técnicos antes de iniciar la fase de ejecución.
- Promover espacios de diálogo permanente y acuerdos colaborativos con las alcaldías, comunidades y cooperantes internacionales es clave para asegurar que los proyectos respondan a contextos reales, se mantengan en el tiempo y cuenten con respaldo ciudadano. Una gobernanza compartida garantiza mayor sostenibilidad, aceptación social y compromiso en cada etapa del ciclo del proyecto.



Secretaría de
Finanzas
Gobierno de la República

ANEXOS



Secretaría de Finanzas
Gobierno de la República

SECRETARÍA DE FINANZAS
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE, 2025
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución/ Programa o Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado III Trimestre				Ejecutado Anual (Devengado)				Compromiso Aprobado			
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comp./Vig)
10	0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social		41,978,547	1,615,070,784	1,657,049,331	97,370,025	1,409,042,787	1,506,412,812	19,262,184	257,759,391	277,021,575	18.4%	41,300,394	616,495,388	657,795,782	43.7%	43,232,751	759,685,303	802,918,054	53.3%
1	ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS	522-0502 Cd E No.9		79,040,000	79,040,000		13,289,800	13,289,800		-	-	0.0%		1,694,598	1,694,598	12.8%		1,694,598	1,694,598	12.8%
	Total ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS			79,040,000	79,040,000		13,289,800	13,289,800		-	-	0.0%		1,694,598	1,694,598	12.8%		1,694,598	1,694,598	12.8%
2	Ampliación del Polideportivo Ramón Díaz López, Etapa II, ubicado en Catacamas, Departamento de Olancho	FN-26000-01	-		-	35,391,478		35,391,478	10,209,094		10,209,094	28.8%	10,209,094		10,209,094	28.8%	10,209,094		10,209,094	28.8%
	Total Ampliación del Polideportivo Ramón Díaz López, Etapa II, ubicado en Catacamas, Depart		-		-	35,391,478		35,391,478	10,209,094		10,209,094	28.8%	10,209,094		10,209,094	28.8%	10,209,094		10,209,094	28.8%
3	Construcción del Primer Hospital Garífuna en el Municipio de Iriona, Departamento de Colón.	FN-25984-1	-		-	20,000,000		20,000,000	6,666,667		6,666,667	33.3%	6,666,667		6,666,667	33.3%	6,956,827		6,956,827	34.8%
	Total Construcción del Primer Hospital Garífuna en el Municipio de Iriona, Departamento de		-		-	20,000,000		20,000,000	6,666,667		6,666,667	33.3%	6,666,667		6,666,667	33.3%	6,956,827		6,956,827	34.8%
4	CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JOVENES EN HONDURAS FASE III	BMZ Nr. 2016 65348	9,081,400	36,683,660	45,765,060	10,986,386	36,683,660	47,670,046	267,107	1,393,844	1,660,951	3.5%	3,079,497	7,705,268	10,784,764	22.6%	3,079,497	8,080,268	11,159,764	23.4%
		KFW 2018.6756.3	-	66,471,315	66,471,315	-	1,904,986	66,471,315	950,888	4,108,492	5,059,380	7.8%	2,622,259	8,429,027	11,051,286	17.1%	3,162,259	9,020,027	12,182,286	18.9%
	Total CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JOVENES EN HONDURAS FASE III		9,081,400	103,154,975	112,236,375	9,081,400	103,154,975	112,236,375	1,217,994	5,502,336	6,720,331	6.0%	5,701,755	16,134,295	21,836,050	19.5%	6,241,755	17,100,295	23,342,050	20.8%
5	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA	522-0501-4	29,787,953	141,834,220	171,622,173	29,787,953	43,066,367	72,854,320	-	-	-	0.0%	17,472,064	8,562,976	26,035,040	35.7%	18,537,564	8,562,976	27,100,540	37.2%
	Total PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA		29,787,953	141,834,220	171,622,173	29,787,953	43,066,367	72,854,320	-	-	-	0.0%	17,472,064	8,562,976	26,035,040	35.7%	18,537,564	8,562,976	27,100,540	37.2%
6	PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)	BMZ 2016 68 763	3,109,194	75,315,848	78,425,042	3,109,194	75,315,848	78,425,042	1,168,429	23,836,335	25,004,764	31.9%	1,250,814	33,184,913	34,435,727	43.9%	1,287,510	33,384,913	34,672,423	44.2%
	Total PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)		3,109,194	75,315,848	78,425,042	3,109,194	75,315,848	78,425,042	1,168,429	23,836,335	25,004,764	31.9%	1,250,814	33,184,913	34,435,727	43.9%	1,287,510	33,384,913	34,672,423	44.2%
7	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y FORMACION EDUCATIVA EN HONDURAS	BCIE - 2239		447,765,093	447,765,093		315,765,093	315,765,093		92,911,358	92,911,358	29.4%		170,770,529	170,770,529	54.1%		302,307,121	302,307,121	95.7%
	Total PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y FORMACION EDUCATIVA EN HONDU			447,765,093	447,765,093		315,765,093	315,765,093		92,911,358	92,911,358	29.4%		170,770,529	170,770,529	54.1%		302,307,121	302,307,121	95.7%
8	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS A NIVEL NACIONAL			-	-		307,114,546	307,114,546		-	-	0.0%		-	-	0.0%		-	-	0.0%
	Total PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS A NIVEL NACIONAL			-	-		307,114,546	307,114,546		-	-	0.0%		-	-	0.0%		-	-	0.0%
9	PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE GRACIAS	BCIE-2261		376,524,959	376,524,959		100,524,959	100,524,959		1,808,793	1,808,793	1.8%		3,827,263	3,827,263	3.8%		5,047,376	5,047,376	5.0%
	Total PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE GRACIA			376,524,959	376,524,959		100,524,959	100,524,959		1,808,793	1,808,793	1.8%		3,827,263	3,827,263	3.8%		5,047,376	5,047,376	5.0%
10	Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras.	6822-HN		391,435,689	391,435,689		450,811,199	450,811,199		133,700,568	133,700,568	29.7%		382,320,815	382,320,815	84.8%		391,588,026	391,588,026	86.9%
	Total Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras.			391,435,689	391,435,689		450,811,199	450,811,199		133,700,568	133,700,568	29.7%		382,320,815	382,320,815	84.8%		391,588,026	391,588,026	86.9%
	Formación Bruta de Capital																			
	0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social		-	-	-	184,311,456	-	184,311,456	33,452,787	-	33,452,787	18.2%	81,052,209	-	81,052,209	44.0%	81,552,332	-	81,552,332	44.2%
	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS A NIVEL NACIONAL		-	-	-	184,311,456	-	184,311,456	33,452,787	-	33,452,787	18.2%	81,052,209	-	81,052,209	44.0%	81,552,332	-	81,552,332	44.2%
	Total PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS A NIVEL NACIONAL		-	-	-	184,311,456	-	184,311,456	33,452,787	-	33,452,787	18.2%	81,052,209	-	81,052,209	44.0%	81,552,332	-	81,552,332	44.2%
	Total general		41,978,547	1,615,070,784	1,657,049,331	281,681,481	1,409,042,787	1,690,724,268	52,714,971	257,759,391	310,474,361	18.39%	122,352,603	616,495,388	738,847,991	43.67%	124,785,083	759,685,303	884,470,387	53.30%

Fuente: SIAFI, al 30 de septiembre de 2025

SECRETARÍA DE FINANZAS						
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública						
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2025						
Cifras en Lempiras						
Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Metas			Ubicación y Observaciones
			Programación 2025	Ejecución Física acumulada al III Trimestre 2025		
			Cantidad	Cantidad	% EJEC. Cantidad	
PROYECTO RECUPERACIÓN DE EMERGENCIA A CAUSA DE CICLONES TROPICALES ETA E IOTA EN HONDURAS	Centros educativos rehabilitados y/o reconstruidos afectados por ciclones Eta e Iota en beneficio de la población afectada por los fenómenos naturales. PRE	CENTRO EDUCATIVO	16	1	100%	Subproyectos finalizados en el II trimestre de 2025: - 108628 Reparación CEB en Lejamani, Comayagua. - 108291 Reparación CEPB y CEB en La Lima, Cortés Sistemas
	Sistemas de agua rehabilitados y/o reconstruidos afectados por ciclones Eta e Iota. PRE	SISTEMA DE AGUA	4	1	100%	Productos entregados en el II, III y IV trimestre Infraestructura
	Infraestructura vial rehabilitada y reconstruida afectados por ciclones Eta e Iota. PRE	KILOMETRO	9	0	0%	Subproyectos finalizados en el II trimestre de 2025: -109249 Reposición de puente en Nueva Arcadia, -108698 Reconstrucción de puente en Florida Copán.
	Infraestructura en centros de salud pública rehabilitados y/o reconstruidos afectados por ciclones Eta e Iota en beneficio de la población afectada por los fenómenos naturales. PRE	UNIDAD DE SALUD	1	0	0%	Productos entregados en el II, III y IV trimestre
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y FORMACION EDUCATIVA EN HONDURAS	Centro educativos construidos, reparados y/o ampliados. MIFE	CENTRO EDUCATIVO	35	9	69.23%	Se finalizaron 9 de los 13 centros educativos que se planificaron terminar para el II Trimestre del 2025. Los dos (2) proyectos restantes se encuentran en su etapa de ejecución final.

SECRETARÍA DE FINANZAS						
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública						
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2025						
Cifras en Lempiras						
Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Metas			Ubicación y Observaciones
			Programación 2025	Ejecución Física acumulada al III Trimestre 2025		
			Cantidad	Cantidad	% EJE. Cantidad	
PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE IV y V)	Centro educativos contruidos, reparados y/o ampliados. PROMINE	CENTRO EDUCATIVO	1	0	0%	
PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS FASE II	Espacios públicos recuperados y entregados para la seguridad ciudadana a las colonias, alcaldías y patronatos en beneficio de la población hondureña CONVIVIR II	OBRA	6	0	100%	El proyecto Plaza Mirador Santa Teresa finalizó en octubre del 2024 con obras de FHIS, quedando pendiente realizar unas subsanaciones que la alcaldía tenía pendiente por lo que en enero se completó todas las actividades pendientes.
	Jóvenes capacitados en habilidades sociales y laborales para personas jóvenes de entre las edades de 12-30 años en los municipios de Santa Rosa de Copán, Intibucá, La Esperanza y Juticalpa. CONVIVIR Fase II	CAPACITADO	960	900	100%	Injuve capacitó jóvenes en la ciudad de Juticalpa, en Habilidades para la Vida y Técnicas de negocio.
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA	Espacios públicos recuperados y entregados para la seguridad ciudadana a las colonias, alcaldías y patronatos en beneficio de la población hondureña ICS	OBRA	2	0	0%	A Junio de 2025 no se han recibido instrucciones adicionales por parte de la USAID para determinar que gastos incurridos posteriores a la remisión de la Orden Ejecutiva serán gastos elegibles bajo el financiamiento de los convenios de ejecución de los programas de la USAID. También se encuentran pendiente de reembolso por parte de la USAID, solicitudes de reembolso remitidas en enero y marzo de 2025 por un monto de L.8,783,702 para ICS, las
	Centros educativos contruidos, reparados y/o ampliados ubicados en Choloma, San Pedro Sula, Chamelecón, La Lima, Tela y en Tegucigalpa en beneficio de niños de las zona urbana y rural de Honduras. ICS	CENTRO EDUCATIVO	8	1	13%	
	Obras complementarias reparados y/o ampliados en los servicios de salud ubicados en La Ceiba, SPS y Tegucigalpa. ICS	OBRA	1	0	0%	

SECRETARÍA DE FINANZAS						
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública – Dirección General de Inversión Pública						
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2025						
Cifras en Lempiras						
Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Metas			Ubicación y Observaciones
			Programación 2025	Ejecución Física acumulada al III Trimestre 2025		
			Cantidad	Cantidad	% EJEC. Cantidad	
						cuales serán regularizadas en presupuesto de SIAFI una vez sean reembolsadas por la USAID.
ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS	Centros educativos contruidos, reparados y/o ampliados en beneficio de niños de las zonas rural y urbanas en Honduras. PIOH	CENTRO EDUCATIVO	6	0	0%	a Junio 2025 no se han recibido instrucciones adicionales por parte de la USAID para determinar que gastos incurridos posteriores a la remisión de la Orden Ejecutiva serán gastos elegibles bajo el financiamiento de los convenios de ejecución de los programas de la USAID. Se finalizo el proyecto: Reparación CEB Dionisio de Herrera y Construcción de obras varias, La Paz, La Paz.
	Infraestructura social (puentes y caja puente), rehabilitada y reconstruida en beneficio de la población a nivel Nacional PIOH	OBRA DE INFRAESTRUCTURA	1	0	0%	
PROGRAMA DE AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE GRACIAS	Diseño de los sistemas de agua potable realizado. GRACIAS	DISEÑO	1	0	0%	Pendiente desembolso de US \$ 11,324.63 (Lps 283,115.75) en concepto de pago de la Adenda nº2 de obras adicionales para el contrato suscrito por la firma consultora correspondiente.

Fuente: FHIS, al 30 de septiembre de 2025
