



Informe de Avance Físico y Financiero

PLAN DE INVERSION PÚBLICA AL III TRIMESTRE 2025

Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR)

Tegucigalpa, Honduras

Octubre, 2025

**DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES
PÚBLICAS**

IV. PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA

a. Ejecución Física-Financiera de la Inversión Pública

La Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR) es la institución rectora del deporte, educación física y recreación, encargada de la construcción, mantenimiento y conservación de la infraestructura deportiva. Con la finalidad de incentivar la práctica del deporte de toda la población sin discriminación de ninguna naturaleza y promover un estado de vida saludable.

En el Plan de Gobierno de Honduras se contempla la inversión para la construcción de infraestructura para la práctica deportiva de acceso público y gratuito. En estas obras se vela por el diseño incluyente de múltiples prácticas deportivas, incluidas las populares tradicionales y el acceso para personas con discapacidad.

Al Tercer Trimestre del año 2025, la institución contó con un presupuesto de inversión pública vigente de **L1,103.5 millones**; de los cuales **L912.8 millones**, corresponden a Inversión productiva, y **L190.6 millones** a la formación bruta de capital. En cuanto a la ejecución presupuestaria al cierre del trimestre, se reporta una ejecución de L364.4 millones en la inversión productiva, L23.9 millones de la formación bruta de capital lo que representa el 33.0% en relación con el presupuesto vigente, tal como se detalla en el Cuadro No. 1.

Dicha inversión se llevó a cabo a través de la ejecución de tres proyectos enfocados en la construcción, mejoras y rehabilitación de espacios físicos deportivos, recreativos y administrativos con acceso inclusivo para uso de la población en general a nivel nacional y la formación bruta de capital. Ver Detalle de Ejecución Financiera en Anexo No. 1.

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al III Trimestre
del 2025

Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	1,133,885,040.0
Inversión Productiva	913,177,040.0
Formación Bruta de Capital	220,708,000.0
Presupuesto Vigente	1,103,451,884.0
Inversión Productiva	912,814,612.0
Formación Bruta de Capital	190,637,272.0
Ejecutado III Trimestre	364,444,447.5
Inversión Productiva	340,509,087.0
Formación Bruta de Capital	23,935,360.6
% Ejecución (Devengado III Trim- 2025/Vigente)	33.0%
Ejecutado Anual	609,968,371.2
Inversión Productiva	572,706,917.7
Formación Bruta de Capital	37,261,453.5
% Ejecución (Devengado Anual/Vigente)	55.3%


Nota: SIAFI, 30/09/2025

b. Financiamiento de la Inversión Pública

En referencia al financiamiento de Inversión Pública, la totalidad de los recursos corresponden a fondos provenientes de fondos nacionales provenientes de Tesorería General de la Republica.

c. Comportamiento de la Ejecución al III Trimestre (2023-2025):

En el periodo comprendido entre el 2023 y el 2025, los proyectos de Inversión Pública de CONDEPOR han considerado la ejecución de 3 Proyectos de Inversión, financiados en su totalidad con recursos fondos nacionales. (Fuentes 11).

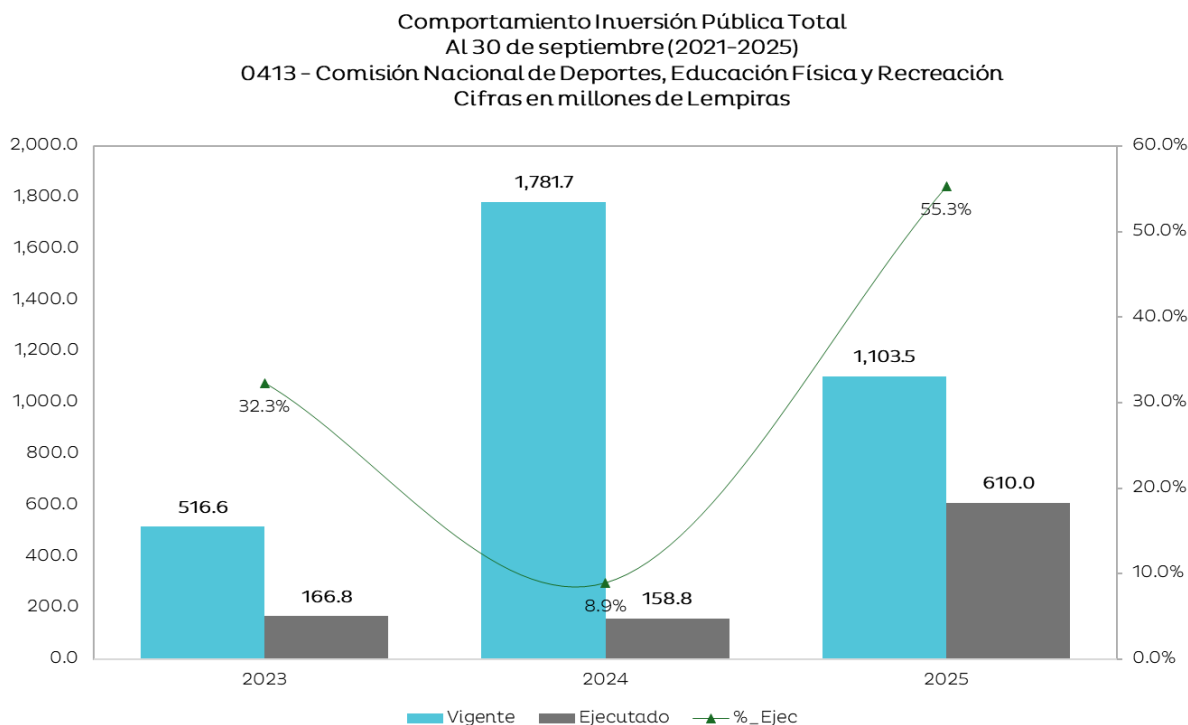

La Gráfica No.1 muestra la ejecución porcentual comparativa al 30 septiembre del año 2025, mostrando disminuciones e incrementos de los niveles de ejecución, aunque el presupuesto vigente para el 2024 disminuyó respecto al 2023, año en el que se registró además una disminución de la ejecución, con una inversión ejecutada de L158.8 millones, que representa el 8.9% en el 2024; la baja ejecución se debe a que los recursos fueron incorporados hasta el mes de junio y otro septiembre y los procesos de adquisiciones obras comenzaron de manera tardía. Finalmente, en el 2025

se reporta el aumento de la ejecución de los proyectos ejecutados por CONDEPOR mejorando a la infraestructura deportiva a nivel nación al.

d. Principales Proyectos

En el Tercer Trimestre del año 2025, la inversión se concentró en los proyectos para Diseño, Construcción, Mejoras y Rehabilitación de Espacios Físicos Deportivos, Recreativos y Administrativos con Acceso Inclusivo para uso de la población en general a Nivel Nacional y Construcción y Mejoramiento de Instalaciones Deportivas y Recreativas para uso de la población a Nivel Nacional:

1. Construcción, Mejoras y Rehabilitación de Espacios Físicos Deportivos, Recreativos y Administrativos con Acceso Inclusivo para Uso de la Población en General a Nivel Nacional:

El Proyecto se enfoca para contrarrestar la disminución del bienestar físico, mental y valores humanos en niños, niñas, jóvenes y adultos, además, el retraso cultural, social y deportivo, CONDEPOR implementa la construcción de 25 canchas deportivas (16 Canchas Sintéticas Tipo 11, 8 Canchas Polideportivas Bajo Techo y 1 Cancha Sintética Tipo 9) y la rehabilitación y equipamiento de espacios físicos Administrativos dentro de las Instalaciones del Complejo deportivo José Simón Azcona.

Los principales avances físicos al 30 de septiembre de 2025 son los siguientes:

Principales Metas Físicas, - III Trimestre-2025							
Meta Física	Unidad de Medida	Anual 2025			III - Trimestre 2025		
		Programación	Ejecución	% Ejecución.	Programación	Ejecución	% Ejecución
Construcción de canchas deportivas y recreativas	Canchas	25	25	100%	6	6	100%

Fuente: Unidad Ejecutora al 30/09/2025

Con el proyecto, se beneficiarán 765,000 habitantes de los departamentos de Francisco Morazán, Olancho, La Paz, Comayagua, Lempira, Santa Barbara, Yoro, Colon Cortes, Choluteca y El Paraíso.

A continuación, se presenta la ejecución financiera histórica del Proyecto al tercer trimestre 2025:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de
				Inicio – Fin
Construcción, Mejoras y Rehabilitación de Espacios Físicos Deportivos, Recreativos y Administrativos con Acceso Inclusivo para uso de la población en general a Nivel Nacional	FN-25332	Lempiras	L402,000,000.00	20/9/2023
				30/11/2025
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
III-Trimestre 2025	20,142,623.00	99,057,157.0	26,508,726.3	26.8%
Acumulado 2025	20,142,623.00	99,057,157.0	50,581,487.7	51.1%
Acumulado Vida del Proyecto **	402,000,000.0	402,000,000.0	353,411,906.7	87.9%

**/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

2. Diseño, Construcción y Remodelación de Instalaciones y Espacios Físicos de Actividades Deportivas y Recreativas, para Uso de la Población a Nivel Nacional

Para contrarrestar la disminución del bienestar físico, mental y valores humanos en niños (as), jóvenes y adultos, además del retraso cultural, social y deportivo, CONDEPOR implementa la construcción de 32 canchas deportivas; las cuales se dividen en 15 canchas sintéticas de fútbol 11, 4 canchas sintéticas de fútbol 7; y 13 canchas multiusos; todas estarán ubicadas a lo largo del territorio nacional. Así mismo, la remodelación y mejora en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera; la remodelación de la grama de cancha.

Al 30 de septiembre de 2025, los principales avances físicos son los siguientes:

Principales Metas Físicas, III - Trimestre-2025

Meta Física	Unidad de Medida	Anual 2025			III -Trimestre 2025		
		Programación	Ejecución	% Ejecución.	Programación	Ejecución	% Ejecución
Remodelaciones en estadios nacionales	Estadio	3	3	100%	1	0.90	90%

Fuente: Unidad Ejecutora al 30/09/2025

- Las 30 canchas del proyecto ya fueron terminadas e inauguradas y de los 3 estadios dos ya fueron inaugurados, en cuanto a la remodelación del estadio José de la Paz Herrera, se está instalando el techado de sol centro para instalación de las butacas.

Los aspectos financieros del proyecto se presentan a continuación:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		Lempiras		
Diseño, construcción y remodelación de instalaciones y espacios físicos de actividades deportivas y recreativas, para uso de la población a nivel nacional	BCH-24789-1	Lempiras	L552,700,000.0	28/8/2022 30/11/2025
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
III-Trimestre 2025	444,034,417.00	90,331,028.0	10,219,538.7	11.3%
Acumulado 2025	444,034,417.00	90,331,028.0	15,986,342.0	17.7%
Acumulado Vida del Proyecto **	552,700,000.0	552,700,000.0	478,355,314.2	86.5%

**/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

3. Construcción y Mejoramiento de Instalaciones Deportivas y Recreativas para uso de la población a Nivel Nacional.

El proyecto consiste implementar la Construcción y Mejoramiento de 60 instalaciones deportivas y recreativas en 9 departamentos y 16

municipios; además, se realiza un estudio para establecer el diagnóstico actualizado del sistema estructural del Estadio Roberto Suazo Córdoba en La Paz.

Al tercer trimestre del 2025, los principales avances físicos son los siguientes:

Principales Metas Físicas, III - Trimestre-2025

Meta Física	Unidad de Medida	Anual 2025			III -Trimestre 2025		
		Programación	Ejecución	% Ejecución.	Programación	Ejecución	% Ejecución
Canchas deportivas	Canchas	60	26	100%	5	5	100%
Estudio sistema estructural del Estadio Roberto Suazo Córdoba en La Paz.	Estudio	1	0	0%	1	0	0%

Fuente: Unidad Ejecutora al 30/09/2025

- ✓ Actualmente de acuerdo con lo reportado por la Unidad Ejecutora de Proyectos, el avance físico acumulado alcanza el 43%; logrando culminar 5 canchas, 21 en ejecución y 24 iniciando de las 60 programadas. Las 10 faltantes, se encuentran en licitación. El proyecto contempla la construcción de campos deportivos con césped sintético para fútbol en diferentes modalidades: tipo 11, 9, 7 y 5.
- ✓ Asimismo, se adjudicó el estudio para establecer un diagnóstico actualizado del sistema estructural del Estadio Roberto Suazo Córdoba, ubicado en La Paz, el cual permitirá su posterior intervención.

Los aspectos financieros del proyecto se presentan a continuación:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de
				Inicio – Fin
Construcción y Mejoramiento de Instalaciones Deportivas y Recreativas para uso de la población a Nivel Nacional	DI-25813	Lempiras	689,964,404.00	30/9/2024
				31/12/2025
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
III-Trimestre 2025	1,374,714,404.00	723,426,427.0	506,139,088.0	70.0%
Acumulado 2025	1,374,714,404.00	723,426,427.0	708,497,354.0	97.9%
Acumulado Vida del Proyecto **	1,374,714,404.0	1,374,714,404.0	806,420,646.0	58.7%

**/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

d.1. Principales Adquisiciones al III Trimestre 2025

- 2 -Estudios y Diseños de las Obras de Infraestructura Deportiva.
- 115-Contratos de Construcción y Mejoramiento de Canchas Deportivas a Nivel Nacional.
- Contrato para la Rehabilitación de espacios físicos administrativos y físicos Complejo Deportivo "José Simón Azcona Hoyo", Villa Olímpica.
- EL Estudio para establecer el diagnostico actualizado del sistema estructural del Estadio Roberto Suazo Córdoba en La Paz.

d.2. Formación Bruta Capital

Referente al presupuesto asignado al cierre del trimestre (L190,637,272.0), se alcanzó una ejecución de L37,261,453.49 que representan el 55.3% del presupuesto vigente al trimestre; este monto fue utilizado en el manejo, mejoramiento y conservación de instalaciones deportivas a nivel nacional, en el Estadio Olímpico y los Gimnasios ubicados en el Complejo Deportivo "José Simón Azcona Hoyo" de la Villa Olímpica de Tegucigalpa.

e. Gestión de la Inversión

- En seguimiento a Circular DGIP No. 01-2025, se actualiza la Proyección de ejecución Mensual para el Año 2025 (septiembre - diciembre).
- Reuniones de seguimiento y ejecución física y financiera
- Atención a modificaciones Presupuestarias.
- Elaboración de enmienda a la Nota Prioridad al proyecto No.3 (Construcción y Mejoramiento de Instalaciones Deportivas y Recreativas para uso de la población a Nivel Nacional)
- Dictamen Técnico Ampliación de Plazo Proyecto No.3(Construcción y Mejoramiento de Instalaciones Deportivas y Recreativas para uso de la población a Nivel Nacional)
- Dictamen Técnico de Categoría de Inversión Proyecto No.1 (Diseño, Construcción y Remodelación de Instalaciones y Espacios Físicos de Actividades Deportivas y Recreativas, para uso de la Población a Nivel Nacional).

f. Problemática y acciones durante el III Trimestre-2025

- Varios procesos de licitación no culminaron satisfactoriamente, lo que ha impedido la adjudicación de numerosas obras, se está monitoreando seguimiento de cada uno de los procesos de licitaciones para agilizar los mismos en base establecido en la normativa hondureña
- Problemas externos a la institución como las aprobaciones por parte de la ONCA, han incidido en retrasos en la ejecución de los proyectos, la CONDEPOR está gestionando coordinaciones con otras instancias para destrabar los procesos de adjudicación.

V. Conclusiones

- La ejecución del proyecto se ha visto afectada por el retraso en la disponibilidad presupuestaria al inicio del periodo fiscal, lo que generó demoras en el cronograma previsto.
- La inclusión de 34 nuevas obras de infraestructura en el proyecto No.3 mediante Enmienda a la Nota de Prioridad original incrementó el alcance del proyecto, pero también la carga administrativa y operativa, lo que demanda una reprogramación de plazos y recursos.

- Se considera necesaria una mayor coordinación interinstitucional y seguimiento continuo para mitigar los factores externos que obstaculizan los procesos de contratación y ejecución.

VI. Recomendaciones

- Fortalecer la planificación y programación presupuestaria, coordinando con las instancias financieras correspondientes para asegurar la disponibilidad oportuna de recursos al inicio del periodo fiscal.
- Revisar y optimizar los procedimientos de licitación, identificando los factores externos que han generado retrasos o desierto, y establecer mecanismos de prevención y contingencia (por ejemplo, ampliar plazos de convocatoria, reforzar requisitos o asistencia técnica a oferentes).
- Implementar un plan de seguimiento y control de obras que permita monitorear de manera permanente el avance físico y financiero, facilitando la detección temprana de desviaciones y la toma de decisiones correctivas.
- Fortalecer la coordinación interinstitucional con los organismos involucrados en los procesos de contratación y supervisión, a fin de reducir tiempos de gestión y resolver con mayor agilidad los inconvenientes administrativos.

ANEXOS

ANEXO No 1

Anexo No. 1

SECRETARÍA DE FINANZAS

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE, 2025

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución/ Programa o Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado		Presupuesto Vigente		Ejecutado III Trimestre			Ejecutado Anual (Devengado)		
			Fondos Nacionales	Total	Fondos Nacionales	Total	Fondos Nacionales	Total	% Ejecución (Dev./Vig)	Fondos Nacionales	Total	% Ejecución (Dev./Vig)
3	0413 - Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación		913,177,040	913,177,040	912,814,612	912,814,612	340,509,087	340,509,087	37.3%	572,706,918	572,706,918	62.7%
1	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA USO DE LA POBLACIÓN A NIVEL NACIONAL	FN-25813	449,000,000	449,000,000	723,426,427	723,426,427	303,780,822	303,780,822	42.0%	506,139,088	506,139,088	70.0%
	Total CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PA		449,000,000	449,000,000	723,426,427	723,426,427	303,780,822	303,780,822	42.0%	506,139,088	506,139,088	70.0%
2	Construcción, Mejoras y Rehabilitación de Espacios Físicos Deportivos, Recreativos y Administrativos con Acceso Inclusivo para uso de la población en general a Nivel Nacional	FN-25332	20,142,623	20,142,623	99,057,157	99,057,157	26,508,726	26,508,726	26.8%	50,581,488	50,581,488	51.1%
	Total Construcción, Mejoras y Rehabilitación de Espacios Físicos Deportivos, Recreativos y Ad		20,142,623	20,142,623	99,057,157	99,057,157	26,508,726	26,508,726	26.8%	50,581,488	50,581,488	51.1%
3	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE INSTALACIONES Y ESPACIOS FISICOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, PARA USO DE LA POBLACIÓN A NIVEL NACIONAL	BCH - 24789-1	444,034,417	444,034,417	90,331,028	90,331,028	10,219,539	10,219,539	11.3%	15,986,342	15,986,342	17.7%
	Total DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE INSTALACIONES Y ESPACIOS FISICOS DE		444,034,417	444,034,417	90,331,028	90,331,028	10,219,539	10,219,539	11.3%	15,986,342	15,986,342	17.7%
	0413 - Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación		220,708,000	220,708,000	190,637,272	190,637,272	23,935,361	23,935,361	12.6%	37,261,453	37,261,453	19.5%
	PROGRAMA DE MANEJO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS		220,708,000	220,708,000	190,637,272	190,637,272	23,935,361	23,935,361	12.6%	37,261,453	37,261,453	19.5%
	Total PROGRAMA DE MANEJO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES DEPOF		220,708,000	220,708,000	190,637,272	190,637,272	23,935,361	23,935,361	12.6%	37,261,453	37,261,453	19.5%

ANEXO No 2

ANEXO No.2
SECRETARÍA DE FINANZAS
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2025

Institución/Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre 2025		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
0413 - Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación								
Diseño, construcción y remodelación de instalaciones y espacios físicos de actividades deportivas y recreativas, para uso de la población a nivel nacional	Remodelaciones en estadios nacionales	Estadio	3	3	100%	1	1	90%
Construcción y Mejoramiento de Instalaciones Deportivas y Recreativas para uso de la población a Nivel Nacional.	Canchas deportivas	Canchas	60	26	100%	5	5	100%
	Estudio sistema estructural del Estadio Roberto Suazo Córdoba en La Paz.	Estudio	1	0	0%	1	0	0%
Construcción, Mejoras y Rehabilitación de Espacios Físicos Deportivos, Recreativos y Administrativos con Acceso Inclusivo para Uso de la Población en General a Nivel Nacional:	Construcción de canchas deportivas y recreativas	Canchas	25	25	100%	6	6	100%

