



Informe de Avance Físico y Financiero

PLAN DE INVERSION PÚBLICA AL III TRIMESTRE 2025

**Instituto Hondureño de
Antropología e Historia (IHAAH)**

Tegucigalpa, Honduras

Octubre, 2025

www.sefin.gob.hn

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

IV. PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA

a. Ejecución Física-financiera de la Inversión Pública

El Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAI) es una institución autónoma, científica y técnica dedicada a la protección, investigación, conservación y divulgación del Patrimonio Cultural del país para el fortalecimiento de la memoria histórica y la identidad cultural de la sociedad hondureña.

El Gobierno de la República pretende fomentar la conservación, participación y el disfrute del Patrimonio Cultural en la ciudadanía. Se busca también impulsar la visión de un país con una riqueza cultural capaz de convertirse en factor de cohesión e inclusión social de los/as hondureños/as. Para ello, el IHAI pretende impulsar las alianzas con los actores locales (municipalidades, gestores de la cultura, investigadores, instituciones educativas) y concebir una política de Patrimonio Cultural en el que se incluya la diversidad de culturas que han poblado y el territorio hondureño.

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al III
Trimestre del 2025
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	32,938,218.0
Inversión Productiva	18,094,639.0
Formación Bruta de Capital	14,843,579.0
Presupuesto Vigente	56,911,710.0
Inversión Productiva	18,094,639.0
Formación Bruta de Capital	38,817,071.0
Ejecutado III Trimestre	15,552,475.4
Inversión Productiva	7,475,856.3
Formación Bruta de Capital	8,076,619.1
% Ejecución (Devenzado III Trim-2025/Vigente)	27.3%
Ejecutado Anual	27,479,796.7
Inversión Productiva	10,168,996.7
Formación Bruta de Capital	17,310,800.0
% Ejecución (Devenzado Anual/Vigente)	48.3%

Nota: SIAFI, 30/09/2025

Al Tercer-Trimestre del 2025, la institución contó con un presupuesto de inversión pública vigente de **L56.9 millones**, concentrando **L18.1 millones** para Inversión productiva y **L38.8 millones** para la formación bruta de capital; con una ejecución presupuestaria al tercer trimestre de **L7.5 millones** en inversión productiva y **L8.1 millones** en formación bruta de capital, lo que en su conjunto representa el 27.3% respecto al presupuesto vigente, tal como se detalla en el Cuadro No. 1.

Dicha ejecución se llevó a cabo a través del proyecto Apoyo para la Defensa, Rescate, Manejo, Protección, Promoción, Mantenimiento, Valoración Histórica y Transmisión a las Generaciones Futuras de los Bienes que Conforman el Patrimonio Cultural de Honduras, el cual está enfocado en el fortalecimiento integral del IHAI para la restauración, rehabilitación, acceso inclusivo e investigación en sitios arqueológicos en

9 departamentos del país y la formación bruta de capital. Ver Detalle de Ejecución Financiera en Anexo No. 1.


b. Financiamiento de la Inversión Pública

En cuanto al financiamiento de Inversión Pública, la totalidad de los recursos proveniente de fondos nacionales con un monto de **L56.9 millones**, Dicha inversión es financiada en su totalidad por la Tesorería General de la Republica.

c. Comportamiento de la Ejecución al III -Trimestre (2023-2025):

En el período comprendido entre el 2023 y el 2025, únicamente se ha considerado, la ejecución del proyecto antes mencionado, financiado en su totalidad con recursos nacionales. A continuación, se presenta el comportamiento histórico del proyecto:

Gráfico No.1

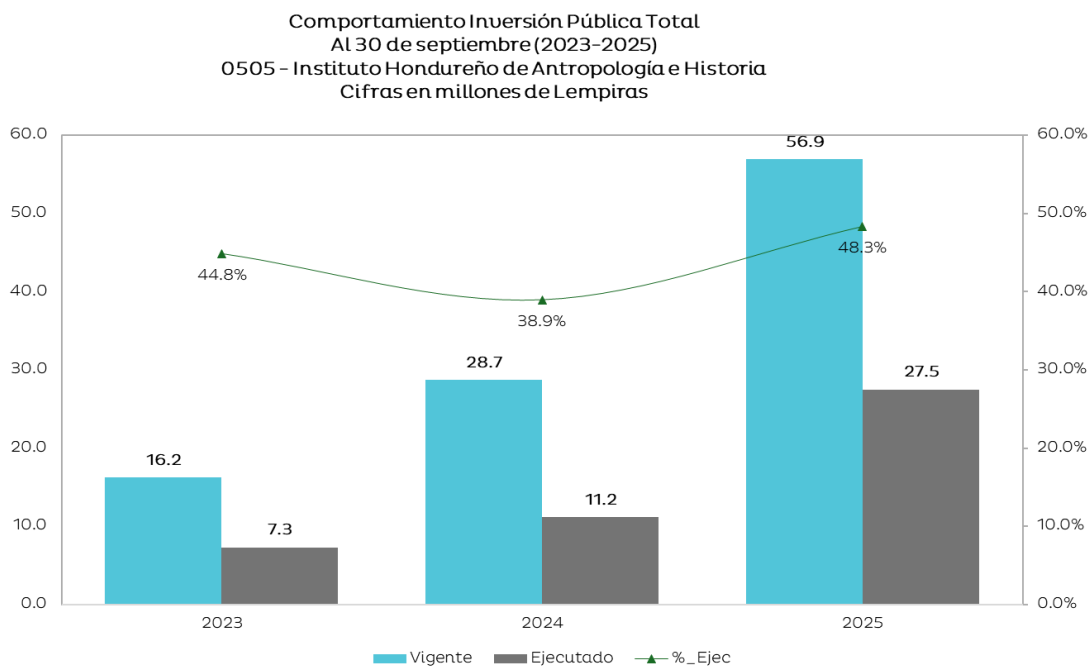

En el grafico No.1 se presenta una comparación porcentual de la ejecución presupuestaria acumulada al 30 de septiembre para los años 2023, 2024 y 2025. Se observa una tendencia ascendente en los niveles de ejecución de los recursos asignados, destacándose una mayor ejecución durante el año 2025.

En particular, en 2025 se registra un incremento significativo en la inversión, alcanzando un monto de L27.5 millones, equivalente al 48.3% del presupuesto asignado para el ejercicio fiscal. Este resultado refleja una ejecución satisfactoria al cierre del tercer trimestre y evidencia un mejor desempeño institucional en la gestión de los recursos respecto a los años anteriores.

Dicho avance pone de manifiesto una mayor eficiencia en la planificación y ejecución de los proyectos institucionales, así como un fortalecimiento en los mecanismos de seguimiento y control presupuestario.

d. Principales Proyectos

En el Tercer -Trimestre del año 2025, la inversión se concentró en el Proyecto Fortalecimiento Integral del Instituto Hondureño de Antropología e Historia, para la Restauración, Rehabilitación, Acceso Inclusivo e Investigación en Sitios Arqueológicos, Museos, Archivos Históricos e Inmuebles de Patrimonio 9 Departamentos del País, para los cuales se detallan los avances físicos y financieros de acuerdo con su presupuesto vigente:

El Proyecto contempla la restauración y rehabilitación de 5 inmuebles de patrimonio cultural de Honduras, 12 investigaciones, distribuidas en zonas arqueológicas históricas y etnohistóricas, creando un sistema de gestión documental elaborado e implementado un Plan Estratégico Institucional; dichos entregables se desarrollarán en 9 departamentos del país que abarcan 16 municipios, en la zona de influencia del proyecto.

Los principales avances físicos al 30 de septiembre de 2025 son los siguientes:

Meta Física	Unidad de Medida	Anual 2025			III - Trimestre 2025		
		Programación	Ejecución	% Ejecución.	Programación	Ejecución	% Ejecución
Restaurados y rehabilitados patrimonio del país	Inmuebles	5	5	100%	2	2	100%

Fuente: Unidad Ejecutora al 30/09/2025

Principales Metas Físicas, III -Trimestre-2025

Es importante resaltar q Las labores de Estabilización del Terreno y Restauración del inmueble museo Villa Roy fueron finalizadas.

En cuanto a la Restauración de la cubierta del inmueble de Casa Valle, Choluteca; esta obra inicio en el mes de julio, teniendo los siguientes avances.

- 1) Desmonte y aperchado de teja.
- 2) Sustitución de la estructura de madera.
- 3) Traslado de libros de la Biblioteca Municipal, que se aloja en este edificio.

Recientemente se adjudicaron las obras para Restaurar y rehabilitar la Casa Fortín, en Yuscarán, El Paraíso.

En el mes de agosto inició la Restauración de la Antigua Comandancia de la Fortaleza Santa Bárbara de Trujillo, Colón, la cual fue condecorada en 1ra. Bienal de Arquitectura de Honduras “ARQUITECTURA PARA LA CIUDAD” – BAH 2019 con “Medalla de Oro”.

Las obras Restaurar y conservar el techo del Museo de Comayagua, Comayagua, iniciaron a finales del mes de mayo; en el tercer trimestre se finalizaron las restauraciones y conservaciones hechas.

Con el proyecto, se benefician 2,835,288 habitantes en 9 departamentos del País.

A continuación, se presenta la ejecución financiera histórica al III trimestre del 2025:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio – Fin
Fortalecimiento Integral del Instituto Hondureño de Antropología e Historia, para la Restauración, Rehabilitación, Acceso Inclusivo e Investigación en Sitios Arqueológicos, Museos, Archivos Históricos e Inmuebles de Patrimonio 9 Departamentos del País	FN-25617-1	Lempiras	L31,707,186.40	01/04/2024
				27/2/2026
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
III-Trimestre 2025	18,094,639.00	18,094,639.00	7,475,856.32	41.3%
Acumulado 2025	18,094,639.00	18,094,639.00	10,168,996.72	56.2%
Acumulado Vida del Proyecto **	31,707,186.40	31,707,186.40	23,748,676.09	74.9%

**/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

d.1 Principales Adquisiciones al III -Trimestre 2025

- Contratos para las Investigaciones históricas de los Centros Mineros inscritos en la Lista Indicativa de Honduras.

- Adquirido el Sistema de Gestión Documental en el Archivo Etnohistórico del IHAH.

e. Gestión de la Inversión

- En seguimiento a Circular DGIP No. 01-2025, se actualiza la Proyección de ejecución Mensual para el Año 2025 (septiembre - diciembre).
- Reuniones Monitoreo y Seguimiento con la UCP/IHAH-DGIP-SEFIN.

f. Problemática y Acciones Durante el III - Trimestre-2025

- Retrasos en los procesos administrativos de contratación, debido a la alta demanda de revisión documental y tiempos extendidos en la evaluación y adjudicación de ofertas, se ha fortalecimiento de los equipos evaluadores y agilización de los procedimientos de contratación.
- Condiciones climáticas adversas en ciertas zonas del país (especialmente en la región centro-sur), que afectaron el ritmo de avance de las obras en ejecución, se ha implementado estrategias de reprogramación de cronogramas de ejecución para adecuarse a los períodos climáticos más favorables y evitar interrupciones prolongadas en los trabajos de campo.

V. Conclusiones

- Durante el año 2025 se observa un progreso sostenido en la ejecución de las actividades contempladas del proyecto, evidenciando un uso eficiente de los recursos asignados y un fortalecimiento en la capacidad operativa e institucional del IHAH.
- Las acciones desarrolladas reflejan una mejora en la planificación, contratación y supervisión del proyecto, así como en la aplicación de criterios técnicos de conservación, accesibilidad e inclusión, alineados con las buenas prácticas en la gestión del patrimonio cultural nacional.

VI. Recomendaciones

- Fortalecer la planificación anual y multianual de los proyectos de restauración, priorizando la programación de obras según su nivel

de riesgo y valor patrimonial, con el fin de optimizar los recursos disponibles y evitar retrasos administrativos.

- Agilizar los procesos de contratación pública y adquisiciones, mediante una mejor coordinación entre las unidades técnicas, jurídicas y administrativas del IHAH, para reducir los tiempos de evaluación, adjudicación y formalización de contratos.
- Reforzar las alianzas interinstitucionales y académicas, especialmente con universidades, municipalidades y organismos internacionales, para potenciar las investigaciones arqueológicas e históricas y garantizar su sostenibilidad científica.

ANEXOS

ANEXO No 1

SECRETARÍA DE FINANZAS
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE, 2025
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución/ Programa o Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado		Presupuesto Vigente		Ejecutado III Trimestre			Ejecutado Anual (Devengado)			Compromiso Aprobado		
			Fondos Nacionales	Total	Fondos Nacionales	Total	Fondos Nacionales	Total	% Ejecución (Dev./Vig)	Fondos Nacionales	Total	% Ejecución (Dev./Vig)	Fondos Nacionales	Total	% Ejecución (Comp./Vig)
1	0505 - Instituto Hondureño de Antropología e Historia		18,094,639	18,094,639	18,094,639	18,094,639	7,475,856	7,475,856	41.3%	10,168,997	10,168,997	56.2%	10,279,897	10,279,897	56.8%
1	FORTALECIMIENTO INTEGRAL IHAH PARA LA RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN, ACCESO INCLUSIVO E INVESTIGACIÓN EN SITIOS ARQUEOLÓGICOS	FN-25617-1	18,094,639	18,094,639	18,094,639	18,094,639	7,475,856	7,475,856	41.3%	10,168,997	10,168,997	56.2%	10,279,897	10,279,897	56.8%
	Total FORTALECIMIENTO INTEGRAL IHAH PARA LA RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN, ACCESO INCLUSIVO E INVESTIGACIÓN EN SITIOS ARQUEOLÓGICOS		18,094,639	18,094,639	18,094,639	18,094,639	7,475,856	7,475,856	41.3%	10,168,997	10,168,997	56.2%	10,279,897	10,279,897	56.8%
	0505 - Instituto Hondureño de Antropología e Historia		14,843,579	14,843,579	38,817,071	38,817,071	8,076,619	8,076,619	20.8%	17,310,800	17,310,800	44.6%	17,310,800	17,310,800	44.6%
	ACTIVIDADES CENTRALES		6,725,252	6,725,252	6,875,252	6,875,252	638,809	638,809	9.3%	3,931,132	3,931,132	57.2%	3,931,132	3,931,132	57.2%
	Total ACTIVIDADES CENTRALES		6,725,252	6,725,252	6,875,252	6,875,252	638,809	638,809	9.3%	3,931,132	3,931,132	57.2%	3,931,132	3,931,132	57.2%
	ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES ARQUEOLÓGICOS, FORTALEZAS Y MUSEOS.		5,387,724	5,387,724	29,211,216	29,211,216	5,925,748	5,925,748	20.3%	11,489,337	11,489,337	39.3%	11,489,337	11,489,337	39.3%
	Total ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES ARQUEOLÓGICOS, FORTALEZAS Y MUSEOS.		5,387,724	5,387,724	29,211,216	29,211,216	5,925,748	5,925,748	20.3%	11,489,337	11,489,337	39.3%	11,489,337	11,489,337	39.3%
	PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA.		2,730,603	2,730,603	2,730,603	2,730,603	1,512,063	1,512,063	55.4%	1,890,331	1,890,331	69.2%	1,890,331	1,890,331	69.2%
	Total PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA.		2,730,603	2,730,603	2,730,603	2,730,603	1,512,063	1,512,063	55.4%	1,890,331	1,890,331	69.2%	1,890,331	1,890,331	69.2%

ANEXO No 2

ANEXO No.2
SECRETARÍA DE FINANZAS
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2025

Institución/Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2025		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
0505 - Instituto Hondureño de Antropología e Historia								
Fortalecimiento Integral Del Instituto Hondureño De Antropología E Historia, Para La Restauración, Rehabilitación, Acceso Inclusivo E Investigación En Sitios Arqueológicos, Museos, Archivos Históricos E Inmuebles De Patrimonio 9 Departamentos Del País	Restaurados y rehabilitados patrimonio del país	Inmuebles	5	5	100%	2	2	100%
0507-Instituto Hondureño para la Prevención y Tratamiento del Alcoholismo, Drogadicción y Farmacodependencia								

Fuente.Unidades Ejecutoras de Proyectos

