



Secretaría de  
**Finanzas**  
Gobierno de la República

## Informe de Avance Físico y Financiero

# PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA AL IV TRIMESTRE 2025

### *Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)*

Tegucigalpa, Honduras

Enero, 2026

[www.sefin.gob.hn](http://www.sefin.gob.hn)



DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS



#### IV. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

##### a. Ejecución Física-Financiera de la Inversión Pública

El Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) adscrito a la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS), tiene como finalidad promover el mejoramiento de las condiciones de vida de los grupos sociales marginados en el área rural y urbana, mediante el otorgamiento de financiamientos para programas y proyectos de desarrollo social o económico, con el propósito de aumentar su productividad, sus niveles de empleo y de ingresos y de contribuir a la satisfacción de sus necesidades básicas.

Al cuarto trimestre del 2025 la institución cuenta con un presupuesto vigente de **L1,529.0 millones** y una ejecución de **L 324.8 millones** que representa **21.2%**, tal como se detalla en el Cuadro No. 01.

Cuadro No. 01  
**Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del**  
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>1,657,049,331.0</b>
Inversión Productiva	1,657,049,331.0
Formación Bruta de Capital	0.0
<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>1,529,075,842.0</b>
Inversión Productiva	1,357,956,213.0
Formación Bruta de Capital	171,119,629.0
<b>Ejecutado IV Trimestre</b>	<b>324,838,836.2</b>
Inversión Productiva	234,771,422.0
Formación Bruta de Capital	90,067,414.2
<b>% Ejecución (Devengado IV Trim - 2024 / Vigente)</b>	<b>21.2%</b>
<b>Ejecutado Anual</b>	<b>1,063,686,827.0</b>
Inversión Productiva	892,567,203.8
Formación Bruta de Capital	171,119,623.2
<b>% Ejecución (Devengado anual / Vigente)</b>	<b>69.6%</b>

Nota: SIAFI, 31/12/2025

Dicha ejecución se llevó a cabo con un presupuesto vigente para inversión productiva de **L 1,357.9 millones** y formación bruta de capital de **L 171.1 millones**, a través de proyectos enfocados en Electrificación Rural; infraestructura Social, Escolar y Caminos Rurales; Fortalecimiento de Capacidades para Jóvenes; Recuperación de Espacios Públicos y Mejora de la Infraestructura Básica.


##### b. Financiamiento de la Inversión Pública

La mayor parte de los proyectos que ejecuta el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) provienen de financiamiento externo proveniente del Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y el Kreditanstalt für Wiederaufbau de Alemania KFW, sumando las donaciones externas; en su conjunto alcanzan el 94%; mientras que el 6% se financia con fondos nacionales.

Del total del presupuesto vigente (L1,357.9.0 millones), el 81% corresponde a fondos provenientes de crédito externo con un monto de L1,097.3 millones y fondos nacionales que corresponden a contrapartes para gastos operativos de proyectos con un monto vigente de L62.5 millones equivalente a 5%. Los fondos de donaciones (L198.1 millones) equivalen al 15% tal como se muestra en el gráfico No 1.



Secretaría de  
**Finanzas**  
Gobierno de la República

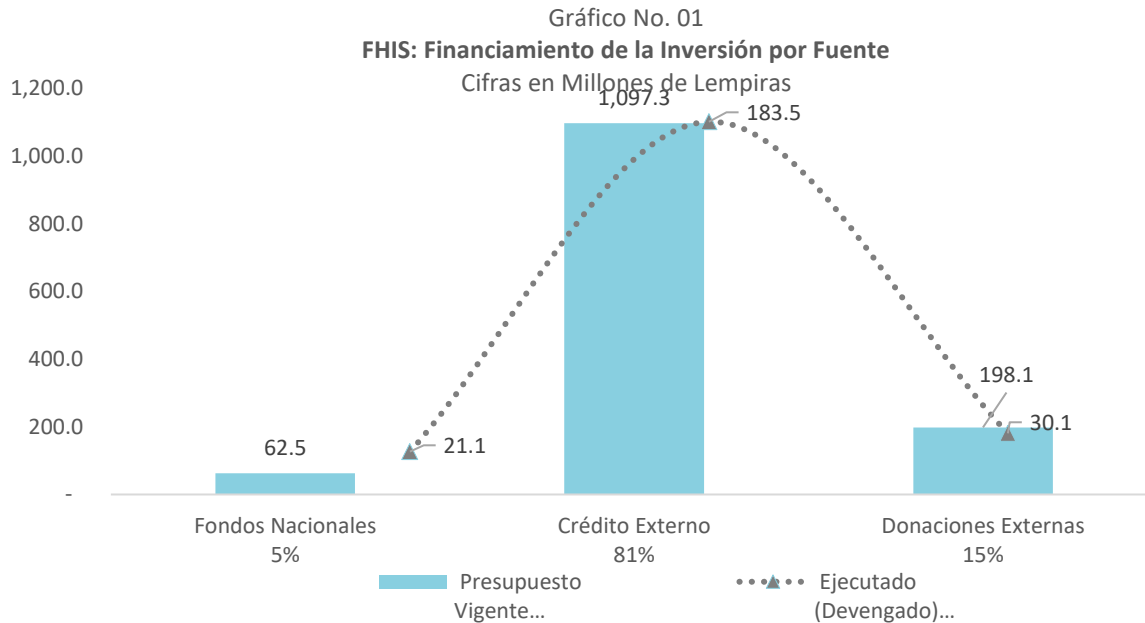

Fuente SIAFI


### c. Comportamiento de la Ejecución al IV Trimestre (2023-2025)

A continuación, se presenta un análisis del comportamiento histórico de la inversión en proyectos del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) en el periodo comprendido entre 2023 y 2025, basado en los montos vigentes y ejecutados.

La inversión registrada en el año 2023 ascendió a L 1,688.0 millones; disminuyendo el presupuesto vigente a L1,144.6 millones en el año 2024, año en el que se incorporaron al presupuesto, nuevos programas para atender la reparación y rehabilitación de escuelas y para proyectos de infraestructura con un presupuesto vigente de L1,144.6 millones. En el año 2025 cuenta con un presupuesto vigente de L1,529.0 millones, mostrando una mejora significativa en la capacidad de ejecución de proyectos e incrementando proyectos como el Hospital del garífuna y el Polideportivo en el Departamento de Olancho.



Gráfico No. 2  
**Comportamiento de la Inversión Pública**  
(FHIS)  
Al 31 de Diciembre (2023-2025)  
Millones de Lempiras

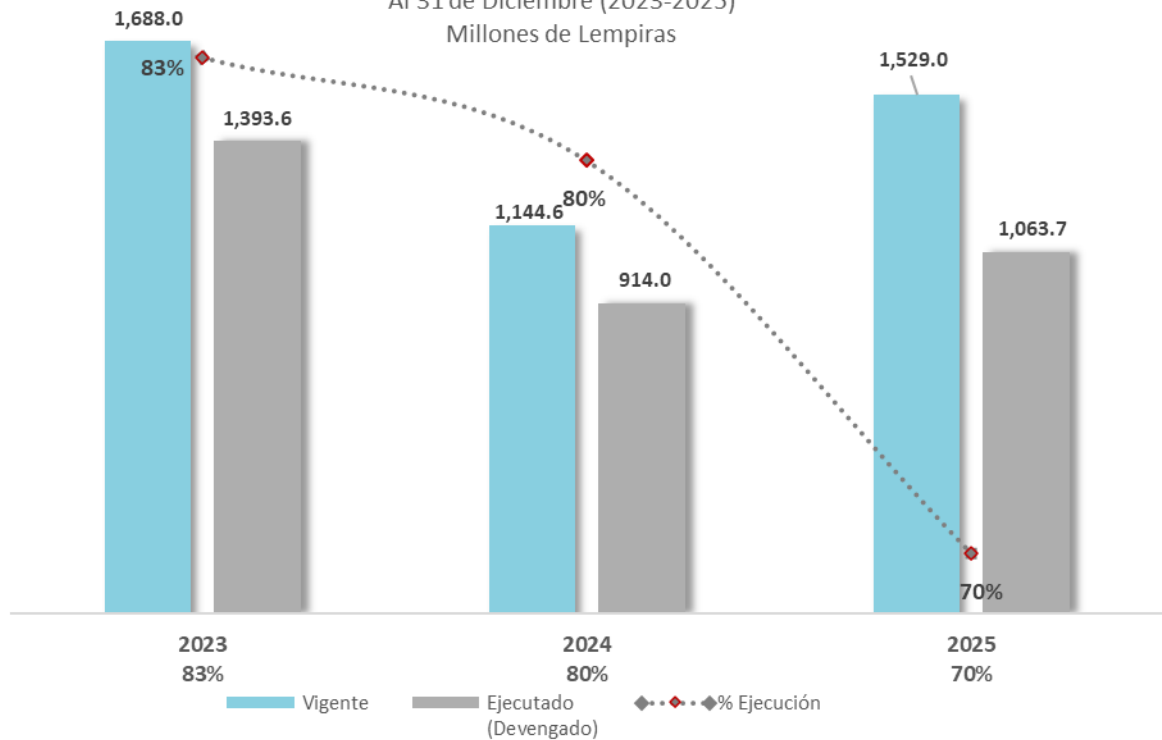

Fuente SIAFI

#### d. Principales Proyectos

La mayor parte de la inversión acumulada al IV trimestre de 2025 se concentra en los siguientes proyectos:

1. Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar (PROMINE/KFW, FASE IV y FASE V)
2. Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras (MIFE)
3. Proyecto Convivencia y Espacios Seguros para los Jóvenes en Honduras (CONVIVIR)
4. Proyecto Recuperación de Emergencia a causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras (PRE).



A continuación, se detallan los avances físicos y financieros de los principales proyectos de acuerdo con su presupuesto vigente:

### 1. Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar (PROMINE/KFW, FASE IV y V) (KFW)

El PROMINE tiene por objetivo general fortalecer la rectoría Sectorial en Infraestructura Educativa de la Secretaría de Educación y la gestión local participativa, así como mejorar el acceso de los alumnos de las comunidades pobres al Centro Educativo de calidad que operan de manera sostenible. De esa manera se pretende contribuir al aumento de la eficiencia y de la calidad del sistema educativo (prebásico y básico).

Los principales avances físicos al 31 de diciembre de 2025 son los siguientes:

#### Principales Metas Físicas al IV trimestre 2025

Metas Física	Unidad de Medida	Anual			IV Trimestre de 2025		
		Programación	Ejecución	% EJEC.	Programación	Ejecución	% EJEC.
Infraestructura Escolar	Centro Educativo	2	2	100%	1	1	100%

Fuente: FHIS, al 31 de Diciembre de 2025

#### Proyectos en Ejecución 2025/ PROMINE

No. Sub-Proyecto	Descripción subproyecto	Departamento	Municipio	% avance
109112	AMPLIACION CEB SAT AMERICA Y CEPB ROSA CANELO	GRACIAS A DIOS	JUAN FCO. BULNES	35.08%
109115	REPOSICION CEB COYOCUTENA	LEMPIRA	PIRAERA	100.00%
109116	REPARACION CEB FRANCISCO MORAZAN	COPAN	SAN ANTONIO	100.00%
109211	REPOSICION CEB LEONCIO VALLE	COMAYAGUA	COMAYAGUA	100.00%
109483	AMPLIACION INSTITUTO GUBERNAMENTAL TECNICO FRANCISCO MORAZAN	FRANCISCO MORAZAN	SABANAGRANDE	74.35%
110192	REPOSICION CEB JOSE TRINIDAD REYES	OLANCHO	DULCE NOMBRE DE CULMI	100.00%
109243	REPOSICION CEB CERRO GRANDE ZONA 2	FRANCISCO MORAZAN	DISTRITO CENTRAL	49.71%

Fuente FHIS



A continuación, se observa la ejecución financiera histórica del Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar (PROMINE/KFW, FASE V) al IV trimestre de 2025:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de
				Inicio - Fin
Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar (PROMINE/KFW, FASE V)	2016 68 763	€ 26,387,000	L817,068,178	02/04/2018-18/4/2025
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Ejecutado (Devengado)</b>	<b>% Ejecución</b>
IV Trimestre 2025	78425042	75315848	15,972,927.66	21%
Acumulado 2025	78425042	75315848	50,408,654.33	67%
Acumulado Vida del Proyecto *	817,068,178	817,068,178	160,688,553	20%

\* / Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 31/12/2025, L30.9648 por €1.00

La ejecución financiera al IV trimestre se cumplió en un 57%, para la mejora de la infraestructura Escolar desarrollado en 7 proyectos en los departamentos de Gracias a Dios, Lempira, Olancho y Francisco Morazán.

## 2. Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras (MIFE) (BCIE)

Consiste en la implementación de la metodología de formación permanente de docentes y estudiantes, la mejora de la infraestructura escolar de centros de educación pública en todo el territorio nacional con énfasis en las zonas de mayor pobreza urbana y rural. El mejoramiento de la infraestructura incluye la ampliación y/o reparación de infraestructura educativa, dotación de mobiliario y equipamiento técnico educativo especializado; y el fortalecimiento de habilidades de los docentes de educación sobre metodologías de enseñanza basadas en competencias y las capacidades de los estudiantes y docentes de bachillerato en temas relacionados al emprendedurismo.

Los principales avances físicos al 31 de diciembre de 2025 son los siguientes:

### Principales Metas Físicas al IV trimestre 2025

Metas Física	Unidad de Medida	Anual			IV Trimestre de 2025		
		Programación	Ejecución	% EJEC.	Programación	Ejecución	% EJEC.
Infraestructura Escolar	Centro Educativo	35	25	71.43%	3	3	100.0%

Fuente: FHS, al 31 de Diciembre de 2025



Secretaría de  
**Finanzas**  
Gobierno de la República

De las obras en ejecución se finalizaron nueve (9) obras de trece (13) programas (73.13% de cumplimiento) en el IV Trimestre 2025, las cuales se detallan a continuación:

Detalle de Centros Educativos finalizados en el IV trimestre/2025

CÓDIGO PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO
108887	JUAN LINDO	CORTES	San Pedro Sula
108908	ALEJANDRO FLORES	El Paraíso	El Paraíso
108909	PEDRO NUFIO	El Paraíso	Danlí
107844	ESCUELA URBANA MIGUEL ANGEL BUESO	Santa Bárbara	Concepción del Norte
109011	OSCAR MEJIA URQUIA	Santa Bárbara	Nueva Frontera
109940	ESCUELA AGRICOLA JHON F. KENNEDY	Atlántida	San Francisco
110073	ESCUELA AGRICULTURA POMPILIO ORTEGA	Santa Bárbara	Macuelizo
110065	ESCUELA DE AGRICULTURA DEL VALLE DE SULA	Cortés	San Pedro Sula
108987	CEB DOMINGA CHIRINOS DE BONILLA	Olancho	San Francisco de Becerra

Fuente FHIS

A continuación, se observa la ejecución financiera histórica del Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras (MIFE) al IV trimestre de 2025:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de
				Inicio - Fin
Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras (MIFE)	BCIE - 2239	US\$80,000,000	L2,107,519,200.0	30/03/2021-
				30/3/2026
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Ejecutado (Devengado)</b>	<b>% Ejecución</b>
III Trimestre 2025	447,765,063	315,765,093	60,150,153.03	19%
Acumulado 2025	447,765,063	315,765,093	230,920,681.81	73%
Acumulado Vida del Proyecto *	2,107,519,200	2,107,519,200	703,932,108	33%

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 31/12/2025 (BCH): L26.34399 por US\$1.00

La ejecución financiera del proyecto al cuarto trimestre acumulada es de L230.9 MM de un presupuesto vigente de L 315.7 MM, representando un 73%, dado que existen proyectos restantes en su etapa de ejecución final.



### 3. Proyecto Convivencia y Espacios Seguros para los Jóvenes en Honduras (CONVIVIR) (KFW)

El programa abarca la construcción, el mejoramiento y el equipamiento de infraestructura social para jóvenes y espacios públicos, financiamiento y/o cofinanciamiento del trabajo con jóvenes y la capacitación de jóvenes, la capacitación de personal de las instituciones involucradas, las municipalidades seleccionadas, las comunidades de barrio y servicios de consultoría.

Los principales avances físicos al 31 de diciembre del 2025 son los siguientes:

#### Principales Metas Físicas al IV trimestre 2025

Metas Física	Unidad de Medida	Anual			IV Trimestre de 2025		
		Programación	Ejecución	% EJEC.	Programación	Ejecución	% EJEC.
Espacios Públicos recuperados	Obra	5	0	0%	0	0	100%
Jóvenes Capacitados	Capacitación	960	960	100%	900	900	100%

Fuente: FHIS, al 31 Diciembre de 2025

Para el año 2025, se programaron 5 espacios públicos recuperados, de los cuales **se encuentran en ejecución los siguientes:**

#### Detalle de proyectos de Espacios Públicos Recuperados en Ejecución.

Código del Sub-Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance
109611	Casa de la Juventud	91.00%
109612	Plaza la Juventud	92.00%
109613	Centro Deportivo Integral San Carlos	95.00%
109614	THAU MISHU (Casa de La Juventud)	93.00%
109615	Centro Formación Integral Juvenil	95.00%

FUENTE FHIS

A continuación, se reporta la ejecución financiera histórica del Proyecto Convivencia y Espacios Seguros para los Jóvenes en Honduras (CONVIVIR) al IV trimestre de 2025:



Secretaría de  
**Finanzas**  
Gobierno de la República

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de
				Inicio - Fin
Proyecto Convivencia y Espacios Seguros para los Jóvenes en Honduras (CONVIVIR Fase II y Fase III)	2016 65348 2018 67563	6,000,000.00	495,436,800	06/12/2013- 6/4/2028
		10,000,000.00		
		600,000.00	49,543,680	
		1,000,000.00		
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
IV Trimestre 2025	112,236,375	93,572,660	10723091.64	11%
Acumulado 2025	112,236,375	93,572,660	32559141.99	35%
Acumulado Vida del Proyecto *	544,980,480	544,980,480	197,630,933	36%

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 31/12/2025, L30.9648 por €1.00

Durante el cuarto trimestre del 2025, no se han realizado contratos de bienes, servicios u obras, ya que el proyecto se encuentra en su fase final.

#### 4. Proyecto Recuperación de Emergencia a causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras (PRE) (Banco Mundial)

El Proyecto se enfoca en la rehabilitación y reconstrucción de la infraestructura pública en salud, educación, agua y saneamiento, vial, comunitaria y vivienda en las zonas geográficas del país afectadas por los ciclones tropicales Eta e Iota.

El PRE tiene por objetivo atender las necesidades identificadas como prioritarias para reactivar la economía y apoyar las más urgentes necesidades de la población afectada por los fenómenos naturales ETA e IOTA, como respuesta de emergencia y recuperación de Honduras, y, en esta perspectiva, fortalecer la capacidad institucional del Estado para gestionar una ejecución eficaz, eficiente y transparente.

Los principales avances físicos al 31 de diciembre de 2025 son los siguientes:

#### Principales Metas Físicas al IV trimestre 2025

Metas Física	Unidad de Medida	Anual			IV Trimestre de 2025		
		Programación	Ejecución	% EJEC.	Programación	Ejecución	% EJEC.
Centros educativos rehabilitados	Centro Educativo	14	9	64%	6	6	100%



### Principales Metas Físicas al IV trimestre 2025

Metas Física	Unidad de Medida	Anual			IV Trimestre de 2025		
		Programación	Ejecución	% EJEC.	Programación	Ejecución	% EJEC.
Sistemas de agua rehabilitados	Sistema de Agua	4	1	25%	0	0	100%
Infraestructura vial rehabilitada y reconstruida	Kilometro	0	0	0%	0	0	0%
Centros de salud pública rehabilitados	Unidad de Salud	1	0	0%	0	0	0%

Fuente: FHIS, al 31 de Diciembre de 2025

Al cierre del IV Trimestre de 2025 están en ejecución los siguientes proyectos:

Código del Sub-Proyecto	Nombre del Proyecto	Departamento
108417	Reparación CEPB Luis Sabillón Ortiz	Santa Bárbara
108374	Reparación Jardín de Niños Rosaura Posas de Navarro	Cortés
108524	Reparación C.E.P.B Miriam J. Gallardo	Francisco Morazán
108620	Reposición Escuela Republica de Honduras	Francisco Morazán
108509	Reparación Jardín de Niños Humberto Rivera Torres	Francisco Morazán
108451	Reparación Escuela Juan Lindo	El Paraíso
108429	Reparación C.E.B.G. Rodolfo Padilla Sunceri	Cortés

A continuación, véase la ejecución financiera histórica del Proyecto Recuperación de Emergencia a causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras (PRE) al IV trimestre de 2025:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de
				Inicio - Fin
Proyecto Recuperación de Emergencia a causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras (PRE)	BCIE - 2261	US\$124,211,000	3,272,213,341.89	25/05/2021-31/12/2026
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Ejecutado (Devengado)</b>	<b>% Ejecución</b>
IV Trimestre 2025	391,435,689	651,793,199	113,807,448.44	17%
Acumulado 2025	391,435,689	651,793,199	496,128,263.74	76%
Acumulado Vida del Proyecto *	3,272,213,342	3,272,213,342	1,328,984,142	41%



De manera acumulada los proyectos ejecutados por el FHIS reportan los siguientes avances en construcción de fondos nacionales:

**Número de Centros Escolares Programados y Finalizados por Proyectos**  
**CENTROS ESCOLARES 2025**  
**IV TRIMESTRE FHIS**

Proyecto	Programados	Ejecutado	Porcentaje
MIFE	35	25	71%
PROMINE	2	2	100%
PRE	16	8	50%
<b>TOTAL</b>	<b>53</b>	<b>35</b>	<b>66%</b>

Fuente FHIS

Asimismo, el resto de los proyectos ejecutados por el FHIS, reportan los siguientes avances relevantes:

**1. Proyectos Financiados por USAID**

Los proyectos bajo el Proyecto Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras USAID/PIOH y el Proyecto Infraestructura de la Seguridad Ciudadana USAID/ICS no han registrado avances en su ejecución. Lo anterior como resultado del cese de la cooperación por parte del Gobierno de los Estados Unidos a través de USAID, conforme a disposiciones emitidas por la Presidencia de dicho país. Esta suspensión ha generado un impacto crítico en la ejecución programática, y actualmente estos proyectos se encuentran en proceso de cancelación y análisis para determinar su viabilidad de implementación futura.

**2. Proyecto “Agua de Gracias” – Fondos BCIE**

El proyecto es financiado con recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), permanece sin ejecución. A la fecha, no se han registrado avances físicos ni financieros significativos en su desarrollo ya que presenta diversos problemas ambientales, sociales y de operación.

Los principales avances físicos al 31 de diciembre del 2025 son los siguientes:

**Principales Metas Físicas al IV trimestre 2025**

Metas Física	Unidad de Medida	Anual			IV Trimestre de 2025		
		Programación	Ejecución	% EJEC.	Programación	Ejecución	% EJEC.
Acceso a servicio de agua potable en beneficio de la población hondureña	obra	1	0	0%	0	0	0%

Fuente: FHIS, al 31 de Diciembre de 2025



### 3. Proyectos de Reciente incorporación en el PIP:

- **Ampliación del Polideportivo Ramón Díaz López – Etapa II**, ubicado en el municipio de Catacamas, Departamento de Olancho.
- **Construcción del Primer Hospital Garífuna**, localizado en el municipio de Irina, Departamento de Colón.

Los Proyectos en mención se encuentran en su etapa inicial.

#### d.1. Principales Adquisiciones al IV Trimestre 2025

Al IV trimestre del 2025, las adquisiciones de bienes incluyeron Equipos informáticos, y contrataciones de obras y consultorías, los cuales se describen a continuación:

#### Contratos Firmados al IV Trimestre 2025

Proyecto Recuperación de Emergencia a causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras (PRE)

NO.	CÓDIGO	NO. DE PROCESO	NOMBRE	EMPRESA ADJUDICADA	MONTO DEL CONTRATO L	NO. DE CONTRATO	FECHA DE FIRMA DE CONTRATO
<b>PROCESOS ADJUDICADOS – IV TRIMESTRE 2025</b>							
<b>OBRAS</b>							
1	110805	HN-SEDECOAS-408308-CW-RFB	Lote 2: Puente Sobre el Río Aguagua San Vicente Centenario Departamento de Santa Bárbara Código 110805	R & M y Asociados, S. de R.L. de C.V.	49,464,751.17	SDO-O-FHIS-19-2025	22/12/2025
2	111277	HN-SEDECOAS-513443-CW-RFB	Lote 1: Restauración CEB República de Colombia Código 111277	HJJ, S.A.	34,089,624.06	SDO-O-FHIS-20-2025	22/12/2025
3	111278		Lote 2: Reposición CEB Renacimiento Código 111278	Servicios Profesionales de Ingeniería Padgett, S. de R.L. (SERPIP)	52,212,480.50	Adjudicado en diciembre de 2025.	
4	111279		Lote 3: Restauración CEB Luis Landa Código 111279 en el Departamento de Comayagua				21,760,208.03
<b>FIRMAS CONSULTORAS</b>							
1	111383	HN-SEDECOAS-457820-CS-CQS	Supervisión Reposición de Escuela y CEPB Código 110184, en Colón; CEB/JN Código 110181 en Atlántida y CEB/CEPB Código 108238 en Yoro	Saybe y Asociados, S. de R.L.	16,059,981.00	Proceso adjudicado el 30 de diciembre de 2025	
2	110490	HN-SEDECOAS-342611-CS-QCBS	Supervisión Rehabilitación de Infraestructura Vial en Caminos Rurales	Asociación de Profesionales, S.A. de C.V. (ASP Consultores)	15,396,531.02	SC-F-FHIS-03-2025	19/12/2025
<b>BIENES / SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA / CONSULTORÍAS INDIVIDUALES</b>							
1	-	HN-SEDECOAS-371708-GO-RFQ	Adquisición de Equipo de Cocina y Comedor para la UEP y SEDECOAS	Distribuidora Universal, S.A. de C.V. (DIUNSA)	8,280.00	Proceso adjudicado el 28 de noviembre del 2025	Proceso declarado cancelado
2	-	HN-SEDECOAS-458060-GO-RFQ	Adquisición de llantas para flota vehicular de la UEP-PRE	Rendillantas, S.A. de C.V.	115,253.52	SDC-B-FHIS-02-2025	16/12/2025
3	-	HN-SEDECOAS-513463-CS-INDV	Especialista en Monitoreo y Evaluación de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP)	Cinthia Nuñez	75,853.17	PRE-S-CI-045-2026	Contrato en firma del Ministro



Estas adquisiciones forman parte de los esfuerzos para mejorar la infraestructura y los servicios públicos, asegurando que se disponga de los recursos necesarios para el desarrollo y el mantenimiento de proyectos Educativos.

#### **e. Gestión de la Inversión**

- Elaboración de Dictamen de Modificación entre Categorías de Inversión de fuente 21 (Crédito Externo), en atención al Oficio No. DSM-0730-2025 del 14 de octubre de 2025, para el "Proyecto de Recuperación de Emergencia a Causa de los Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras (PRE)", para su ejecución en el presente año fiscal por \$7,824,400.00,
- En seguimiento a la Circular DGIP No. 01-2025, se actualiza la Proyección de ejecución Mensual para el Año 2025.
- Durante el cuarto trimestre del año 2025, se realizó la solicitud de cuota trimestral de fondos externos a la SEFIN para garantizar la disponibilidad de recursos financieros de los proyectos de inversión pública.
- Acompañamiento constante a los diferentes proyectos ejecutados por FHIS.

#### **f. Problemática y Acciones al IV Trimestre-2025 en los proyectos del FHIS**

- En empresas contratistas y de supervisión, se detectan debilidades técnicas, administrativas y de personal especializado. Estas limitaciones afectan la revisión, validación y tramitación de documentación esencial para la ejecución.
- Procesos internos lentos debido a restricciones con el pago en moneda extranjera, retrasan el flujo financiero requerido para ejecutar las obras.
- Algunos proyectos dependen de la operatividad de municipalidades, que en muchos casos no cumplen con requisitos básicos como disponibilidad de terrenos, regulación de recursos hídricos o aceptación comunitaria, generando conflictos sociales o afectaciones a la viabilidad de largo plazo.
- Los programas financiados por USAID (ICS y PIOH) fueron cancelados tras una decisión oficial del Gobierno de Estados Unidos, comunicada el 13 de junio de 2025. La falta de planificación del cierre a nivel nacional provocó retrasos operativos, incluyendo la no renovación de contratos técnicos, lo que paralizó actividades clave durante más de un mes.

### **V. CONCLUSIONES**

- Durante el IV Trimestre de 2025, Las experiencias recientes han puesto en evidencia aspectos clave a mejorar en los procesos de formulación, supervisión y ejecución de obras. Estos retos no deben verse como fallas estructurales, sino como oportunidades para consolidar aprendizajes, actualizar metodologías y promover la profesionalización continua del personal técnico y administrativo involucrado en la ejecución de proyectos de alto impacto social.



- El desarrollo de infraestructura social y comunitaria depende en gran medida del trabajo conjunto entre el nivel central, las municipalidades, las comunidades y los socios de cooperación. Los obstáculos encontrados en algunos proyectos muestran la importancia de reforzar mecanismos de coordinación, comunicación y corresponsabilidad, con el fin de asegurar que los proyectos respondan de forma integral a las necesidades locales y perduren en el tiempo para la debida sostenibilidad.

## **VI. RECOMENDACIONES**

- A partir de los aprendizajes acumulados, es conveniente continuar invirtiendo en la formación especializada del personal en áreas clave como formulación de proyectos, análisis de riesgos, supervisión de obras y gestión presupuestaria. Esto permitirá contar con expedientes más robustos, para promover la eficiencia operativa y anticiparse a desafíos técnicos antes de iniciar la fase de ejecución.
- Promover espacios de diálogo permanente y acuerdos colaborativos con las alcaldías, comunidades y cooperantes internacionales es clave para asegurar que los proyectos respondan a contextos reales, se mantengan en el tiempo y cuenten con respaldo ciudadano. Una gobernanza compartida garantiza mayor sostenibilidad, aceptación social y compromiso en cada etapa del ciclo del proyecto.



Secretaría de  
**Finanzas**  
Gobierno de la República

# ANEXOS



Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas  
**PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE, 2025**  
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Programa o Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado IV Trimestre				Ejecutado Anual (Devengado)			
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)
<b>10</b>	<b>0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social</b>		<b>41,978,547.0</b>	<b>1,615,070,784.0</b>	<b>1,657,049,331.0</b>	<b>62,467,028.0</b>	<b>1,295,489,185.0</b>	<b>1,357,956,213.0</b>	<b>21,166,621.0</b>	<b>213,604,801.0</b>	<b>234,771,422.0</b>	<b>17.3</b>	<b>62,467,015.1</b>	<b>830,100,188.7</b>	<b>892,567,203.8</b>	<b>65.7</b>
1	ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS	522-0502 Cd E No.9	-	79,040,000.0	79,040,000.0	-	13,289,800.0	13,289,800.0	-	2,718,623.6	2,718,623.6	20.5	-	4,413,221.2	4,413,221.2	33.2
	<b>Total ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS</b>		<b>-</b>	<b>79,040,000.0</b>	<b>79,040,000.0</b>	<b>-</b>	<b>13,289,800.0</b>	<b>13,289,800.0</b>	<b>-</b>	<b>2,718,623.6</b>	<b>2,718,623.6</b>	<b>20.5</b>	<b>-</b>	<b>4,413,221.2</b>	<b>4,413,221.2</b>	<b>33.2</b>
2	Ampliación del Polideportivo Ramón Díaz López, Etapa II, ubicado en Catacamas, Departamento de Olancho	FN-26000-01	-	-	-	28,889,176.0	-	28,889,176.0	18,680,081.7	-	18,680,081.7	64.7	28,889,175.9	-	28,889,175.9	100.0
	<b>Total Ampliación del Polideportivo Ramón Díaz López, Etapa II, ubicado en Catacamas</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>28,889,176.0</b>	<b>-</b>	<b>28,889,176.0</b>	<b>18,680,081.7</b>	<b>-</b>	<b>18,680,081.7</b>	<b>64.7</b>	<b>28,889,175.9</b>	<b>-</b>	<b>28,889,175.9</b>	<b>100.0</b>
3	Construcción del Primer Hospital Garífuna en el Municipio de Iriona, Departamento de Colón.	FN-25984-1	-	-	-	7,468,629.0	-	7,468,629.0	801,961.0	-	801,961.0	10.7	7,468,627.6	-	7,468,627.6	100.0
	<b>Total Construcción del Primer Hospital Garífuna en el Municipio de Iriona, Departamento de Colón.</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7,468,629.0</b>	<b>-</b>	<b>7,468,629.0</b>	<b>801,961.0</b>	<b>-</b>	<b>801,961.0</b>	<b>10.7</b>	<b>7,468,627.6</b>	<b>-</b>	<b>7,468,627.6</b>	<b>100.0</b>
4	CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JOVENES EN HONDURAS FASE III	BMZ Nr. 2016 65348	9,081,400.0	36,683,660.0	45,765,060.0	10,622,139.0	20,124,175.0	30,746,314.0	162,639.9	7,124,438.6	7,287,078.5	23.7	3,242,136.5	14,829,706.4	18,071,842.9	58.8
		KFW 2018.6756.3	-	66,471,315.0	66,471,315.0	3,684,969.0	66,471,315.0	62,786,346.0	1,072,768.8	2,363,244.3	3,436,013.1	5.5	3,695,027.4	10,792,271.7	14,487,299.1	23.1
	<b>Total CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JOVENES EN HONDURAS FASE III</b>		<b>9,081,400.0</b>	<b>103,154,975.0</b>	<b>112,236,375.0</b>	<b>6,937,170.0</b>	<b>86,595,490.0</b>	<b>93,532,660.0</b>	<b>1,235,408.8</b>	<b>9,487,682.9</b>	<b>10,723,091.6</b>	<b>11.5</b>	<b>6,937,163.9</b>	<b>25,621,978.1</b>	<b>32,559,142.0</b>	<b>34.8</b>
5	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA	522-0501-4	29,787,953.0	141,834,220.0	171,622,173.0	17,472,064.0	43,066,367.0	60,538,431.0	-	9,569,910.8	9,569,910.8	15.8	17,472,063.9	18,132,886.6	35,604,950.4	58.8
	<b>Total PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA</b>		<b>29,787,953.0</b>	<b>141,834,220.0</b>	<b>171,622,173.0</b>	<b>17,472,064.0</b>	<b>43,066,367.0</b>	<b>60,538,431.0</b>	<b>-</b>	<b>9,569,910.8</b>	<b>9,569,910.8</b>	<b>15.8</b>	<b>17,472,063.9</b>	<b>18,132,886.6</b>	<b>35,604,950.4</b>	<b>58.8</b>
6	PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)	BMZ 2016 68 763	3,109,194.0	75,315,848.0	78,425,042.0	1,699,989.0	75,315,848.0	77,015,837.0	449,169.7	15,523,758.0	15,972,927.7	20.7	1,699,983.7	48,708,670.6	50,408,654.3	65.5
	<b>Total PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)</b>		<b>3,109,194.0</b>	<b>75,315,848.0</b>	<b>78,425,042.0</b>	<b>1,699,989.0</b>	<b>75,315,848.0</b>	<b>77,015,837.0</b>	<b>449,169.7</b>	<b>15,523,758.0</b>	<b>15,972,927.7</b>	<b>20.7</b>	<b>1,699,983.7</b>	<b>48,708,670.6</b>	<b>50,408,654.3</b>	<b>65.5</b>
7	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y FORMACION EDUCATIVA EN HONDURAS	BCIE - 2239	-	447,765,093.0	447,765,093.0	-	315,765,093.0	315,765,093.0	-	60,150,153.0	60,150,153.0	19.0	-	230,920,681.8	230,920,681.8	73.1
	<b>Total PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y FORMACION EDUCATIVA EN HONDURAS</b>		<b>-</b>	<b>447,765,093.0</b>	<b>447,765,093.0</b>	<b>-</b>	<b>315,765,093.0</b>	<b>315,765,093.0</b>	<b>-</b>	<b>60,150,153.0</b>	<b>60,150,153.0</b>	<b>19.0</b>	<b>-</b>	<b>230,920,681.8</b>	<b>230,920,681.8</b>	<b>73.1</b>
8	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS A NIVEL NACIONAL		-	-	-	-	100,122,708.0	100,122,708.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS A NIVEL NACIONAL</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100,122,708.0</b>	<b>100,122,708.0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
9	PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE GRACIAS	BCIE-2261	-	376,524,959.0	376,524,959.0	-	9,540,680.0	9,540,680.0	-	2,347,224.1	2,347,224.1	24.6	-	6,174,486.8	6,174,486.8	64.7
	<b>Total PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE GRACIAS</b>		<b>-</b>	<b>376,524,959.0</b>	<b>376,524,959.0</b>	<b>-</b>	<b>9,540,680.0</b>	<b>9,540,680.0</b>	<b>-</b>	<b>2,347,224.1</b>	<b>2,347,224.1</b>	<b>24.6</b>	<b>-</b>	<b>6,174,486.8</b>	<b>6,174,486.8</b>	<b>64.7</b>
10	Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras.	6822-HN	-	391,435,689.0	391,435,689.0	-	651,793,199.0	651,793,199.0	-	113,807,448.4	113,807,448.4	17.5	-	496,128,263.7	496,128,263.7	76.1
	<b>Total Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras.</b>		<b>-</b>	<b>391,435,689.0</b>	<b>391,435,689.0</b>	<b>-</b>	<b>651,793,199.0</b>	<b>651,793,199.0</b>	<b>-</b>	<b>113,807,448.4</b>	<b>113,807,448.4</b>	<b>17.5</b>	<b>-</b>	<b>496,128,263.7</b>	<b>496,128,263.7</b>	<b>76.1</b>
	<b>0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>171,119,629.0</b>	<b>-</b>	<b>171,119,629.0</b>	<b>90,067,414.2</b>	<b>-</b>	<b>90,067,414.2</b>	<b>52.6</b>	<b>171,119,623.2</b>	<b>-</b>	<b>171,119,623.2</b>	<b>100.0</b>
	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS A NIVEL NACIONAL		-	-	-	171,119,629.0	-	171,119,629.0	90,067,414.2	-	90,067,414.2	52.6	171,119,623.2	-	171,119,623.2	100.0
	<b>Total PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS A NIVEL NACIONAL</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>171,119,629.0</b>	<b>-</b>	<b>171,119,629.0</b>	<b>90,067,414.2</b>	<b>-</b>	<b>90,067,414.2</b>	<b>52.6</b>	<b>171,119,623.2</b>	<b>-</b>	<b>171,119,623.2</b>	<b>100.0</b>
	<b>Total general</b>		<b>41,978,547.0</b>	<b>1,615,070,784.0</b>	<b>1,657,049,331.0</b>	<b>233,586,657.0</b>	<b>1,295,489,185.0</b>	<b>1,529,075,842.0</b>	<b>111,234,035.2</b>	<b>213,604,801.0</b>	<b>324,838,836.2</b>	<b>69.9</b>	<b>233,586,638.3</b>	<b>830,100,188.7</b>	<b>1,063,686,827.0</b>	<b>165.7</b>

Fuente: SIAFI, 31/12/2025



**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública  
**PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL IV TRIMESTRE, 2025**  
Cifras en Lempiras

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Metas			Ubicación y Observaciones
			Programación 2025	Ejecución Física acumulada al IV Trimestre 2025		
			Cantidad	Cantidad	% EJEC. Cantidad	
PROYECTO RECUPERACIÓN DE EMERGENCIA A CAUSA DE CICLONES TROPICALES ETA E IOTA EN HONDURAS	Centros educativos rehabilitados y/o reconstruidos afectados por ciclones Eta e Iota en beneficio de la población afectada por los fenómenos naturales. PRE	CENTRO EDUCATIVO	16	8	50%	Subproyectos finalizados en el II trimestre de 2025: - 108628 Reparación CEB en Lejamani, Comayagua. - 108291 Reparación CEPB y CEB en La Lima, Cortés Sistemas
	Sistemas de agua rehabilitados y/o reconstruidos afectados por ciclones Eta e Iota. PRE	SISTEMA DE AGUA	4	1	100%	Productos entregados en el II, III y IV trimestre Infraestructura
	Infraestructura vial rehabilitada y reconstruida afectados por ciclones Eta e Iota. PRE	KILOMETRO	9	0	0%	Subproyectos finalizados en el II trimestre de 2025: -109249 Reposición de puente en Nueva Arcadia, -108698 Reconstrucción de puente en Florida Copán.
	Infraestructura en centros de salud pública rehabilitados y/o reconstruidos afectados por ciclones Eta e Iota en beneficio de la población afectada por los fenómenos naturales. PRE	UNIDAD DE SALUD	1	0	0%	Productos entregados en el II, III y IV trimestre
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y FORMACION EDUCATIVA EN HONDURAS	Centro educativos construidos, reparados y/o ampliados. MIFE	CENTRO EDUCATIVO	35	25	71%	Se finalizaron 9 de los 13 centros educativos que se planificaron terminar para el II Trimestre del 2025. Los dos (2) proyectos restantes se encuentran en su etapa de ejecución final.
PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE IV y V)	Centro educativos construidos, reparados y/o ampliados. PROMINE	CENTRO EDUCATIVO	2	2	100%	
PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS FASE II	Espacios públicos recuperados y entregados para la seguridad ciudadana a las colonias, alcaldías y patronatos en beneficio de la población hondureña CONVIVIR II	OBRA	5	0	0%	El proyecto Plaza Mirador Santa Teresa finalizó en octubre del 2024 con obras de FHIS, quedando pendiente realizar unas subsanaciones que la alcaldía tenía pendiente por lo que en enero se completó todas las actividades pendientes.



**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública  
**PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL IV TRIMESTRE, 2025**  
Cifras en Lempiras

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Metas			Ubicación y Observaciones
			Programación 2025	Ejecución Física acumulada al IV Trimestre 2025		
			Cantidad	Cantidad	% EJEC. Cantidad	
	Jóvenes capacitados en habilidades sociales y laborales para personas jóvenes de entre las edades de 12-30 años en los municipios de Santa Rosa de Copán, Intibucá, La Esperanza y Juticalpa. CONVIVIR Fase II	CAPACITADO	960	960	100%	Injuve capacitó jóvenes en la ciudad de Juticalpa, en Habilidades para la Vida y Técnicas de negocio.
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA	Espacios públicos recuperados y entregados para la seguridad ciudadana a las colonias, alcaldías y patronatos en beneficio de la población hondureña ICS	OBRA	2	0	0%	A Junio de 2025 no se han recibido instrucciones adicionales por parte de la USAID para determinar que gastos incurridos posteriores a la remisión de la Orden Ejecutiva serán gastos elegibles bajo el financiamiento de los convenios de ejecución de los programas de la USAID. También se encuentran pendiente de reembolso por parte de la USAID, solicitudes de reembolso remitidas en enero y marzo de 2025 por un monto de L.8,783,702 para ICS, las cuales serán regularizadas en presupuesto de SIAFI una vez sean reembolsadas por la USAID.
	Centros educativos construidos, reparados y/o ampliados ubicados en Choloma, San Pedro Sula, Chamelecón, La Lima, Tela y en Tegucigalpa en beneficio de niños de las zona urbana y rural de Honduras. ICS	CENTRO EDUCATIVO	8	1	13%	
	Obras complementarias reparados y/o ampliados en los servicios de salud ubicados en La Ceiba, SPS y Tegucigalpa. ICS	OBRA	1	0	0%	
ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS	Centros educativos construidos, reparados y/o ampliados en beneficio de niños de las zonas rural y urbanas en Honduras. PIOH	CENTRO EDUCATIVO	6	0	0%	a Junio 2025 no se han recibido instrucciones adicionales por parte de la USAID para determinar que gastos incurridos posteriores a la remisión de la Orden Ejecutiva serán gastos elegibles bajo el financiamiento de los convenios de ejecución de los programas de la USAID. Se finalizó el proyecto: Reparación CEB Dionisio de Herrera y Construcción de obras varias, La Paz, La Paz.
	Infraestructura social (puentes y caja puente), rehabilitada y reconstruida en beneficio de la población a nivel Nacional PIOH	OBRA DE INFRAESTRUCTURA	1	0	0%	



**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública  
**PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL IV TRIMESTRE, 2025**  
Cifras en Lempiras

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Metas			Ubicación y Observaciones
			Programación 2025	Ejecución Física acumulada al IV Trimestre 2025		
			Cantidad	Cantidad	% EJEC. Cantidad	
PROGRAMA DE AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE GRACIAS	Diseño de los sistemas de agua potable realizado. GRACIAS	DISEÑO	1	0	0%	Pendiente desembolso de US \$ 11,324.63 (Lps 283,115.75) en concepto de pago de la Adenda nº2 de obras adicionales para el contrato suscrito por la firma consultora correspondiente.

Fuente: FHIS, al 31 de diciembre de 2025
