



Secretaría de
Finanzas
Gobierno de la República

Informe de Avance Físico y Financiero

PLAN DE INVERSION PÚBLICA AL IV TRIMESTRE 2025

Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR)

Tegucigalpa, Honduras

Enero, 2026

IV. PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA

a. Ejecución Física-Financiera de la Inversión Pública

La Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR) es la institución rectora del deporte, educación física y recreación, encargada de la construcción, mantenimiento y conservación de la infraestructura deportiva. Con la finalidad de incentivar la práctica del deporte de toda la población sin discriminación de ninguna naturaleza y promover un estado de vida saludable.

En el Plan de Gobierno de Honduras se contempla la inversión para la construcción de infraestructura para la práctica deportiva de acceso público y gratuito. En estas obras se vela por el diseño incluyente de múltiples prácticas deportivas, incluidas las populares tradicionales y el acceso para personas con discapacidad.

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del
2024

Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	1,133,885,040.0
Inversión Productiva	913,177,040.0
Formación Bruta de Capital	220,708,000.0
Presupuesto Vigente	1,139,751,884.0
Inversión Productiva	930,527,041.0
Formación Bruta de Capital	209,224,843.0
Ejecutado IV Trimestre	423,001,619.1
Inversión Productiva	294,288,180.4
Formación Bruta de Capital	128,713,438.8
% Ejecución (Devengado IV Trim- 2024/Vigente)	37.1%
Ejecutado Anual	1,032,969,990.3
Inversión Productiva	866,995,098.1
Formación Bruta de Capital	165,974,892.3
% Ejecución (Devengado anual/Vigente)	90.6%

Nota: SIAFI, 31/12/2025
(Preliminar)

Al Último Trimestre del 2025, la institución contó con un presupuesto de inversión pública vigente de **L1,133.9 millones**; de los cuales **L913.2 millones**, corresponden a Inversión productiva, y **L220.7 millones** a la formación bruta capital. En cuanto a la ejecución presupuestaria al cierre del trimestre, se reporta una ejecución de **L294.3 millones** en la inversión productiva, **L128.7 millones** de la formación bruta de capital lo que representa el 37.1% en relación con el presupuesto vigente, tal como se detalla en el Cuadro No. 1.

Dicha inversión se llevó a cabo a través de la ejecución de tres proyectos enfocados en la construcción, mejoras y rehabilitación de espacios físicos deportivos, recreativos y administrativos con acceso inclusivo para uso de la población en general a nivel nacional y la formación bruta de capital. Ver


Detalle de Ejecución Financiera en Anexo No. 1.

b. Financiamiento de la Inversión Pública

En referencia al financiamiento de Inversión Pública, la totalidad de los recursos corresponden a fondos provenientes de fondos nacionales provenientes de Tesorería General de la Republica.

c. Comportamiento de la Ejecución al IV Trimestre (2023-2025):

En el periodo comprendido entre el 2023 y el 2025, los proyectos de Inversión Pública ejecutados por la CONDEPOR han considerado la ejecución de 3 Proyectos de Inversión, financiados en su totalidad con recursos fondos nacionales. (Fuentes 11).

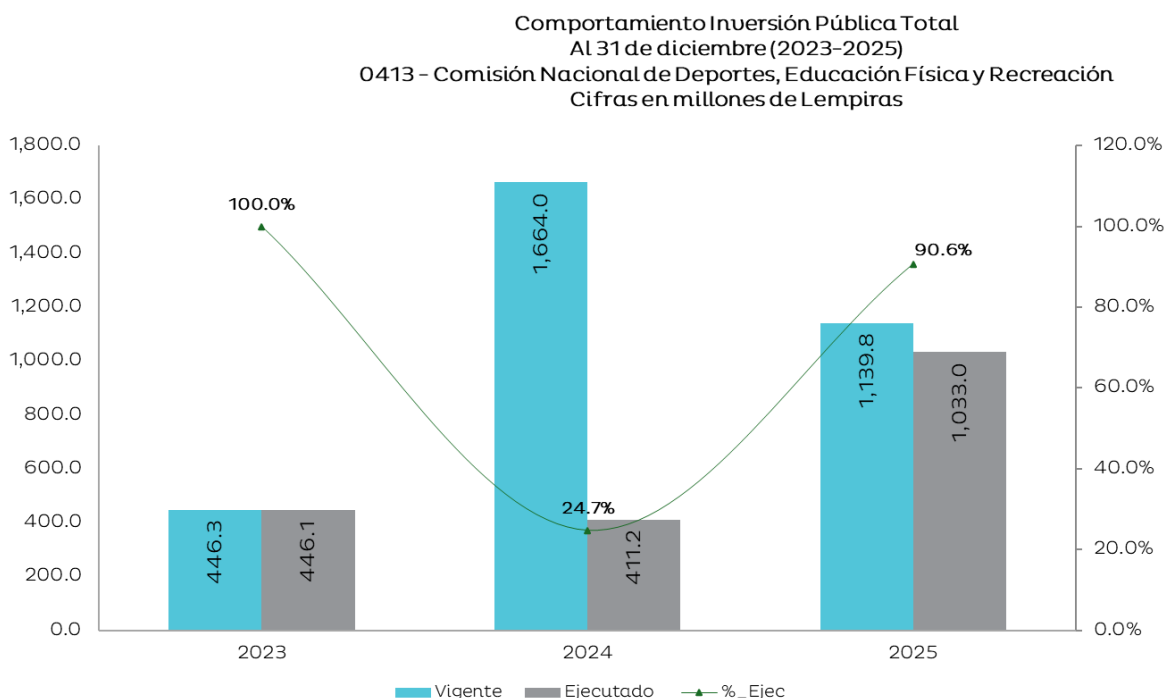

La Gráfica No. 1 presenta un análisis comparativo de la ejecución presupuestaria porcentual al 31 de diciembre de 2025, en el que se observan variaciones tanto en los incrementos como en las disminuciones de los niveles de ejecución. Si bien el presupuesto vigente correspondiente al año 2024 fue inferior al registrado en 2023, durante ese período también se evidenció una reducción en la ejecución presupuestaria, alcanzando una inversión ejecutada de L411.2 millones, equivalente al 24.7%. Esta baja ejecución se atribuye principalmente a la incorporación tardía de los

recursos realizada en los meses de junio y septiembre, lo que ocasionó el inicio retrasado de los procesos de adquisición y ejecución de las obras. No obstante, a ello para el año 2025 se reporta un incremento fuerte en los niveles de ejecución de los proyectos desarrollados por la institución, contribuyendo de manera sustancial al mejoramiento de la infraestructura deportiva en el país.

d. Principales Proyectos

En el Último Trimestre del año 2025, la inversión se concentró en los subproyectos del **Proyecto para Diseño, Construcción, Mejoras y Rehabilitación de Espacios Físicos Deportivos, Recreativos y Administrativos con Acceso Inclusivo para uso de la población en general a Nivel Nacional y Construcción y Mejoramiento de Instalaciones Deportivas y Recreativas para uso de la población a Nivel Nacional:**

1. Construcción, Mejoras y Rehabilitación de Espacios Físicos Deportivos, Recreativos y Administrativos con Acceso Inclusivo para uso de la población en general a Nivel Nacional

El Proyecto se enfoca en incentivar bienestar físico, mental y valores humanos en niños, niñas, jóvenes y adultos, además, el retraso cultural, social y deportivo, implementando la construcción de 25 canchas deportivas (16 Canchas Sintéticas Tipo 11, 8 Canchas Polideportivas Bajo Techo y 1 Cancha Sintética Tipo 9) y la rehabilitación y equipamiento de espacios físicos Administrativos dentro de las Instalaciones del Complejo deportivo José Simón Azcona.

Los principales avances físicos al 31 de diciembre de 2025 son los siguientes:

Principales Metas Físicas, - IV Trimestre-2025							
Meta Física	Unidad de Medida	Anual 2025			IV - Trimestre 2025		
		Programación	Ejecución	% Ejecución.	Programación	Ejecución	% Ejecución
Construcción de canchas deportivas y recreativas	Canchas	25	25	100%	2	2	100%

Fuente: Unidad Ejecutora al 31/12/2025

De acuerdo con lo reportado por la Unidad Ejecutora de Proyectos, se alcanzó un avance físico acumulado del 92%, logrando culminar 23 canchas de las 25 previstas, las dos faltantes corresponden a obras de

infraestructura deportiva y recreativa ubicadas en Choloma y San Manuel; en las cuales se reporta un 20% de avance físico de la obra;

Con esta inversión, se benefician 765,000 habitantes de los departamentos de Francisco Morazán, Olancho, La Paz, Comayagua, Lempira, Santa Barbara, Yoro, Colon Cortes, Choluteca y El Paraíso.

A continuación, se presenta la ejecución financiera histórica del Proyecto al cuarto trimestre 2025:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de
		US\$		Inicio - Fin
Construcción, Mejoras y Rehabilitación de Espacios Físicos Deportivos, Recreativos y Administrativos con Acceso Inclusivo para uso de la población en general a Nivel Nacional	FN-25332	US\$		20/9/2023
		Lempiras	L402,000,000.00	30/11/2025
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
IV-Trimestre 2025	20,142,623.00	99,169,586.0	13,215,894.1	13.3%
Acumulado 2025	20,142,623.00	99,169,586.0	63,797,381.8	64.3%
Acumulado Vida del Proyecto **	402,000,000.0	402,000,000.0	366,627,800.8	91.2%

**/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

2. Diseño, Construcción y Remodelación de Instalaciones y Espacios Físicos de Actividades Deportivas y Recreativas, para Uso de la Población a Nivel Nacional

Para contrarrestar la disminución del bienestar físico, mental y valores humanos en niños (as), jóvenes y adultos, además del retraso cultural, social y deportivo, CONDEPOR implementa la construcción de 32 canchas deportivas; las cuales se dividen en 15 canchas sintéticas de futbol 11, 4 canchas sintéticas de futbol 7; y 13 canchas multiusos; todas estarán

ubicadas a lo largo del territorio nacional. Así mismo, la remodelación y mejora en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera; la remodelación de la grama de cancha.

Al 31 diciembre de 2025, los principales avances físicos son los siguientes:

Principales Metas Físicas, IV - Trimestre-2025

Meta Física	Unidad de Medida	Anual 2025			IV-Trimestre 2025		
		Programación	Ejecución	% Ejecución.	Programación	Ejecución	% Ejecución
Remodelaciones en estadios nacionales	Estadio	3	3	100%	1	1	100%

Fuente: Unidad Ejecutora al 31/12/2025

Las 30 canchas contempladas en el proyecto han sido concluidas e inauguradas en su totalidad. De los tres estadios programados, dos ya fueron inaugurados. En cuanto a la remodelación del Estadio José de la Paz Herrera, el mismo se finalizó la instalación del techado del sector Sol Centro y la instalación de las butacas, alcanzándose un 100 % de avance en las obras.

Los aspectos financieros del proyecto se presentan a continuación:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de
		US\$		Inicio - Fin
Diseño, construcción y remodelación de instalaciones y espacios físicos de actividades deportivas y recreativas, para uso de la población a nivel nacional	BCH-24789-1	US\$		28/8/2022
		Lempiras	L552,700,000.0	30/11/2025
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Deuengado)	% Ejecución
IV-Trimestre 2025	444,034,417.00	90,331,028.0	54,090,388.0	59.9%
Acumulado 2025	444,034,417.00	90,331,028.0	70,076,730.1	77.6%
Acumulado Vida del Proyecto **	552,700,000.0	552,700,000.0	532,445,702.2	96.3%

**/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

3. Construcción y Mejoramiento de Instalaciones Deportivas y Recreativas para uso de la población a Nivel Nacional.

El proyecto consiste implementar la Construcción y Mejoramiento de 60 instalaciones deportivas y recreativas en 9 departamentos y 16 municipios; además, se realiza un estudio para establecer el diagnóstico actualizado del sistema estructural del Estadio Roberto Suazo Córdoba en La Paz.

Al Cuarto trimestre del 2025, los principales avances físicos son los siguientes:

Principales Metas Físicas, IV - Trimestre-2025

Meta Física	Unidad de Medida	Anual 2025			IV-Trimestre 2025		
		Programación	Ejecución	% Ejecución.	Programación	Ejecución	% Ejecución
Canchas deportivas	Canchas	60	60	100%	34	34	100%
Estudio sistema estructural del Estadio Roberto Suazo Córdoba en La Paz.	Estudio	1	0	0%	1	0	0%

Fuente: Unidad Ejecutora al 31/12/2025

- ✓ De acuerdo con lo reportado por la Unidad Ejecutora de Proyectos, Actualmente se registra un avance físico correspondiente a 34 campos deportivos en ejecución, de los cuales 26 ya han sido concluidos y recepcionados. El proyecto contempla la construcción de canchas de fútbol con césped sintético en distintas modalidades: fútbol 11, 9, 7 y 5.
- ✓ Asimismo, fue adjudicado el estudio para la elaboración de un diagnóstico actualizado del sistema estructural del Estadio Roberto Suazo Córdoba, ubicado en el departamento de La Paz, el cual servirá como base técnica para su posterior intervención y rehabilitación.

Los aspectos financieros del proyecto se presentan a continuación:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de
		US\$		Inicio - Fin
Construcción y Mejoramiento de Instalaciones Deportivas y Recreativas para uso de la población a Nivel Nacional	DI-25813	US\$		30/9/2024
		Lempiras	1,374,714,404.0	31/12/2026
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
IV-Trimestre 2025	1,374,714,404.00	741,026,427.0	226,981,898.2	30.6%
Acumulado 2025	1,374,714,404.00	741,026,427.0	733,120,986.2	98.9%
Acumulado Vida del Proyecto **	1,374,714,404.0	1,374,714,404.0	831,044,278.2	60.5%

**/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

d.1. Principales Adquisiciones al IV Trimestre 2025

- Contratación de dos Estudios y Diseños de las Obras de Infraestructura Deportiva.
- 115 contratos de Construcción y Mejoramiento de Canchas Deportivas a Nivel Nacional.
- Contrato para la Rehabilitación de espacios físicos administrativos y físicos Complejo Deportivo "José Simón Azcona Hoyo", Villa Olímpica.
- EL Estudio para establecer el diagnostico actualizado del sistema estructural del Estadio Roberto Suazo Córdoba en La Paz.

d.2. Formación Bruta Capital

Referente al presupuesto asignado al cierre del trimestre (209,224,843.0), se alcanzó una ejecución de L 165,974,892.3 que representan el 79.3 % del presupuesto vigente al trimestre; este monto fue utilizado en el manejo, mejoramiento y conservación de instalaciones deportivas a nivel nacional.

e. Gestión de la Inversión

- En seguimiento a Circular DGIP No. 01-2025, se actualiza la Proyección de ejecución Mensual para el Año 2025 (septiembre - diciembre).
- Reuniones de seguimiento y ejecución física y financiera
- Atención a modificaciones Presupuestarias.
- Seguimiento en el Cierre de ejercicio presupuestaria.

f. Problemática y Acciones Durante el IV Trimestre del 2025

- Retrasos en la ejecución de algunas obras de infraestructura deportiva, fortalecimiento del seguimiento y supervisión de obras.
- Ejecución parcial del alcance total del proyecto, priorización de la finalización de proyectos estratégicos.
- Complejidad en la gestión simultánea de múltiples proyectos, para lo cual se ha mejorado la coordinación interinstitucional, la articulación entre la Unidad Ejecutora de Proyectos, supervisión técnica y autoridades locales para optimizar la ejecución y entrega de las obras.

V. Conclusiones

- Los proyectos de infraestructura deportiva presentan un avance físico significativo, reflejado en la culminación y puesta en funcionamiento de la mayoría de las canchas y estadios programados, lo que evidencia una gestión orientada al cumplimiento de los objetivos establecidos.
- A pesar de los retrasos registrados en algunas obras puntuales, las acciones de seguimiento y supervisión implementadas han permitido mantener altos niveles de ejecución y encaminar la finalización del alcance total del proyecto.
- La ejecución progresiva y la priorización de proyectos estratégicos han contribuido a maximizar el impacto social y deportivo, fortaleciendo el acceso a infraestructura adecuada a nivel nacional.
- La adjudicación de estudios técnicos especializados para el diagnóstico de infraestructura existente constituye un avance clave para la planificación de futuras intervenciones y la sostenibilidad de los activos deportivos.

VI. Recomendaciones

- Fortalecer el seguimiento técnico y administrativo de las obras pendientes, estableciendo cronogramas actualizados y mecanismos de control que permitan asegurar su finalización oportuna.
- Mantener y reforzar los procesos de supervisión y recepción de obras, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, normas de calidad y condiciones contractuales.
- Implementar planes de mantenimiento preventivo para la infraestructura deportiva concluida, con el fin de preservar su funcionalidad, seguridad y vida útil a largo plazo.
- Dar continuidad a los estudios técnicos adjudicados y utilizar sus resultados como insumo clave para la planificación y priorización de futuras intervenciones en estadios y otras instalaciones deportivas existentes.



Secretaría de
Finanzas
Gobierno de la República

ANEXOS



ANEXO No 1

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE, 2025
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Programa o Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado IV Trimestre				Ejecutado Anual (Devengado)			
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)
3	0413 - Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación		913,177,040.0	-	913,177,040.0	930,527,041.0	-	930,527,041.0	294,288,180.4	-	294,288,180.4	31.6	866,995,098.1	-	866,995,098.1	93.2
1	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA USO DE LA POBLACIÓN A NIVEL NACIONAL	FN-25813	449,000,000.0	-	449,000,000.0	741,026,427.0	-	741,026,427.0	226,981,898.2	-	226,981,898.2	30.6	733,120,986.2	-	733,120,986.2	98.9
	Total CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS		449,000,000.0	-	449,000,000.0	741,026,427.0	-	741,026,427.0	226,981,898.2	-	226,981,898.2	30.6	733,120,986.2	-	733,120,986.2	98.9
2	Construcción, Mejoras y Rehabilitación de Espacios Físicos Deportivos, Recreativos y Administrativos con Acceso Inclusivo para uso de la población en general a Nivel Nacional	FN-25332	20,142,623.0	-	20,142,623.0	99,169,586.0	-	99,169,586.0	13,215,894.1	-	13,215,894.1	13.3	63,797,381.8	-	63,797,381.8	64.3
	Total Construcción, Mejoras y Rehabilitación de Espacios Físicos Deportivos		20,142,623.0	-	20,142,623.0	99,169,586.0	-	99,169,586.0	13,215,894.1	-	13,215,894.1	13.3	63,797,381.8	-	63,797,381.8	64.3
3	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE INSTALACIONES Y ESPACIOS FISICOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, PARA USO DE LA POBLACIÓN A NIVEL NACIONAL	BCH - 24789-1	444,034,417.0	-	444,034,417.0	90,331,028.0	-	90,331,028.0	54,090,388.0	-	54,090,388.0	59.9	70,076,730.1	-	70,076,730.1	77.6
	Total DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE INSTALACIONES Y E		444,034,417.0	-	444,034,417.0	90,331,028.0	-	90,331,028.0	54,090,388.0	-	54,090,388.0	59.9	70,076,730.1	-	70,076,730.1	77.6
	0413 - Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación		220,708,000.0	-	220,708,000.0	209,224,843.0	-	209,224,843.0	128,713,438.8	-	128,713,438.8	61.5	-	1,263,146,727.0	165,974,892.3	79.3
	PROGRAMA DE MANEJO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS		210,972,000.0	-	210,972,000.0	209,224,843.0	-	209,224,843.0	128,713,438.8	-	128,713,438.8	61.5	-	1,263,146,727.0	165,974,892.3	79.3
	Total PROGRAMA DE MANEJO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE IN		210,972,000.0	-	210,972,000.0	209,224,843.0	-	209,224,843.0	128,713,438.8	-	128,713,438.8	61.5	-	1,263,146,727.0	165,974,892.3	79.3
	RECCIÓN Y COORDINACIÓN		4,596,000.0	-	4,596,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		4,596,000.0	-	4,596,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FORMACIÓN DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO		5,050,000.0	-	5,050,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL FORMACIÓN DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO		5,050,000.0	-	5,050,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FORMACIÓN DEPORTIVA NO FEDERADOS		90,000.0	-	90,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL FORMACIÓN DEPORTIVA NO FEDERADOS		90,000.0	-	90,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN CONASA		-	-	-	3,285,000.0	-	3,285,000.0	845,562.5	-	845,562.5	25.7	-	3,285,000.0	2,570,871.6	78.3
	Total COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN CONASA		-	-	-	3,285,000.0	-	3,285,000.0	845,562.5	-	845,562.5	25.7	-	3,285,000.0	2,570,871.6	78.3
	COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA		-	-	-	8,477,000.0	-	8,477,000.0	6,036,886.5	-	6,036,886.5	71.2	-	8,477,000.0	6,218,877.0	73.4
	Total COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA		-	-	-	8,477,000.0	-	8,477,000.0	6,036,886.5	-	6,036,886.5	71.2	-	8,477,000.0	6,218,877.0	73.4
	PERACION Y MANTENIMIENTO DE ACUEDUCTOS		12,260,000.0	-	12,260,000.0	13,360,000.0	-	13,360,000.0	4,040,280.6	-	4,040,280.6	30.2	-	25,620,000.0	5,452,998.1	40.8
	Total OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ACUEDUCTOS		12,260,000.0	-	12,260,000.0	13,360,000.0	-	13,360,000.0	4,040,280.6	-	4,040,280.6	30.2	-	25,620,000.0	5,452,998.1	40.8

ente: SIAFI, 31/12/2025 (Preliminar)

ANEXO No 2

ANEXO No.2
SECRETARÍA DE FINANZAS
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL IV TRIMESTRE, 2025

Institución/Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre 2025		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
0413 - Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación								
Diseño, construcción y remodelación de instalaciones y espacios físicos de actividades deportivas y recreativas, para uso de la población a nivel nacional	Remodelaciones en estadios nacionales	Estadio	3	3	100%	1	1	100%
Construcción y Mejoramiento de Instalaciones Deportivas y Recreativas para uso de la población a Nivel Nacional.	Canchas deportivas	Canchas	60	60	100%	34	34	50%
	Estudio sistema estructural del Estadio Roberto Suazo Córdoba en La Paz.	Estudio	1	0	0%	1	0	0%
Construcción, Mejoras y Rehabilitación de Espacios Físicos Deportivos, Recreativos y Administrativos con Acceso Inclusivo para Uso de la Población en General a Nivel Nacional:	Construcción de canchas deportivas y recreativas	Canchas	25	25	100%	2	2	20%

Fuente: Unidades Ejecutoras de Proyectos

