



# SECRETARÍA DE FINANZAS



Informe Trimestral de Avance Físico y Financiero

**PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA**

# Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)

Informe No. 0022-001-2026

Tegucigalpa, abril 2026



# SECRETARÍA DE FINANZAS



## Contenido

Contenido .....	2
IV. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN .....	3
A. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA.....	3
B. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA .....	4
C. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA EJECUCIÓN AL I TRIMESTRE (2022-2026) 4	
D. PRINCIPALES PROYECTOS .....	6
La mayor parte de la inversión acumulada al I trimestre de 2026 se concentra en los siguientes proyectos:.....	6
1. Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar (PROMINE/KFW, FASE IV y FASE V) 6	
2. Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras (MIFE) .....	6
3. Proyecto Convivencia y Espacios Seguros para los Jóvenes en Honduras (CONVIVIR) .....	6
4. Proyecto Recuperación de Emergencia a causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras (PRE). .....	6
D.1.1. Principales Metas Físicas al I Trimestre 2026 .....	6
D.1.2. Evaluación Financiera al I Trimestre 2026 .....	8
D.1.3. Principales Adquisiciones al I Trimestre 2026 .....	15
E. GESTIÓN DE LA INVERSIÓN .....	15
F. PROBLEMÁTICA Y ACCIONES DURANTE EL I TRIMESTRE 2026 .....	15
G. CONCLUSIONES .....	16
H. RECOMENDACIONES .....	16
ANEXO 1 .....	17
ANEXO 2.....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>



# SECRETARÍA DE FINANZAS



## IV. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN

### A. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

El Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) adscrito a la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS), tiene como finalidad promover el mejoramiento de las condiciones de vida de los grupos sociales marginados en el área rural y urbana, mediante el otorgamiento de financiamientos para programas y proyectos de desarrollo social o económico, con el propósito de aumentar su productividad, sus niveles de empleo y de ingresos y de contribuir a la satisfacción de sus necesidades básicas.

Al primer trimestre del 2026 la institución cuenta con un presupuesto vigente de L 1,225.9 millones y una ejecución de L19.4 millones que representa 1.6%, tal como se detalla en el Cuadro No. 01.

Cuadro No. 01  
**Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del 2026**  
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>861,530,868.0</b>
Inversión Productiva	825,113,857.0
Formación Bruta de Capital	36,417,011.0
<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>1,225,974,731.0</b>
Inversión Productiva	818,607,955.0
Formación Bruta de Capital	407,366,776.0
<b>Ejecutado Anual</b>	<b>19,384,591.9</b>
Inversión Productiva	2,327,553.0
Formación Bruta de Capital	17,057,038.9
<b>% Ejecución (Devengado anual/Vigente)</b>	<b>1.6%</b>
<b>Compromiso Aprobado</b>	<b>19,994,725.2</b>
Inversión Productiva	2,937,686.4
Formación Bruta de Capital	17,057,038.9
<b>% Compromiso (Compromiso I Cuatrim-2026/Vigente)</b>	<b>1.6%</b>

Nota: SIAFI, 31/03/2026

Dicha ejecución se llevó a cabo con un presupuesto vigente para inversión productiva de L 818.6 millones y formación bruta de capital de L 407.3 millones, a través de proyectos enfocados en infraestructura Social, Escolar y Caminos Rurales; Fortalecimiento de Capacidades para Jóvenes; Recuperación de Espacios Públicos y Mejora de la Infraestructura Básica.

Mediante Decreto Ejecutivo PCM-004-2026 de fecha 25 de febrero 2026 artículo 11 se instruye adscribir como dependencia interna de la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT) al Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) y el proceso de traspaso de los proyectos a la nueva institución debe estar concluido en agosto del 2026.




# SECRETARÍA DE FINANZAS



## B. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

La mayor parte de los proyectos que ejecuta el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) provienen de financiamiento externo proveniente del Banco Mundial (BM) y el Kreditanstalt für Wiederaufbau de Alemania KFW, sumando las donaciones externas; en su conjunto alcanzan el 63%; mientras que el 37% se financia con fondos nacionales.

Del total del presupuesto vigente (L 1,125.97 millones), el 48% corresponde a fondos provenientes de crédito externo con un monto de L 580.85 millones y fondos nacionales que corresponden a contrapartes para gastos operativos de proyectos con un monto vigente de L 450.27 millones equivalente a 37%. Los fondos de donaciones (L 184.86 millones) equivalen al 15% tal como se muestra en el **gráfico No 1**.

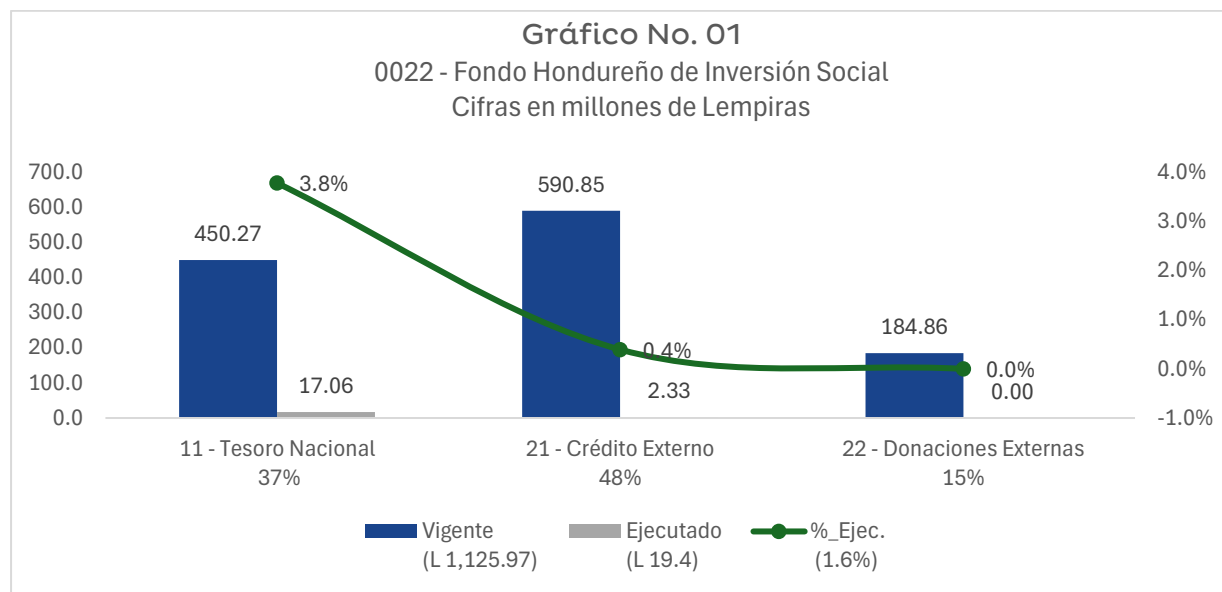

Fuente: SIAFI

## C. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA EJECUCIÓN AL I TRIMESTRE (2022-2026)

A continuación, se presenta un análisis del comportamiento histórico de la inversión pública ejecutada por el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) durante el período 2022-2026, con base en los montos vigentes y ejecutados de su cartera de proyectos.

En el año 2022, la inversión registrada ascendió a L 1,858.8 millones. Para 2023, el presupuesto vigente reflejó una disminución, situándose en L 1,727.3 millones, equivalente a una reducción de aproximadamente 7.1% respecto al año anterior, evidenciando una desaceleración en la capacidad de inversión institucional.



# SECRETARÍA DE FINANZAS




Posteriormente, en 2024 se observó una recuperación presupuestaria, alcanzando un presupuesto vigente de L 2,143.6 millones, lo que representó un incremento de aproximadamente 24.1% en comparación con 2023. Este aumento respondió a la incorporación y continuidad de proyectos estratégicos de infraestructura social y desarrollo comunitario.

No obstante, para el ejercicio fiscal 2025 el presupuesto vigente disminuyó nuevamente a L 1,856.3 millones, reflejando una reducción aproximada de 13.4% respecto a 2024. Esta situación incidió directamente en la capacidad operativa y de ejecución de proyectos, generando limitaciones financieras para atender compromisos programados y provocando rezagos en la ejecución física y financiera de algunas iniciativas prioritarias.

Entre los proyectos que presentaron mayores afectaciones destacan el Hospital del Garífuna y el Polideportivo en el departamento de Olancho, los cuales registraron atrasos asociados a restricciones presupuestarias, disponibilidad de recursos y ajustes en la programación institucional.

En términos generales, el comportamiento histórico evidencia fluctuaciones importantes en los niveles de inversión y ejecución del FHIS durante el período analizado, lo cual ha incidido en la continuidad, ritmo de avance y sostenibilidad de la cartera de proyectos de inversión pública bajo su administración.

Gráfico No. 2  
Comportamiento de la Inversión Pública  
0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social  
Cifras en millones de Lempiras

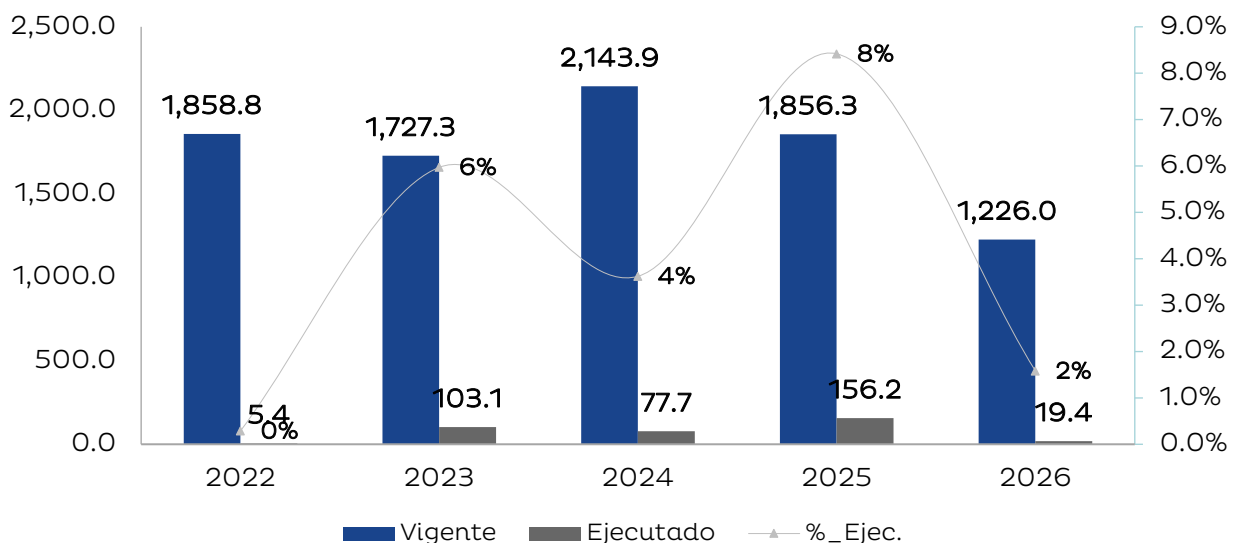

Fuente: SIAFI



## D. PRINCIPALES PROYECTOS

La mayor parte de la inversión acumulada al I trimestre de 2026 se concentra en los siguientes proyectos:

1. Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar (PROMINE/KFW, FASE IV y FASE V)
2. Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras (MIFE)
3. Proyecto Convivencia y Espacios Seguros para los Jóvenes en Honduras (CONVIVIR)
4. Proyecto Recuperación de Emergencia a causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras (PRE).

### *D.1.1. Principales Metas Físicas al I Trimestre 2026*

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros de los principales proyectos de acuerdo con su presupuesto vigente:

#### **1. Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar (PROMINE/KFW, FASE IV y V) (KFW)**

El PROMINE tiene por objetivo general fortalecer la rectoría Sectorial en Infraestructura Educativa de la Secretaría de Educación y la gestión local participativa, así como mejorar el acceso de los alumnos de las comunidades pobres al Centro Educativo de calidad que operan de manera sostenible. De esa manera se pretende contribuir al aumento de la eficiencia y de la calidad del sistema educativo (prebásico y básico).

### **Principales Metas Físicas al I trimestre 2026**

Metas Física	Unidad de Medida	Anual			I Trimestre de 2026		
		Programación	Ejecución	% EJEC.	Programación	Ejecución	% EJEC.
Infraestructura Escolar	Centro Educativo	8	8	100%	0	0	0%

Fuente: Unidad Ejecutora del proyecto



# SECRETARÍA DE FINANZAS



## Proyectos en Ejecución 2026/ PROMINE

No.	Nombre del Proyecto	Depto	Monto	Avance Físico	Avance Financiero	Estatus	Ejecutor
1	Ampliación Ceb Sat America Y Cepb Rosa Canelo	GRACIAS A DIOS	27,902,374.13	39.10%	33.76%	Suspendido	Servicios De Diseño Y Construcción S. De R.L. (Serdicon)
2	Ampliación Instituto Gubernamental Técnico Francisco Morazán	FRANCISCO MORAZAN	23,110,444.63	77.23%	79.13%	Ejecución	A.M. Sabanagrande
3	Reposición Ceb Cerro Grande Zona 2	FRANCISCO MORAZAN	26,431,249.40	70.00%	55.44%	Suspendido	Servicios De Ingeniería Para Telecomunicaciones, Electricidad Y Constr Sinterc, S.A.
4	Reposición Escuela Y Jardín De Niños Jesus Mejia Paz	GRACIAS A DIOS	12,832,143.80	54.29%	29.00%	Ejecución	Construcciones Diversas S De R.L De C.V
5	Reposición Ceb Republica De Costa Rica Y Jn Stanley Goff	GRACIAS A DIOS	17,374,544.72	22.90%	25.44%	Suspendido	Servicios De Diseño Y Construcción S. De R.L. (Serdicon)
6	Reposición Cepb José Dolores Urquía	COMAYAGUA	2,683,379.76	0.00%	0.00%	Proceso de contratación	A.M. Lamani
7	Reposición Cepb Adalid Arauz,	COMAYAGUA	3,377,977.65	0.00%	0.00%	Proceso de contratación	A.M. Ajuterique
8	Reposición Ceb Enriqueta Orellana Y Ccpreb Mundo Infantil	LEMPIRA	7,449,351.54	0.00%	0.00%	Proceso de contratación	A.M. Las Flores
9	Ceb Independencia	SANTA BARBARA	9,630,000.00	0.00%	0.00%	Formulación	A.M. Macuelizo/ Cep

Fuente: Unidad Ejecutora del proyecto



## D.1.2. Evaluación Financiera al I Trimestre 2026

### Evaluación Financiera I trimestre 2026

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de
				Inicio - Fin
Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar (PROMINE/KFW, FASE V)	2016 68 763	€ 26,387,000	L 817,068,177.60	02/04/2018-18/4/2026
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Ejecutado (Devengado)</b>	<b>% Ejecución</b>
I Trimestre 2026	55,095,857.00	55,095,857.00	0.0	0%
Acumulado 2026				0%
Acumulado Vida del Proyecto *	L817,068,177.60	L817,068,177.60	L 177,744,149.41	20%

\* / Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto  
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto  
Tipo de Cambio al 31/03/2026, L26.6959 por \$1.00

A la fecha no reporta ejecución presupuestaria, teniendo pagos pendientes por un monto de L.6,258,657.33 y pendiente regularizar por un monto de L.2,469,651.51 para un total de L. 8,728,308.84

Es importante indicar que para concretar estos pagos se requiere en algunos casos la aprobación de los contratos en el Congreso Nacional, elaboración y firmas de adendas.

Indicar que el proyecto esta en proceso de ampliación de plazo para la contratación, ejecución y finalización de las obras de los centros escolares.

## 2. Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras (MIFE) (BCIE).

Consiste en la implementación de la metodología de formación permanente de docentes y estudiantes, la mejora de la infraestructura escolar de centros de educación pública en todo el territorio nacional con énfasis en las zonas de mayor pobreza urbana y rural. El mejoramiento de la infraestructura incluye la ampliación y/o reparación de infraestructura educativa, dotación de mobiliario y equipamiento técnico educativo especializado; y el fortalecimiento de habilidades de los docentes de educación sobre metodologías de enseñanza basadas en competencias y las capacidades de los estudiantes y docentes de bachillerato en temas relacionados al emprendedurismo.



# SECRETARÍA DE FINANZAS



## Principales Metas Físicas al I trimestre 2026

Metas Física	Unidad de Medida	Anual			I Trimestre de 2026		
		Programación	Ejecución	% EJEC.	Programación	Ejecución	% EJEC.
Infraestructura Escolar	Centro Educativo	0	0	100%	0	0	0%

Fuente: Unidad Ejecutora del proyecto

Indicar la problemática del proyecto y a que se debe que no presentará obras en el 2026, con este préstamo .

## Evaluación Financiera I trimestre 2026

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de
				Inicio - Fin
Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras (MIFE)	BCIE - 2239	US\$80,000,000	L2,107,519,200.0	02/04/2021-31/3/2026
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Ejecutado (Devengado)</b>	<b>% Ejecución</b>
I Trimestre 2026	L 98,494,585.00	L 98,494,585.00	0.0	0%
Acumulado 2026				0%
Acumulado Vida del Proyecto *	L 2,107,519,200	L 2,107,519,200	L 703,932,108	33%

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 31/03/2026, L26.6959 por \$1.00

**Nota técnica:** Se informa que al Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras (MIFE) se le desestimaron fondos por un monto de \$ **49,833,582.98**. Asimismo, la fecha de cierre contractual del proyecto se encuentra vencida (31/03/2026), por lo que se requiere la revisión del estado administrativo y financiero, así como la definición de las acciones correspondientes para su regularización y cierre.

### 3. Proyecto Convivencia y Espacios Seguros para los Jóvenes en Honduras (CONVIVIR) (KFW)

El programa abarca la construcción, el mejoramiento y el equipamiento de infraestructura social para jóvenes y espacios públicos, financiamiento y/o cofinanciamiento del trabajo con jóvenes y la capacitación de jóvenes, la capacitación de personal de las instituciones involucradas, las municipalidades seleccionadas, las comunidades de barrio y servicios de consultoría.



# SECRETARÍA DE FINANZAS



Los principales avances físicos al 31 de marzo del 2026 son los siguientes:

## Principales Metas Físicas al I trimestre 2026

Metas Física	Unidad de Medida	Anual			I Trimestre de 2026		
		Programación	Ejecución	% EJEC.	Programación	Ejecución	% EJEC.
Espacios Públicos recuperados	Obra	9	9	100%	0	0	0%
Jóvenes Capacitados	Capacitación	14	14	100%	0	0	0%

Fuente: Unidad Ejecutora del proyecto

Al 31 de marzo de 2026, el Proyecto CONVIVIR NO registró avances físicos ya que la Fase II venció el 31 diciembre de 2025 por lo que se debe solicitar ampliación de plazo para cierre de la fase en mención, a la fecha se avanzó principalmente en el componente de infraestructura (Fase II), con 12 obras bajo modalidad PEC, de las cuales 7 alcanzaron 100% de avance físico y 5 se mantienen en etapa de cierre con avances entre 91% y 95%, afectadas por situaciones administrativas y financieras vinculadas a la falta de desembolsos y pagos pendientes (órdenes de cambio y devoluciones/retenciones).

Paralelamente, en la Fase III se mantuvieron actividades técnicas de planificación, revisión y seguimiento, con proyectos en etapas de diseño conceptual, anteproyecto y revisión de control y calidad, a la espera de definiciones institucionales necesarias para reactivar plenamente los desembolsos y formalizaciones contractuales.

**A continuación, se presenta una tabla de la situación actual de los proyectos seleccionados para ejecutar 2026.**

Departamento	Municipio	Colonia	Nombre del Proyecto	Método de adquisición	Estatus
La Paz	La Paz	Bo. San Juan	Plaza de Convivencia La Paz	Modalidad PEC	Revisión Control y Calidad
El Paraíso	Danlí	Bo. Nueva Esperanza	Parque Recreativo Nueva Esperanza	Modalidad PEC	Diseño Conceptual
La Paz	La Paz	Bo. San José	Casa CONVIVIR La Paz	Modalidad PEC	Diseño Anteproyecto
El Paraíso	Danlí	Bo. La Concepción	Plaza Concepción Los Sueños	Modalidad PEC	Pendiente
La Paz	La Paz	Bo. La Merced	La Perolera	Modalidad PEC	Diseño Anteproyecto



# SECRETARÍA DE FINANZAS



Departamento	Municipio	Colonia	Nombre del Proyecto	Método de adquisición	Estatus
La Paz	La Paz	Bo. San Antonio	Centro de Formación La Raiz	Modalidad PEC	Pendiente
Yoro	El Progreso	Col. San Jorge	Plaza San Jorge	Modalidad PEC	Pendiente
Yoro	El Progreso	Casa Joven El Progreso	Casa Joven El Progreso	Modalidad PEC	Pendiente
Yoro	Yoro	Col. Primero de Mayo	Plaza de Convivencia Lluvia de Peces	Modalidad PEC	Pendiente

Fuente: Unidad Ejecutora del proyecto

A la fecha, se continúa a la espera de la definición por parte de las autoridades competentes respecto a la situación del Proyecto CONVIVIR, ya que deben solicitar una ampliación de plazo para cierre en la fase II y en la Fase III deben solicitar No objeción de reprogramación de cronograma de ejecución, así como para la formalización y firma de las nuevas adendas contractuales. Esta condición, que se mantiene pendiente desde el 27 de enero, sin embargo, el equipo técnico ha continuado avanzando en actividades clave de planificación, revisión y seguimiento, a fin de no detener el progreso general del proyecto y asegurar condiciones favorables para su pronta reactivación administrativa y financiera.

A continuación, se reporta la ejecución financiera histórica del Proyecto Convivencia y Espacios Seguros para los Jóvenes en Honduras (CONVIVIR) al I trimestre de 2026:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de
				Inicio - Fin
Proyecto Convivencia y Espacios Seguros para los Jóvenes en Honduras (CONVIVIR) (KFW)	2016 65348	6,600,000.00	L 544,980,480	02/04/2021-6/4/2028
	2018 67563	11,000,000.00		
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Ejecutado (Devengado)</b>	<b>% Ejecución</b>
I Trimestre 2026	L 142,666,062.00	L 142,666,062.00	0.0	0%
Acumulado 2026				0%
Acumulado Vida del Proyecto *	L 544,980,480	L 544,980,480	L 197,630,933	36%

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 31/03/2026, L26.6959 por \$1.00

Durante el I trimestre del 2026, no se han realizado contratos de bienes, servicios u obras.



#### 4. Proyecto Recuperación de Emergencia a causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras (PRE) (Banco Mundial).

El Proyecto se enfoca en la rehabilitación y reconstrucción de la infraestructura pública en salud, educación, agua y saneamiento, vial, comunitaria y vivienda en las zonas geográficas del país afectadas por los ciclones tropicales Eta e Iota.

El PRE tiene por objetivo atender las necesidades identificadas como prioritarias para reactivar la economía y apoyar las más urgentes necesidades de la población afectada por los fenómenos naturales ETA e IOTA, como respuesta de emergencia y recuperación de Honduras, y, en esta perspectiva, fortalecer la capacidad institucional del Estado para gestionar una ejecución eficaz, eficiente y transparente.

Los principales avances físicos al 31 de marzo de 2026 son los siguientes:

#### Principales Metas Físicas al I trimestre 2026

Metas Física	Unidad de Medida	Anual			IV Trimestre de 2025		
		Programación	Ejecución	% EJEC.	Programación	Ejecución	% EJEC.
Centros educativos rehabilitados	Centro Educativo	19	19	100%	0	0	0%
Sistemas de agua rehabilitados	Sistema de Agua	9	9	100%	0	0	100%
Infraestructura vial rehabilitada y reconstruida	Kilometro	2	2	100%	0	0	0%
Centros de salud pública rehabilitados	Unidad de Salud	1	1	100%	0	0	0%

**Fuente: FHIS, al 31 de marzo de 2026**

Durante el primer trimestre de 2026, no se han registrado nuevas adjudicaciones de contratos de Obras, Bienes, Servicios de Consultorías (firmas e Individuales) o Servicios de No Consultoría. Los procesos activos en cada categoría de contratación y su estado actual a marzo de 2026 se presentan a continuación:



# SECRETARÍA DE FINANZAS



No.	Descripción	Estado actual al 31 de marzo de 2026
<b>OBRAS</b>		
1	<b>HN-SEDECOAS-407817-CW-RFB</b> Lote 2: Reposición CEB Ramón Montoya en Colón Código 110030, Enmienda No. 1 Contrato No. SDO-O-FHIS-09-2024	A la espera de obtener los datos generales del Contratante/nuevas autoridades para proceder con la emisión del documento de enmienda.
2	<b>HN-SEDECOAS-371603-CW-RFB</b> Enmienda No. 1 al Contrato No. SDO-O-FHIS-07-2024 Lote No. 2 Reposición Sistema de Agua Potable en Aldea Casco Urbano, Municipio de Apacilagua en el Departamento de Choluteca, Código 109073	En revisión de los documentos de las ordenes de cambio de monto y plazo aprobadas.
<b>CONSULTORÍAS: FIRMAS CONSULTORAS</b>		
1	<b>HN-SEDECOAS-477034-CS-CQS</b> Supervisión de Reposición de Puentes en: San Lorenzo Techín Código 108785 y Reposición de Puente en Santa Clara Código 108700 en el Departamento de Copán, Puente Sobre el Río Aguagua San Vicente Centenario Código 110805 y Reposición de Puente sobre Río Palaja en el Municipio El Nispero, Código 111225 en el Departamento de Santa Barbara, y Puente Río Siale en Las Casitas en el Municipio de Orica, Código 111226 Departamento de Francisco Morazán	El 21/01/2026 fue aprobado por el Comité de Operaciones.  A la espera del Visto Bueno de las nuevas autoridades para proceder con la publicación del proceso.
2	<b>HN-SEDECOAS-513456-CS-CQS</b> Supervisión para la Restauración CEB República de Colombia Código 111277; Reposición CEB Renacimiento Código 111278 y Restauración CEB Luis Landa Código 111279 en el Municipio de Siguatepeque en el Departamento de Comayagua	Informe de evaluación de expresiones de interés finalizado, firmado por los integrantes de la Comisión Evaluadora. A la espera de instrucciones por parte de las autoridades institucionales para proceder con los siguientes pasos del proceso.
3	<b>CPN-SEDECOAS-FHIS-28-2021</b> Supervisión Técnica de Obras de Rehabilitación y Reconstrucción de Escuelas, Paquetes No.1,4,6 y 7, Departamentos de Copán, Ocotepeque, Santa Bárbara, Cortés, Yoro e Islas de la Bahía de la República de Honduras, Enmienda No. 1 Contrato No. CPN-F-FHIS-02-2022	A la espera de obtener los datos generales del Contratante/nuevas autoridades para proceder con la emisión del documento de enmienda.
4	<b>CPN-FHIS-16-2022</b> Supervisión de Escuelas Paquete No.2 Ubicadas en los Departamentos de Comayagua, El Paraíso, Francisco Morazán, Intibucá, La Paz y Lempira. Códigos: 108505, 108504, 108275, 108524, 108620, 108509, 108451, 108579, 108443, 108491, 108602 y 108393, Enmienda No. 1 Contrato No. CPN-F-FHIS-03-2022	A la espera de obtener los datos generales del Contratante/nuevas autoridades para proceder con la emisión del documento de enmienda.
5	<b>HN-SEDECOAS-342138-CS-CQS</b> Supervisión de Rehabilitación de Sistema de Agua Potable en los Departamentos de Yoro y Comayagua, Códigos: 108702, 108703 Y 108705, Enmienda No. 2 Contrato No. SC-F-FHIS-01-2023	A la espera de recibir documentación complementaria por parte Inspector de Proyectos de la UEP-PRE para la elaboración de la Enmienda.



# SECRETARÍA DE FINANZAS



No.	Descripción	Estado actual al 31 de marzo de 2026
6	<b>HN-SEDECOAS-342611-CS-QCBS</b> Supervisión Rehabilitación de Infraestructura Vial en Caminos Rurales, Enmienda 1 Contrato No. SC-F-FHIS-03-2025	Pendiente de recibir de Especialista en Carreteras de la UEP-PRE la información complementaria para elaborar la enmienda, así mismo a la espera de obtener los datos generales del Contratante/nuevas autoridades.
<b>CONSULTORÍAS INDIVIDUALES</b>		
1	<b>HN-SEDECOAS-536914-CS-INDV</b> <b>HN-SEDECOAS-536920-CS-INDV</b> <b>HN-SEDECOAS-536921-CS-INDV</b> <b>HN-SEDECOAS-536923-CS-INDV</b> <b>HN-SEDECOAS-536924-CS-INDV</b> <b>HN-SEDECOAS-536926-CS-INDV</b> <b>HN-SEDECOAS-536927-CS-INDV</b> Inspector I de Proyectos de Infraestructura de la Unidad Ejecutora del Proyecto PRE	En revisión de Hojas de Vida y conformación de expedientes.  A la espera del visto bueno de las nuevas autoridades para proceder con la adjudicación del proceso.
2	<b>HN-SEDECOAS-536932-CS-INDV</b> Administrador de Contratos de la Unidad Ejecutora del Proyecto PRE	
3	<b>HN-SEDECOAS-536928-CS-INDV</b> Ingeniero Estructuralista de la Unidad Ejecutora del Proyecto PRE	

A continuación, véase la ejecución financiera histórica del Proyecto Recuperación de Emergencia a causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras (PRE) al I trimestre de 2026:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de
				Inicio - Fin
Proyecto Recuperación de Emergencia a causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras (PRE)	BCIE - 2261	US\$124,211,000	L 3,272,213,341.89	25/05/2021-30/06/2028
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Ejecutado (Devengado)</b>	<b>% Ejecución</b>
I Trimestre 2026	L 481,522,205.00	L 481,522,205.00	L 2,327,553.01	0.4%
Acumulado 2026	L 481,522,205.00	L 481,522,205.00	L 2,327,553.01	0.4%
Acumulado Vida del Proyecto *	3,272,213,342	3,272,213,342	1,331,311,694.54	41%

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 31/03/2026 (BCH): L26.6959 por \$1.00



# SECRETARÍA DE FINANZAS



Asimismo, el resto de los proyectos ejecutados por el FHIS, no reportan avances:

1. Proyecto “Agua de Gracias” es financiado con recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), permanece sin ejecución. A la fecha, no se han registrado avances físicos ni financieros significativos en su desarrollo ya que presenta diversos problemas ambientales, sociales y de operación.
2. Proyecto Construcción del Primer Hospital Garífuna en el Municipio de Iriona, Departamento de Colón.
3. Ampliación del Polideportivo Ramón Díaz López

Financiados con recursos del tesoro nacional no reportan ejecución durante el primer trimestre 2026.

### ***D.1.3. Principales Adquisiciones al I Trimestre 2026***

No se registran adquisiciones para este trimestre.

## **E. GESTIÓN DE LA INVERSIÓN**

- Mediante Decreto Ejecutivo PCM-004-2026 de fecha 25 de febrero 2026 artículo 11 se instruye adscribir como dependencia interna de la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT), el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS).
- En atención a lo indicado en el PCM-004-2026, la Secretaría de Finanzas a través de la Dirección General de Inversiones Públicas emite Dictamen de Enmienda favorable para realizar cambio de ejecutor de todos los proyectos ejecutados por FHIS para ser ejecutados en SIT.
- Durante el I trimestre del año 2026, se realizó la solicitud de cuota trimestral de fondos externos a la SEFIN para garantizar la disponibilidad de recursos financieros de los proyectos de inversión pública.

## **F. PROBLEMÁTICA Y ACCIONES DURANTE EL I TRIMESTRE 2026**

La Formalización y firma de Contratos del personal de las Unidades Coordinadoras de Proyectos para realizar las actividades de firma de estimaciones, supervisión en campo y demás pertinentes, habilitando el proceso de pago de estimaciones a contratistas.

Ejecutar el cronograma de transición a la SIT, el cual se ha trabajado con algunos retrasos y se contempla finalizar la transición a la SIT en el mes de agosto 2026.

Al 31 de marzo de 2026 los contratos enviados a ratificación por el Congreso Nacional aun se encuentran pendientes de aprobación.



# SECRETARÍA DE FINANZAS



## G. CONCLUSIONES

El Fondo Hondureño de Inversión Social se encuentra en etapa de transición a la Secretaría de Infraestructura y Transporte, esto ha generado fragilidad en los procesos de los proyectos (administrativos, avances físicos y ejecución), por lo que se espera que para el siguiente trimestre se refleje un mejor panorama con respecto a los avances de cada uno de los proyectos.

## H. RECOMENDACIONES

Agilizar los procesos internos a fin de cumplir con los lineamientos compartidos por la SEFIN con respecto al cronograma de transición.

Realizar las gestiones necesarias para la solicitud de usuarios y perfiles, a fin de actualizar la información de los proyectos en el SNIPH.



# SECRETARÍA DE FINANZAS



## ANEXO 1

Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas  
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE, 2026  
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Programa o Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente				Ejecutado Anual (Devengado)				Com promiso Aprobado			
			Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total general	12 - Recursos Propios	Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total general	Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total general	% Ejec	Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total general	% Comp./Vig
<b>79</b>	<b>1. Inversión Productiva</b>		<b>49.407.087</b>	<b>775.706.770</b>	<b>825.113.857</b>	-	<b>42.901.185</b>	<b>775.706.770</b>	<b>818.607.955</b>	-	<b>2.327.553</b>	<b>2.327.553</b>	<b>12.2%</b>	<b>156.000</b>	<b>2.781.686</b>	<b>2.937.686</b>	<b>0.4%</b>
7	<b>0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social</b>		<b>49.407.087</b>	<b>775.706.770</b>	<b>825.113.857</b>	-	<b>42.901.185</b>	<b>775.706.770</b>	<b>818.607.955</b>	-	<b>2.327.553</b>	<b>2.327.553</b>	<b>0.3%</b>	<b>156.000</b>	<b>2.781.686</b>	<b>2.937.686</b>	<b>0.4%</b>
1	Ampliación del Polideportivo Ramón Díaz López, Etapa II, ubicado en Catacamas, Departamento de Olancho		6,505,902		6,505,902		-		-				0.0%	-		-	0.0%
	<b>Total Ampliación del Polideportivo Ramón Díaz López, Etapa II, ubicado en Catacamas, Depa</b>		<b>6.505.902</b>		<b>6.505.902</b>		-		-				<b>0.0%</b>	-		-	<b>0.0%</b>
2	Construcción del Primer Hospital Garífuna en el Municipio de Iriona, Departamento de Colón.	FN-25984-1	30,000,000		30,000,000		30,000,000		30,000,000				0.0%	-		-	0.0%
	<b>Total Construcción del Primer Hospital Garífuna en el Municipio de Iriona, Departamento d</b>		<b>30.000.000</b>		<b>30.000.000</b>		<b>30.000.000</b>		<b>30.000.000</b>				<b>0.0%</b>	-		-	<b>0.0%</b>
3	CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JOVENES EN HONDURAS FASE III	KfW	9,846,678	132,819,384	142,666,062		9,846,678	132,819,384	142,666,062				0.0%	156,000	367,467	523,467	0.4%
	<b>Total CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JOVENES EN HONDURAS FASE III</b>		<b>9.846.678</b>	<b>132.819.384</b>	<b>142.666.062</b>		<b>9.846.678</b>	<b>132.819.384</b>	<b>142.666.062</b>				<b>0.0%</b>	<b>156.000</b>	<b>367.467</b>	<b>523.467</b>	<b>0.4%</b>
4	PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KfW, FASE II)	BMZ 2016 68 763	3,054,507	52,041,350	55,095,857		3,054,507	52,041,350	55,095,857				0.0%	-	86,667	86,667	0.2%
	<b>Total PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KfW, FASE</b>		<b>3.054.507</b>	<b>52.041.350</b>	<b>55.095.857</b>		<b>3.054.507</b>	<b>52.041.350</b>	<b>55.095.857</b>				<b>0.0%</b>	-	<b>86.667</b>	<b>86.667</b>	<b>0.2%</b>
5	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y FORMACION EDUCATIVA EN HONDURAS	BCIE - 2239		340,494,705	340,494,705			340,494,705	340,494,705				0.0%	-		-	0.0%
	<b>Total PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y FORMACION EDUCATIVA E</b>			<b>340.494.705</b>	<b>340.494.705</b>			<b>340.494.705</b>	<b>340.494.705</b>				<b>0.0%</b>	-		-	<b>0.0%</b>
6	PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE GRACIAS	BCIE-2261		74,885,392	74,885,392			74,885,392	74,885,392				0.0%	-		-	0.0%
	<b>Total PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD</b>			<b>74.885.392</b>	<b>74.885.392</b>			<b>74.885.392</b>	<b>74.885.392</b>				<b>0.0%</b>	-		-	<b>0.0%</b>
7	Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras.	6822-HN		175,465,939	175,465,939			175,465,939	175,465,939		2,327,553	2,327,553	1.3%		2,327,553	2,327,553	1.3%
	<b>Total Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras.</b>			<b>175.465.939</b>	<b>175.465.939</b>			<b>175.465.939</b>	<b>175.465.939</b>		<b>2.327.553</b>	<b>2.327.553</b>	<b>1.3%</b>		<b>2.327.553</b>	<b>2.327.553</b>	<b>1.3%</b>
	<b>2. Formación Bruta de Capital Fijo</b>		<b>36.417.011</b>		<b>36.417.011</b>	-	<b>407.366.776</b>		<b>407.366.776</b>	<b>17.057.039</b>	-	<b>17.057.039</b>	<b>9.8%</b>	<b>17.057.039</b>	-	<b>17.057.039</b>	<b>4.2%</b>
	<b>0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social</b>		<b>36.417.011</b>		<b>36.417.011</b>	-	<b>407.366.776</b>		<b>407.366.776</b>	<b>17.057.039</b>	-	<b>17.057.039</b>	<b>4.2%</b>	<b>17.057.039</b>	-	<b>17.057.039</b>	<b>4.2%</b>
	INFRAESTRUCTURA NACIONAL (FONDOS NACIONALES)		36,417,011		36,417,011		407,366,776		407,366,776	17,057,039		17,057,039	4.2%	17,057,039		17,057,039	4.2%
	<b>Total INFRAESTRUCTURA NACIONAL (FONDOS NACIONALES)</b>		<b>36.417.011</b>		<b>36.417.011</b>		<b>407.366.776</b>		<b>407.366.776</b>	<b>17.057.039</b>		<b>17.057.039</b>	<b>4.2%</b>	<b>17.057.039</b>		<b>17.057.039</b>	<b>4.2%</b>
	<b>Total general</b>		<b>85.824.098</b>	<b>775.706.770</b>	<b>861.530.868</b>	-	<b>450.267.961</b>	<b>775.706.770</b>	<b>1.225.974.731</b>	<b>17.057.039</b>	<b>2.327.553</b>	<b>19.384.592</b>	<b>0</b>	<b>17.213.039</b>	<b>2.781.686</b>	<b>19.994.725</b>	<b>2.6%</b>

Nota: SIAFI, 30/04/2026
