



SECRETARÍA
DE FINANZAS



DGIP
Dirección General de
INVERSIÓN PÚBLICA

SNIPH
SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN
PÚBLICA DE HONDURAS

Dirección General de Inversiones Públicas

INFORME GENERAL II TRIMESTRE 2026



JULIO, 2026

Dirección General de Inversiones Públicas

1 Tabla de contenido

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2026	3
PRESENTACIÓN	3
I. ANALISIS GLOBAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA AL SEGUNDO TRIMESTRE 2026.....	3
1.1 INVERSIÓN PÚBLICA GLOBAL 2026	3
1.2 INVERSIÓN INSTITUCIONAL	4
1.3 INVERSIÓN PÚBLICA POR ESTRUCTURA DEL SECTOR PÚBLICO	9
1.4 LA INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL DE SECTOR ECONOMICO (PRODUCTIVA Y FORMACION BRUTA DE CAPITAL)	10
1.5 FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA GLOBAL	13
1.6 EJECUCIÓN HISTÓRICA INVERSIÓN PRODUCTIVA PERÍODO 2022 – 2026.....	13
1.7 ANALISIS DE LA FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL II TRIMESTRE 2026	14
1.8 EJECUCIÓN FÍSICA A NIVEL DE SECTORES:.....	15
1.8.1 Sector Carreteras:.....	15
1.8.1.1 Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT)	15
1.8.2 Sector Modernización del Estado	17
1.8.2.1 Instituto Nacional de Estadística (INE).....	17
1.8.2.2 Registro Nacional de las Personas	17
1.8.2.3 Secretaria de Trabajo y Seguridad Social (SETRASS).....	18
1.8.3 Sector Transporte y Obras Públicas.....	18
1.8.3.1 Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT)	18
1.8.4 Sector Agua y Saneamiento	18
1.8.4.1 Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).....	18
1.8.4.2 Alcaldía Municipal de Distrito Central (AMDC)	19
1.8.5 Sector Seguridad y Defensa	19
1.8.5.1 Secretaría de Seguridad (SEDS)	19
1.8.6 Sector Salud.....	19
1.8.6.1 Secretaría de Salud (SESAL)	19
1.8.7 Sector Desarrollo Productivo	20
1.8.7.1 Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).....	21
1.8.8 Sector Forestal.....	21
1.8.8.1 Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF).....	21
1.8.9 Sector Cultura Artes y Deportes	22
1.8.9.1 Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras (SECAPPH)	22
1.9 ANÁLISIS DE IMPACTO SOCIAL QUE OBSTACULIZARON LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA.....	22
1.10 FACTORES QUE HAN INCIDIDO EN LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA, EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026.	23

Dirección General de Inversiones Públicas

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2026

PRESENTACIÓN

El presente informe, muestra el análisis del comportamiento de la ejecución física y financiera de la Inversión Pública correspondiente al Segundo Trimestre del ejercicio fiscal 2026. Este documento es elaborado por la Dirección General de Inversiones Públicas (DGIP), en el marco de sus competencias como ente rector de la Inversión Pública y técnico coordinador del Programa de Inversión Pública (PIP).

El Plan de Inversión Pública para el año 2026 aprobado por el Congreso Nacional asciende a L48,229.6 millones conformada por dos grandes grupos de inversión: Inversión Productiva L16,130.5 millones y Formación Bruta de Capital Fijo L32,099.1 millones, representando 4.4% del Producto Interno Bruto (PIB)¹ y 10.8% del Presupuesto General de la República 2026², destinados para la ejecución de 71 proyectos de arrastre y 7 nuevos, totalizando 78 proyectos registrados en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIPH), además de Transferencias de Capital y Bienes de Formación Bruta de Capital Fijo.

EL informe analiza detalladamente la distribución y ejecución de la inversión pública correspondiente al Segundo Trimestre 2026, por tipo de inversión, institucional, estructura del sector público, sectorial y fuente de financiamiento, así como su comportamiento histórico en el último quinquenio, destacando los avances en la ejecución de proyectos prioritarios y la problemática que aún persiste en la gestión de la inversión pública en el país.

I. ANALISIS GLOBAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA AL SEGUNDO TRIMESTRE 2026

1.1 INVERSIÓN PÚBLICA GLOBAL 2026

El monto global de la Inversión Pública aprobado Congreso Nacional para el año 2026, asciende a **L48,229.6 millones** de los cuales **33.4% (L16,130.5) millones**, corresponden a los proyectos para Inversión Productiva, registrados en el Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIPH), para la ejecución de 78 proyectos de Inversión Pública y **66.6% L32,099.1 millones**, corresponden a Formación Bruta de Capital; que comprende el (64.9% a Bienes capitalizables y el 35.1% a Transferencias de Capital) **ver Cuadro N°1.**

El Plan de Inversión Pública, al cierre del segundo trimestre de 2026, alcanzó un presupuesto vigente de **L46,137.2 millones** y una ejecución de **33.6%**, equivalente a **L15,495.3 millones**. Adicionalmente, se encuentra en proceso la incorporación de recursos correspondientes a proyectos de inversión productiva que cumplan con las disposiciones legales y normativas requeridas para su inclusión en el presupuesto de 2026.

Es de mencionar que El Presupuesto General de la República para la Gestión 2026 fue aprobado mediante Decreto Legislativo No 62-2026 de fecha 23 de abril de 2026, es decir, posteriormente al inicio del segundo trimestre (1 de abril al 30 de junio). En consecuencia, durante el primer trimestre y parte del segundo trimestre, las instituciones operaron con un presupuesto prorrogado correspondiente a la vigencia fiscal 2025, conforme a lo establecido en la normativa presupuestaria aplicable, caso particular la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).

¹ PIB proyectado año 2026, L1,084,884.1 millones, Cifras Banco Central de Honduras (BCH).

² Presupuesto General de la República 2026 L444,335.8 millones

Dirección General de Inversiones Públicas

Por lo tanto, al comparar el presupuesto aprobado (base legal definitiva) con el presupuesto vigente al corte del 30 de junio (base operativa real durante el trimestre), se observan diferencias que son normales en contextos de prórroga presupuestaria. Estas variaciones no afectan la validez de los reportes trimestrales, siempre que se interpreten considerando el momento de la aprobación de la Ley de Presupuesto y la transitoriedad del presupuesto prorrogado.

Del total de la Inversión Pública, **La Inversión Productiva** para el año 2026 según lo reportado en el Sistema de Administración Financiera Integrado (SIAFI) muestra un presupuesto vigente al segundo trimestre de **L14,484.2 millones** y una ejecución de **L3,592.7 millones, (24.8%)**, para la ejecución de **69 proyectos** con presupuesto vigente en los diferentes sectores prioritarios del país entre ellos; Carreteras, Energía, Salud, Modernización del Estado, Desarrollo Productivo y Riego.

Respecto al presupuesto vigente para la **Formación Bruta de Capital Fijo**, asciende a **L31,653.0 millones** y una ejecución de **L11,902.6 millones (37.6%)**, ejecución que contempla Bienes Capitalizables (Grupo 40000) para las instituciones del sector público, representando incremento de los activos fijos financieros del país, como reparaciones menores, compra de maquinaria y equipo, así como Transferencias de Capital (Grupo 50000). Ver **Cuadro No.1**.

Cuadro No. 1
Plan de Inversión Pública, Ejecución
Financiera Acumulada al II Trimestre
2026
(Cifras en Millones de Lempiras)

Tipo de Inversión Pública	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Devengado	% Ejecución
1. Inversión Productiva	16,130.5	14,484.2	3,592.7	24.8%
Proyectos de Inversión Pública	16,130.5	14,484.2	3,592.7	24.8%
2. Formación Bruta de Capital Fijo	32,099.1	31,653.0	11,902.6	37.6%
Bienes Capitalizables	20,825.1	20,379.0	7,083.7	34.8%
Transferencias de Capital	11,274.0	11,274.0	4,818.9	42.7%
Total	48,229.6	46,137.2	15,495.3	33.6%

Fuente: Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI), 30/06/2026. En proceso la incorporación de recursos correspondientes a proyectos de inversión productiva que cumplan con las disposiciones legales y normativas requeridas para su inclusión en el presupuesto de 2026.

1.2 INVERSIÓN INSTITUCIONAL

La Inversión Productiva a nivel de institución y con mayor porcentaje de ejecución la lidera La Universidad Nacional de Agricultura con ejecución de L98.6 millones (90.3%), la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), con una ejecución de L2,222.3 millones (38.0%), Secretaría de Agricultura y Ganadería con L330.1 millones (34.2%), Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras con L7.7 millones (24.6%), Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal con L46.3 millones (23.6%), La Secretaría de Salud (SESAL) con L303.1 millones (20.4%), la Secretaría de Seguridad con L21.6 millones (15.7%), El Programa de la Red Solidaria L80.1 millones (15.3%), El Fondo Hondureño de Inversión Social L120.1 millones (14.7%), la Empresa Nacional de Energía Eléctrica L278.2 millones (14.3%), En conjunto estas 10 instituciones concentran el 98.0% (L3,508.0 millones), del total del monto ejecutado, el resto de las instituciones abarcan el 2% del total (L84.7 millones), alcanzando un monto ejecutado total de L3,592.7 millones. En el **Cuadro No.2** se puede observar a detalle el presupuesto vigente de la inversión productiva, su ejecución a nivel de devengado, y el porcentaje de ejecución.

Dirección General de Inversiones Públicas

Cuadro No. 2
Inversión Pública Productiva al 30 de Junio del 2026
 (Cifras en Millones de Lempiras)

Institución	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado Aprobado	% Ejecución (Dev./Vig.)
0703 - Universidad Nacional de Agricultura	516.68	109.23	98.62	90.3%
0411 - Secretaría de Infraestructura y Transporte	6,549.32	5,844.62	2,222.34	38.0%
0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería	966.14	966.14	330.14	34.2%
0410 - Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras	31.3	31.3	7.7	24.6%
0028 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal	195.28	195.28	46.03	23.6%
0060 - Secretaría de Salud	1,484.42	1,483.86	303.07	20.4%
0070 - Secretaría de Seguridad	137.36	137.36	21.59	15.7%
0415 - Programa de la Red Solidaria	622.86	525.08	80.15	15.3%
0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social	825.11	818.61	120.09	14.7%
0801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica	2,143.95	1,952.10	278.27	14.3%
1801 - Alcaldía Municipal del Distrito Central	160.31	160.31	15.49	9.7%
0050 - Secretaría de Educación	454.45	151.95	11.53	7.6%
0130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social	82.95	82.95	4.56	5.5%
0513 - Instituto Nacional de Estadísticas	510.41	510.41	21.53	4.2%
0416 - Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento	183.81	183.81	6.96	3.8%
0414 - Dirección de Gestión por Resultados	249.98	364.06	13.06	3.6%
0400 - Administración Aduanera de Honduras	261.27	261.27	7.29	2.8%
0180 - Registro Nacional de las Personas	185.86	185.86	4.07	2.2%
0511 - Universidad de Ciencias Forestales	12.2	12.2	0.21	1.7%
0505 - Instituto Hondureño de Antropología e Historia	22.62	0.17	0	0.0%
0515 - Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación	73.11	73.11	0	0.0%
0803 - Empresa Nacional Portuaria	461.1	434.52	0	0.0%
Total general	16,130.47	14,484.17	3,592.68	24.8%

Fuente: Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI), al 30/06/2026

La Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF) a nivel institucional presenta diferentes niveles de ejecución, entre las instituciones públicas con mayor porcentaje de ejecución al segundo trimestre de 2026 son: Fondo Hondureño de Inversión Social que alcanzó el 99.8% ejecutando L36.3 millones, Poder Judicial con 76.0% ejecutando L700.0 millones, Secretaría de Infraestructura y Transporte que con una ejecución de L5,608.3 millones alcanzo el 55.9% de su vigente; Ministerio Público con un 48.8% ejecutando 143.8 millones y la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización que ejecutó L4,818.9 millones alcanzando el 44.5% de ejecución en este tipo de inversión


En términos de monto ejecutado, la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) concentra la mayor ejecución presupuestaria, con L5,608.3 millones, lo que representa el valor más alto entre todas las instituciones analizadas; le sigue la Secretaría de Gobernación, Justicia y

Dirección General de Inversiones Públicas

Descentralización, con L4,818.9 millones devengados, mientras que el Poder Judicial ocupa el tercer lugar con una ejecución de L700.0 millones.

Asimismo, destacan la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), con L 155.4 millones, el Instituto de Previsión Militar, con L155.4 millones, la Secretaría de Defensa Nacional, con L150.6 millones, el Ministerio Público, con L143.8 millones, y el Instituto Nacional Agrario, con L103.3 millones. En conjunto, estas instituciones concentran la mayor parte de los recursos destinados a la Formación Bruta de Capital Fijo devengados durante el período de análisis, evidenciando que la ejecución presupuestaria en términos monetarios se encuentra altamente concentrada en un número reducido de entidades públicas, particularmente aquellas responsables de infraestructura, administración territorial, justicia, seguridad y programas de inversión pública.

Gráfico No.1
Formación Bruta de Capital Fijo
Inst. Con mayor porcentaje de ejecución

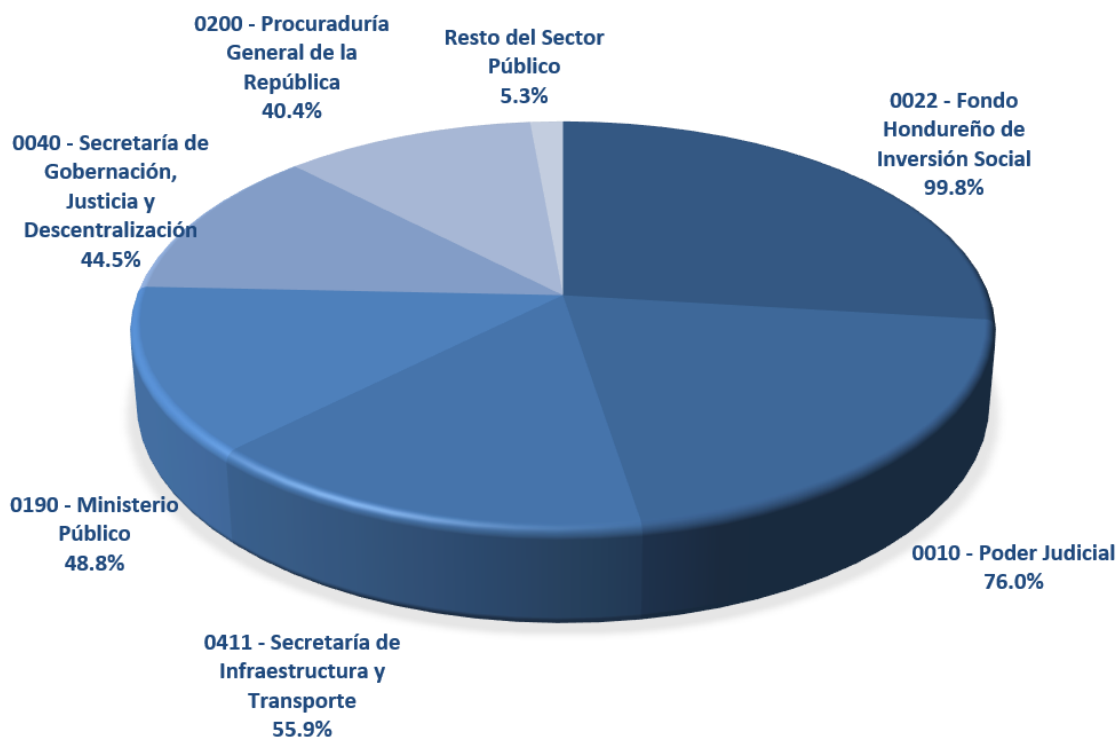

Fuente: Construcción propia con datos del Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI), al 30/06/2026

Dirección General de Inversiones Públicas

Cuadro No. 3
Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF) al 30 de Junio del 2026
 (Cifras en Millones de Lempira)

Institución	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado Aprobado	% Ejecución (Dev./Vig.)
0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social	36.42	36.42	36.34	99.8%
0010 - Poder Judicial	920.62	920.62	700.00	76.0%
0411 - Secretaría de Infraestructura y Transporte	9,448.26	10,035.50	5,608.30	55.9%
0190 - Ministerio Público	294.67	294.67	143.79	48.8%
0040 - Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización	10,834.34	10,834.34	4,818.95	44.5%
0200 - Procuraduría General de la República	13.40	13.40	5.41	40.4%
0500 - Instituto Nacional Agrario	300.53	300.53	103.33	34.4%
0604 - Instituto de Previsión Militar	500.00	500.00	155.40	31.1%
0090 - Secretaría de Defensa Nacional	465.04	492.98	150.61	30.6%
0004 - Consejo Nacional Electoral	33.96	33.96	10.18	30.0%
0150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente	5.09	1.15	0.33	28.3%
0808 - Ferrocarril Nacional de Honduras	0.75	0.75	0.17	23.2%
0091 - Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil	7.65	7.65	1.71	22.4%
0180 - Registro Nacional de las Personas	96.18	96.18	21.02	21.9%
0037 - Servicio de Administración de Rentas	141.40	141.40	29.88	21.1%
0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería	7.39	12.70	2.42	19.0%
0002 - Tribunal Superior de Cuentas	10.07	10.07	1.90	18.9%
0901 - Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda	45.89	45.89	8.08	17.6%
0513 - Instituto Nacional de Estadísticas	5.12	5.12	0.86	16.8%
0290 - Secretaría de Desarrollo Económico	2.98	2.98	0.38	12.7%
0702 - Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán	4.98	4.98	0.58	11.6%
0301 - Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas	0.30	0.30	0.03	10.6%
0511 - Universidad de Ciencias Forestales	20.78	20.78	2.12	10.2%
0005 - Tribunal de Justicia Electoral	0.43	0.43	0.04	8.3%
0028 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal	6.30	6.30	0.49	7.8%
0025 - Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinserción Soc	0.03	0.03	0.00	7.5%
0030 - Secretaría de la Presidencia	34.86	34.86	2.33	6.7%
0102 - Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía	105.20	105.20	6.24	5.9%
0045 - Instituto Nacional de Migración	104.78	104.78	6.04	5.8%
0416 - Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento	6.79	6.79	0.39	5.7%
0806 - Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola	4.00	4.00	0.23	5.6%
0506 - Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas	2.15	9.15	0.51	5.5%
0505 - Instituto Hondureño de Antropología e Historia	80.47	80.47	3.97	4.9%
0805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados	9.46	9.46	0.45	4.8%
0902 - Banco Central de Honduras	147.94	147.94	6.27	4.2%
0043 - Empresa Nacional de Artes Gráficas	0.84	0.84	0.03	4.1%
0060 - Secretaría de Salud	1,383.97	315.58	13.08	4.1%
0603 - Instituto Nacional de Previsión del Magisterio	122.00	122.00	4.98	4.1%
0605 - Ins. de Prev.Soc. de los Emp.de la Univ.Nal.Aut. de Honduras	9.53	9.53	0.33	3.5%
0153 - Comisión Reguladora de Energía Eléctrica	3.32	6.96	0.22	3.2%
0123 - Instituto Hondureño de Transporte Terrestre	8.30	8.71	0.28	3.2%
0046 - Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores	16.61	16.61	0.50	3.0%
0062 - Agencia de Regulación Sanitaria	41.40	41.40	1.10	2.7%
0101 - Comisión Nacional de Telecomunicaciones	36.46	36.46	0.96	2.6%
0903 - Banco Nacional de Desarrollo Agrícola	75.50	75.50	1.69	2.2%
0070 - Secretaría de Seguridad	417.46	417.46	9.33	2.2%
0514 - Comisión Para La Defensa Y La Promoción de la Competencia	3.36	3.36	0.07	2.2%
0809 - Empresa de Correos de Honduras	1.00	1.00	0.02	2.0%
0080 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional	12.60	15.60	0.28	1.8%
0503 - Instituto Nacional de Formación Profesional	61.27	61.27	1.08	1.8%
0050 - Secretaría de Educación	100.32	100.86	1.62	1.6%

Dirección General de Inversiones Públicas

Institución	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado Aprobado	% Ejecución (Dev./Vig.)
0035 - Instituto Hondureño de Geología y Minas	21.22	21.22	0.34	1.6%
0044 - Instituto Nacional Penitenciario	236.97	236.97	2.91	1.2%
0701 - Universidad Nacional Autónoma de Honduras	194.42	194.42	2.13	1.1%
0024 - Instituto de la Propiedad	81.46	81.46	0.88	1.1%
0413 - Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación	964.86	964.86	9.77	1.0%
0100 - Secretaría de Finanzas	93.97	100.52	0.96	1.0%
0803 - Empresa Nacional Portuaria	110.79	137.36	1.14	0.8%
0121 - Dirección General de la Marina Mercante	14.49	14.49	0.11	0.8%
0801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica	1,926.50	1,926.50	14.13	0.7%
0310 - Secretaría de Energía	174.74	175.40	0.85	0.5%
0703 - Universidad Nacional de Agricultura	437.95	437.95	1.68	0.4%
0601 - Instituto Hondureño de Seguridad Social	221.71	306.82	1.00	0.3%
0144 - Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible	721.92	721.92	2.01	0.3%
0039 - Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios	82.46	82.46	0.22	0.3%
0804 - Empresa Hondureña de Telecomunicaciones	22.27	22.27	0.05	0.2%
0510 - Confederación Deportiva Autónoma de Honduras (CONDEPAH)	11.00	11.00	0.02	0.2%
0419 - Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia	14.50	14.50	0.02	0.1%
0807 - Suplidora Nacional de Productos Básicos	10.59	10.59	0.01	0.1%
0950 - Comisión Nacional de Bancos y Seguros	21.14	21.14	0.02	0.1%
0602 - Inst. Nal. de Jubi.y Pen. de los Emp. y Fun. del Poder Ejec.	100.00	100.00	0.07	0.1%
0410 - Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras	36.87	36.87	0.01	0.0%
0003 - Comisionado Nacional de Derechos Humanos	0.90	0.90	0.00	0.0%
0026 - Instituto Nacional de la Juventud	0.15	0.15	0.00	0.0%
0032 - Instituto de Acceso a la Información Pública	11.00	11.00	0.00	0.0%
0033 - Programa de Vivienda y Asentamientos Humanos	1.50	1.50	0.00	0.0%
0042 - Cuerpo de Bomberos de Honduras	107.16	107.16	0.00	0.0%
0051 - Centro Nacional de Educación para el Trabajo	0.10	2.10	0.00	0.0%
0061 - Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento	0.55	0.55	0.00	0.0%
0072 - Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales	6.69	6.69	0.00	0.0%
0130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social	7.40	12.22	0.00	0.0%
0145 - Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria	0.00	10.31	0.00	0.0%
0244 - Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer	1.70	1.70	0.00	0.0%
0300 - Secretaria de Derechos Humanos	0.16	1.92	0.00	0.0%
0400 - Administración Aduanera de Honduras	83.29	83.29	0.00	0.0%
0405 - Unidad Especial de Protección	5.00	5.00	0.00	0.0%
0406 - Secretaría de Asuntos de la Mujer	26.80	26.80	0.00	0.0%
0412 - Secretaría de Desarrollo Social	5.00	5.00	0.00	0.0%
0414 - Dirección de Gestión por Resultados	42.90	27.04	0.00	0.0%
0415 - Programa de la Red Solidaria	17.50	0.00	0.00	0.0%
0417 - Programa de Acción Solidaria	0.00	0.00	0.00	0.0%
0418 - Administración Nacional de Servicio Civil	0.92	0.93	0.00	0.0%
0420 - Comisión Nacional del Ferrocarril Interoceánico	3.74	3.74	0.00	0.0%
0421 - Secretaría de Vivienda y Asentamientos Humanos	137.01	137.01	0.00	0.0%
0422 - Oficina Presidencial de Comercio Exterior	5.59	5.59	0.00	0.0%
0501 - Instituto Hondureño de Turismo	19.05	19.05	0.00	0.0%
0504 - Instituto de Crédito Educativo	0.24	0.24	0.00	0.0%
0507 - Inst. Hondureño para Prev. y Trat. del Alcohol.Drog.y Farm.	2.50	2.50	0.00	0.0%
0508 - Patronato Nacional de la Infancia	4.75	4.75	0.00	0.0%
0515 - Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación	0.30	0.30	0.00	0.0%
0516 - Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg	2.00	2.00	0.00	0.0%
Bienes Capitalizables	31,985.87	31,653.07	11,902.66	37.6%

Fuente: Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI), al 30/06/2026


Dirección General de Inversiones Públicas

1.3 INVERSIÓN PÚBLICA POR ESTRUCTURA DEL SECTOR PÚBLICO

De acuerdo con la Clasificación del Sector Público, la distribución del **Plan de Inversión Pública** (PIP) para el segundo trimestre 2026, muestra un presupuesto vigente de **L46,137.2 millones**, lo cual, **L 38,286.5** millones, corresponden a la Administración Central, mientras que **L7,850.7** millones corresponden al Resto del Sector Público, según lo reportado en SIAFI al 30 de junio de 2026, alcanzando una ejecución presupuestaria total de **L15,495.3** millones equivalente al **33.6%** del presupuesto vigente.

En cuanto a la ejecución presupuestaria en la Administración Central, el monto ejecutado equivale a los **L 14,770.8 millones** que representan el **38.6%** de ejecución del total vigente y **L724.5 millones** en el Resto del Sector Público, que representan el **9.2%** de ejecución presupuestaria.

En el **Gráfico No.2**, se muestra el porcentaje de ejecución de la Administración Central y Resto Sector Público según tipo de Inversión y así como en el **Cuadro No. 4**. El desglose de la Inversión por estructura del Sector Público.

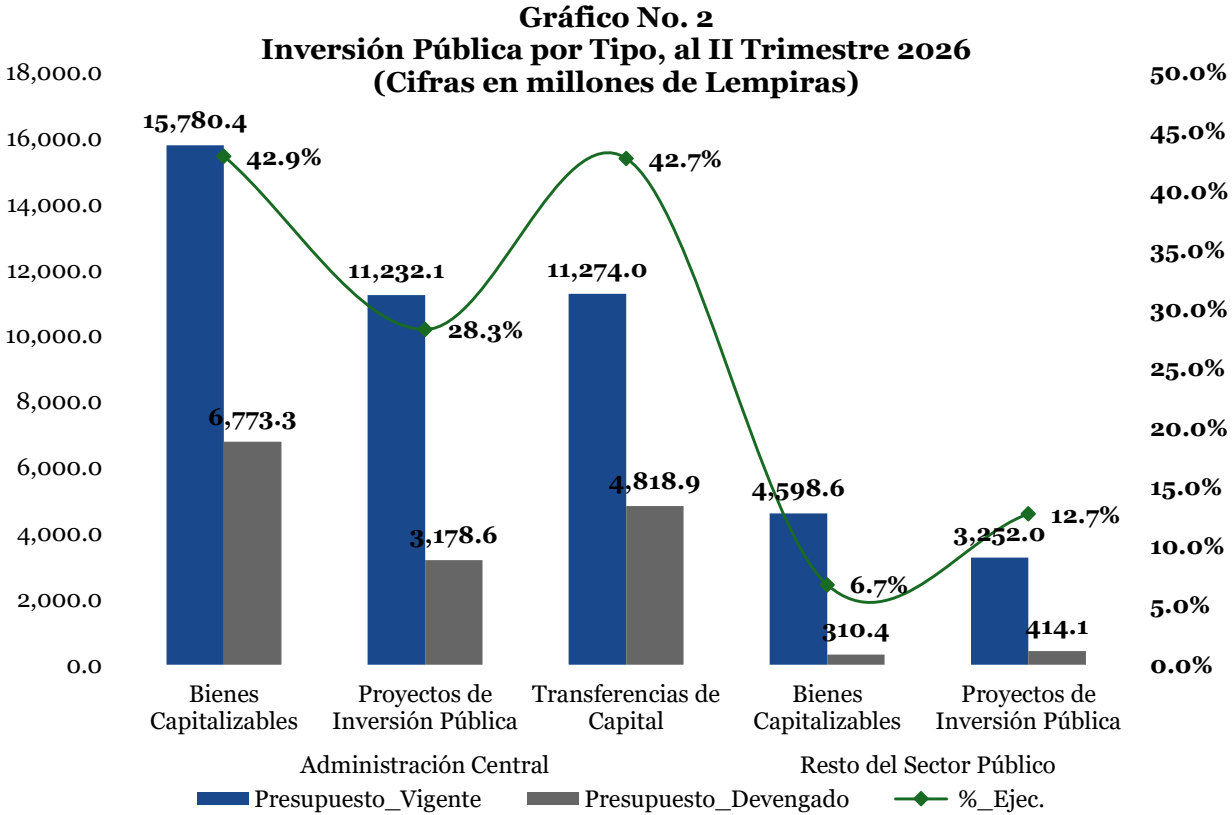

Fuente: Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI), al 30/06/2026

Cuadro No. 4
Inversión Pública por Estructura del Sector Público
Al II Trimestre 2026
 (Cifras en Millones de Lempiras)

Tipo de Inversión Pública	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Devengado	% Ejecución
Administración Central	39,849.3	38,286.6	14,770.8	38.6%
Bienes Capitalizables	16,345.1	15,780.4	6,773.3	42.9%
Proyectos de Inversión Pública	12,230.1	11,232.1	3,178.6	28.3%
Transferencias de Capital	11,274.0	11,274.0	4,818.9	42.7%
Resto Sector Público	8,380.3	7,850.7	724.5	9.2%
Bienes Capitalizables	4,479.9	4,598.6	310.4	6.7%
Proyectos de Inversión Pública	3,900.4	3,252.0	414.1	12.7%
Total	48,229.6	46,137.2	15,495.3	33.6%

Fuente: Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI), al 30/06/2026

Al II trimestre de 2026, la inversión pública presenta una baja ejecución generalizada respecto al presupuesto vigente, con una marcada concentración del gasto en la Administración Central.

Se refleja una mayor ejecución en la Administración Central: en Bienes Capitalizables un 42.9% y en proyectos de inversión pública el 28.3%, por otra parte, se muestra una ejecución moderada en Transferencias de Capital (42.7%).

En cambio, en el Resto del Sector Público, la ejecución en Bienes capitalizables indica un 6.7% y en Proyectos el 12.7%, el patrón general refleja una ejecución lenta en el segundo trimestre, especialmente fuera de la Administración Central.

1.4 LA INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL DE SECTOR ECONOMICO (PRODUCTIVA Y FORMACION BRUTA DE CAPITAL)

A nivel Sectorial, el porcentaje de Inversión Pública varía según la priorización, con el fin de dinamizar la economía, dentro de los sectores que lideran en mayor porcentaje respecto al presupuesto vigente de L46,137.2 millones se destacan los siguientes:

El **Sector Carretero** con una inversión de **L 13,296.6 millones** equivalente a **28.8%** de la inversión total alcanzando una ejecución presupuestaria de **L7,245.1 millones**, equivalente al **54.5% de ejecución**, para la construcción, rehabilitación y pavimentación de varios Tramos Carreteros del país como ser: el Programa de Carreteras Resilientes de Honduras (PCR-HN), Libramiento Anillo Periférico CA-5 Sur, el Anillo Agrícola, entre otros.

Mientras tanto, **El Sector Descentralización** se posiciona en segundo lugar, priorizando el fortalecimiento institucional, mediante las transferencias a los Gobiernos Locales, alcanzando una inversión de **L10,834.3 millones (23.5%)** con un devengado aprobado de **L4,818.9 millones** equivalente a un **44.5%** de su presupuesto vigente.

Dirección General de Inversiones Públicas

El **Sector Energía**, reporta un monto de inversión de **L 4,060.9 millones (8.8%)**, de los cuales se alcanzó una ejecución a nivel de devengado de **L293.5 millones (7.2%)**, para la ejecución de los proyectos de: Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral-Río Lindo, Renovación de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán y Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica.

El **Sector Transporte y Obras Públicas**, presenta una inversión de **L3,833.2 millones (8.3%)** de la inversión total, de los cuales logró ejecutar a nivel de devengado **L723.4 millones (18.9%)**, para la ejecución de proyectos como Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras, la Reconstrucción del Puente No.1 (Viejo, Tangente) y Rehabilitación del Puente No.2 (Nuevo, Curvo) sobre la Laguna de Alvarado, ubicado en Puerto Cortés, Departamento de Cortés, así como la construcción de obras urbanas a nivel nacional y obras civiles ejecutadas por la SIT, entre otros.

Así mismo, **El Sector Modernización del Estado**, alcanzando **L3,672.8 millones** que representa el **8.0%** del total de la inversión, y con un porcentaje de ejecución de **26.8%** equivalente a **L986.1 millones**; con esto se busca priorizar la inscripción, gestión, custodia e identificación nacional, programa de apoyo al censo de población y vivienda y fortalecimiento del sistema estadístico nacional, programa de transformación digital para una mayor competitividad, entre otros.

El **Sector Salud**, con una inversión de **L2.194.5 millones** representa el **4.8%** de la inversión total para el 2026 y una ejecución de **L349.4 millones**, de los cuales representó un **15.9%** de ejecución presupuestaria, para la cobertura de los servicios de salud y la red hospitalaria del País, a través de la contratación de gestores en el segundo nivel y segundo nivel de atención, así como, el diseño y construcción de hospitales.

El Sector **Protección Social**, con una inversión de **L1,588.7 millones** con un porcentaje de participación de **3.4%** de la inversión total y un **13.7%** de ejecución presupuestaria (**L217.3 millones**) para proyectos en apoyo al sistema integral de protección social, programa de apoyo para la inserción laboral en honduras, así como previsión social.

El **Sector Desarrollo Productivo** con una inversión de **L1,497.9 millones** concentra el **3.2%** de la inversión total con una ejecución de **L228.7 millones (15.3%)**, para la ejecución de inversiones orientadas a mejorar el acceso a los mercados y a las prácticas agrícolas climáticamente inteligentes y contribuir a la inclusión económica de los productores beneficiarios y sus familias en el marco de cadenas de valor agrícolas, a través del programa Competitividad Rural (COMRURAL).

Por su parte, el **Sector Seguridad y Defensa** con una inversión de **L 1,450.7 millones** representa el **3.1%** de la inversión total con una ejecución de **L194.9 millones** que representan el **13.4%** de ejecución, recursos ejecutados en su mayoría por la Secretaría de Seguridad, para la obra de construcción de la Academia Nacional de la Policía ANAPO y recursos ejecutados para el fortalecimiento de la Secretaría de Defensa.

Así mismo el **Sector Educación** con una inversión de **L 1,178.9 millones** que representan el **2.6%** de la inversión total y un ejecutado de **L133.1 millones** representando únicamente un **11.3%** de la ejecución del sector, para la ejecución del proyecto Mejoramiento de la Calidad en la Educación Pre básica En Honduras, el Programa Hacia una Educación más Inclusiva "Transformando la Escuela Rural"

Con relación al **Sector Cultura, Artes y Deportes**, alcanzó un monto de inversión de **L1,124.6 millones** que equivalen al **2.4%** del total de inversión pública para el 2026, al cierre del segundo trimestre registró un devengado de L16.0 millones un 14.2% en términos


Dirección General de Inversiones Públicas

porcentuales de ejecución, con el fin de desarrollar mejoras en el sistema de abastecimiento de agua potable para la población, así como Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana.

Con relación al **Sector Agua y Saneamiento**, alcanzó un monto de inversión de **L583.8** millones que equivalen al **1.3%** del total de inversión pública para el 2026, al cierre del segundo trimestre registró un devengado de L92.2 millones un 15.8% en términos porcentuales de ejecución, con el fin de desarrollar actividades en apoyo al fortalecimiento de la gestión cultural, de las artes y los patrimonios de los pueblos, al programa nacional de cinematografía, apoyo a los programas de construcción y conservación de instalaciones deportivas, recreativas a nivel nacional, restauración y conservación de sitios históricos y culturales.

Por último, el **Resto de los sectores** comprendidos por: Riego, Comunicaciones, Recursos Forestal y Ambiente, Vivienda, Agroforestal y Turismo, juntos concentran el 1.8% de la inversión total (L819.9) registrando un devengado de L94.3 millones equivalente a 11.5% de ejecución presupuestaria al segundo trimestre de 2026.


A continuación, se muestra gráfico No.3 Inversión Pública: Distribución Sectorial con mayor porcentaje de ejecución al segundo trimestre 2026.

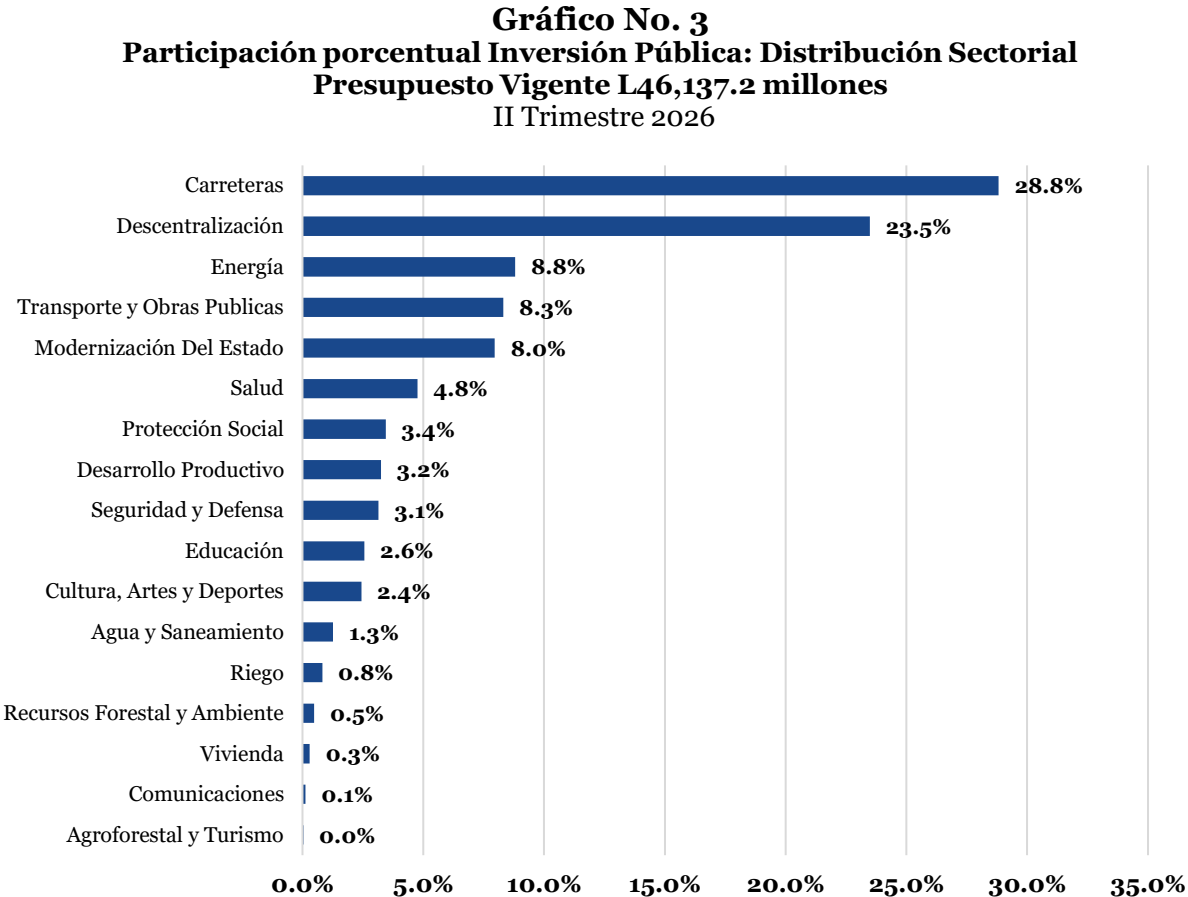

Fuente: Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI), al 30/06/2026

Dirección General de Inversiones Públicas

1.5 FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA GLOBAL

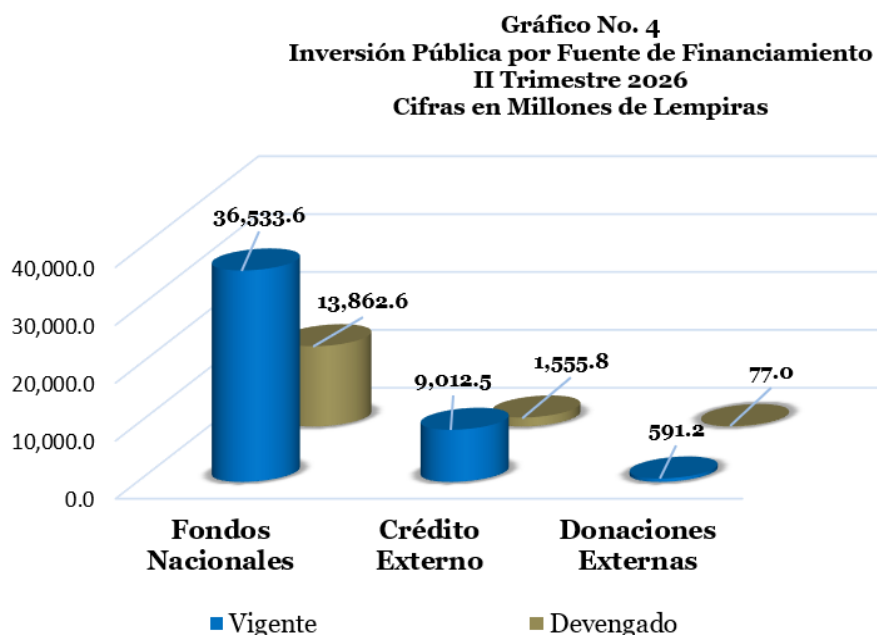

Fuente: Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI), al 30/06/2026

La inversión pública está financiada por dos grandes Fuentes Específicas; Fondos Nacionales y Fondos Externos.

En el Gráfico No.4 se muestra que el financiamiento de Fondos Nacionales (Fuente 11) y Recursos propio (Fuente 12) generado por las mismas instituciones públicas equivalente al 79.2% del total del presupuesto vigente destinados a la Inversión Pública, siendo los fondos nacionales con mayor porcentaje de aporte de financiamiento **(67.0%) L30,913.5 millones y fondos propios (12.2%) con L5,620.1 millones.**

Con respecto a Fondos externos conformado por dos Fuentes específicas; Crédito Externo (Fuente 21) y Donaciones Externas (Fuente 22) con una participación de 19.5% y 1.3% respectivamente, para un total del **20.8%** fondos obtenidos a través de organismos financieros multilaterales dentro de los cuales se destacan Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Asociación Internacional de Fomento, que concentran el **90.8%** de los fondos externos equivalente a **L9,603.7 millones.**

Al cierre del segundo trimestre el porcentaje de ejecución presupuestaria por fuente de financiamiento, los Fondos Nacionales concentró el 89.5% de los fondos devengados cerrando con **L13,862.6 millones** ejecutados, mientras los Fondos externos contribuyendo con el **10.5%** equivalente a **L1,632.8 millones** sumando un total de **L15,495.3 millones.**

1.6 EJECUCIÓN HISTÓRICA INVERSIÓN PRODUCTIVA PERÍODO 2022 – 2026

Durante el período **2022–2026**, el presupuesto vigente acumulado destinado a la Inversión Productiva asciende a **L72,716.8 millones**, con una ejecución acumulada de **L15,285.5 millones**, lo que representa una **ejecución presupuestaria global de 21.6%**. Asimismo, el presupuesto vigente registra una **tasa de crecimiento promedio anual de 9.8%**, al pasar de **L9,980.2 millones en 2022 a L14,484.2 millones en 2026.**


Dirección General de Inversiones Públicas

En términos comparativos, durante la **gestión 2023** el presupuesto vigente alcanzó **L13,652.5 millones**, lo que representa un incremento de **36.8%** respecto a 2022. Posteriormente, al cierre de **2024** el presupuesto aumentó a **L16,783.4 millones**, equivalente a un crecimiento de **22.9%** respecto al año anterior. Para **2025**, el presupuesto vigente ascendió a **L17,861.6 millones**, registrando un crecimiento más moderado de **6.4%**. Finalmente, para **2026** se observa una disminución del **18.9%**, situándose en **L14,484.2 millones**.

En cuanto a la ejecución presupuestaria, durante el período analizado se registra un **promedio de ejecución de 21.6%**. En **2022** la ejecución fue de **10.1%**, equivalente a **L1,009.9 millones**. Para **2023**, el porcentaje de ejecución aumentó a **20.1%**, con un monto ejecutado de **L2,741.6 millones**. En **2024** la ejecución alcanzó **17.8%**, equivalente a **L2,980.1 millones**. El mayor nivel de ejecución se registró en **2025**, con **27.8%**, correspondiente a **L4,961.2 millones**. Finalmente, al **II Trimestre de 2026** la ejecución asciende a **24.8%**, equivalente a **L3,592.7 millones**.

En comparación con el mismo período del año anterior, la ejecución presupuestaria presenta una disminución de **3.0 puntos porcentuales**, al pasar de **27.8% en 2025** a **24.8% en 2026**. Sin embargo, el nivel de ejecución al II Trimestre de 2026 continúa siendo superior al registrado en **2022, 2023 y 2024**, reflejando un desempeño presupuestario favorable en términos históricos, aunque con un presupuesto vigente inferior al alcanzado en 2025. Ver **Gráfico No.5**.

Gráfico No. 5
Inversión Productiva Histórica al II Trimestre (2022-2026)
(Cifras en millones de Lempiras)

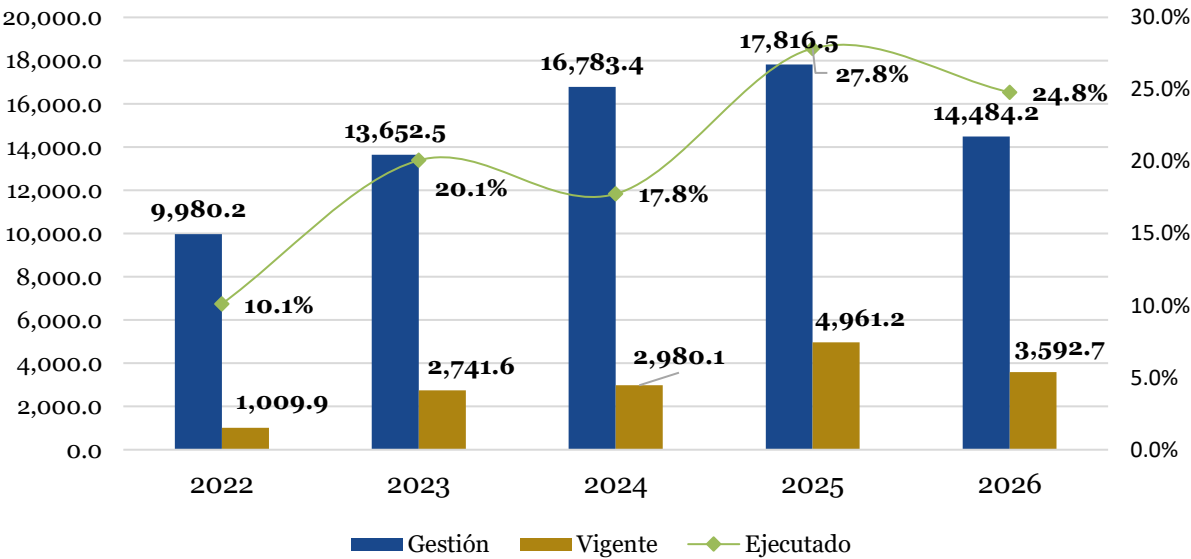

Fuente: Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI), al 30/06/2026

1.7 ANALISIS DE LA FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL II TRIMESTRE 2026

Respecto al presupuesto vigente para la **Formación Bruta de Capital Fijo**, asciende a **L31,653.0 millones** y una ejecución de **L11,902.6 millones (37.6%)**, ejecución que contempla Bienes Capitalizables (Grupo 40000) para las instituciones del sector público, representando incremento de los activos fijos financieros del país, como reparaciones menores, compra de maquinaria y equipo, así como Transferencias de Capital (Grupo 50000).

Dirección General de Inversiones Públicas

Al cierre de junio de 2026, las cinco instituciones con mayor asignación presupuestaria en Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF) concentran el **78%** del presupuesto vigente total de esta categoría, equivalente a **L24,681.8 millones** de un total de L31,653.0 millones. Dentro de este grupo destacan la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (L10,834.3 millones) y la Secretaría de Infraestructura y Transporte (L10,035.5 millones), que en conjunto representan el 68.5% de los recursos asignados a la FBKF, las otras tres instituciones son ENEE (L1,926.5 millones), CONDEPOR (L964.9 millones) y Poder Judicial (L920.6 millones). En términos de ejecución financiera, estas cinco instituciones registran un devengado acumulado de L11,151.1 millones, equivalente al 93.7% del total ejecutado en la FBKF (L11,902.7 millones), evidenciando una alta concentración tanto de los recursos como de la ejecución en un reducido número de entidades públicas.

Estas inversiones en capital fijo se concentran principalmente en transferencias de capital a gobiernos locales; atención a la red vial nacional; operación y mantenimiento de los sistemas de generación transmisión y distribución del sistema de energía eléctrica nacional; construcción, mantenimiento y conservación de instalaciones deportivas, recreativas y administrativas; y fortalecimiento institucional.

1.8 EJECUCIÓN FÍSICA A NIVEL DE SECTORES:

Los avances correspondientes al Segundo Trimestre 2026 de la ejecución física en relación con el Plan de Inversión Pública y a Nivel Sectorial bajo las diferentes instituciones públicas, se presentan a continuación:

1.8.1 Sector Carreteras:

1.8.1.1 Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT)

Al cierre del segundo trimestre de 2026, la SIT construyó y rehabilitó **77 kilómetros de carreteras** a nivel nacional por medio de proyectos de inversión pública (Programa 11 – Construcción de Carreteras y Programa 12 – Rehabilitación de Carreteras). De igual forma, durante el trimestre, se realizó el mantenimiento de **174.6 kilómetros de carretera** en la red vial pavimentada, **7,640 metros cúbicos** de obras para el control de inundaciones en el Valle de Sula y **43.4 kilómetros** de obras urbanas a nivel nacional, entre otras inversiones realizadas.

Se detallan los avances físicos al segundo trimestre del 2026 de los principales proyectos:

- **Rehabilitación con Concreto Hidráulico de la Carretera CA-6, Tramo: "Tegucigalpa (Posta de Villa Vieja) - Empalme Concreto Hidráulico Neteapa (Desvío a Moroceli)", con una Longitud de 50.5 Km.**

El proyecto está ejecutado por sub tramos, los cuales tienen un avance físico acumulado del **87%** equivalente a **36.8 kilómetros** de carretera rehabilitada con concreto hidráulico de acuerdo con el siguiente detalle:

- Sub tramo Desvío a Tatumbla – Desvío a Pinares de Uyuca y ampliación a 4 carriles del puente peatonal de villa Nueva a Posta Villa Vieja (6.8 km): el sub tramo tiene un avance del 100%, correspondiente a 6.6 km de carretera construida.
- Sub tramo Desvío a Pinares de Uyuca – El Zamorano (desvío a Guinope) (14.9 km): El sub tramo tiene un avance del 64% correspondiente a 9.5 km de carretera construida.

Dirección General de Inversiones Públicas

- Sub tramo El Zamorano (desvío a Guinope) – Las Mesas (desvío al Batallón): El tramo finalizó su ejecución en el mes de enero de 2025, entregando un total de 9.44 km de carretera construida.
 - Sub tramo Las Mesas (Desvío al Batallón) – Ojo de Agua (Desvío a Villa de San Francisco): El tramo finalizó su ejecución en el mes de febrero de 2025, entregando un total de 11.1 km de carretera construida.
- **Construcción y pavimentación con carpeta asfáltica del tramo carretero: "La ENA - San José de Río Tinto - Dulce Nombre de Culmí, subtramo La Ena - El Pataste", ruta N-83**

El proyecto está ejecutado por sub tramos, los cuales tienen un avance físico del 80% equivalente a **26.35 kilómetros** de carretera rehabilitada con concreto hidráulico de acuerdo con el siguiente detalle:

- Sub tramo La ENA – El Aguacate (16.15 km): el sub tramo tiene un avance del 60.0%, correspondiente a 9.75 km de carretera construida.
 - Sub tramo El Aguacate – El Pataste (16.60 km): El sub tramo tiene un avance del 100% correspondiente a 16.6 km de carretera construida.
- **Rehabilitación con Concreto Hidráulico de la Carretera de Occidente, Tramo: Cucuyagua - Ocotepeque - El Poy - Ocotepeque - Agua Caliente (CA-4, CA-10), con una Longitud de 93.6 Km.**

El proyecto está ejecutado por sub tramos, los cuales tienen un avance físico del 90% equivalente a **84.2 kilómetros** de carretera rehabilitada con concreto hidráulico de acuerdo con el siguiente detalle:

- Sub tramo Desvío Sensenti – Cucuyagua (21.8km): el sub tramo tiene un avance del 100%, correspondiente a **21.8 km** de carretera construida.
- Sub tramo El Portillo - Desvío Sensenti (21.8 km): El sub tramo tiene un avance del 100% correspondiente a **21.8 km** de carretera construida.
- Sub tramo Ocotepeque – El Portillo (20.0 km): el sub tramo tiene un avance del 53% correspondiente a **10.6 km** de carretera construida.
- Sub tramo Ocotepeque – El Poy (**8.0 km**): el sub tramo tiene un avance del 100.0% el cual conecta la zona occidental del país con la Aduana El Poy.
- Sub tramo Ocotepeque – Agua Caliente (22.0 km): el sub tramo tiene un avance del 100% correspondiente a **22.0 km** de carretera construida.

➤ **Libramiento Anillo Periférico CA-5 Sur**

Las obras registran un **avance físico del 47.8%**, en actividades preliminares, movimientos de tierra y drenaje menor principalmente. Incluyen los siguientes componentes de ingeniería: Intercambiador a desnivel en La Cañada; Túnel hacia Altos de Santa Rosa; e Intercambiador en la zona de El Tizatillo. La orden de inicio para las obras del proyecto se dio oficialmente el 29 de septiembre de 2025 (contratos de supervisión y obra suscritos entre junio y julio de 2025).

Dirección General de Inversiones Públicas

➤ Programa de Carreteras Resilientes de Honduras (PCR-HN)

A la fecha, el único tramo en ejecución es la carretera Danlí – Trojes, de 78 kilómetros. Para optimizar su construcción, se ha dividido en tres lotes, los cuales iniciaron su ejecución física en julio de 2025 y se describen a continuación:

- **Lote 1: Danlí – El Empalme (22.8 km)**, finaliza el 31 de diciembre de 2026. Presenta un avance físico del 94.3% (21.5 km intervenidos).
- **Lote 2: El Empalme – El Chaparral (27.59 km)**, finaliza el 30 de junio de 2027. Presenta un avance físico del 70.7% (19.5 km intervenidos).
- **Lote 3: El Chaparral – Trojes (27.59 km)**, finaliza el 30 de junio de 2027. Presenta un avance físico del 58.7% (16.2 km intervenidos).

El 14 de mayo de 2026 se suscribió el contrato para el diseño y mejoramiento de la carretera Ojo de Agua – Cantarranas (30.9 Km) y se pagó un primer 10% de anticipo para iniciar la ejecución del contrato respecto a los trabajos de estudios de investigación y diseño.

1.8.2 Sector Modernización del Estado

1.8.2.1 Instituto Nacional de Estadística (INE)

➤ Programa Censo de Población y Vivienda y Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional

Al cierre del segundo trimestre de 2026, el Programa de Apoyo al **Censo de Población y Vivienda y Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional**, registra un avance físico del 44% según el Plan de Ejecución Plurianual, con hitos clave finalizados al 100%: actualización cartográfica de los 298 municipios, censo piloto en Orica, boleta censal socializada, adquisición de 16,200 tabletas, indumentaria censal y manual de reclutamiento masivo. Adicionalmente, se reporta un avance del 80% en carnés de identificación y 60% en la campaña de comunicación. El CNPV se ejecutará en un período de 60 días entre agosto y octubre de 2026, lo que exige un aceleramiento significativo de los desembolsos y de la logística operativa.

1.8.2.2 Registro Nacional de las Personas

➤ Fortalecimiento del Ecosistema Nacional de Registros Civil e Identificación en Honduras

Al cierre del segundo trimestre de 2026, el proyecto registra avances físicos principalmente en la identificación de niñas, niños y adolescentes (NNA) de 6-17 años (iniciada en Tegucigalpa y San Pedro Sula, con despliegue nacional previsto para agosto), el despliegue de equipamiento para modernizar los 298 Centros de Registro Municipal y Regional, y la puesta en marcha del Mecanismo de Atención al Ciudadano (MAC).

También están en proceso de adquisición la infraestructura del nuevo Centro de Datos y los kioscos de autoservicio. Adicionalmente, se mantiene operativa la aplicación móvil para confirmación de datos de menores.

Sin embargo, la implementación física del sistema automatizado de registro de nacimientos y las brigadas móviles aún no ha iniciado, al encontrarse en etapas de contratación y diseño. Con aproximadamente el 62% del tiempo de ejecución transcurrido, la mayor parte de la ejecución

Dirección General de Inversiones Públicas

física queda concentrada en los próximos trimestres, por lo que el proyecto requiere acelerar contrataciones e implementación operativa.

1.8.2.3 Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (SETRASS)

➤ Programa de Apoyo para la Inserción Laboral en Honduras PAILH

Al cierre del segundo trimestre de 2026, el PAILH avanza con trece consultores individuales contratados y la ejecución de sus procesos prioritarios de contratación: firma de capacitación en Educación y Formación Técnica Profesional (EFTP), rehabilitación de tres oficinas regionales de empleo, supervisión de dichas obras, y consultora para el fortalecimiento de los sistemas informáticos del Servicio Integral de Empleo. Paralelamente, se prepararon TDR y especificaciones técnicas de las demás adquisiciones previstas.

Se ejecutó el Taller de Arranque (15–17 de abril en Tegucigalpa) con BID, SETRASS, SRECI y SEDESOL, producto del cual se suscribió la ayuda memoria, se ajustaron el PEP y el Plan de Adquisiciones y se obtuvo la No Objeción del BID.

1.8.3 Sector Transporte y Obras Públicas

1.8.3.1 Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT)

➤ Reconstrucción del Puente No. 1 (Viejo Tangente) y Rehabilitación del Puente No. 2 (Nuevo Curvo) sobre la Laguna de Alvarado, ubicado en Puerto Cortés, Departamento de Cortés.

La ejecución del proyecto presenta un **avance físico global del 100%**, mediante la reconstrucción del Puente No. 1 (Viejo Tangente) con una longitud de 150 metros lineales y la rehabilitación del Puente No. 2 (Nuevo, Curvo) con una longitud de 150 metros lineales, encontrándose en la etapa de cierre financiero y administrativo.

1.8.4 Sector Agua y Saneamiento

1.8.4.1 Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)

➤ Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana

En términos de avance físico, al cierre del segundo trimestre del 2026 la SAG reporta ejecución en los subproyectos de obras civiles de Puerto Cortés, Choloma y Danlí con avances físicos significativos en las obras de rehabilitación de los sistemas de agua potable, destacando la instalación de tuberías y conexiones domiciliarias en Choloma; la ejecución de obras en redes de distribución, tanques y líneas de conducción en Danlí y La Paz; así como el avance en las actividades constructivas y el pago de estimaciones correspondientes al subproyecto de Puerto Cortés.

Por otra parte, como resultado de la reestructuración financiera del proyecto acordada con el Banco Mundial, se determinó la cancelación de los procesos correspondientes a los subproyectos de San Marcos de Colón, Comayagua (Fases I y II) y Juticalpa, priorizando las inversiones con mayor viabilidad de ejecución dentro del período restante del proyecto.

En cuanto al fortalecimiento institucional del ERSAPS, al cierre del trimestre se dio continuidad al monitoreo del Marco de Resultados del Proyecto, la actualización de indicadores, el

Dirección General de Inversiones Públicas

fortalecimiento de los sistemas: Sistema de Monitoreo y Evaluación (SIME) y Sistema de Información de Agua Potable y Saneamiento (SIRAPS), el seguimiento a los Programas de Control de Calidad del Agua y la evaluación del desempeño de los prestadores de servicios. Asimismo, se realizaron actividades de asistencia técnica para el fortalecimiento de las instancias regulatorias municipales, el acompañamiento a nuevos modelos de gestión y el seguimiento a los acuerdos de mejora suscritos con los prestadores.

1.8.4.2 Alcaldía Municipal de Distrito Central (AMDC)

➤ Proyecto: Fortalecer los Servicios de Agua Potable de Tegucigalpa

Durante el segundo trimestre 2026, se reactivó y avanzó la contratación de las obras de sectores hidráulicos mediante un segundo proceso licitatorio, completándose las evaluaciones, la No Objeción del Banco Mundial y la formalización del contrato del Lote 1, dejando las condiciones listas para el inicio de obras en julio de 2026.

Adicionalmente, se continuó el proceso de contratación para la construcción y equipamiento del Laboratorio de Limnología, concluyéndose la evaluación de ofertas y las notificaciones de intención de adjudicación, paso clave para la formalización del contrato y el fortalecimiento de las capacidades de investigación y monitoreo de los recursos hídricos.

1.8.5 Sector Seguridad y Defensa

1.8.5.1 Secretaría de Seguridad (SEDS)

➤ Programa Modernización Integral y Profesionalización de los Servicios de la Policía Nacional de Honduras.

Al cierre del segundo trimestre de 2026, el Programa registra un avance físico acumulado del **22%**, correspondiente principalmente a actividades preparatorias, estudios, diseños y procesos de contratación.

En el Componente 1: se formalizó la contratación de la consultoría para la Política Integral de Seguridad Ciudadana 2026–2030 y se elaboraron los Términos de Referencia para la carpeta conceptual de desarrollo organizacional de la Policía y la estrategia de prevención de faltas disciplinarias con enfoque de género. En educación policial, se prepararon los TDR para el Supervisor del grupo de trabajo y para la interconexión entre los sistemas de gestión académica e institucional.

El diseño de la ANAPO avanza bajo criterios de género, inclusión y estándares EDGE, con inicio de obras previsto para diciembre de 2026.

1.8.6 Sector Salud

1.8.6.1 Secretaría de Salud (SESAL)

➤ Programa Diseño, Construcción y Equipamiento del Nuevo Hospital en las Ciudades de Choluteca y Tocoa Como Apoyo a la Red Hospitalaria de la República de Honduras (PARH).

Al cierre del segundo trimestre 2026, el PARH reporta:

Dirección General de Inversiones Públicas

- Hospital Regional del Sur (Choluteca): preinversión casi concluida (97.45%), construcción en 55.80% y equipamiento iniciado (13.79%).
- Hospital San Isidro (Tocoa): preinversión culminada (100%), construcción en 22.77% y equipamiento aún sin iniciar (0%).

➤ **Programa de Construcción y Equipamiento de Tres Hospitales (Tegucigalpa, San Pedro Sula y Roatán) para el Fortalecimiento de la Red Hospitalaria en Honduras.**

Al cierre del segundo trimestre 2026, el programa reporta un avance global físico del 9%. La **Construcción y Equipamiento del Hospital de Roatán** es la obra más avanzada con 44% de ejecución física, donde se ejecutan trabajos de demolición, instalaciones de HVAC, gases medicinales, agua, electricidad y telecomunicaciones. Para el **Hospital de Trauma de San Pedro Sula**, los pliegos fueron enviados al BID para no objeción y se realizó la visita de campo con oferentes. Además, se ajustó el convenio de becas SESAL-UNAH y se inició la hoja de ruta para la reconfiguración de la red de salud de Islas de la Bahía.

➤ **Programa Respuesta Inmediata de Salud para Contener y Controlar El Coronavirus (COVID-19) y Mitigar su Efecto en la Prestación del Servicio, en Honduras (RISP-HO-2):**

Al cierre del segundo trimestre 2026, el RISP-HO-2 registra un avance físico del **88%**. Se canceló la adecuación del Centro de Datos de SESAL, reasignando los fondos a la adquisición y reparación de equipo médico y no médico para cuatro hospitales prioritarios a fin de reducir la mora quirúrgica. Se presentó al BID el informe de adquisición de generadores eléctricos para cinco hospitales, se pagaron las estimaciones de obra de la subestación eléctrica del Hospital Escuela, y se ejecutaron gestiones de supervisión de obras, entrega de equipos e inspección de bodegas.

➤ **Proyecto de Servicios Esenciales de Salud y Preparación ante Emergencias (RESHAPE):**

El proyecto RESHAPE reporta 918,958 personas atendidas con servicios esenciales de salud, nutrición y población, de ellas, 452,794 mujeres y 917,778 niños inmunizados. Se atendieron 1,180 partos por personal sanitario certificado y el 31.28% de las embarazadas acudió a su primer control prenatal con 12 semanas o menos de gestación. En vigilancia epidemiológica, 8 laboratorios regionales confirmaron casos sospechosos de dengue y 1,170 establecimientos de salud reportaron datos al Sistema Integrado de SESAL.

1.8.7 Sector Desarrollo Productivo

Los principales rubros de inversión están enfocados en la ejecución de Planes de Negocios, implementación de Sistemas de Riego, el incremento de los ingresos de las poblaciones rurales en el Corredor Seco a fin de prepararse para los efectos del cambio climático y abordar la inseguridad alimentaria. La Secretaría de Agricultura y Ganadería reporta los siguientes avances físicos:

Dirección General de Inversiones Públicas

1.8.7.1 Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)

➤ Proyecto de Desarrollo Rural y Productividad (SAG-ProOccidente)

ProOccidente reporta la implementación de 75 planes de inversión con tecnologías climáticamente inteligentes que benefician a 1,915 productores en 26 municipios, 150 eventos de asistencia técnica con 2,249 participantes, y la aprobación de 9 planes de manejo de microcuencas que cubren más de 15,400 hectáreas.

Además, se aprobaron 25 planes de inversión y 25 dirigidos a MIPYMES lideradas por mujeres, se emitieron 49 constancias de financiamiento y se colocaron 92 préstamos productivos por L21.99 millones. Paralelamente, se avanzó en la planificación de herramientas TIC para mercados, asistencia técnica y control fitosanitario, y se presentó al BID la propuesta del nuevo Sistema de Monitoreo y Evaluación.

➤ Proyecto de Inclusión Económica y Social de Pequeños Productores Rurales en la Región Noreste de Honduras (PROINORTE)

Al cierre del segundo trimestre 2026, PROINORTE registra una atención acumulada de 5,361 beneficiarios (58% hombres, 42% mujeres; 22% jóvenes y 13% pueblos indígenas), cumpliendo la meta trimestral de 2,150 beneficiarios (100%). Se aprobaron 23 planes por el Comité Aprobador de Inversiones y se implementaron 12 planes de inversión/negocios. Asimismo, se atendió el 100% de la programación trimestral en asistencia técnica (95 eventos), 10 planes de negocios para la Región 2 y adopción de nuevas tecnologías en 20 organizaciones. Las cadenas productivas priorizadas siguen siendo granos básicos, cacao, arroz, ganadería, lácteos y piscicultura.

1.8.8 Sector Forestal

1.8.8.1 Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF)

➤ Rehabilitación y Reforestación Tecnificada de Fincas de Café en Agrobosques Sostenibles y Productivos en Varias Regiones Cafetaleras de Honduras "AGROBOSQUE"

El proyecto AGROBOSQUE culminó durante el trimestre, la identificación y georreferenciación de 3,650 hectáreas aptas para sistemas agroforestales a nivel nacional. En mega viveros, se tienen 12,551,936 plantas (café y forestales) en camas de crecimiento, en proceso hacia la meta de 15 millones, aunque aún sin plantas listas para entrega. Además, se ejecutaron 21 eventos de capacitación en prácticas sostenibles con enfoque de cambio climático, género e inclusión.

➤ Fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras - SINAPH (LIFEWEB)

Al cierre del segundo trimestre 2026, el proyecto LifeWeb aprobó 5 Planes de Acción Ambientales y Sociales (PAAS) para áreas protegidas del Grupo B y formalizó contratos de administración con organizaciones implementadoras en áreas priorizadas. Las áreas del Grupo A avanzan en gestión integral, conservación de ecosistemas y gobernanza. Se ejecutaron patrullajes terrestres y marino-costeros, se fortalecieron cuadrillas comunitarias contra incendios y la vigilancia de amenazas, mientras se impulsaron alternativas productivas sostenibles y participación ciudadana.

➤ Diseño e Implementación de un Piloto del Sistema para Asegurar la Legalidad de la Madera en Bosque de Pino (SALH):

Dirección General de Inversiones Públicas

El proyecto SALH ejecutó 7 inspecciones a planes de manejo y operativos anuales, 6 acciones de monitoreo en puestos de control y regeneración natural, y desplegó operativos contra la tala ilegal. El puesto de control de Los Jobos registró 333 mediciones que totalizaron 343,379 m³ de madera y 411,737 toneladas de biomasa durante abril.

1.8.9 Sector Cultura Artes y Deportes

1.8.9.1 Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras (SECAPPH)

➤ Proyecto Potenciación de Industrias Culturales y Creativas en los Clúster de Música y Artes Plásticas de Honduras (PICCCMAH).

Al cierre del segundo trimestre de 2026, el proyecto registra los siguientes avances físicos:

El proyecto presenta un avance de restauración 213 metros cuadrados en la restauración al Teatro Nicolás Avellaneda, ubicado en la ciudad de Comayagüela, lo que representa el 36% de la meta programada del año. Asimismo, se reporta un avance de 724 metros cuadrados de restauración en el Teatro Manuel Bonilla, ubicado en Tegucigalpa, equivalente al 37% de lo programado. Elaborada la estrategia de marketing para potenciar a los y las artistas de artes plásticas a nivel nacional e internacional por medio de una Galería Virtual y desarrollada estrategia de marketing nacional para impulsar a nivel nacional e internacional el sello discográfico.

1.9 ANÁLISIS DE IMPACTO SOCIAL QUE OBSTACULIZARON LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA.

Durante el segundo trimestre de 2026 persistieron los efectos derivados de la transición gubernamental, reflejados en ajustes en la estructura institucional y en la rotación de personal de las unidades ejecutoras de inversión pública. Asimismo, la reducción de recursos humanos técnicos, producto de la conclusión de contratos sin las autorizaciones correspondientes por el nuevo gobierno, incidió negativamente en la capacidad de gestión de los proyectos. Adicionalmente, la falta de aprobación por parte del Congreso Nacional a los contratos que trascendieron el periodo de gobierno continuó afectando el desarrollo oportuno de las inversiones públicas.

La limitada disponibilidad de técnicos y profesionales especializados en áreas estratégicas de la gestión pública y las finanzas constituye un factor que afecta la planificación, supervisión y ejecución eficiente de los proyectos, generando retrasos en la toma de decisiones y riesgos de carácter técnico, y demoras en la toma de decisiones. Asimismo, la alta rotación de personal derivada de cambios administrativos en las instituciones públicas dificulta la continuidad de las iniciativas, obliga a la reinducción de equipos y, en algunos casos, a la revisión o reinicio de procesos previamente avanzados. Esta situación repercute en el cumplimiento oportuno de los objetivos de inversión, retrasando la ejecución de obras e intervenciones prioritarias en sectores como salud, educación, infraestructura, seguridad alimentaria y desarrollo productivo. Como consecuencia, se limita el acceso de la población a los beneficios esperados de los proyectos, se reducen las oportunidades de empleo y se restringe la incorporación de nuevas tecnologías y mejores prácticas productivas, afectando el desarrollo económico local y la calidad de vida de los habitantes.

La prolongación en la ejecución de los proyectos genera un aumento en los costos a largo plazo, incluyendo mayores gastos administrativos para las unidades ejecutoras, incrementos en los precios de materiales y equipos, así como la necesidad de realizar ajustes contractuales en los convenios de crédito, entre otros impactos.

Dirección General de Inversiones Públicas

Con el propósito de mitigar estos riesgos y promover la continuidad de las inversiones estratégicas, la Secretaría de Finanzas (SEFIN), a través de la Dirección General de Inversiones Públicas (DGIP), mantiene un seguimiento permanente a la ejecución física y financiera de los proyectos, impulsando acciones orientadas a fortalecer la capacidad de ejecución institucional, promoviendo la identificación temprana de cuellos de botella, la formulación de planes de acción para atender atrasos, la coordinación interinstitucional para agilizar gestiones administrativas y financieras, y la emisión de recomendaciones técnicas que permitan anticipar riesgos que puedan afectar el cumplimiento de metas, a fin de garantizar la continuidad de los proyectos, optimizar el uso de los recursos públicos y asegurar que los beneficios de la inversión lleguen oportunamente a la población.

Para ello, se desarrollan revisiones de cartera con los organismos de financiamiento, reuniones periódicas con las máximas autoridades y equipos técnicos de las instituciones ejecutoras, en las que se revisan las proyecciones de ejecución, la programación de desembolsos, el avance de los procesos de contratación y adquisiciones, así como otros factores críticos que impactan en el desempeño de los proyectos de inversión pública.

1.10 FACTORES QUE HAN INCIDIDO EN LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA, EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026.

Durante la ejecución de programas y proyectos, se presenta una serie de obstáculos que limitan la normal ejecución de estos, en términos físicos y financieros, sin cumplir el objetivo esperado, y por ende la ausencia de impacto en la población meta. Entre los problemas relevantes sobresalen:

Área	Problemas	Acciones
Técnica	Planificación deficiente, lo que implica retrasos y reprogramaciones. Falta de estudios de preinversión, conlleva ajustes, mayores costos y plazos.	Se requiere que la Secretaría de Finanzas y los organismos financiadores: Fortalecer asistencia técnica a unidades ejecutoras. Exigir cumplimiento de estándares de preinversión antes de aprobar proyectos.
Administrativa-Financiera	Debilidades en la gestión administrativa y financiera, planificación inconsistente y alta rotación de personal, que generan retrasos en contratación, ejecución y desembolsos, además de ineficiencia en el uso de recursos.	Fortalecer capacidades técnicas, mejorar la planificación financiera, optimizar procesos de ejecución y contratación, y asegurar la continuidad del personal clave con mayor supervisión institucional.
Legal	Los proyectos han sido afectados por la transición por cambio de gobierno en enero 2026 y la reestructuración institucional en el cual se trasladan proyectos a nuevas instituciones (Decreto Ejecutivo PCM-004-2026).	Fortalecer las capacidades legales de las unidades ejecutoras mediante capacitación continua en normativa de contratación pública, gestión contractual y regulaciones de los organismos financiadores.

Dirección General de Inversiones Públicas

Área	Problemas	Acciones
	Retrasos y suspensión por falta de aprobación legislativa de contratos de obra y supervisión que trascendieron periodo de Gobierno.	Las Instituciones Ejecutoras de Proyectos deberán promover una coordinación más efectiva entre las áreas técnicas, administrativas y legales, asegurando una gestión integral que facilite el cumplimiento normativo y la ejecución eficiente de los proyectos.

ANEXO No.1
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública / Dirección General de Inversiones Públicas
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE, 2016
Cifras en Lempiras

Institución / Programa o Proyecto	Convencio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado II Trimestre				Total Fondos Nacionales	Ejecutado Anual (Devengado)			Total Fondos Nacionales	Ejecutado Anual (Devengado)		
		Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total General	Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total General	Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total General	% Ejecución (Dev./Vig.)		Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total General		Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total General
I. Inversión Productiva																			
0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social		6,186,768,724	9,943,703,032	16,130,471,756	5,123,341,533	9,360,828,400	14,484,169,933	646,219,831	1,246,093,150	1,892,612,981	13.1%		1,960,008,103	1,632,672,412	3,592,680,515	24.8%			
Ampliación del Polideportivo Ramón Díaz López, Etapa II, ubicado en Catacamas, Departamento de Olancho		49,407,087	775,706,770	825,113,857	42,901,185	775,706,770	818,607,955	1,433,997	116,326,432	117,760,428	14.4%		1,433,997	118,653,985	120,087,981	14.7%			
		6,505,902	-	6,505,902	-	-	-	-	-	-	0.0%		-	-	-	0.0%			
Total Ampliación del Polideportivo Ramón Díaz López, Etapa II, ubicado en Catacamas, Departamento de Olancho		6,505,902	-	6,505,902	-	-	-	-	-	-	0.0%		-	-	-	0.0%			
Construcción del Primer Hospital Garfuna en el Municipio de Iruya, Departamento de Colón	FN-25984-1	30,000,000	-	30,000,000	30,000,000	-	30,000,000	-	-	-	0.0%		-	-	-	0.0%			
Total Construcción del Primer Hospital Garfuna en el Municipio de Iruya, Departamento de Colón		30,000,000	-	30,000,000	30,000,000	-	30,000,000	-	-	-	0.0%		-	-	-	0.0%			
CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JOVENES EN HONDURAS FASE III	KfW 2018-676-61	9,846,678	132,819,384	142,666,062	9,846,678	132,819,384	142,666,062	1,154,667	8,847,551	10,002,218	7.0%	1,154,667	8,847,551	10,002,218	7.0%				
TOTAL CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JOVENES EN HONDURAS FASE III		9,846,678	132,819,384	142,666,062	9,846,678	132,819,384	142,666,062	1,154,667	8,847,551	10,002,218	7.0%	1,154,667	8,847,551	10,002,218	7.0%				
PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)	BMZ 2016 68 761	3,054,507	52,041,350	55,095,857	3,054,507	52,041,350	55,095,857	279,330	3,018,318	3,297,648	6.0%	279,330	3,018,318	3,297,648	6.0%				
TOTAL PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)		3,054,507	52,041,350	55,095,857	3,054,507	52,041,350	55,095,857	279,330	3,018,318	3,297,648	6.0%	279,330	3,018,318	3,297,648	6.0%				
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y FORMACION EDUCATIVA EN HONDURAS	BCIE - 2239	-	98,494,585	98,494,585	-	98,494,585	98,494,585	-	10,869,951	10,869,951	11.0%	-	10,869,951	10,869,951	11.0%				
TOTAL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y FORMACION EDUCATIVA EN HONDURAS		98,494,585	98,494,585	98,494,585	98,494,585	98,494,585	98,494,585	-	10,869,951	10,869,951	11.0%	-	10,869,951	10,869,951	11.0%				
PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE GRACIAS	BCIE-2261	-	10,829,246	10,829,246	-	10,829,246	10,829,246	-	2,154,479	2,154,479	19.9%	-	2,154,479	2,154,479	19.9%				
TOTAL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE GRACIAS		10,829,246	10,829,246	10,829,246	10,829,246	10,829,246	10,829,246	-	2,154,479	2,154,479	19.9%	-	2,154,479	2,154,479	19.9%				
Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras	6822-HN	-	481,522,205	481,522,205	-	481,522,205	481,522,205	-	91,436,333	91,436,333	19.0%	-	93,763,686	93,763,686	19.5%				
TOTAL Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras		481,522,205	481,522,205	481,522,205	481,522,205	481,522,205	481,522,205	-	91,436,333	91,436,333	19.0%	-	93,763,686	93,763,686	19.5%				
0028 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal		146,211,267	49,069,333	195,280,600	146,211,267	49,069,333	195,280,600	5,430,988	-	5,430,988	2.8%		46,033,833	-	46,033,833	23.6%			
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PILOTO DEL SISTEMA PARA ASEGURAR LA LEGALIDAD DE LA MADERA EN BOSQUE DE PINO	NDICI LA/2021/043-250	-	4,694,291	4,694,291	-	4,694,291	4,694,291	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%				
TOTAL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PILOTO DEL SISTEMA PARA ASEGURAR LA LEGALIDAD DE LA MADERA EN BOSQUE DE PINO		4,694,291	4,694,291	4,694,291	4,694,291	4,694,291	4,694,291	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%				
Fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras- SINAPI (LIFEWEB)	BMZ N202166984	4,734,790	44,375,062	49,109,852	4,734,790	44,375,062	49,109,852	652,623	-	652,623	1.3%	1,301,831	-	1,301,831	2.7%				
TOTAL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DE HONDURAS- SINAPI (LIFEWEB)		4,734,790	44,375,062	49,109,852	4,734,790	44,375,062	49,109,852	652,623	-	652,623	1.3%	1,301,831	-	1,301,831	2.7%				
Rehabilitación y Reforestación tecnificada de fincas de café en agroecosistemas sostenibles y productivos en varias regiones cafetaleras de Honduras "AGROBOSQUE"	FN-ICF-25751	-	141,476,477	141,476,477	-	141,476,477	141,476,477	-	4,778,365	4,778,365	3.4%	-	44,732,004	44,732,004	31.6%				
TOTAL Rehabilitación y Reforestación tecnificada de fincas de café en agroecosistemas sostenibles y productivos en varias regiones cafetaleras de Honduras "AGROBOSQUE"		141,476,477	141,476,477	141,476,477	141,476,477	141,476,477	141,476,477	-	4,778,365	4,778,365	3.4%	-	44,732,004	44,732,004	31.6%				
0050 - Secretaría de Educación		585,624	453,859,625	454,445,249	585,624	453,859,625	454,445,249	94,560	10,231,280	10,325,840	6.8%		94,560	11,430,446	11,525,006	7.6%			
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN PREBÁSICA EN HONDURAS	6560-HN TFOB218-HN	-	91,481,275	91,481,275	-	91,481,275	91,481,275	-	7,834,133	7,834,133	8.7%	-	9,133,479	9,133,479	10.0%				
		-	59,797,350	59,797,350	-	59,797,350	59,797,350	-	2,296,967	2,296,967	3.8%	-	2,296,967	2,296,967	3.8%				
TOTAL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN PREBÁSICA EN HONDURAS		585,624	453,859,625	454,445,249	585,624	453,859,625	454,445,249	94,560	10,231,280	10,325,840	6.8%	94,560	11,430,446	11,525,006	7.6%				
PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)	BMZ 2016 68 761	585,624	81,000	666,624	585,624	81,000	666,624	94,560	-	94,560	14.2%	94,560	-	94,560	14.2%				
TOTAL PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)		585,624	81,000	666,624	585,624	81,000	666,624	94,560	-	94,560	14.2%	94,560	-	94,560	14.2%				
PROGRAMA HACIA UNA EDUCACIÓN MÁS INCLUSIVA "TRANSFORMANDO LA ESCUELA RURAL"		-	302,500,000	302,500,000	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	-	0.0%			
TOTAL PROGRAMA HACIA UNA EDUCACIÓN MÁS INCLUSIVA "TRANSFORMANDO LA ESCUELA RURAL"		302,500,000	302,500,000	302,500,000	302,500,000	302,500,000	302,500,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%				
0050 - Secretaría de Salud		27,532,928	1,436,866,984	1,464,419,912	27,532,928	1,436,866,984	1,464,419,912	-	282,578,133	282,578,133	19.0%	-	303,066,844	303,066,844	20.4%				
APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 5008/BL-HO	5008/BL-HO	-	-	-	-	-	-	-	23,044,610	23,044,610	38.7%	-	8,911,080	8,911,080	38.7%				
TOTAL APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 5008/BL-HO		27,532,928	1,436,866,984	1,464,419,912	27,532,928	1,436,866,984	1,464,419,912	-	282,578,133	282,578,133	19.0%	-	303,066,844	303,066,844	20.4%				
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y DEL LABORATORIO NACIONAL DE VIGILANCIA (LNV) DE LA SALUD EN TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN	Acuerdo Donación No 1660400	27,532,928	148,917	27,701,845	27,532,928	148,917	27,701,845	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%				
TOTAL CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y DEL LABORATORIO NACIONAL DE VIGILANCIA (LNV) DE LA SALUD EN TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN		27,532,928	148,917	27,701,845	27,532,928	148,917	27,701,845	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%				
PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE TRES HOSPITALES (TEGUCIGALPA, SAN PEDRO SULA Y ROATÁN) PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RED HOSPITALARIA EN HONDURAS	BID 5790/BL-HO	-	575,566,138	575,566,138	-	575,566,138	575,566,138	-	76,427,368	76,427,368	18.1%	-	85,537,983	85,537,983	20.3%				
TOTAL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE TRES HOSPITALES (TEGUCIGALPA, SAN PEDRO SULA Y ROATÁN) PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RED HOSPITALARIA EN HONDURAS		575,566,138	575,566,138	575,566,138	575,566,138	575,566,138	575,566,138	-	76,427,368	76,427,3									

ANEXO No.1
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública / Dirección General de Inversiones Públicas
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE, 2016
Cifras en Lempiras

Institución / Programa o Proyecto	Convencio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado II Trimestre				Ejecutado Anual (Devengado)			
		Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total General	Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total General	Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total General	% Ejecución (Dev./Vig.)	Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total General	% Ejecución (Dev./Vig.)
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y OPERATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN ADUANERA	BID 5694/BL-HO	-	261,270,015	261,270,015	-	261,270,015	261,270,015	-	4,145,678	4,145,678	1.6%	-	7,289,302	7,289,302	2.8%
Total PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y OPERATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN ADUANERA		-	261,270,015	261,270,015	-	261,270,015	261,270,015	-	4,145,678	4,145,678	1.6%	-	7,289,302	7,289,302	2.8%
0410 - Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras		31,300,000	-	31,300,000	31,300,000	-	31,300,000	4,081,413	-	4,081,413	13.0%	7,700,425	-	7,700,425	24.6%
POTENCIACIÓN DE INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS EN LOS	FN-25305-1	31,300,000	-	31,300,000	31,300,000	-	31,300,000	4,081,413	-	4,081,413	13.0%	7,700,425	-	7,700,425	24.6%
Total POTENCIACIÓN DE INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS EN LOS		31,300,000	-	31,300,000	31,300,000	-	31,300,000	4,081,413	-	4,081,413	13.0%	7,700,425	-	7,700,425	24.6%
0411 - Secretaría de Infraestructura y Transporte		3,425,939,399	3,123,356,927	6,549,296,326	2,838,718,270	3,005,902,217	5,844,620,787	525,383,309	437,951,056	963,334,365	16.5%	1,718,829,825	503,507,573	2,222,337,398	38.0%
COMPLEJO CIENTÍFICO INDUSTRIAL DE HONDURAS PROYECTO LABORATORIO NACIONAL DE MOLECULAS BIOLÓGICAS, GENÉTICA Y PROTOTIPOS DE SALUD (COCINH LAB-HONDURAS)	FN-25387-1	-	877,722,640	877,722,640	-	25,239,034	25,239,034	-	-	-	0.0%	25,239,033	-	25,239,033	100.0%
Total COMPLEJO CIENTÍFICO INDUSTRIAL DE HONDURAS PROYECTO LABORATORIO NACIONAL DE MOLECULAS BIOLÓGICAS, GENÉTICA Y PROTOTIPOS DE SALUD (COCINH LAB-HONDURAS)		-	877,722,640	877,722,640	-	25,239,034	25,239,034	-	-	-	0.0%	25,239,033	-	25,239,033	100.0%
CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ANEXO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, UBICADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGÜELA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN	FN-23999-1	-	11,396,005	11,396,005	-	11,396,005	11,396,005	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
Total CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ANEXO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, UBICADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGÜELA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN		-	11,396,005	11,396,005	-	11,396,005	11,396,005	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DEL TRAMO CARRETERO: "LA ENA - SAN JOSÉ DE RÍO TINTO - DULCE NOMBRE DE CULMI, SUBTRAMO LA ENA - EL PATASTE", RUTA N-83	FN-25993-1	-	248,336,518	248,336,518	-	248,336,518	248,336,518	125,577,926	-	125,577,926	50.6%	189,984,112	-	189,984,112	76.5%
Total CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DEL TRAMO CARRETERO: "LA ENA - SAN JOSÉ DE RÍO TINTO - DULCE NOMBRE DE CULMI, SUBTRAMO LA ENA - EL PATASTE", RUTA N-83		-	248,336,518	248,336,518	-	248,336,518	248,336,518	125,577,926	-	125,577,926	50.6%	189,984,112	-	189,984,112	76.5%
CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL TRAMO CARRETERO: LA ENA - SAN JOSÉ DE RÍO TINTO - DULCE NOMBRE DE CULMI, SUB TRAMO: "PUENTE RÍO EL PATASTE - DULCE NOMBRE DE CULMI, SUB TRAMO: "PUENTE RÍO EL PATASTE - DULCE NOMBRE DE CULMI"	FN-24590-1	-	25,858,734	25,858,734	-	25,858,734	25,858,734	15,741,373	-	15,741,373	61.4%	18,487,122	-	18,487,122	72.1%
Total CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL TRAMO CARRETERO: LA ENA - SAN JOSÉ DE RÍO TINTO - DULCE NOMBRE DE CULMI, SUB TRAMO: "PUENTE RÍO EL PATASTE - DULCE NOMBRE DE CULMI"		-	25,858,734	25,858,734	-	25,858,734	25,858,734	15,741,373	-	15,741,373	61.4%	18,487,122	-	18,487,122	72.1%
CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN con Doble Tratamiento Superficial del Tramo Carretero: Via Rápida Tegucigalpa - Santa Lucía, Ubicado en el Departamento de Francisco Morazán, Honduras C.A.	BCH-20582-1	-	178,152,662	178,152,662	-	117,084,077	117,084,077	-	-	-	0.0%	2,479,289	-	2,479,289	2.1%
Total CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN con Doble Tratamiento Superficial del Tramo Carretero: Via Rápida Tegucigalpa - Santa Lucía, Ubicado en el Departamento de Francisco Morazán, Honduras C.A.		-	178,152,662	178,152,662	-	117,084,077	117,084,077	-	-	-	0.0%	2,479,289	-	2,479,289	2.1%
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN VIAL CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CORREDOR DE OCCIDENTE, TRAMO CARRETERO: "NACO - LA ENTRADA" (79.1 KM), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA BÁRBARA Y COPÁN	FN-24878-1	-	29,670,000	29,670,000	-	81,477,610	81,477,610	17,311,154	-	17,311,154	21.2%	7,115,066	-	7,115,066	87.3%
Total CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN VIAL CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CORREDOR DE OCCIDENTE, TRAMO CARRETERO: "NACO - LA ENTRADA" (79.1 KM), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA BÁRBARA Y COPÁN		-	29,670,000	29,670,000	-	81,477,610	81,477,610	17,311,154	-	17,311,154	21.2%	7,115,066	-	7,115,066	87.3%
Diseño, Construcción y Equipamiento de Hospital General ubicado en Santa Bárbara, municipio de Santa Bárbara, Aldea Inguava	FN-25476-1	-	307,331,339	307,331,339	-	307,331,339	307,331,339	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
Total Diseño, Construcción y Equipamiento de Hospital General ubicado en Santa Bárbara, municipio de Santa Bárbara, Aldea Inguava		-	307,331,339	307,331,339	-	307,331,339	307,331,339	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
Diseño, construcción y equipamiento de un Hospital Básico en el Municipio de Salamá, Olanchito	FN-25039-1	-	98,813,408	98,813,408	-	98,813,408	98,813,408	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
Total Diseño, construcción y equipamiento de un Hospital Básico en el Municipio de Salamá, Olanchito		-	98,813,408	98,813,408	-	98,813,408	98,813,408	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
Diseño, construcción y equipamiento del Hospital Básico de Ocotepaque, ubicado la Ciudad de Ocotepaque, Municipio de Ocotepaque, Departamento de Ocotepaque	FN-25485-1	-	151,994,801	151,994,801	-	151,994,801	151,994,801	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
Total Diseño, construcción y equipamiento del Hospital Básico de Ocotepaque, ubicado la Ciudad de Ocotepaque, Municipio de Ocotepaque, Departamento de Ocotepaque		-	151,994,801	151,994,801	-	151,994,801	151,994,801	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
Total Diseño, construcción y equipamiento del Hospital Básico de Ocotepaque, ubicado la Ciudad de Ocotepaque, Municipio de Ocotepaque, Departamento de Ocotepaque		-	151,994,801	151,994,801	-	151,994,801	151,994,801	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
Libramiento Anillo Periférico CA-5 Sur	BCIE 2221	-	309,053,335	309,053,335	-	306,900,809	306,900,809	44,049,706	-	44,049,706	9.0%	-	-	-	9.0%
Total Libramiento Anillo Periférico CA-5 Sur		-	309,053,335	309,053,335	-	306,900,809	306,900,809	44,049,706	-	44,049,706	9.0%	-	-	-	9.0%
Pavimentación con Concreto Hidráulico del Anillo Agrícola, Ruta 77, Tramos Carreteros: "El Bijaqual" y "San Francisco de Becerra - Catacamas" con una Longitud de 62.75 Km, Ubicado	FN-25430-1	-	588,232,333	588,232,333	-	591,722,423	591,722,423	184,083,408	-	184,083,408	31.1%	581,927,775	-	581,927,775	98.3%
Total Pavimentación con Concreto Hidráulico del Anillo Agrícola, Ruta 77, Tramos Carreteros: "El Bijaqual" y "San Francisco de Becerra - Catacamas" con una Longitud de 62.75 Km, Ubicado		-	588,232,333	588,232,333	-	591,722,423	591,722,423	184,083,408	-	184,083,408	31.1%	581,927,775	-	581,927,775	98.3%
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL ANILLO AGRÍCOLA, TRAMO CARRETERO: "EL BIJAGUAL - SAN FRANCISCO DE BECERRA (R77)", CON UNA LONGITUD DE 15.09 KM, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO	BCH-25234-1	-	27,430,681	27,430,681	-	40,113,124	40,113,124	13,699,609	-	13,699,609	34.2%	32,752,043	-	32,752,043	81.6%
Total PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL ANILLO AGRÍCOLA, TRAMO CARRETERO: "EL BIJAGUAL - SAN FRANCISCO DE BECERRA (R77)", CON UNA LONGITUD DE 15.09 KM, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO		-	27,430,681	27,430,681	-	40,113,124	40,113,124	13,699,609	-	13,699,609	34.2%	32,752,043	-	32,752,043	81.6%
Programa de Carreteras Resilientes de Honduras (PCR-HN)	BCIE 2333	-	112,170,000	2,160,466,059	2,272,636,059	112,170,000	2,159,238,875	-	303,884,174	303,884,174	17.1%	-	-	-	20.2%
Total Programa de Carreteras Resilientes de Honduras (PCR-HN)		-	112,170,000	2,160,466,059	2,272,636,059	112,170,000	2,159,238,875	-	303,884,174	303,884,174	17.1%	-	-	-	20.2%
Programa para incrementar la resiliencia ante inundaciones del Valle de Sula en Honduras	5875/BL-HO	-	169,768,024	169,768,024	-	169,768,024	169,768,024	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
Total Programa para incrementar la resiliencia ante inundaciones del Valle de Sula en Honduras		-	169,768,024	169,768,024	-	169,768,024	169,768,024	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
PROYECTO DE CONECTIVIDAD SOSTENIBLE DE HONDURAS	IDA-7672-HN	-	484,069,509	484,069,509	-	369,994,509	369,994,509	17,175	-	17,175	0.0%	-	-	-	0.0%
Total PROYECTO DE CONECTIVIDAD SOSTENIBLE DE HONDURAS		-	484,069,509	484,069,509	-	369,994,509	369,994,509	17,175	-	17,175	0.0%	-	-	-	0.0%
Reconstrucción del Puente No.1 (Viejo, Tangente) y Rehabilitación del Puente No.2 (Nuevo, Curvo) sobre la Laguna de Alvarado, ubicado en Puerto Cortés, Departamento de Cortés.	FN-25564-1	-	50,000,000	50,000,000	-	57,455,444	57,455,444	6,896,083	-	6,896,083	12.0%	14,351,525	-	14,351,525	25.0%
Total Reconstrucción del Puente No.1 (Viejo, Tangente) y Rehabilitación del Puente No.2 (Nuevo, Curvo) sobre la Laguna de Alvarado, ubicado en Puerto Cortés, Departamento de Cortés.		-	50,000,000	50,000,000	-	57,455,444	57,455,444	6,896,083	-	6,896,083	12.0%	14,351,525	-	14,351,525	25.0%
Rehabilitación con Concreto Hidráulico de la Carretera CA-6, Tramo: "Tegucigalpa (Posta de Villa Vieja) - Empalme Concreto Hidráulico Netepea (Desvío a Morceli)", con una Longitud de 50.5 Km, Ubicado	BCH-25378-1	-	158,847,501	158,847,501	-	167,121,001	167,121,001	63,924,001	-	63,924,001	38.3%	160,468,033	-	160,468,033	96.0%
Total Rehabilitación con Concreto Hidráulico de la Carretera CA-6, Tramo: "Tegucigalpa (Posta de Villa Vieja) - Empalme Concreto Hidráulico Netepea (Desvío a Morceli)", con una Longitud de 50.5 Km, Ubicado		-	158,847,501	158,847,501	-	167,121,001	167,121,001	63,924,001	-	63,924,001	38.3%	160,468,033	-	160,468,033	96.0%
REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA DE OCCIDENTE, TRAMO: CUCUYAGUA - OCOTEPEQUE - EL POY - OCOTEPEQUE - AGUA CALIENTE (CA-4, CA-10), CON UNA LONGITUD DE 91.6 KM	BCH-25341-1	-	379,184,229	379,184,229	-	563,236,502	563,236,502	57,813,080	-	57,813,080	10.3%	563,236,501	-	563,236,501	100.0%
Total REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA DE OCCIDENTE, TRAMO: CUCUYAGUA - OCOTEPEQUE - EL POY - OCOTEPEQUE - AGUA CALIENTE (CA-4, CA-10), CON UNA LONGITUD DE 91.6 KM		-	379,184,229	379,184,229	-	563,236,502	563,236,502	57,813,080	-	57,813,080	10.3%	563,236,501	-	563,236,501	100.0%
Rehabilitación del Tramo Carretero: "Sigatopeque - La Esperanza" (67.00 Km), Localizado en los Departamentos de Comayagua e Intibucá.	FN-24994-1	-	-	-	-	58,789,327	58,789,327	40,336,675	-	40,336,675	68.6%	58,789,325	-	58,789,325	100.0%
Total Rehabilitación del Tramo Carretero: "Sigatopeque - La Esperanza" (67.00 Km), Localizado en los Departamentos de Comayagua e Intibucá.		-	-	-	-	58,789,327	58,789,327	40,336,675	-	40,336,675	68.6%	58,789,325	-	58,789,325	100.0%
0413 - Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA USO DE LA POBLACIÓN A NIVEL NACIONAL	FN-25813	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
Total CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA USO DE LA POBLACIÓN A NIVEL NACIONAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
0414 - Dirección de Gestión por Resultados	BID 4942/BL-HO	58,532,398	191,451,277	249,983,675	58,532,398	305,526,277	364,058,675	-	9,691,782	9,691,782	2.7%	-	13,059,976	13,059,976	3.6%
Proyecto Transformación Digital para una Mayor Competitividad		58,532,398	191,451,277	249,983,675	58,532,398	305,526,277	364,058,675	-	9,691,782	9,691,782	2.7%	-	13,059,976	13,059,976	3.6%
Total Proyecto Transformación Digital para una Mayor Competitividad		58,532,398	191,451,277	249,983,675	58,532,398	305,526,277	364,058,675	-	9,691,782	9,691,782	2.7%	-	13,059,976	13,059,976	3.6%
0415 - Programa de la Red Solidaria		622,860,221	-	622,860,221	622,860,221	-	622,860,221	75,000,217	-	75,000,217	11.8%	80,151,669	-	80,1	

ANEXO No.1
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública / Dirección General de Inversiones Públicas
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE, 2016
Cifras en Lempiras

Institución / Programa o Proyecto	Convencio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado II Trimestre				Ejecutado Anual (Devengado)				
		Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total General	Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total General	Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total General	% Ejecución (Dev./Vig.)	Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total General	% Ejecución (Dev./Vig.)	
Total Programa para incrementar la resiliencia ante inundaciones del Valle de Sula en Honduras			11,476,838	11,476,838		11,476,838	11,476,838	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	
0905- Instituto Hondureño de Antropología e Historia		22,618,483		22,618,483	167,043		167,043	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	
FORTALECIMIENTO INTEGRAL IHAH PARA LA RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN, ACCESO INCLUSIVO E INVESTIGACIÓN EN SITIOS ARQUEOLÓGICOS	FN-2567-1	167,043		167,043	167,043		167,043	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	
Total FORTALECIMIENTO INTEGRAL IHAH PARA LA RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN, ACCESO INCLUSIVO E INVESTIGACIÓN EN SITIOS ARQUEOLÓGICOS		167,043		167,043	167,043		167,043	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	
Programa de apoyo para la habilitación y manejo de Sitios Arqueológicos, promoción, protección, conservación, valorización histórica y transmisión a las generaciones futuras de los bienes que conforma el Patrimonio Cultural de Honduras		22,451,440		22,451,440	-		-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	
Total Programa de apoyo para la habilitación y manejo de Sitios Arqueológicos, promoción, protección, conservación, valorización histórica y transmisión a las generaciones futuras de los bienes que conforma el Patrimonio Cultural de Honduras		22,451,440		22,451,440	-		-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	
0511- Universidad de Ciencias Forestales		12,200,000		12,200,000	12,200,000		12,200,000	205,582		205,582	1.7%	205,582		205,582	1.7%	
Construcción, ampliación y remodelación de obras de infraestructura en el campus central de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales	FN-2575	12,200,000		12,200,000	12,200,000		12,200,000	205,582		205,582	1.7%	205,582		205,582	1.7%	
Total Construcción, ampliación y remodelación de obras de infraestructura en el campus central de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales		12,200,000		12,200,000	12,200,000		12,200,000	205,582		205,582	1.7%	205,582		205,582	1.7%	
0515- Instituto Nacional de Estadísticas		510,408,559		510,408,559	510,408,559		510,408,559	18,887,897		18,887,897	3.7%	21,533,211		21,533,211	4.2%	
PROGRAMA DE APOYO AL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL	5832/BL-HO		510,408,559	510,408,559		510,408,559	510,408,559		18,887,897	18,887,897	3.7%		21,533,211	21,533,211	4.2%	
Total PROGRAMA DE APOYO AL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL			510,408,559	510,408,559		510,408,559	510,408,559		18,887,897	18,887,897	3.7%		21,533,211	21,533,211	4.2%	
0515- Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación		73,106,231		73,106,231	73,106,231		73,106,231	-		-	0.0%	-		-	0.0%	
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE SENACT/ IHCITI PARA BRINDAR SERVICIOS INTEGRADOS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICAS A LA POBLACIÓN DE HONDURAS	FN-25706-1	73,106,231		73,106,231	73,106,231		73,106,231	-		-	0.0%	-		-	0.0%	
Total FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE SENACT/ IHCITI PARA BRINDAR SERVICIOS INTEGRADOS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICAS A LA POBLACIÓN DE HONDURAS		73,106,231		73,106,231	73,106,231		73,106,231	-		-	0.0%	-		-	0.0%	
0703- Universidad Nacional de Agricultura		516,676,250		516,676,250	109,226,250		109,226,250	98,616,898		98,616,898	90.3%	98,616,898		98,616,898	90.3%	
Proyecto de Construcción y Equipamiento de Edificio Residencial para Estudiantes Mujeres "Xiomara Castro" en la Universidad Nacional de Agricultura, ubicado en la ciudad de Catacamas, departamento de	FN-25920-1	109,226,250		109,226,250	109,226,250		109,226,250	98,616,898		98,616,898	90.3%	98,616,898		98,616,898	90.3%	
Total Proyecto de Construcción y Equipamiento de Edificio Residencial para Estudiantes Mujeres "Xiomara Castro" en la Universidad Nacional de Agricultura, ubicado en la ciudad de Catacamas, departamento de		109,226,250		109,226,250	109,226,250		109,226,250	98,616,898		98,616,898	90.3%	98,616,898		98,616,898	90.3%	
Proyecto de Fortalecimiento de la Infraestructura y Equipamiento para el Desarrollo Social, Formativo e Investigativo en Varias Sedes de la Universidad Nacional de Agricultura (PRODESOFI-UNAG)	FN-25920-1	407,450,000		407,450,000	-		-	-		-	0.0%	-		-	0.0%	
Total Proyecto de Fortalecimiento de la Infraestructura y Equipamiento para el Desarrollo Social, Formativo e Investigativo en Varias Sedes de la Universidad Nacional de Agricultura (PRODESOFI-UNAG)		407,450,000		407,450,000	-		-	-		-	0.0%	-		-	0.0%	
0801- Empresa Nacional de Energía Eléctrica		1,283,792,222	860,159,371	2,143,951,593	1,270,591,222	681,509,238	1,952,100,460	9,097,433		33,034,318	42.131,750	2.2%	84,020,331	194,253,769	278,274,100	14.3%
Descarbonización de los Activos de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y Apoyo a la Sostenibilidad Financiera		13,201,000	127,838,453	141,039,453	-	-	-	-		-	0.0%	-	-	-	0.0%	
Total Descarbonización de los Activos de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y Apoyo a la Sostenibilidad Financiera		13,201,000	127,838,453	141,039,453	-	-	-	-		-	0.0%	-	-	-	0.0%	
APoyo AL PROGRAMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	BID-4508/BL-HO	52,854,375	226,472,884	279,327,259	52,854,375	226,472,884	279,327,259	220,191	9,814,917	10,035,108	3.6%	261,003	54,876,675	55,137,678	19.7%	
Total APOYO AL PROGRAMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA		52,854,375	226,472,884	279,327,259	52,854,375	226,472,884	279,327,259	220,191	9,814,917	10,035,108	3.6%	261,003	54,876,675	55,137,678	19.7%	
CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA MULTIPROPOSITO EL TABLÓN, ETAPA I	BCIE-2442	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	
Total CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA MULTIPROPOSITO EL TABLÓN, ETAPA I		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	
Construcción de un Sistema de Almacenamiento de Energía con Batería Conectado a la Red (BESS) de una Capacidad de 75MW/300MWh y sus Trabajos Asociados, en la Subestación Amarateca en el Distrito Cent	RP-ENEE-25939-1	680,420,000		680,420,000	680,420,000		680,420,000	-		-	0.0%	71,875,028		71,875,028	10.6%	
Total Construcción de un Sistema de Almacenamiento de Energía con Batería Conectado a la Red (BESS) de una Capacidad de 75MW/300MWh y sus Trabajos Asociados, en la Subestación Amarateca en el Distrito Cent		680,420,000		680,420,000	680,420,000		680,420,000	-		-	0.0%	71,875,028		71,875,028	10.6%	
Desarrollo Bajo en Carbono, Clímicamente Resistente e Inclusivo en las Cuencas de El Cajón y el Lago de Yojoa en Honduras			50,811,680	50,811,680	-		-	-		-	0.0%	-		-	0.0%	
Total Desarrollo Bajo en Carbono, Clímicamente Resistente e Inclusivo en las Cuencas de El Cajón y el Lago de Yojoa en Honduras			50,811,680	50,811,680	-		-	-		-	0.0%	-		-	0.0%	
MEJORA DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN LA REGIÓN CENTRO SUR (OLANCHO, EL PARAÍSO Y FCO MORAZÁN)-SECCIONAMIENTO LT L612/L613-ZAMORANO II-DANLI II-TERRERO BLANCO EN 230KV, CONSTRUCCION DE SE Y EXPANSION DE LT	FN-ENEE-25655	66,777,337		66,777,337	66,777,337		66,777,337	-		-	0.0%	-		-	0.0%	
Total MEJORA DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN LA REGIÓN CENTRO SUR (OLANCHO, EL PARAÍSO Y FCO MORAZÁN)-SECCIONAMIENTO LT L612/L613-ZAMORANO II-DANLI II-TERRERO BLANCO EN 230KV, CONSTRUCCION DE SE Y EXPANSION DE LT		66,777,337		66,777,337	66,777,337		66,777,337	-		-	0.0%	-		-	0.0%	
MEJORA DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN LOS DEPARTAMENTOS DE YORO Y COLÓN- CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN NEGRO-YORO DOS-ARENALES-COVULES CENTRAL DOS-REGULEITO Y CONSTRUCCION DE SE Y OBRAS CONEXAS	FN-ENEE-25644	55,665,387		55,665,387	55,665,387		55,665,387	-		-	0.0%	-		-	0.0%	
Total MEJORA DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN LOS DEPARTAMENTOS DE YORO Y COLÓN- CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN NEGRO-YORO DOS-ARENALES-COVULES CENTRAL DOS-REGULEITO Y CONSTRUCCION DE SE Y OBRAS CONEXAS		55,665,387		55,665,387	55,665,387		55,665,387	-		-	0.0%	-		-	0.0%	
PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL- RÍO LINDO	JICA HO-P6	319,504,123	332,444,354	651,948,477	319,504,123	332,444,354	651,948,477	7,663,411	-	7,663,411	1.2%	10,190,210	116,146,680	126,336,890	19.4%	
Total PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL- RÍO LINDO		319,504,123	332,444,354	651,948,477	319,504,123	332,444,354	651,948,477	7,663,411	-	7,663,411	1.2%	10,190,210	116,146,680	126,336,890	19.4%	
RENOVACION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN PARA FACILITAR EL	BID 5392/BL-HO	15,370,000	109,720,000	125,090,000	15,370,000	109,720,000	125,090,000	1,213,830	-	1,213,830	0.9%	1,694,090	23,230,414	24,924,504	12.2%	
Total RENOVACION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN PARA FACILITAR EL		15,370,000	109,720,000	125,090,000	15,370,000	109,720,000	125,090,000	1,213,830	23,219,401	24,433,231	11.2%	1,694,090	23,230,414	24,924,504	11.4%	
0803- Empresa Nacional Portuaria		461,109,545		461,109,545	434,329,545		434,329,545	-		-	0.0%	-		-	0.0%	
DISEÑO Y CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL MALECON DE PUERTO CORTÉS	RP-24869-1	235,834,106		235,834,106	235,834,106		235,834,106	-		-	0.0%	-		-	0.0%	
Total DISEÑO Y CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL MALECON DE PUERTO CORTÉS		235,834,106		235,834,106	235,834,106		235,834,106	-		-	0.0%	-		-	0.0%	
PROYECTO DE AMPLIACION DE LA TERMINAL MARITIMA DE GRANELES LIQUIDOS DE PUERTO CORTÉS	RP-24770-1	225,266,439		225,266,439	225,266,439		225,266,439	-		-	0.0%	-		-	0.0%	
Total PROYECTO DE AMPLIACION DE LA TERMINAL MARITIMA DE GRANELES LIQUIDOS DE PUERTO CORTÉS		225,266,439		225,266,439	225,266,439		225,266,439	-		-	0.0%	-		-	0.0%	
1801- Alcaldía Municipal del Distrito Central		160,313,478		160,313,478	160,313,478		160,313,478	15,485,920		15,485,920	9.7%	15,485,920		15,485,920	9.7%	
Proyecto para Fortalecer la Prestación de Agua Potable de Tegucigalpa	IDA 6460	160,313,478		160,313,478	160,313,478		160,313,478	15,485,920		15,485,920	9.7%	15,485,920		15,485,920	9.7%	
Total Proyecto para Fortalecer la Prestación de Agua Potable de Tegucigalpa		160,313,478		160,313,478	160,313,478		160,313,478	15,485,920		15,485,920	9.7%	15,485,920		15,485,920	9.7%	
2. Formación Bruta de Capital Fijo		30,780,270,622	1,318,824,878	32,099,095,500	31,410,312,107	242,844,717	31,653,056,824	8,782,037,246	59,015	8,782,097,161	27.7%	11,902,597,735	59,015	11,902,657,650	27.6%	
0002- Tribunal Superior de Cuentas		10,066,000		10,066,000	10,066,000		10,066,000	1,903,300		1,903,300	18.9%	1,903,300		1,903,300	18.9%	
CONTROL DEL MANEJO DE LOS RECURSOS PARA GARANTIZAR LA PROBIIDAD DE LA GESTION PÚBLICA		10,066,000		10,066,000	10,066,000		10,066,000	1,903,300		1,903,300	18.9%	1,903,300		1,903,300	18.9%	
Total CONTROL DEL MANEJO DE LOS RECURSOS PARA GARANTIZAR LA PROBIIDAD DE LA GESTION PÚBLICA		10,066,000		10,066,000	10,066,000		10,066,000	1,903,300		1,903,300	18.9%	1,903,300		1,903,300	18.9%	
0003- Comisionado Nacional de Derechos Humanos		902,424		902,424	902,424		902,424	-		-	0.0%	-		-	0.0%	
ACTIVIDADES CENTRALES		902,424		902,424	902,424		902,424	-		-	0.0%	-		-	0.0%	
Total ACTIVIDADES CENTRALES		902,424		902,424	902,424		902,424	-		-	0.0%	-		-	0.0%	
0004- Consejo Nacional Electoral		33,964,609		33,964,609	33,964,609		33,964,609	10,177,500		10,177,500	30.0%	10,177,500		10,177,500	30.0%	
PROCESO ELECTORAL		33,964,609		33,964,609	33,964,609		33,964,609	10,177,500		10,177,500	30.0%	10,177,500		10,177,500	30.0%	
Total PROCESO ELECTORAL		33,964,609		33,964,609	33,964,609		33,964,609	10,177,500		10,177,500	30.0%	10,177,500		10,177,500	30.0%	
0005- Tribunal de Justicia Electoral		427,700		427,700	427,700		427,700	35,600		35,600	8.3%	35,600		35,600	8.3%	
POLITICA DE JUSTICIA ELECTORAL		427,700		427,700	427,700		427,700	35,600		35,600	8.3%	35,600		35,600	8.3%	
Total POLITICA DE JUSTICIA ELECTORAL		427,700		427,700	427,700		427,700	35,600		35,600	8.3%	35,600		35,		

ANEXO No.1
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública / Dirección General de Inversiones Públicas
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EDUCACIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE, 2006
Cifras en Lempiras

Institución / Programa o Proyecto	Convencio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado II Trimestre				Ejecutado Anual (Devengado)			
		Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total General	Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total General	Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total General	% Ejecución (Dev./Vig.)	Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total General	% Ejecución (Dev./Vig.)
00025 - Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinserción Soc		30,000	-	30,000	30,000	-	30,000	2,250	-	2,250	7.5%	2,250	-	2,250	7.5%
PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y REINSECCIÓN SOCIAL		30,000	-	30,000	30,000	-	30,000	2,250	-	2,250	7.5%	2,250	-	2,250	7.5%
Total PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y REINSECCIÓN SOCIAL		30,000	-	30,000	30,000	-	30,000	2,250	-	2,250	7.5%	2,250	-	2,250	7.5%
00026 - Instituto Nacional de la Juventud		150,000	-	150,000	150,000	-	150,000	-	-	0.0%	-	-	-	-	0.0%
ACTIVIDADES CENTRALES		150,000	-	150,000	150,000	-	150,000	-	-	0.0%	-	-	-	-	0.0%
Total ACTIVIDADES CENTRALES		150,000	-	150,000	150,000	-	150,000	-	-	0.0%	-	-	-	-	0.0%
00028 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal		6,300,000	-	6,300,000	6,300,000	-	6,300,000	494,167	-	494,167	7.8%	494,167	-	494,167	7.8%
ACTIVIDADES CENTRALES		6,300,000	-	6,300,000	6,300,000	-	6,300,000	494,167	-	494,167	7.8%	494,167	-	494,167	7.8%
Total ACTIVIDADES CENTRALES		6,300,000	-	6,300,000	6,300,000	-	6,300,000	494,167	-	494,167	7.8%	494,167	-	494,167	7.8%
00030 - Secretaría de la Presidencia		34,860,000	-	34,860,000	34,860,000	-	34,860,000	466,948	-	466,948	1.3%	2,328,220	-	2,328,220	6.7%
ASESORÍA PARA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DECRETOS Y POLÍTICAS PÚBLICAS		860,000	-	860,000	860,000	-	860,000	361,968	-	361,968	42.1%	361,968	-	361,968	42.1%
Total ASEROSIA PARA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DECRETOS Y POLÍTICAS PÚBLICAS		860,000	-	860,000	860,000	-	860,000	361,968	-	361,968	42.1%	361,968	-	361,968	42.1%
SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE, UNO, UNO 001		34,000,000	-	34,000,000	34,000,000	-	34,000,000	104,980	-	104,980	0.3%	1,966,251	-	1,966,251	5.8%
Total SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE, UNO, UNO 001		34,000,000	-	34,000,000	34,000,000	-	34,000,000	104,980	-	104,980	0.3%	1,966,251	-	1,966,251	5.8%
00032 - Instituto de Acceso a la Información Pública		11,000,000	-	11,000,000	11,000,000	-	11,000,000	-	-	0.0%	-	-	-	-	0.0%
CONTROL DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		11,000,000	-	11,000,000	11,000,000	-	11,000,000	-	-	0.0%	-	-	-	-	0.0%
Total CONTROL DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		11,000,000	-	11,000,000	11,000,000	-	11,000,000	-	-	0.0%	-	-	-	-	0.0%
00033 - Programa de Vivienda y Asentamientos Humanos		1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	1,500,000	-	-	0.0%	-	-	-	-	0.0%
PROGRAMA DE VIVIENDA PARA REFUNDAR HONDURAS (PVRH)		1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	1,500,000	-	-	0.0%	-	-	-	-	0.0%
Total PROGRAMA DE VIVIENDA PARA REFUNDAR HONDURAS (PVRH)		1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	1,500,000	-	-	0.0%	-	-	-	-	0.0%
00035 - Instituto Hondureño de Geología y Minas		21,216,666	-	21,216,666	21,216,666	-	21,216,666	338,148	-	338,148	1.6%	338,148	-	338,148	1.6%
ACTIVIDADES CENTRALES		14,800,000	-	14,800,000	14,800,000	-	14,800,000	338,148	-	338,148	2.3%	338,148	-	338,148	2.3%
Total ACTIVIDADES CENTRALES		14,800,000	-	14,800,000	14,800,000	-	14,800,000	338,148	-	338,148	2.3%	338,148	-	338,148	2.3%
DESARROLLO Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL RECURSO MINERO		2,600,000	-	2,600,000	2,600,000	-	2,600,000	-	-	0.0%	-	-	-	-	0.0%
Total DESARROLLO Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL RECURSO MINERO		2,600,000	-	2,600,000	2,600,000	-	2,600,000	-	-	0.0%	-	-	-	-	0.0%
MINERÍA ARTESANAL Y PEQUEÑA MINERÍA SOSTENIBLE CON EQUIDAD DE GÉNERO		616,666	-	616,666	616,666	-	616,666	-	-	0.0%	-	-	-	-	0.0%
Total MINERÍA ARTESANAL Y PEQUEÑA MINERÍA SOSTENIBLE CON EQUIDAD DE GÉNERO		616,666	-	616,666	616,666	-	616,666	-	-	0.0%	-	-	-	-	0.0%
REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES MINERAS		3,200,000	-	3,200,000	3,200,000	-	3,200,000	-	-	0.0%	-	-	-	-	0.0%
Total REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES MINERAS		3,200,000	-	3,200,000	3,200,000	-	3,200,000	-	-	0.0%	-	-	-	-	0.0%
00037 - Servicio de Administración de Rentas		141,402,820	-	141,402,820	141,402,820	-	141,402,820	29,875,738	-	29,875,738	21.1%	29,875,738	-	29,875,738	21.1%
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA INTERNA		141,402,820	-	141,402,820	141,402,820	-	141,402,820	29,875,738	-	29,875,738	21.1%	29,875,738	-	29,875,738	21.1%
Total ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA INTERNA		141,402,820	-	141,402,820	141,402,820	-	141,402,820	29,875,738	-	29,875,738	21.1%	29,875,738	-	29,875,738	21.1%
00039 - Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios		82,455,000	-	82,455,000	82,455,000	-	82,455,000	221,651	-	221,651	0.3%	221,651	-	221,651	0.3%
SERVICIOS DE EMPRENDIMIENTO Y DE PEQUEÑOS NEGOCIOS		82,455,000	-	82,455,000	82,455,000	-	82,455,000	221,651	-	221,651	0.3%	221,651	-	221,651	0.3%
Total SERVICIOS DE EMPRENDIMIENTO Y DE PEQUEÑOS NEGOCIOS		82,455,000	-	82,455,000	82,455,000	-	82,455,000	221,651	-	221,651	0.3%	221,651	-	221,651	0.3%
00040 - Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización		10,834,340,886	-	10,834,340,886	10,834,340,886	-	10,834,340,886	4,710,613,651	-	4,710,613,651	43.5%	4,818,946,612	-	4,818,946,612	44.5%
ACTIVIDADES CENTRALES		100,000	-	100,000	100,000	-	100,000	-	-	0.0%	-	-	-	-	0.0%
Total ACTIVIDADES CENTRALES		100,000	-	100,000	100,000	-	100,000	-	-	0.0%	-	-	-	-	0.0%
TRANSFERENCIAS		10,834,240,886	-	10,834,240,886	10,834,240,886	-	10,834,240,886	4,710,613,651	-	4,710,613,651	43.5%	4,818,946,612	-	4,818,946,612	44.5%
Total TRANSFERENCIAS		10,834,240,886	-	10,834,240,886	10,834,240,886	-	10,834,240,886	4,710,613,651	-	4,710,613,651	43.5%	4,818,946,612	-	4,818,946,612	44.5%
00042 - Cuerpo de Bomberos de Honduras		107,158,799	-	107,158,799	107,158,799	-	107,158,799	-	-	0.0%	-	-	-	-	0.0%
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE INCENDIOS Y CALAMIDADES PÚBLICAS		107,158,799	-	107,158,799	107,158,799	-	107,158,799	-	-	0.0%	-	-	-	-	0.0%
Total PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE INCENDIOS Y CALAMIDADES PÚBLICAS		107,158,799	-	107,158,799	107,158,799	-	107,158,799	-	-	0.0%	-	-	-	-	0.0%
00043 - Empresa Nacional de Artes Gráficas		840,000	-	840,000	840,000	-	840,000	34,850	-	34,850	4.1%	34,850	-	34,850	4.1%
SERVICIOS DE ARTES GRÁFICAS		840,000	-	840,000	840,000	-	840,000	34,850	-	34,850	4.1%	34,850	-	34,850	4.1%
Total SERVICIOS DE ARTES GRÁFICAS		840,000	-	840,000	840,000	-	840,000	34,850	-	34,850	4.1%	34,850	-	34,850	4.1%
00044 - Instituto Nacional Penitenciario		236,908,370	-	236,908,370	236,908,370	-	236,908,370	2,913,928	-	2,913,928	1.3%	2,913,928	-	2,913,928	1.3%
REHABILITACIÓN, REEDUCACIÓN Y REINSECCIÓN SOCIAL PENITENCIARIA		11,871,979	-	11,871,979	11,871,979	-	11,871,979	-	-	0.0%	-	-	-	-	0.0%
Total REHABILITACIÓN, REEDUCACIÓN Y REINSECCIÓN SOCIAL PENITENCIARIA		11,871,979	-	11,871,979	11,871,979	-	11,871,979	-	-	0.0%	-	-	-	-	0.0%
SEGURIDAD PENITENCIARIA		225,096,391	-	225,096,391	225,096,391	-	225,096,391	2,913,928	-	2,913,928	1.3%	2,913,928	-	2,913,928	1.3%
Total SEGURIDAD PENITENCIARIA		225,096,391	-	225,096,391	225,096,391	-	225,096,391	2,913,928	-	2,913,928	1.3%	2,913,928	-	2,913,928	1.3%
00045 - Instituto Nacional de Migración		104,783,000	-	104,783,000	104,783,000	-	104,783,000	5,787,351	-	5,787,351	5.5%	6,039,231	-	6,039,231	5.8%
SERVICIOS DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA		104,783,000	-	104,783,000	104,783,000	-	104,783,000	5,787,351	-	5,787,351	5.5%	6,039,231	-	6,039,231	5.8%
Total SERVICIOS DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA		104,783,000	-	104,783,000	104,783,000	-	104,783,000	5,787,351	-	5,787,351	5.5%	6,039,231	-	6,039,231	5.8%
00046 - Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores		16,605,408	-	16,605,408	16,605,408	-	16,605,408	501,908	-	501,908	3.0%	501,908	-	501,908	3.0%
SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA ADOLESCENTES Y JÓVENES EN CONFLICTO CON LA LEY		16,605,408	-	16,605,408	16,605,408	-	16,605,408	501,908	-	501,908	3.0%	501,908	-	501,908	3.0%
Total SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA ADOLESCENTES Y JÓVENES EN CONFLICTO CON LA LEY		16,605,408	-	16,605,408	16,605,408	-	16,605,408	501,908	-	501,908	3.0%	501,908	-	501,908	3.0%
00050 - Secretaría de Educación		100,322,237	-	100,322,237	100,856,179	-	100,856,179	1,620,338	-	1,620,338	1.6%	1,620,338	-	1,620,338	1.6%
ACTIVIDADES CENTRALES		86,817,037	-	86,817,037	86,175,037	-	86,175,037	1,157,105	-	1,157,105	1.3%	1,157,105	-	1,157,105	1.3%
Total ACTIVIDADES CENTRALES		86,817,037	-	86,817,037	86,175,037	-	86,175,037	1,157,105	-	1,157,105	1.3%	1,157,105	-	1,157,105	1.3%
EDUCACIÓN MEDIA		695,000	-	695,000	695,000	-	695,000	437,500	-	437,500	62.9%	437,500	-	437,500	62.9%
Total EDUCACIÓN MEDIA		695,000	-	695,000	695,000	-	695,000	437,500	-	437,500	62.9%	437,500	-	437,500	62.9%
FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN EDUCATIVA		5,211,000	-	5,211,000	5,211,000	-	5,211,000	-	-	0.0%	-	-	-	-	0.0%
Total FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN EDUCATIVA		5,211,000	-	5,211,000	5,211,000	-	5,211,000	-	-	0.0%	-	-	-	-	0.0%
SERVICIOS TÉCNICO PEDAGÓGICO		8,599,200	-	8,599,200	8,775,142	-	8,775,142	25,933	-	25,933	0.3%	25,933	-	25,933	0.3%
Total SERVICIOS TÉCNICO PEDAGÓGICO		8,599,200	-	8,599,200	8,775,142										

ANEXO No.1
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública / Dirección General de Inversiones Públicas
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EDUCACIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE, 2006
Cifras en Lempiras

Institución / Programa o Proyecto	Convencio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado II Trimestre				Ejecutado Anual (Devengado)			
		Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total General	Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total General	Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total General	% Ejecución (Dev./Vig.)	Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total General	% Ejecución (Dev./Vig.)
FORMACIÓN Y PROMOCIÓN UNIVERSITARIA		11,704,467		11,704,467	11,704,467		11,704,467	2,448,679		2,448,679	20.9%	2,448,679		2,448,679	20.9%
Total FORMACIÓN Y PROMOCIÓN UNIVERSITARIA		11,704,467		11,704,467	11,704,467		11,704,467	2,448,679		2,448,679	20.9%	2,448,679		2,448,679	20.9%
OPERACIONES DE APOYO A LA SOSTENIBILIDAD DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE		6,850,000		6,850,000	6,850,000		6,850,000	6,708,629		6,708,629	97.9%	6,708,629		6,708,629	97.9%
Total OPERACIONES DE APOYO A LA SOSTENIBILIDAD DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE		6,850,000		6,850,000	6,850,000		6,850,000	6,708,629		6,708,629	97.9%	6,708,629		6,708,629	97.9%
PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS		7,793,399		7,793,399	7,793,399		7,793,399	-		-	0.0%	-		-	0.0%
Total PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS		7,793,399		7,793,399	7,793,399		7,793,399	-		-	0.0%	-		-	0.0%
SISTEMA DE SALUD MILITAR		28,485,000		28,485,000	28,485,000		28,485,000	2,460,000		2,460,000	8.6%	2,738,078		2,738,078	9.6%
Total SISTEMA DE SALUD MILITAR		28,485,000		28,485,000	28,485,000		28,485,000	2,460,000		2,460,000	8.6%	2,738,078		2,738,078	9.6%
SISTEMA ESTRATÉGICO DE LA DEFENSA NACIONAL		75,983,464		75,983,464	75,983,464		75,983,464	14,301,437		14,301,437	18.8%	14,301,437		14,301,437	18.8%
Total SISTEMA ESTRATÉGICO DE LA DEFENSA NACIONAL		75,983,464		75,983,464	75,983,464		75,983,464	14,301,437		14,301,437	18.8%	14,301,437		14,301,437	18.8%
SISTEMAS OPERATIVOS EN MATERIA DE SEGURIDAD NACIONAL		11,228,000		11,228,000	11,228,000		11,228,000	-		-	0.0%	-		-	0.0%
Total SISTEMAS OPERATIVOS EN MATERIA DE SEGURIDAD NACIONAL		11,228,000		11,228,000	11,228,000		11,228,000	-		-	0.0%	-		-	0.0%
0001 - Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil		7,650,000		7,650,000	7,650,000		7,650,000	1,408,023		1,408,023	18.4%	1,713,800		1,713,800	22.4%
ACTIVIDADES CENTRALES		7,650,000		7,650,000	7,650,000		7,650,000	1,408,023		1,408,023	18.4%	1,713,800		1,713,800	22.4%
Total ACTIVIDADES CENTRALES		7,650,000		7,650,000	7,650,000		7,650,000	1,408,023		1,408,023	18.4%	1,713,800		1,713,800	22.4%
0100 - Secretaría de Finanzas		93,965,861		93,965,861	93,965,861		93,965,861	949,187		949,187	0.9%	927,832		927,832	0.9%
ACTIVIDADES CENTRALES		17,010,000		17,010,000	17,010,000		17,010,000	533,029		533,029	3.1%	541,754		541,754	3.2%
Total ACTIVIDADES CENTRALES		17,010,000		17,010,000	17,010,000		17,010,000	533,029		533,029	3.1%	541,754		541,754	3.2%
ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA		1,310,000		1,310,000	1,310,000		1,310,000	-		-	0.0%	-		-	0.0%
Total ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA		1,310,000		1,310,000	1,310,000		1,310,000	-		-	0.0%	-		-	0.0%
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS Y MUNICIPALIDADES		420,000		420,000	420,000		420,000	-		-	0.0%	-		-	0.0%
Total ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS Y MUNICIPALIDADES		420,000		420,000	420,000		420,000	-		-	0.0%	-		-	0.0%
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL		300,000		300,000	300,000		300,000	-		-	0.0%	-		-	0.0%
Total CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL		300,000		300,000	300,000		300,000	-		-	0.0%	-		-	0.0%
CUSTODIA Y MANEJO DE LOS FONDOS PÚBLICOS		445,117		445,117	445,117		445,117	18,565		18,565	4.2%	18,565		18,565	4.2%
Total CUSTODIA Y MANEJO DE LOS FONDOS PÚBLICOS		445,117		445,117	445,117		445,117	18,565		18,565	4.2%	18,565		18,565	4.2%
DEFINICIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA TRIBUTARIA		478,500		478,500	478,500		478,500	-		-	0.0%	-		-	0.0%
Total DEFINICIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA TRIBUTARIA		478,500		478,500	478,500		478,500	-		-	0.0%	-		-	0.0%
EXONERACIONES FISCALES Y FRANQUICIAS ADUANERAS		3,710,000		3,710,000	3,710,000		3,710,000	77,050		77,050	2.1%	77,050		77,050	2.1%
Total EXONERACIONES FISCALES Y FRANQUICIAS ADUANERAS		3,710,000		3,710,000	3,710,000		3,710,000	77,050		77,050	2.1%	77,050		77,050	2.1%
POLÍTICA MACROFISCAL		938,000		938,000	938,000		938,000	-		-	0.0%	-		-	0.0%
Total POLÍTICA MACROFISCAL		938,000		938,000	938,000		938,000	-		-	0.0%	-		-	0.0%
PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA		640,000		640,000	640,000		640,000	213,256		213,256	33.3%	213,256		213,256	33.3%
Total PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA		640,000		640,000	640,000		640,000	213,256		213,256	33.3%	213,256		213,256	33.3%
PROGRAMACIÓN Y ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA		8,587,140		8,587,140	8,587,140		8,587,140	-		-	0.0%	-		-	0.0%
Total PROGRAMACIÓN Y ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA		8,587,140		8,587,140	8,587,140		8,587,140	-		-	0.0%	-		-	0.0%
REGULACIÓN DE LAS COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL ESTADO		85,000		85,000	85,000		85,000	-		-	0.0%	-		-	0.0%
Total REGULACIÓN DE LAS COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL ESTADO		85,000		85,000	85,000		85,000	-		-	0.0%	-		-	0.0%
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES		365,000		365,000	365,000		365,000	-		-	0.0%	-		-	0.0%
Total SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES		365,000		365,000	365,000		365,000	-		-	0.0%	-		-	0.0%
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		59,677,404		59,677,404	59,677,404		59,677,404	107,226		107,226	0.2%	107,226		107,226	0.2%
0101 - Comisión Nacional de Telecomunicaciones		36,460,722		36,460,722	36,460,722		36,460,722	957,634		957,634	2.6%	957,634		957,634	2.6%
ACTIVIDADES CENTRALES		36,460,722		36,460,722	36,460,722		36,460,722	957,634		957,634	2.6%	957,634		957,634	2.6%
Total ACTIVIDADES CENTRALES		36,460,722		36,460,722	36,460,722		36,460,722	957,634		957,634	2.6%	957,634		957,634	2.6%
0102 - Comité Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía		105,202,094		105,202,094	105,202,094		105,202,094	6,235,755		6,235,755	5.9%	6,235,755		6,235,755	5.9%
DESARROLLO SOSTENIBLE ZONA LIBRE TURÍSTICA		105,202,094		105,202,094	105,202,094		105,202,094	6,235,755		6,235,755	5.9%	6,235,755		6,235,755	5.9%
Total DESARROLLO SOSTENIBLE ZONA LIBRE TURÍSTICA		105,202,094		105,202,094	105,202,094		105,202,094	6,235,755		6,235,755	5.9%	6,235,755		6,235,755	5.9%
0109 - Administración de Pasivos Contingentes e Imprevistos		113,230,830		113,230,830	113,230,830		113,230,830	-		-	0.0%	-		-	0.0%
ADMINISTRACIÓN DE PASIVOS CONTINGENTES E IMPREVISTOS		113,230,830		113,230,830	113,230,830		113,230,830	-		-	0.0%	-		-	0.0%
Total ADMINISTRACIÓN DE PASIVOS CONTINGENTES E IMPREVISTOS		113,230,830		113,230,830	113,230,830		113,230,830	-		-	0.0%	-		-	0.0%
0121 - Dirección General de la Marina Mercante		14,492,480		14,492,480	14,492,480		14,492,480	110,594		110,594	0.8%	110,594		110,594	0.8%
SERVICIO DE APOYO A LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL MEDIO MARINO		640,000		640,000	640,000		640,000	49,374		49,374	7.7%	49,374		49,374	7.7%
Total SERVICIO DE APOYO A LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL MEDIO MARINO		640,000		640,000	640,000		640,000	49,374		49,374	7.7%	49,374		49,374	7.7%
SERVICIO DE FORMACIÓN Y TITULACIÓN DE GENTE DE MAR		3,650,000		3,650,000	3,650,000		3,650,000	61,220		61,220	1.7%	61,220		61,220	1.7%
Total SERVICIO DE FORMACIÓN Y TITULACIÓN DE GENTE DE MAR		3,650,000		3,650,000	3,650,000		3,650,000	61,220		61,220	1.7%	61,220		61,220	1.7%
SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA NAVEGACIÓN Y LA VIDA HUMANA EN LA MAR		10,202,480		10,202,480	10,202,480		10,202,480	-		-	0.0%	-		-	0.0%
Total SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA NAVEGACIÓN Y LA VIDA HUMANA EN LA MAR		10,202,480		10,202,480	10,202,480		10,202,480	-		-	0.0%	-		-	0.0%
0123 - Instituto Hondureño de Transporte Terrestre		8,300,000		8,300,000	8,300,000		8,300,000	276,273		276,273	3.3%	276,273		276,273	3.3%
ACTIVIDADES CENTRALES		8,300,000		8,300,000	8,300,000		8,300,000	276,273		276,273	3.3%	276,273		276,273	3.3%
Total ACTIVIDADES CENTRALES		8,300,000		8,300,000	8,300,000		8,300,000	276,273		276,273	3.3%	276,273		276,273	3.3%
0130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social		7,494,053		7,494,053	7,494,053		7,494,053	9,981,507		9,981,507	133.0%	-		-	0.0%
ACTIVIDADES CENTRALES		7,494,053		7,494,053	7,494,053		7,494,053	9,981,507		9,981,507	133.0%	-		-	0.0%
Total ACTIVIDADES CENTRALES		7,494,053		7,494,053	7,494,053		7,494,053	9,981,507		9,981,507	133.0%	-		-	0.0%
ATENCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS HIJOS DE TRABAJADORES(AS)		453,561		453,561	453,561		453,561	-		-	0.0%	-		-	0.0%
Total ATENCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS HIJOS DE TRABAJADORES(AS)		453,561		453,561	453,561		453,561	-		-	0.0%	-		-	0.0%
GESTIÓN DE CENTROS DE EMPLEO		1,130,345		1,130,345	1,130,345		1,130,345	-		-	0.0%	-		-	0.0%
Total GESTIÓN DE CENTROS DE EMPLEO		1,130,345		1,130,345	1,130,345		1,130,345	-		-	0.0%	-		-	0.0%
GESTIÓN DE POLÍTICAS DE EMPLEO, INCLUSIÓN, MIGRACION LABORAL Y FORMACION PROFESIONAL		205,436		205,436	205,436		205,436	-		-	0.0%	-		-	0.0%
Total GESTIÓN DE POLÍTICAS DE EMPLEO, INCLUSIÓN, MIGRACION LABORAL Y FORMACION PROFESIONAL		205,436		205,436	205,436		205,436	-		-	0.0%	-		-	0.0%
PROTECCIÓN Y FOMENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL		128,432		128,432	128,432		128,432	-		-	0.0%	-		-	0.0%
Total PROTECCIÓN Y FOMENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL		128,432		128,432	128,432		128,432	-		-	0.0%	-		-	0.0%
REGULACIÓN DE LAS RELACIONES LABORALES		317,538		317,538	317,538		317,538	-		-	0.0%	-		-	0.0%
Total REGULACIÓN DE LAS RELACIONES LABORALES		317,538		317,538	317,538		317,538	-		-	0.0%	-		-	0.0%
SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CONDICIONES LABORALES		1,537,234		1,537,234	1,537,234		1,537,234	-		-	0.0%	-		-	0.0%
Total SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CONDICIONES LABORALES		1,537,234		1,537,234	1,537,234		1,537,234	-		-	0.0%	-		-	0.0%
0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería		7,388,007		7,388,007	12,609,639		12,609,639	2,415,932		2,415,932	19.0%	2,415,932		2,415,932	19.0%
ACTIVIDADES CENTRALES		7,388,007		7,388,007	12,609,639		12,609,639	2,415,932		2,415,932	19.0%	2,415,932		2,415,932	19.0%
Total ACTIVIDADES CENTRALES		7,388,007		7,388,007	12,609,639		12,609,639	2,415,932		2,415,932	19.0%	2,415,932		2,415,932	19.0%
PROGRAMA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN AGROALIMENTARIA (SISAGRO)		3,292,044		3,292,044	6,453,646		6,453,646	2,415,932		2,415,932	37.4%	2,415,932		2,415,932	37.4%
Total PROGRAMA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN AGROALIMENTARIA (SISAGRO)		3,292,044		3,292,044	6,453,646		6,453,646	2,415,932		2,415,932	37.4%	2			

ANEXO No.1
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública / Dirección General de Inversiones Públicas
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EDUCACIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE, 2006
Cifras en Lempiras

Institución / Programa o Proyecto	Convencio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado II Trimestre				Ejecutado Anual (Devengado)			
		Total Fondos Nacionales	Total Fondon Externos	Total General	Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total General	Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total General	% Ejecución (Dev./Vig.)	Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total General	% Ejecución (Dev./Vig.)
0290 - Secretaría de Desarrollo Económico		2,982,300		2,982,300	2,982,300		2,982,300	378,322		378,322	12.7%	378,322		378,322	12.7%
ACTIVIDADES CENTRALES		2,982,300		2,982,300	2,982,300		2,982,300	378,322		378,322	12.7%	378,322		378,322	12.7%
Total ACTIVIDADES CENTRALES		2,982,300		2,982,300	2,982,300		2,982,300	378,322		378,322	12.7%	378,322		378,322	12.7%
FOMENTO AL DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMERCIO INTERIOR		-		-	-		-	-		-	0.0%	-		-	0.0%
Total FOMENTO AL DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMERCIO INTERIOR		-		-	-		-	-		-	0.0%	-		-	0.0%
FOMENTO AL DESARROLLO Y A LA DEMOSTRACION DE LA CALIDAD		-		-	-		-	-		-	0.0%	-		-	0.0%
Total FOMENTO AL DESARROLLO Y A LA DEMOSTRACION DE LA CALIDAD		-		-	-		-	-		-	0.0%	-		-	0.0%
PROMOCION INTERNACIONAL DE LAS INVERSIONES Y EL COMERCIO		-		-	-		-	-		-	0.0%	-		-	0.0%
Total PROMOCION INTERNACIONAL DE LAS INVERSIONES Y EL COMERCIO		-		-	-		-	-		-	0.0%	-		-	0.0%
TRANSFERENCIAS		-		-	-		-	-		-	0.0%	-		-	0.0%
Total TRANSFERENCIAS		-		-	-		-	-		-	0.0%	-		-	0.0%
0300 - Secretaría de Derechos Humanos		159,000		159,000	1,924,500		1,924,500	-		-	0.0%	-		-	0.0%
ACTIVIDADES CENTRALES		159,000		159,000	1,924,500		1,924,500	-		-	0.0%	-		-	0.0%
Total ACTIVIDADES CENTRALES		159,000		159,000	1,924,500		1,924,500	-		-	0.0%	-		-	0.0%
PROGRAMA MEMORIA Y REPARACION		-		-	-		-	-		-	0.0%	-		-	0.0%
Total PROGRAMA MEMORIA Y REPARACION		-		-	-		-	-		-	0.0%	-		-	0.0%
0301 - Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas		300,000		300,000	300,000		300,000	31,658		31,658	10.6%	31,658		31,658	10.6%
ACTIVIDADES CENTRALES		300,000		300,000	300,000		300,000	31,658		31,658	10.6%	31,658		31,658	10.6%
Total ACTIVIDADES CENTRALES		300,000		300,000	300,000		300,000	31,658		31,658	10.6%	31,658		31,658	10.6%
0310 - Secretaría de Energía		174,738,671		174,738,671	175,403,671		175,403,671	850,957		850,957	0.5%	850,957		850,957	0.5%
ACTIVIDADES CENTRALES		4,250,000		4,250,000	-		-	-		-	0.0%	-		-	0.0%
Total ACTIVIDADES CENTRALES		4,250,000		4,250,000	-		-	-		-	0.0%	-		-	0.0%
CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS HIDROCARBUROS		250,000		250,000	5,175,000		5,175,000	744,077		744,077	14.4%	744,077		744,077	14.4%
Total CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS HIDROCARBUROS		250,000		250,000	5,175,000		5,175,000	744,077		744,077	14.4%	744,077		744,077	14.4%
ESTUDIO Y DISEÑO DE LA POLÍTICA ENERGÉTICA NACIONAL		94,500		94,500	-		-	-		-	0.0%	-		-	0.0%
Total ESTUDIO Y DISEÑO DE LA POLÍTICA ENERGÉTICA NACIONAL		94,500		94,500	-		-	-		-	0.0%	-		-	0.0%
FUENTES DE RADIACION IONIZANTES Y SEGURIDAD RADIOLÓGICA		134,171		134,171	134,171		134,171	106,880		106,880	79.7%	106,880		106,880	79.7%
Total FUENTES DE RADIACION IONIZANTES Y SEGURIDAD RADIOLÓGICA		134,171		134,171	134,171		134,171	106,880		106,880	79.7%	106,880		106,880	79.7%
TRANSFERENCIAS		-		-	-		-	-		-	0.0%	-		-	0.0%
Total TRANSFERENCIAS		-		-	-		-	-		-	0.0%	-		-	0.0%
0400 - Administración Aduanera de Honduras		83,290,883		83,290,883	83,290,883		83,290,883	-		-	0.0%	-		-	0.0%
ADMINISTRACIÓN ADUANERA		83,290,883		83,290,883	83,290,883		83,290,883	-		-	0.0%	-		-	0.0%
Total ADMINISTRACIÓN ADUANERA		83,290,883		83,290,883	83,290,883		83,290,883	-		-	0.0%	-		-	0.0%
0404 - Dirección General de Cinematografía		-		-	-		-	-		-	0.0%	-		-	0.0%
PROGRAMA NACIONAL DE CINEMATOGRAFIA		-		-	-		-	-		-	0.0%	-		-	0.0%
Total PROGRAMA NACIONAL DE CINEMATOGRAFIA		-		-	-		-	-		-	0.0%	-		-	0.0%
0405 - Unidad Especial de Protección		5,000,000		5,000,000	5,000,000		5,000,000	-		-	0.0%	-		-	0.0%
SERVICIOS DE PROTECCIÓN		5,000,000		5,000,000	5,000,000		5,000,000	-		-	0.0%	-		-	0.0%
Total SERVICIOS DE PROTECCIÓN		5,000,000		5,000,000	5,000,000		5,000,000	-		-	0.0%	-		-	0.0%
0406 - Secretaría de Asuntos de la Mujer		26,799,099		26,799,099	26,799,099		26,799,099	-		-	0.0%	-		-	0.0%
PROMOVER LA JUSTICIA DE GENERO, IGUALDAD DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES PLENAS PARA LAS MUJERES Y NIÑAS		26,799,099		26,799,099	26,799,099		26,799,099	-		-	0.0%	-		-	0.0%
Total PROMOVER LA JUSTICIA DE GENERO, IGUALDAD DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES PLENAS PARA LAS MUJERES Y NIÑAS		26,799,099		26,799,099	26,799,099		26,799,099	-		-	0.0%	-		-	0.0%
0407 - Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos		-		-	-		-	-		-	0.0%	-		-	0.0%
ACTIVIDADES CENTRALES		-		-	-		-	-		-	0.0%	-		-	0.0%
Total ACTIVIDADES CENTRALES		-		-	-		-	-		-	0.0%	-		-	0.0%
DESARROLLO DE PROYECTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES		-		-	-		-	-		-	0.0%	-		-	0.0%
Total DESARROLLO DE PROYECTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES		-		-	-		-	-		-	0.0%	-		-	0.0%
SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACION DE PROYECTOS		-		-	-		-	-		-	0.0%	-		-	0.0%
Total SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACION DE PROYECTOS		-		-	-		-	-		-	0.0%	-		-	0.0%
0409 - Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción		-		-	-		-	-		-	0.0%	-		-	0.0%
ACTIVIDADES CENTRALES		-		-	-		-	-		-	0.0%	-		-	0.0%
Total ACTIVIDADES CENTRALES		-		-	-		-	-		-	0.0%	-		-	0.0%
DESARROLLO INTEGRAL DE CONTROL INTERNO		-		-	-		-	-		-	0.0%	-		-	0.0%
Total DESARROLLO INTEGRAL DE CONTROL INTERNO		-		-	-		-	-		-	0.0%	-		-	0.0%
RECTORIA DE LA TRANSPARENCIA Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN		-		-	-		-	-		-	0.0%	-		-	0.0%
Total RECTORIA DE LA TRANSPARENCIA Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN		-		-	-		-	-		-	0.0%	-		-	0.0%
REGULACIÓN DE LAS COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL ESTADO		-		-	-		-	-		-	0.0%	-		-	0.0%
Total REGULACIÓN DE LAS COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL ESTADO		-		-	-		-	-		-	0.0%	-		-	0.0%
0410 - Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras		36,867,679		36,867,679	36,867,679		36,867,679	12,213		12,213	0.0%	12,213		12,213	0.0%
ACTIVIDADES CENTRALES		267,679		267,679	267,679		267,679	-		-	0.0%	-		-	0.0%
Total ACTIVIDADES CENTRALES		267,679		267,679	267,679		267,679	-		-	0.0%	-		-	0.0%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN CULTURAL, DE LAS ARTES Y LOS PATRIMONIOS DE LOS PUEBLOS		35,000,000		35,000,000	35,000,000		35,000,000	-		-	0.0%	-		-	0.0%
Total FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN CULTURAL, DE LAS ARTES Y LOS PATRIMONIOS DE LOS PUEBLOS		35,000,000		35,000,000	35,000,000		35,000,000	-		-	0.0%	-		-	0.0%
PROGRAMA NACIONAL DE CINEMATOGRAFIA		600,000		600,000	600,000		600,000	12,213		12,213	2.0%	12,213		12,213	2.0%
Total PROGRAMA NACIONAL DE CINEMATOGRAFIA		600,000		600,000	600,000		600,000	12,213		12,213	2.0%	12,213		12,213	2.0%
TRANSFERENCIAS		1,000,000		1,000,000	1,000,000		1,000,000	-		-	0.0%	-		-	0.0%
Total TRANSFERENCIAS		1,000,000		1,000,000	1,000,000		1,000,000	-		-	0.0%	-		-	0.0%
0411 - Secretaría de Infraestructura y Transporte		9,337,305,669	90,957,669	9,448,263,338	9,444,546,038	90,957,669	10,045,303,727	3,197,209,369	-	3,197,209,369	31.9%	5,608,208,677	-	5,608,208,677	55.9%
ACTIVIDADES CENTRALES		31,124,500		31,124,500	128,892,500		128,892,500	442,769		442,769	0.3%	98,210,769		98,210,769	76.2%
Total ACTIVIDADES CENTRALES		31,124,500		31,124,500	128,892,500		128,892,500	442,769		442,769	0.3%	98,210,769		98,210,769	76.2%
ATENCIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIA		4,967,000,000		4,967,000,000	5,312,526,747		5,312,526,747	2,742,053,537		2,742,053,537	51.6%	3,291,643,013		3,291,643,013	62.0%
Total ATENCIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIA		4,967,000,000		4,967,000,000	5,312,526,747		5,312,526,747	2,742,053,537		2,742,053,537	51.6%	3,291,643,013		3,291,643,013	62.0%
ATENCIÓN DE OBRAS EN ZONAS FRONTERIZAS		27,500,000		27,500,000	27,500,000		27,500,000	-		-	0.0%	-		-	0.0%
Total ATENCIÓN DE OBRAS EN ZONAS FRONTERIZAS		27,500,000		27,500,000	27,500,000		27,500,000	-		-	0.0%	-		-	0.0%
CONSERVACION DE PUENTES A NIVEL NACIONAL		198,000,000		198,000,000	198,000,000		198,000,000	7,234,060		7,234,060	3.7%	56,174,528		56,174,528	28.4%
Total CONSERVACION DE PUENTES A NIVEL NACIONAL		198,000,000		198,000,000	198,000,000		198,000,000	7,234,060		7,23					

ANEXO No.1
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública / Dirección General de Inversiones Públicas
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE, 2006
Cifras en Lempiras

Institución / Programa o Proyecto	Convênio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado II Trimestre				Ejecutado Anual (Devengado)			
		Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total General	Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total General	Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total General	% Ejecución (Dev./Vig.)	Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total General	% Ejecución (Dev./Vig.)
0414 - Dirección de Gestión por Resultados		42,900,000	-	42,900,000	27,039,999	-	27,039,999	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
ACTIVIDADES CENTRALES		42,900,000	-	42,900,000	27,039,999	-	27,039,999	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
Total ACTIVIDADES CENTRALES		42,900,000	-	42,900,000	27,039,999	-	27,039,999	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
PROGRAMA DE GESTIÓN PÚBLICA POR RESULTADOS		-	-	-	10,000	-	10,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
Total PROGRAMA DE GESTIÓN PÚBLICA POR RESULTADOS		-	-	-	10,000	-	10,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
0415 - Programa de la Red Solidaria		-	17,504,700	17,504,700	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
ACTIVIDADES CENTRALES		-	17,504,700	17,504,700	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
Total ACTIVIDADES CENTRALES		-	17,504,700	17,504,700	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
0416 - Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento		6,789,022	-	6,789,022	6,789,022	-	6,789,022	-	-	-	0.0%	389,022	-	389,022	5.7%
ACTIVIDADES CENTRALES		6,789,022	-	6,789,022	6,789,022	-	6,789,022	-	-	-	0.0%	389,022	-	389,022	5.7%
Total ACTIVIDADES CENTRALES		6,789,022	-	6,789,022	6,789,022	-	6,789,022	-	-	-	0.0%	389,022	-	389,022	5.7%
GESTIÓN DE PROYECTOS NACIONALES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
Total GESTIÓN DE PROYECTOS NACIONALES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
0417 - Programa de Acción Solidaria		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
ACTIVIDADES CENTRALES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
Total ACTIVIDADES CENTRALES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y ATENCIÓN SOCIAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
Total PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y ATENCIÓN SOCIAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
Total PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
0418 - Administración Nacional de Servicio Civil		919,644	-	919,644	932,744	-	932,744	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
REGULACIÓN DEL EMPLEO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA		919,644	-	919,644	932,744	-	932,744	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
Total REGULACIÓN DEL EMPLEO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA		919,644	-	919,644	932,744	-	932,744	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
0419 - Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia		14,498,000	-	14,498,000	14,498,000	-	14,498,000	20,208	20,208	0.1%	20,208	20,208	0.1%	20,208	0.1%
ACTIVIDADES CENTRALES		14,498,000	-	14,498,000	14,498,000	-	14,498,000	20,208	20,208	0.1%	20,208	20,208	0.1%	20,208	0.1%
Total ACTIVIDADES CENTRALES		14,498,000	-	14,498,000	14,498,000	-	14,498,000	20,208	20,208	0.1%	20,208	20,208	0.1%	20,208	0.1%
PREVENCIÓN Y GARANTÍA DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES		8,276,820	-	8,276,820	8,276,820	-	8,276,820	20,208	20,208	0.2%	20,208	20,208	0.2%	20,208	0.2%
Total PREVENCIÓN Y GARANTÍA DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES		8,276,820	-	8,276,820	8,276,820	-	8,276,820	20,208	20,208	0.2%	20,208	20,208	0.2%	20,208	0.2%
PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN ESPECIAL DE DERECHOS A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A NIVEL LOCAL Y TERRITORIAL		207,928	-	207,928	207,928	-	207,928	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
Total PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN ESPECIAL DE DERECHOS A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A NIVEL LOCAL Y TERRITORIAL		207,928	-	207,928	207,928	-	207,928	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
PROTECCIÓN ESPECIAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE VULNERACIÓN		4,629,997	-	4,629,997	4,629,997	-	4,629,997	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
Total PROTECCIÓN ESPECIAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE VULNERACIÓN		4,629,997	-	4,629,997	4,629,997	-	4,629,997	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
PLANIFICACIÓN, DISEÑO Y GESTIÓN PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL FERROCARRIL		1,383,255	-	1,383,255	1,383,255	-	1,383,255	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
Total PLANIFICACIÓN, DISEÑO Y GESTIÓN PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL FERROCARRIL		1,383,255	-	1,383,255	1,383,255	-	1,383,255	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
0420 - Comisión Nacional del Ferrocarril Interoceánico		3,740,000	-	3,740,000	3,740,000	-	3,740,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
PLANIFICACIÓN, DISEÑO Y GESTIÓN PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL FERROCARRIL		3,740,000	-	3,740,000	3,740,000	-	3,740,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
Total PLANIFICACIÓN, DISEÑO Y GESTIÓN PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL FERROCARRIL		3,740,000	-	3,740,000	3,740,000	-	3,740,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
0421 - Secretaría de Vivienda y Asentamientos Humanos		137,005,231	-	137,005,231	137,005,231	-	137,005,231	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
POLÍTICA INTEGRAL DE ACCESOS A LA VIVIENDA, SOLUCIONES HABITACIONALES DIGNAS, ASENTAMIENTOS HUMANOS ORDENADOS Y SOSTENIBLES		137,005,231	-	137,005,231	137,005,231	-	137,005,231	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
Total POLÍTICA INTEGRAL DE ACCESOS A LA VIVIENDA, SOLUCIONES HABITACIONALES DIGNAS, ASENTAMIENTOS HUMANOS ORDENADOS Y SOSTENIBLES		137,005,231	-	137,005,231	137,005,231	-	137,005,231	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
0422 - Oficina Presidencial de Comercio Exterior		5,590,000	-	5,590,000	5,590,000	-	5,590,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
ADMINISTRACIÓN POLÍTICA Y ESTRATÉGICA DEL RÉGIMEN DE COMERCIO EXTERIOR		5,590,000	-	5,590,000	5,590,000	-	5,590,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
Total ADMINISTRACIÓN POLÍTICA Y ESTRATÉGICA DEL RÉGIMEN DE COMERCIO EXTERIOR		5,590,000	-	5,590,000	5,590,000	-	5,590,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
0440 - Servicios Financieros de la Administración Central		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
SERVICIOS FINANCIEROS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
Total SERVICIOS FINANCIEROS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
0500 - Instituto Nacional Aéreo		300,525,797	-	300,525,797	300,525,797	-	300,525,797	28,242,060	28,242,060	9.4%	103,334,647	103,334,647	34.4%	103,334,647	34.4%
ACTIVIDADES CENTRALES		300,525,797	-	300,525,797	300,525,797	-	300,525,797	28,242,060	28,242,060	9.4%	103,334,647	103,334,647	34.4%	103,334,647	34.4%
Total ACTIVIDADES CENTRALES		300,525,797	-	300,525,797	300,525,797	-	300,525,797	28,242,060	28,242,060	9.4%	103,334,647	103,334,647	34.4%	103,334,647	34.4%
RECONVERSIÓN EMPRESARIAL		6,085,219	-	6,085,219	6,085,219	-	6,085,219	2,824,714	2,824,714	46.4%	2,917,088	2,917,088	47.9%	2,917,088	47.9%
Total RECONVERSIÓN EMPRESARIAL		6,085,219	-	6,085,219	6,085,219	-	6,085,219	2,824,714	2,824,714	46.4%	2,917,088	2,917,088	47.9%	2,917,088	47.9%
TITULACIÓN DE TIERRAS		3,203,091	-	3,203,091	3,203,091	-	3,203,091	3,203,091	3,203,091	100.0%	3,203,091	3,203,091	100.0%	3,203,091	100.0%
Total TITULACIÓN DE TIERRAS		3,203,091	-	3,203,091	3,203,091	-	3,203,091	3,203,091	3,203,091	100.0%	3,203,091	3,203,091	100.0%	3,203,091	100.0%
0501 - Instituto Hondureño de Turismo		291,237,487	-	291,237,487	291,237,487	-	291,237,487	22,214,264	22,214,264	7.6%	97,214,468	97,214,468	33.4%	97,214,468	33.4%
ACTIVIDADES CENTRALES		291,237,487	-	291,237,487	291,237,487	-	291,237,487	22,214,264	22,214,264	7.6%	97,214,468	97,214,468	33.4%	97,214,468	33.4%
Total ACTIVIDADES CENTRALES		291,237,487	-	291,237,487	291,237,487	-	291,237,487	22,214,264	22,214,264	7.6%	97,214,468	97,214,468	33.4%	97,214,468	33.4%
AGENCIA NACIONAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA		1,747,000	-	1,747,000	1,747,000	-	1,747,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
Total AGENCIA NACIONAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA		1,747,000	-	1,747,000	1,747,000	-	1,747,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
DESARROLLO Y GESTIÓN DE REGIONES TURÍSTICAS		750,000	-	750,000	750,000	-	750,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
Total DESARROLLO Y GESTIÓN DE REGIONES TURÍSTICAS		750,000	-	750,000	750,000	-	750,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
FOMENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA TURÍSTICA		16,090,157	-	16,090,157	16,090,157	-	16,090,157	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
Total FOMENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA TURÍSTICA		16,090,157	-	16,090,157	16,090,157	-	16,090,157	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
0502 - Instituto Nacional de Formación Profesional		502,000	-	502,000	502,000	-	502,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
ACTIVIDADES CENTRALES		502,000	-	502,000	502,000	-	502,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
Total ACTIVIDADES CENTRALES		502,000	-	502,000	502,000	-	502,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
CERTIFICAR TRABAJADORES EN SUS COMPETENCIAS LABORALES		61,273,328	-	61,273,328	61,273,328	-	61,273,328	1,001,083	1,001,083	1.6%	1,079,712	1,079,712	1.8%	1,079,712	1.8%
Total CERTIFICAR TRABAJADORES EN SUS COMPETENCIAS LABORALES		61,273,328	-	61,273,328	61,273,328	-	61,273,328	1,001,083	1,001,083	1.6%	1,079,712	1,079,712	1.8%	1,079,712	1.8%
FORMACIÓN PROFESIONAL Y CAPACITACIÓN TÉCNICA		20,738,268	-	20,738,268	20,738,268	-	20,738,268	511,213	511,213	2.5%	511,213	511,213	2.5%	511,213	2.5%
Total FORMACIÓN PROFESIONAL Y CAPACITACIÓN TÉCNICA		20,738,268	-	20,738,268	20,738,268	-	20,738,268	511,213	511,213	2.5%	511,213	511,213	2.5%	511,213	2.5%
0504 - Instituto de Crédito Educativo		2,454,930	-	2,454,930	2,454,930	-	2,454,930	125,550	125,550	5.1%	125,550	125,550	5.1%	125,550	5.1%
ASISTENCIA FINANCIERA PARA FORMACIÓN PROFESIONAL		2,454,930	-	2,454,930	2,454,930	-	2,454,930	125,550	125,550	5.1%	125,550	125,550	5.1%	125,550	5.1%
Total ASISTENCIA FINANCIERA PARA FORMACIÓN PROFESIONAL		2,454,930	-	2,454,930	2,454,930	-	2,454,930	125,550	125,550	5.1%	125,550	125,550	5.1%	125,550	5.1%
0505 - Instituto Hondureño de Antropología e Historia		240,000	-	240,000	240,000	-	240,000	2,135,622	2,135,622	2.7%	3,974,311	3,974,311	4.9%	3,974,311	4.9%
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA CULTURA, ARTES Y DEPORTES.		240,000	-	240,000	240,000	-	240,000	2,135,622	2,135,622	2.7%	3,974,311	3,974,311	4.9%	3,974,311	4.9%
Total PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA CULTURA, ARTES Y DEPORTES.		240,000	-	240,000	240,000	-	240,000	2,135,622	2,135,622	2.7%	3,974,311	3,974,311	4.9%	3,974,311	4.9%
0506 - Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas		80,465,070	-	80,465,070	80,465,070	-	80,465,070	283,984	283,984	3.1%	507,057	507,057	5.5%	507,057	5.5%
SUPERVISIÓN Y REGULACIÓN DEL SISTEMA COOPERATIVO		80,465,070	-	80,465,070	80,465,070	-	80,465,070	283,984	283,984	3.1%	507,057	507,057	5.5%	507,057	5.5%
Total SUPERVISIÓN Y REGULACIÓN DEL SISTEMA COOPERATIVO		80,465,070	-	80,465,070	80,465,070	-	80,465,070	283,984	283,984	3.1%	507,057	507,057	5.5%	507,057	5.5%
0507 - Inst. Hondureño para Prev. y Trat. del Alcohol, Drog. y Farn.		2,150,000	-	2,150,000	2,150,000	-	2,150,000	800,000							

ANEXO No.1
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública / Dirección General de Inversiones Públicas
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE, 2006
Cifras en Lempiras

Institución / Programa o Proyecto	Convênio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado II Trimestre				Ejecutado Anual (Devengado)			
		Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total General	Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total General	Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total General	% Ejecución (Dev./Vig.)	Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total General	% Ejecución (Dev./Vig.)
0602 - Inst. Nal. de Juhl. y Pen. de los Emp. y Fun. del Poder Ejec.		100,000,000		100,000,000	100,000,000		100,000,000	73,884		73,884	0.1%	73,884		73,884	0.1%
ACTIVIDADES CENTRALES		100,000,000		100,000,000	100,000,000		100,000,000	73,884		73,884	0.1%	73,884		73,884	0.1%
Total ACTIVIDADES CENTRALES		100,000,000		100,000,000	100,000,000		100,000,000	73,884		73,884	0.1%	73,884		73,884	0.1%
0603 - Instituto Nacional de Previsión del Magisterio		100,000,000		100,000,000	100,000,000		100,000,000	4,098,180		4,098,180	3.4%	4,097,843		4,097,843	4.1%
ACTIVIDADES CENTRALES		100,000,000		100,000,000	100,000,000		100,000,000	4,098,180		4,098,180	3.4%	4,097,843		4,097,843	4.1%
Total ACTIVIDADES CENTRALES		100,000,000		100,000,000	100,000,000		100,000,000	4,098,180		4,098,180	3.4%	4,097,843		4,097,843	4.1%
0604 - Instituto de Previsión Militar		500,000,000		500,000,000	500,000,000		500,000,000	93,845,463		93,845,463	18.8%	153,402,792		153,402,792	31.1%
ACTIVIDADES CENTRALES		500,000,000		500,000,000	500,000,000		500,000,000	93,845,463		93,845,463	18.8%	153,402,792		153,402,792	31.1%
Total ACTIVIDADES CENTRALES		500,000,000		500,000,000	500,000,000		500,000,000	93,845,463		93,845,463	18.8%	153,402,792		153,402,792	31.1%
0605 - Ins. de Prev. Soc. de los Emp. de la Univ. Nal. Aut. de Honduras		449,000,000		449,000,000	449,000,000		449,000,000	92,685,521		92,685,521	20.6%	138,375,526		138,375,526	30.8%
ACTIVIDADES CENTRALES		449,000,000		449,000,000	449,000,000		449,000,000	92,685,521		92,685,521	20.6%	138,375,526		138,375,526	30.8%
Total ACTIVIDADES CENTRALES		449,000,000		449,000,000	449,000,000		449,000,000	92,685,521		92,685,521	20.6%	138,375,526		138,375,526	30.8%
0701 - Universidad Nacional Autónoma de Honduras		194,415,083	-	194,415,083	194,415,083	-	194,415,083	1,768,803	-	1,768,803	0.9%	2,128,693	-	2,128,693	1.1%
ACTIVIDADES CENTRALES		194,415,083	-	194,415,083	194,415,083	-	194,415,083	1,768,803	-	1,768,803	0.9%	2,128,693	-	2,128,693	1.1%
Total ACTIVIDADES CENTRALES		194,415,083	-	194,415,083	194,415,083	-	194,415,083	1,768,803	-	1,768,803	0.9%	2,128,693	-	2,128,693	1.1%
0702 - Universidad Nacional de Agricultura		437,933,787	-	437,933,787	437,933,787	-	437,933,787	1,210,691	-	1,210,691	0.3%	1,673,688	-	1,673,688	0.4%
ACTIVIDADES CENTRALES		437,933,787	-	437,933,787	437,933,787	-	437,933,787	1,210,691	-	1,210,691	0.3%	1,673,688	-	1,673,688	0.4%
Total ACTIVIDADES CENTRALES		437,933,787	-	437,933,787	437,933,787	-	437,933,787	1,210,691	-	1,210,691	0.3%	1,673,688	-	1,673,688	0.4%
0703 - Universidad Nacional de Tecnología		38,398,703	-	38,398,703	38,398,703	-	38,398,703	1,094,751	-	1,094,751	2.9%	1,319,002	-	1,319,002	3.4%
ACTIVIDADES CENTRALES		38,398,703	-	38,398,703	38,398,703	-	38,398,703	1,094,751	-	1,094,751	2.9%	1,319,002	-	1,319,002	3.4%
Total ACTIVIDADES CENTRALES		38,398,703	-	38,398,703	38,398,703	-	38,398,703	1,094,751	-	1,094,751	2.9%	1,319,002	-	1,319,002	3.4%
0704 - Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán		3,240,231	-	3,240,231	3,240,231	-	3,240,231	188,941	-	188,941	5.8%	188,941	-	188,941	5.8%
ACTIVIDADES CENTRALES		3,240,231	-	3,240,231	3,240,231	-	3,240,231	188,941	-	188,941	5.8%	188,941	-	188,941	5.8%
Total ACTIVIDADES CENTRALES		3,240,231	-	3,240,231	3,240,231	-	3,240,231	188,941	-	188,941	5.8%	188,941	-	188,941	5.8%
0801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica		1,824,773,879	100,724,298	1,924,497,877	1,824,773,879	100,724,298	1,924,497,877	9,132,380	-	9,132,380	0.5%	14,129,825	-	14,129,825	0.7%
ACTIVIDADES CENTRALES		1,824,773,879	100,724,298	1,924,497,877	1,824,773,879	100,724,298	1,924,497,877	9,132,380	-	9,132,380	0.5%	14,129,825	-	14,129,825	0.7%
Total ACTIVIDADES CENTRALES		1,824,773,879	100,724,298	1,924,497,877	1,824,773,879	100,724,298	1,924,497,877	9,132,380	-	9,132,380	0.5%	14,129,825	-	14,129,825	0.7%
0802 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica		862,769,800	-	862,769,800	862,769,800	-	862,769,800	2,849,841	-	2,849,841	0.3%	3,060,017	-	3,060,017	0.4%
ACTIVIDADES CENTRALES		862,769,800	-	862,769,800	862,769,800	-	862,769,800	2,849,841	-	2,849,841	0.3%	3,060,017	-	3,060,017	0.4%
Total ACTIVIDADES CENTRALES		862,769,800	-	862,769,800	862,769,800	-	862,769,800	2,849,841	-	2,849,841	0.3%	3,060,017	-	3,060,017	0.4%
0803 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica		147,188,651	-	147,188,651	147,188,651	-	147,188,651	3,168,399	-	3,168,399	2.2%	7,935,659	-	7,935,659	5.4%
ACTIVIDADES CENTRALES		147,188,651	-	147,188,651	147,188,651	-	147,188,651	3,168,399	-	3,168,399	2.2%	7,935,659	-	7,935,659	5.4%
Total ACTIVIDADES CENTRALES		147,188,651	-	147,188,651	147,188,651	-	147,188,651	3,168,399	-	3,168,399	2.2%	7,935,659	-	7,935,659	5.4%
0804 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica		433,563,838	100,724,298	534,288,136	433,563,838	100,724,298	534,288,136	1,531,910	-	1,531,910	0.3%	1,531,910	-	1,531,910	0.3%
ACTIVIDADES CENTRALES		433,563,838	100,724,298	534,288,136	433,563,838	100,724,298	534,288,136	1,531,910	-	1,531,910	0.3%	1,531,910	-	1,531,910	0.3%
Total ACTIVIDADES CENTRALES		433,563,838	100,724,298	534,288,136	433,563,838	100,724,298	534,288,136	1,531,910	-	1,531,910	0.3%	1,531,910	-	1,531,910	0.3%
0805 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica		382,251,290	-	382,251,290	382,251,290	-	382,251,290	1,602,240	-	1,602,240	0.4%	1,602,240	-	1,602,240	0.4%
ACTIVIDADES CENTRALES		382,251,290	-	382,251,290	382,251,290	-	382,251,290	1,602,240	-	1,602,240	0.4%	1,602,240	-	1,602,240	0.4%
Total ACTIVIDADES CENTRALES		382,251,290	-	382,251,290	382,251,290	-	382,251,290	1,602,240	-	1,602,240	0.4%	1,602,240	-	1,602,240	0.4%
0806 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica		110,785,153	-	110,785,153	110,785,153	-	110,785,153	1,104,532	-	1,104,532	0.8%	1,104,532	-	1,104,532	0.8%
ACTIVIDADES CENTRALES		110,785,153	-	110,785,153	110,785,153	-	110,785,153	1,104,532	-	1,104,532	0.8%	1,104,532	-	1,104,532	0.8%
Total ACTIVIDADES CENTRALES		110,785,153	-	110,785,153	110,785,153	-	110,785,153	1,104,532	-	1,104,532	0.8%	1,104,532	-	1,104,532	0.8%
0807 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica		22,270,000	-	22,270,000	22,270,000	-	22,270,000	42,805	-	42,805	0.2%	42,805	-	42,805	0.2%
ACTIVIDADES CENTRALES		22,270,000	-	22,270,000	22,270,000	-	22,270,000	42,805	-	42,805	0.2%	42,805	-	42,805	0.2%
Total ACTIVIDADES CENTRALES		22,270,000	-	22,270,000	22,270,000	-	22,270,000	42,805	-	42,805	0.2%	42,805	-	42,805	0.2%
0808 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica		9,460,000	-	9,460,000	9,460,000	-	9,460,000	372,535	-	372,535	3.9%	454,768	-	454,768	4.8%
ACTIVIDADES CENTRALES		9,460,000	-	9,460,000	9,460,000	-	9,460,000	372,535	-	372,535	3.9%	454,768	-	454,768	4.8%
Total ACTIVIDADES CENTRALES		9,460,000	-	9,460,000	9,460,000	-	9,460,000	372,535	-	372,535	3.9%	454,768	-	454,768	4.8%
0809 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica		4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	-	4,000,000	-	-	-	0.0%	225,130	-	225,130	5.6%
ACTIVIDADES CENTRALES		4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	-	4,000,000	-	-	-	0.0%	225,130	-	225,130	5.6%
Total ACTIVIDADES CENTRALES		4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	-	4,000,000	-	-	-	0.0%	225,130	-	225,130	5.6%
0810 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica		10,587,736	-	10,587,736	10,587,736	-	10,587,736	-	-	-	0.0%	14,000	-	14,000	0.1%
ACTIVIDADES CENTRALES		10,587,736	-	10,587,736	10,587,736	-	10,587,736	-	-	-	0.0%	14,000	-	14,000	0.1%
Total ACTIVIDADES CENTRALES		10,587,736	-	10,587,736	10,587,736	-	10,587,736	-	-	-	0.0%	14,000	-	14,000	0.1%
0811 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica		750,000	-	750,000	750,000	-	750,000	-	-	-	0.0%	174,140	-	174,140	23.2%
ACTIVIDADES CENTRALES		750,000	-	750,000	750,000	-	750,000	-	-	-	0.0%	174,140	-	174,140	23.2%
Total ACTIVIDADES CENTRALES		750,000	-	750,000	750,000	-	750,000	-	-	-	0.0%	174,140	-	174,140	23.2%
0812 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica		1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	15,442	-	15,442	1.5%	19,830	-	19,830	2.0%
ACTIVIDADES CENTRALES		1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	15,442	-	15,442	1.5%	19,830	-	19,830	2.0%
Total ACTIVIDADES CENTRALES		1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	15,442	-	15,442	1.5%	19,830	-	19,830	2.0%
0813 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica		45,890,000	-	45,890,000	45,890,000	-	45,890,000	268,946	-	268,946	0.6%	8,077,273	-	8,077,273	17.6%
ACTIVIDADES CENTRALES		45,890,000	-	45,890,000	45,890,000	-	45,890,000	268,946	-	268,946	0.6%	8,077,273	-	8,077,273	17.6%
Total ACTIVIDADES CENTRALES		45,890,000	-	45,890,000	45,890,000	-	45,890,000	268,946	-	268,946	0.6%	8,077,273	-	8,077,273	17.6%
0814 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica		147,939,267	-	147,939,267	147,939,267	-	147,939,267	772,130	-	772,130	0.5%	6,266,515	-	6,266,515	4.2%
ACTIVIDADES CENTRALES		147,939,267	-	147,939,267	147,939,267	-	147,939,267	772,130	-	772,130	0.5%	6,266,515	-	6,266,515	4.2%
Total ACTIVIDADES CENTRALES		147,939,267	-	147,939,267	147,939,267	-	147,939,267	772,130	-	772,130	0.5%	6,266,515	-	6,266,515	4.2%
0815 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica		69,585,580	-	69,585,580	69,585,580	-	69,585,580	690,886	-	690,886	0.9%	6,103,936	-	6,103,936	8.1%
ACTIVIDADES CENTRALES		69,585,580	-	69,585,580	69,585,580	-	69,585,580	690,886	-	690,886	0.9%	6,103,936	-	6,103,936	8.1%
Total ACTIVIDADES CENTRALES		69,585,580	-	69,585,580	69,585,580	-	69,585,580	690,886	-	690,886	0.9%	6,103,936	-	6,103,936	8.1%
0816 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica		66,335,736	-	66,335,736	66,335,736	-	66,335,736	48							

ANEXO 2

SECRETARÍA DE FINANZAS
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL II TRIMESTRE, 2026

Institución/Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre 2026		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
0022- Fondo Hondureño de Inversión Social								
Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar (PROMINE/KFW, FASE IV y V) (KFW)	Infraestructura Escolar	Centro Educativo	8	0	0%	0	0	0%
Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras (MIFE) (BCIE).	Infraestructura Escolar	Centro Educativo	0	0	0%	0	0	0%
Proyecto Convivencia y Espacios Seguros para los Jóvenes en Honduras (CONVIVIR) (KFW)	Espacios Públicos recuperados	Obra	9	0	0%	0	0	0%
	Jóvenes Capacitados	Capacitación	14	0	0%	0	0	0%
Proyecto Recuperación de Emergencia a causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras (PRE) (Banco Mundial)	Centros educativos rehabilitados	Centro Educativo	19	0	0%	0	0	0%
	Sistemas de agua rehabilitados	Sistema de Agua	7	1	14.30%	1	1	100%
	Infraestructura vial rehabilitada y reconstruida	Kilometro	2	0	0%	0	0	0%
	Centros de salud pública rehabilitados	Unidad de Salud	1	0	0%	0	0	0%
0028 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal								
Rehabilitación y Reforestación tecnificada de fincas de café en agrobosques sostenibles y productivos en varias regiones cafetaleras de Honduras "AGROBOSQUE"	Sistemas Agroforestales en proceso de establecimiento en fincas de café, que permitan generar condiciones de adaptación al cambio climático e incidencia positiva en los modelos de producción cafetaleros comunitarios	Hectáreas	5,000	3,650	73%	1,257	1,257	100%
	Eventos de capacitación desarrollados con los productores, en temas orientados a la aplicación de prácticas agrícolas sostenibles, considerando el enfoque de cambio climático, género y la inclusión de los pueblos indígenas y afrohondureños	Eventos	42	21	50%	21	21	100%
	Plantas producidas en vivero con uso de envases biodegradables y equipo automatizado	Plántula	15,000,000	12,551,936	84%	12,551,936	12,551,936	100%
Fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras - SINAPH (LIFEWEB)	Protocolos ambientales y sociales socializados y aplicados en campo	Protocolo	4	2	50%	0	0	0%
	Talleres técnicos (género, conservación y ordenamiento	Taller	10	5	50%	0	0	0%
	Mecanismo de sugerencias y reclamos implementado	Mecanismo	1	1	50%	0	0	0%
	Planes de acción para fortalecimiento de áreas protegidas – Grupo	Plan	10	9	90%	5	5	100%
Diseño e Implementación de un piloto del Sistema para asegurar la legalidad de la madera en bosque de pino (SALH)	Guías metodológicas, censos y tablas técnicas elaboradas y validadas	Documento	1	1	100 %	0	0	0%
	Informes técnicos de avance elaborados	Informe	2	2	100 %	1	1	100%
	Comités interinstitucionales AVA-FLEGT conformados y operando	Comité	1	1	100 %	0	0	0%
	Sistema informático de trazabilidad desarrollado	Sistema	1	1	50 %	0	0	0%
	Implementación piloto del sistema en campo	Piloto	1	0	0 %	0	0	0%
0060 - Secretaría de Salud								
Apoyo al Sistema Integral de Protección Social A 5008/BL-HO	80 - Realizado el fortalecimiento de los Servicios de Salud Materno Infantil, en beneficios de la población de municipios prorizados de los departamento de Copán, Ocotepeque y La Paz	Informe	1	0	0%	1	0	0%
Respuesta Inmediata de Salud Pública para contener y Controlar el Coronavirus (COVID -19) y Mitigar su efecto en la Prestación de Servicios en Honduras (RISP-HO-2)	46 - Realizada la adecuación y equipamiento del centro de datos de la SESAL	Informe	2	0	0%	0	0	0%
	47 - Adquiridos generadores eléctricos para los Hospitales Juan Manuel Gálvez y Aníbal Murillo	Equipo	2	0	0%	0	0	0%
	48 - Reemplazo de la sub estación eléctrica del bloque médico quirúrgico del Hospital Escuela el equipo no médico para salas neonatales.	Equipo	28	15	54%	3	3	100%
	49 - Realizadas las gestiones administrativas y auditados los fondos para el 2026	Informe	18	13	72%	11	11	100%

ANEXO 2

SECRETARÍA DE FINANZAS
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL II TRIMESTRE, 2026

Institución/Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre 2026		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Construcción y Equipamiento del Edificio Administrativo y del Laboratorio Nacional De Vigilancia (LNV) de la Salud En Tegucigalpa, Francisco Morazán	67 - Adquirido mobiliario, equipo tecnológico, y terrestre para el año 2026	Lote de Equipo	1	0	0%	1	0	0%
	74 - Construcción y Equipamiento del edificio administrativo para el nuevo Laboratorio Nacional de Vigilancia.	Informe Técnico	6	0	0%	1	0	0%
Programa De Construcción Y Equipamiento De Tres Hospitales (Tegucigalpa, San Pedro Sula Y Roatán) Para El Fortalecimiento De La Red Hospitalaria En Honduras	51 - Construcción, Equipamiento y supervisión de la obra del Hospital General de Roatán	Informe	24	11	46%	7	7	100%
	52 - Construcción y supervisión de la obra del hospital de especialidades (trauma) en la ciudad de Tegucigalpa	Informe	0	0	0%	0	0	0%
	53 - Construcción y supervisión de la obra del hospital de especialidades (trauma) en la ciudad de san pedro sula	Informe	2	0	0%	0	0	0%
	54 - Realizada la formación y educación continua en especialidades médicas del personal hospitalario para la puesta en marcha de los tres hospitales	Informe	7	0	0%	2	0	0%
	55 - Reorganizada y fortalecida la red de servicio del área de influencia y servicio prehospitario de emergencia de los tres	Informe	2	0	0%	0	0	0%
	56 - Realizadas los procesos administrativos y auditados los fondos para el 2026	Informe	336	155	46%	75	75	100%
Programa De Diseño, Construcción Y Equipamiento Del Nuevo Hospital En Las Ciudades De Choluteca Y Tocoa Como Apoyo A La Red Hospitalaria De La República De Honduras	58 - Diseñado, Construido y Supervisado el Nuevo Hospital General de Choluteca	Informe	14	5	36%	10	5	50%
	59 - Diseñado, Construido y Supervisado el Nuevo Hospital Básico de Tocoa	Informe	16	4	25%	8	4	50%
Programa de Diseño, Construcción y Equipamiento del Nuevo Hospital den las ciudades de Choluteca y Tocoa Como Apoyo a la Red Hospitalaria en la República de Honduras	60 - Fortalecidas las capacidades de la SESAL para la administración de los hospitales	Taller de Socialización	7	0	0%	0	0	0%
	61 - Realizados los procesos de administración del proyecto para el año 2026	Informe	100	46	46%	54	46	85%
Proyecto de Servicios Esenciales de Salud y Preparación Ante Emergencias	69 - Fortalecidas las jornadas de vacunación masivas a nivel	Informe	255	0	0%	30	0	0%
	70 - Fortalecido el Sistema de Vigilancia de la Salud y Laboratorio de Virología Nacional	Informe	46	0	0%	11	0	0%
	71 - Realizado el Monitoreo, evaluación y auditoría del proyecto	Informe	1	0	0%	1	0	0%
	72 - Fortalecido el sistema del Servicios de Materno Infantil (SMI)	Informe	1	0	0%	1	0	0%
	73 - Fortalecido el Servicio de Salud Sexual y Reproductiva (SSR) para los adolescentes.	Taller	4	0	0%	1	0	0%
	75 - Fortalecidas las jornadas de vacunación masivas a nivel nacional (GAVI)	Informe	49	0	0%	48	0	0%
	76 - Fortalecido el Sistema de Vigilancia de la Salud y Laboratorio de Virología Nacional (GAVI)	Informe	1	0	0%	1	0	0%
	77 - Realizado el Monitoreo, evaluación y auditoría del proyecto (GAVI)	Informe	7	0	0%	7	0	0%
0140-Secretaría de Agricultura y Ganadería								
Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana	13 Sistemas de agua rehabilitados/Mejorados	Porcentaje	50%	10%	20.0%	-	10%	-
	Subproyecto de Rehabilitación del Sistema Urbano de las obras de Agua Potable de Puerto Cortés, Cortés	Porcentaje	0	1%	-	-	1%	-
	Plan de Asistencia Técnica a prestadores	Plan	12	5.00	42%	3.00	3.00	100%
	Prestadores desconcentrados de servicios urbanos de agua potable en proceso de fortalecimiento, beneficiando a 13 cabeceras municipales.	Prestador	6	-	-	-	-	-
	Oficinas de los nuevos prestadores de servicios de agua potable equipadas (personal, mobiliario y equipo instalado)	Oficina	6	-	-	-	-	-

ANEXO 2

SECRETARÍA DE FINANZAS
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL II TRIMESTRE, 2026

Institución/Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre 2026		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II) Tipo de proyecto: Inversión Pública	Informe de cierre final del proyecto aprobado.	Informe	1	-	-	-	-	-
	Informe de cierre de las Organizaciones de Productores Rurales (OPRs) beneficiadas por el proyecto, aprobado.*	Informe	1	-	-	-	-	-
	Informe de cierre de los convenios Interinstitucionales aprobado.	Informe	1	-	-	-	-	-
Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Prodcutividad INTEGRAL	(PF) Planes de inversión con adopción de tecnologías CI (Climáticamente inteligentes) implementados, en beneficio de productores(as) organizados.	Planes de inversión	150	75.00	50%	-	75.00	-
	(PI)Planes de inversión con adopción de tecnologías CI aprobados por el Comité de la UEP (Equipo técnico del proyecto).	Planes de Inversión	50	25.00	50%	-	25.00	-
	(PF)Asistencias técnicas brindadas en temas de Producción y Mercado, Gestión de Crédito y Nutrición a grupos de productores (as) y MiPymes organizados.	Asistencias	305	150.00	49%	-	150.00	-
	(PF) Planes de manejo de microcuencas implementados en la zona de intervención.	Planes de manejo de	10	-	0%	-	-	-
	(PI) Planes de manejo de microcuenca aprobados por el ICF.	Planes de manejo de	10	-	0%	-	-	-
	Préstamos otorgados por BANHPROVI del fondo de Inversión del proyecto a productores certificados.	Número	200	92.00	46%	-	92.00	-
	Diagnostico Institucional del sistema de M&E aprobado para el fortalecimiento de SAG	Unidad	1	-	0%	-	-	-
Proyecto De Inclusión Económica y Social de Pequeños Productores Rurales en la Región Noreste De Honduras (PROINORTE)	Mejorada la productividad y competitividad de los grupos de productores (as) rurales organizados que integran las cadenas de valor, bajo un enfoque de empresariedad, sostenibilidad ambiental, equidad e inclusión, accediendo a nuevos mercados que les permita incrementar sus ingresos y asegurar su seguridad	Beneficiarios	6750	2,150.00	32%	2,150.00	2,150.00	100%
	Planes de Inversión o/y Negocios implementados beneficiando a organizaciones de productores y productoras.	Planes	40	12.00	30%	10.00	12.00	120%
	Organizaciones de productores y productoras de la zona de influencia del proyecto, hacen uso de nuevas tecnologías en sistemas contables y de información agrícola y pecuaria	Unidad	60	20.00	33%	20.00	20.00	100%
	Capacitaciones en educación financiera brindadas.	Capacitaciones	135	-	-	-	-	-
	Productores y productoras promovidas en igualdad y equidad de género implementan acciones afirmativas en el marco de acceso a sus derechos humanos.	Productores	2500	-	-	-	-	-
	Planes de Negocios implementados a organizaciones de productores y productoras rurales para garantizar el entorno de las inversiones con enfoque de cadena de valor en la Región 2, Valle de Leán o Caribe Hondureño.	Plan	60	22.00	37%	10.00	10.00	100%
	Planes de Negocios aprobados por el Comité Aprobador de Inversiones (CAI).	Plan	60	56.00	93%	20.00	23.00	115%
	Asistencia técnica brindada a organizaciones de productores y productoras y acompañamiento especializado en la implementación de planes de negocios.	Cpacitaciones	735	170.00	23%	95.00	95.00	100%
	Planes de inversión ecosistémicos implementados a organizaciones de productores y productoras rurales para garantizar la gestión de las microcuencas con las inversiones realizadas en comunidades focalizadas por el proyecto	Plan	6	-	-	-	-	-

ANEXO 2

SECRETARÍA DE FINANZAS
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL II TRIMESTRE, 2026

Institución/Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre 2026		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Proyecto De Inclusión Económica y Social de Pequeños Productores Rurales en la Región Noreste De Honduras (PROINORTE)	Campañas de concientización y buenas prácticas (nutrición, higiene, cambio climático) realizadas a organizaciones de productores y productoras rurales en la Región 2, Valle de Lean o Caribe Hondureño.	Capacitación	9	-	-	-	-	-
Proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco de Honduras	Plan de Modernización de los Servicios Hidrológicos y Climáticos de la Cuenca de Nacaome implementado.	Plan	1	-	-	-	-	-
	viveros agroforestales municipales y comunitarios construidas, en los municipios de La Paz, Intibucá, La Venta y Curarén.	Vivero	4	-	-	-	-	-
	Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS) de Manazapa y Las Mercedes y La Venta, Construidos.	Porcentaje	20%	-	-	-	-	-
	Construcción de obras de rehabilitación de la planta de tratamientode Nacaome.	Porcentaje	20%	-	-	-	-	-
	Radar meteorológico para pronóstico de precipitación con cobertura	Porcentaje	1	-	-	-	-	-
	Informes de supervisión de Viveros agroforestales municipales y comunitarios en los municipios de La Paz, Intibucá, La Venta y Curaren	Informe	12	-	-	-	-	-
	Diseños finales de los Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS) La Paz y Curaren, actualizados y entregados.	Diseño	2	2.00	100%	-	2.00	-
	Informes de supervisión de la Obra de Rehabilitación de la planta de	Informe	2	-	-	-	-	-
	Rehabilitación de Estaciones Meteorológicas, Climatológicas e Hidrológicas de la red hidro climática de la Cuenca Nacaome.	Estación	12	-	-	-	-	-
	Estudios de Evaluación de Impactos y Riesgos Ambientales y Sociales, incluyendo Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) de los Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS) en beneficio de las aldeas	Estudio	4	-	-	-	-	-
	Informes de supervisión de la construcción de los Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS) de Manazapa y Las Mercedes, La Venta.	Informe	2	-	-	-	-	-
Proyetco de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)	Hectáreas de tierra agrícolas con infraestructura de riego rehabilitadas y modernizada en parcelas de los productores y productoras.	Hectarea	272	-	0%	272.00	-	0%
	Líneas de tuberías para riego instaladas	Kilometros	38	2.54	7%	19.70	1.57	8%
Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL III)	Productores organizados mejoran su seguridad alimentaria, la productividad y competitividad e incursionan en nuevos mercados, bajo un enfoque de empresarialidad.	Productores	0	0	0%	0	0	0%
	Planes de Negocios implementados beneficiando a Grupos/Organización de Productores Rurales (OPRs).	Plan de Negocios	0	4	0%	0	4	0%
	Planes de Negocios identificados/Ventana 1. Agricultura en Subsistencia	Planes de Negocios	0	0	0%	0	0	0%
	Planes de Negocios Financiados/Ventana 2. Agricultura en Transición.	Planes de Negocios	0	4	0%	0	4	0%
	Planes de Negocios Financiados/Ventana 3. Agricultura Comercial.	Planes de Negocios	0	0	0%	0	0	0%
	Planes de Negocios identificados/Ventana 4. Servicios Agro-logísticos	Planes de Negocios	0	0	0%	0	0	0%
	Subproyectos agro costeros identificados en la zona de la Moskitia, Costa Atlántica	Subproyectos	0	0	0%	0	0	0%
0180 - Registro Nacional de las Personas	Planes Comunitarios de Nutrición e Higiene identificados en la zona de la Moskitia, Costa Atlántica	Planes de Higiene	0	0	0%	0	0	0%
Proyecto de Fortalecimiento del Ecosistema Nacional del Registro Civil e Identificación de Honduras	Niños Niñas y Adolescentes 6-17 años (NNA) identificados	Persona	1,500,000.00	0	0%	0	0	0%
	Centros Municipales equipados con kit biométrico y computadora.	Centro	205.00	0	0%	0	0	0%
	Personas Capacitadas para la identificación NNA 6-17 años	Persona	650.00	0	0%	0	0	0%
	Estrategia de Ciberseguridad elaborada	Estrategia	1.00	0	0%	0	0	0%

ANEXO 2

SECRETARÍA DE FINANZAS
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL II TRIMESTRE, 2026

Institución/Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre 2026		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
0400 - Administración Aduanera de Honduras								
Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Aduanera	1.2 Estrategia de gestión del RH con enfoque de equidad de género y diversidad diseñada.	Estrategia	0.1	0	0%	0	0	0%
	1.2 Estrategia de gestión del RH con enfoque de equidad de género y diversidad diseñada.	Estrategia	0.1	0	0%	0	0	0%
	1.5 Estrategia de gestión de cambio interna y externa	Estrategia	1	0	0%	0	0	0%
	2.1 Reingeniería de procesos aduaneros y procedimientos operativos estandarizados implementada	Manual Operativo/Proc edimientos	0.6	0	0%	0	0	0%
	3.1 Sistemas informáticos SARAH y PECH actualizados	Sistema	0.4	0	0%	0	0	0%
	3.4 Centro de Control y Monitoreo (CCM) con equipamiento adquirido	Modelo diseñado y	1	0	0%	0	0	0%
0411 - Secretaría de Infraestructura y Transporte								
Programa de Carreteras Resilientes de Honduras (PCR-HN)	Servicios de Consultoría para el Diseño Final de la Construcción del Libramiento de la Ciudad de El Progreso	Informe	1	0	0%	0	0	100%
	Construcción de las obras para la Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Danlí – Trojes (Lotes 1, 2 y 3)	Kilometro	40.07	39.6	99%	10	23.65	237%
	Diseño de la Carretera Ojo de Agua – Cantarranas (San Juan de Flores)	Informe	1	0	0%	0	0	0%
Libramiento Anillo Periférico CA-5 Sur	Construcción y Pavimentación de la Carretera con cuatro carriles del Tramo La Cañada hasta el Tizatillo, para el Libramiento Anillo Periférico, Carretera CA-5 Sur	Kilometro	2	0	0%	0	0	0%
Programa para Incrementar la Resiliencia ante Inundaciones del Valle de Sula en Honduras	Canales rehabilitados	Kilometro	7	0	0%	0	0	0%
	Dragados de causas	Kilometro	5	0	0%	0	0	0%
Reconstrucción del Puente No.1 (Viejo, Tangente) y Rehabilitación del Puente No.2 (Nuevo, Curvo) sobre la Laguna de Alvarado, ubicado en Puerto Cortés.	Obras de reconstrucción del Puente No. 1 (Viejo, Tangente) sobre la Laguna de Alvarado	Metro lineal	150	150	100%	150	150	100%
	Rehabilitación del Puente No.2 (Nuevo, Curvo) sobre la Laguna de Alvarado	Metro lineal	150	150	100%	0	0	0%
Construcción del Edificio Anexo del Tribunal Superior de Cuentas, Ubicado en la Ciudad de Comayaguela, Municipio del Distrito Central, Depto. De Francisco Morazán	Construcción del Edificio Anexo del Tribunal Superior de Cuentas, ubicado en la ciudad de Comayagüela, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán	Metro cuadrado	776	0	0%	0	0	0%
Pavimentación con Concreto Hidráulico del Anillo Agrícola, Ruta 77, Tramos Carreteros: "Las Delicias (R15) - El Bijagual" y "San Francisco de Becerra - Catacamas" con una Longitud de 62.75 Km.	Sub tramo R15 - El Bijagual	Kilómetro	10.85	4.05	37%	4	0	0%
	Sub tramo San Luis de Las Lajas - San Pedro de Catacamas	Kilómetro	3.78	3.63	96%	0.21	0.06	28%
	Sub tramo San Pedro de Catacamas - Catacamas	Kilómetro	9.86	9.7	98%	2	2.33	116%
Construcción y pavimentación con carpeta asfáltica del tramo carretero: "La ENA - San José de Río Tinto - Dulce Nombre de Culmí, subtramo La Ena - El Pataste", ruta N-83	La ENA - El Aguacate	Kilómetro	13.65	7.25	53%	10	5.23	52%
	El Aguacate - El Pataste	Kilómetro	15.1	15.1	100%	1.56	1.56	100%
Rehabilitación con Concreto Hidráulico de la Carretera de Occidente, Tramo: Cucuyagua - Ocotepeque - El Poy - Ocotepeque - Agua Caliente (CA-4, CA-10), con una Longitud de 93.6 Km	Sub tramo El Portillo - Beneficio San Marco desvío Sensenti	Kilómetro	0.3	0.3	100%	0	0	0%
	Sub tramo Ocotepeque - El Portillo	Kilómetro	11.7	2.32	20%	5	1.66	33%
Construcción y Pavimentación con Doble Tratamiento Superficial del Tramo Carretero: Vía Rápida Tegucigalpa - Santa Lucía, Ubicado en el Departamento de Francisco Morazán	Construcción y pavimentación de carretera de alivio de Tegucigalpa a Santa Lucía	Km	9.22	3.64	39%	4	0.34	9%
Construcción y pavimentación con concreto hidráulico del Tramo Carretero: LA ENA - SAN JOSE DE RIO TINTO - DULCE NOMBRE DE CULMI, sub tramo: "Puente Río El Pataste - Dulce Nombre de Culmi" Ruta N° 83.	15.33 Km sub tramo: "Puente Río El Pataste - Dulce Nombre de Culmí	Km	3.9	3.3	84%	0.3	0	0%

ANEXO 2

SECRETARÍA DE FINANZAS
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL II TRIMESTRE, 2026

Institución/Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre 2026		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Pavimentación con Concreto Hidráulico del Anillo Agrícola, Tramo Carretero: "El Bijagual - San Francisco de Becerra (R77)", con una Longitud de 15.09 km, Olancho	15.09 Km sub tramo: " El Bijagual – San Francisco de Becerra”	Informe	1	1	0%	0	0	0%
Rehabilitación del Tramo Carretero: "Siguatepeque - La Esperanza" (67.00 Km), Localizado en los Deptos. de Comayagua e Intibucá	Obras de pavimentación, complementarias y de seguridad vial Etapa II	Km	67	49.23	0%	50	49.23	98%
Construcción y Rehabilitación Vial con Concreto Hidráulico del Corredor de Occidente, Tramo Carretero: "Naco - La Entrada" (79.1 Km), Localizado en Santa Bárbara y Copán	Sub Tramo: Quimistán – Sula	Informe	1	0	0%	0	0	0%
	Sub Tramo: Sula – La Entrada	Informe	1	0	0%	0	0	0%
Conectividad Sostenible de Honduras	Publicación y desarrollo del proceso de contratación de los estudios, diseño final y supervisión del corredor CA-4–CA-13 (46 km) Macuelizo-Corinto	Proceso	1	1	100%	1	1	100%
	Adjudicación del contrato de estudios y diseños final y supervisión del corredor CA-4–CA-13 Macuelizo-Corinto	Adjudicación Contrato	1	0	0%	0	0	0%
	Preparación y publicación de los TdR para contratación de la Consultoría de estudios, diseño final y supervisión del mejoramiento de la red secundaria (41 km) Programa Interconexión Municipal	Proceso	1	0	0%	0	0	0%
	Publicación y desarrollo del proceso de contratación la Consultoría de Apoyo, Supervisión y Monitoreo (CASM) del Proyecto	Proceso	1	1	100%	1	1	100%
	Adjudicación del contrato de la Consultoría de Apoyo, Supervisión y Monitoreo (CASM) del Proyecto	Adjudicación Contrato	1	0	0%	0	0	0%
	Publicación y desarrollo del proceso de contratación de la Consultoría Independiente de Monitoreo Ambiental y Social (CIMAS)	Proceso	1	1	100%	1	1	100%
	Adjudicación del contrato de la Consultoría Independiente de Monitoreo Ambiental y Social (CIMAS)	Adjudicación Contrato	1	0	0%	0	0	0%
	Publicación y desarrollo del proceso de contratación del la Consultoría de Seguridad Vial	Proceso	1	1	100%	1	1	100%
	Adjudicación del Contrato de la Consultoría de Seguridad Vial	Adjudicación Contrato	1	0	0%	0	0	0%
	Cumplimiento de los compromisos ambientales y sociales (PCAS/ESCP)	Informe semestral	2	1	50%	0	0	0%
0414 - Dirección de Gestión por Resultados								
Proyecto Transformación Digital para una Mayor Competitividad	1.1 Sitios y edificios públicos conectados	Sitios	608	422	69%	422	422	100%
	2.1 Capacidad técnica y operativa de la DGER incrementada	Personas contratadas	19	14	74%	0	14	74%
	2.4 Servicios de back office, tanto verticales como compartidos, digitalizados y simplificados	Servicios	1	0	0%	0	0	N/A
	2.6 Actualización del marco normativo de gobierno digital desarrollado	Marco normativo	1	0	0%	0	0	N/A
	2.9 Actividades de sensibilización y alfabetización digital realizadas	Actividades/ Eventos	4		0%	0	0	N/A
	3.2 Centro de Diseño e Innovación Tecnológico para Emprendedores equipado y operando	Centro	1	0	0%	0	0	N/A
0415 - Programa de la Red Solidaria								
Apoyo Al Sistema Integral De Protección Social 5008/BI-HoO	Hogares del PRS que reciben incentivo de capital semilla para fortalecer capacidades productivas en emprendimiento 5008/BL-Reporte generado de los participantes del PRS que reciben incentivos de capital semilla, remitido al organismo financiador.	Hogares	1000	0	0%	0	0	N/A
	Contrato suscrito con ONG para impartir capacitaciones a jóvenes beneficiados por el PRS.	Reporte	1	0	0%	0	0	N/A
	Contrato suscrito para la evaluación de las intervenciones integrales del PRS.	Contrato	1	0	0%	1	1	100%
		Contrato	1	0	0%	0	0	N/A

ANEXO 2

SECRETARÍA DE FINANZAS
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL II TRIMESTRE, 2026

Institución/Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre 2026		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Proyecto De Integración De La Protección Social / 6401-Hn	Encuesta de percepción de beneficiarios del PRS elaborada y entregada a las autoridades del PRS para posibles acciones de mejora en los procesos de atención a los participantes.	Informe	1	0	0%	0	0	N/A
	Informe de cierre para pago de comisiones bancarias operación 6401/HN11111000%	Informe	1	1	100%	1	1	100%
Financiamiento Adicional Al Proyecto De Integración De La Protección Social/ 6918-Hn	Paquetes escolares entregados a estudiantes y docentes de centros educativos focalizados por el PRS	Kits o paquetes entregados	2143	0	100%	0	0	N/A
Programa De Desarrollo Infantil Temprano En Las Comunidades De Atlantida En Honduras (TFOC 3767)	Mujeres embarazadas del Departamento de Atlántida beneficiadas con la entrega de los KITS. BM TF oC3767	Kits entregados	500	0	0%	0	0	N/A
	Mejorados los espacios físicos en centros de salud, para habilitación de Bebetecas para niños pequeños en el Departamento de Atlántida.	Obra	2	0	0%	0	0	N/A
Proyecto De Mejora De La Gestion Y Calidad De Los Servicios De Salud Materno-Neonatal	Unidades de Cuidados Intensivos (UCIN), y Salas de Neonatología de obras hospitalarias construidas.	Unidades de Cuidados Intensivos	0.1	0	0%	0	0	N/A
Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven	Escuelas con módulos de tres aulas del tercer ciclo construidos y equipados.	Obra	18	18	100%	18	18	100%
0416- Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento								
Programa de Agua Potable y Saneamiento en Honduras	Sistemas de agua potable construidos nuevos en pequeñas comunidades	SISTEMA	8	0	0%	0	0	0%
	Obras de Mitigación	OBRA	3	0	0%	0	0	0%
0513 - Instituto Nacional de Estadísticas								
Programa de Apoyo al Censo de Población y Vivienda y Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional	Entregable Principal en NP: Finalizado el Censo Nacional de Poblacion y Vivienda de la Republica de Honduras	Censo	1	0	0%	0	0	0%
	Campaña de comunicación y sensibilización censal desarrolladas	Campaña	0.5	0	0%	0	0	0%
	Operativo de campo para el CNPV desarrollado	Censo	1	0	0%	0	0	0%
	Diseminación de la Información del Censo Agropecuario	Estudios	1	0	0%	0	0	0%
	Estrategia de ciberseguridad desarrollada	Estrategia	1	0	0%	0	0	0%
0801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica								
Renovación de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán para Facilitar la Integración de Energías Renovables	Entregable 1.2.2 Sistema de protección eléctrica de unidades principales modernizados	Lote	4	1	25%	1	1	100%
	Entregable 1.2.3 Adquisición e instalación de reguladores de velocidad y válvulas de admisión para dos turbinas Francis de 1.7 MW de las unidades auxiliares de generación	Lote	2	0	0%	0	0	0%
	Diseño para la implementación de soluciones de protección contra derrumbes y mitigación de inestabilidades de laderas en la CHF M	Informe Técnico	1	0	0%	0	0	0%
	Entregable 2.1 y 2.3 Estudios de viabilidad para la instalación de la quinta unidad incluye investigaciones geologicas geotecnicas y estudios técnicos	Estudios	1		0%	0	0	0%
	Entregable 3.2.1 Desarrollo estrategia turismo con enfoque de participación comunitaria y genero+ Plan de negocios y mercadeo + Campaña de comunicación + Manejo financiero sostenible y	Informe	1	0	0%	0	0	0%
	Entregable 3.4.1 Plan de Manejo Integral de la zona forestal protegida del Embalse de CHF M elaborado	Informe	1	0	0%	0	0	0%
	Gestión fiduciaria del proyecto	Informes	2	0	0%	0		0%
	Auditoria Externa realizada (Años 2023-2024)	Informe	1	1	100%	0	1	0%
	Entregable 1.2.4 Adquisición de sellos de turbina	Lote	4	1	25%	1	1	100%
	Entregable 1.2.5 Adquisición de grúa 05 (Descarga de turbina) y grúa 07 (Bocatoma)	Unidad	0.2	0	0%	0	0	0%
	Entregable 1.6.2 Obras para la construcción de planta de tratamiento de aguas del campamento	Obras	0.2	0	0%	0	0	0%
	Gestion técnica del proyecto	informes	1		0%	0	0	0%

ANEXO 2

SECRETARÍA DE FINANZAS
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL II TRIMESTRE, 2026

Institución/Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre 2026		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica	Subestaciones Ampliadas	Subestación	2	0	0%	0	0	0%
	Subestaciones Construidas	Subestación	0	0	0%	0	0	0%
	Línea de Transmisión 230kV construidas	km	0	0	0%	0	0	0%
	Línea de Transmisión 138kV construidas	km	4	0	0%	0	0	0%
	Bancos de compensación capacitiva en la Red de Transmisión en Servicio	MVAR	0	0	0%	0	0	0%
	Supervisión técnica del proyecto y gestión de servidumbres	Informe	6	6	100%	3	3	100%
	Plan Estratégico para la Sostenibilidad Financiera y Operativa de la Empresa de Transmisión	Plan	1	0	0%	0	0	0%
	Equipo para el Fortalecimiento de la Supervisión ENEE y Mantenimiento del Sistema de Transmisión ENEE adquirido	Lote de equipos	1	0	0%	0	0	0%
	Asistencia técnica para fortalecimiento de ENEE-Transmisión para la supervisión y monitoreo de contratos, temas ambientales y sociales (etapa de cierre)	Consultoría	3	2	67%	2	2	100%
	Acompañamiento técnico para obtener Estados Financieros con Opinión -ENEE Transmisión	Consultoría	0.2	0	0%	0	0	0%
	Auditoría anual externa del Proyecto	Informe	1	1	100%	1	1	100%
	Gestión y Administración del Proyecto	Informe	2	1	50%	0	0	0%
	Auditoría ambiental del proyecto	Auditoría	0.2	0	0%	0	0	0%
	Evaluación final del proyecto	Evaluación	0.2	0	0%	0	0	0%
Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral Río Lindo	Equipo Generador de la Central Hidroeléctrica Cañaveral, adquirido e instalado (2 unidades)	Lote de Equipo	44%	16%	36%	0%	0%	0%
	Equipo Generador de la Central Hidroeléctrica Río Lindo, adquirido e instalado (4 unidades)	Lote de Equipo	36%	14%	39%	0%	9%	9%
	Sistemas Limpia Rejillas Instalado en las Centrales Hidroeléctricas de Cañaveral y Río Lindo	Sistema	2	0	0%	0	0	0%
	Bienes para Instalaciones Civiles en la Central Hidroeléctrica Cañaveral y Río Lindo adquiridos	Lote de bienes	3	0	0%	0	0	0%
	Supervisión y Asesoría a la ENEE en las Etapas de Adquisición e Implementación del Provento bajo la Norma AOD del Japón	informes trimestrales	4	2	50%	1	1	100%
	Auditoría Externa del Proyecto	informes	1	1	100%	1	1	100%
	Obras de rehabilitación y construcción ejecutadas en la Central Hidroeléctrica Cañaveral–Río Lindo (CHCARL)	obras	2	2	100%	1	2	200%
	Equipos y suministros para la CHCARL adquiridos	lotes	8	2	25%	5	2	40%
	Gestión y administración del proyecto	informes	4	2	50%	1	1	100%
	0803 - Empresa Nacional Portuaria							
Proyecto Ampliación de la Terminal Marítima de Graneles Líquidos de Puerto Cortés.	Construcción de 977.6 m² de estructuras de obra marítima	Metros² de Construcción	3881.6	926.92	23.9%	903.24832	540.71	60%
	Obras de pavimentación terrestre y electromecánica 2904m² (total 3881.6 m²)							
1801-Alcaldía Municipal del Distrito Central								
Proyecto Fortalecer los Servicios de Agua Potable de Tegucigalpa	Obras de Sectores Hidráulicos	Obras	3	0	0%	3	0	0%
	Evaluación integral de riesgos para las represas La Concepción y Los Laureles que incluye planes de seguridad y planes de acción de emergencia.	Planes	2	2	67%	2	2	67%
	Laboratorio de Limnología	Laboratorio	1	0	0%	1	0	0%

Fuente: Unidades Ejecutoras de Proyectos al 30/06/2026
