



# SECRETARÍA DE FINANZAS



Informe al II Trimestre de Avance Físico y Financiero

**PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA**

# Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)

Informe No. 0022-002-2026

Tegucigalpa, julio 2026



# SECRETARÍA DE FINANZAS



## Contenido

|                                                                                                                 |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Contenido .....                                                                                                 | 2                                    |
| IV. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN .....                                                           | 3                                    |
| A. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA.....                                                     | 3                                    |
| B. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA .....                                                                 | 4                                    |
| C. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA EJECUCIÓN AL II TRIMESTRE (2022-2026) .....                                   | 5                                    |
| D. PRINCIPALES PROYECTOS .....                                                                                  | 6                                    |
| La mayor parte de la inversión acumulada al II trimestre de 2026 se concentra en los siguientes proyectos:..... | 6                                    |
| 1. Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar (PROMINE/KFW, FASE IV y FASE V) .....                       | 6                                    |
| 2. Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras (MIFE) .....       | 6                                    |
| 3. Proyecto Convivencia y Espacios Seguros para los Jóvenes en Honduras (CONVIVIR) .....                        | 6                                    |
| 4. Proyecto Recuperación de Emergencia a causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras (PRE). .....       | 6                                    |
| D.1.1. Principales Metas Físicas al II Trimestre 2026 .....                                                     | 7                                    |
| D.1.2. Evaluación Financiera al II Trimestre 2026 .....                                                         | 8                                    |
| D.1.3. Principales Adquisiciones al II Trimestre 2026.....                                                      | 15                                   |
| E. GESTIÓN DE LA INVERSIÓN .....                                                                                | 15                                   |
| F. PROBLEMÁTICA Y ACCIONES DURANTE EL II TRIMESTRE 2026.....                                                    | 15                                   |
| G. CONCLUSIONES .....                                                                                           | 16                                   |
| H. RECOMENDACIONES .....                                                                                        | 16                                   |
| ANEXO 1 .....                                                                                                   | 17                                   |
| ANEXO 2 .....                                                                                                   | <b>¡Error! Marcador no definido.</b> |



# SECRETARÍA DE FINANZAS



## IV. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN

### A. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

El Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) adscrito a la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS), tiene como finalidad promover el mejoramiento de las condiciones de vida de los grupos sociales marginados en el área rural y urbana, mediante el otorgamiento de financiamientos para programas y proyectos de desarrollo social o económico, con el propósito de aumentar su productividad, sus niveles de empleo y de ingresos y de contribuir a la satisfacción de sus necesidades básicas.

Al segundo trimestre del 2026 la institución cuenta con un presupuesto vigente de L855.0 millones y una ejecución de L156.4 millones que representa 18.3%, tal como se detalla en el Cuadro No. 01.

Dicha ejecución se llevó a cabo con un presupuesto vigente para inversión productiva de L 818.6 millones y formación bruta de capital de L 36.4 millones, a través de proyectos enfocados en infraestructura Social, Escolar y Caminos Rurales; Fortalecimiento de Capacidades para Jóvenes; Recuperación de Espacios Públicos y Mejora de la Infraestructura Básica.

Mediante Decreto Ejecutivo PCM-004-2026 y PCM 013-2026 fecha 25 de febrero y 30 de junio 2026 respectivamente, donde se instruye adscribir como dependencia interna de la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT) al Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) y el proceso de traspaso de los proyectos a la nueva institución debe estar concluido en diciembre del 2026.

Cuadro No. 01  
**Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del 2026**  
Cifras en Lempiras

| Descripción                                           | Monto              |
|-------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Presupuesto Aprobado</b>                           | <b>861,530,868</b> |
| Inversión Productiva                                  | 825,113,857        |
| Formación Bruta de Capital                            | 36,417,011         |
| <b>Presupuesto Vigente</b>                            | <b>855,024,966</b> |
| Inversión Productiva                                  | 818,607,955        |
| Formación Bruta de Capital                            | 36,417,011         |
| <b>Ejecutado II Trimestre</b>                         | <b>137,038,426</b> |
| Inversión Productiva                                  | 117,760,428        |
| Formación Bruta de Capital                            | 19,277,998         |
| <b>% Ejecución (Ejecutado II Trim-2026/Vigente)</b>   | <b>16.0%</b>       |
| <b>Ejecutado Anual</b>                                | <b>156,423,018</b> |
| Inversión Productiva                                  | 120,087,981        |
| Formación Bruta de Capital                            | 36,335,036         |
| <b>% Ejecución (Ejecutado Anual/Vigente)</b>          | <b>18.3%</b>       |
| <b>Compromiso Aprobado</b>                            | <b>159,439,105</b> |
| Inversión Productiva                                  | 123,104,068        |
| Formación Bruta de Capital                            | 36,335,036         |
| <b>% Compromiso (Compromiso II Trim-2026/Vigente)</b> | <b>18.6%</b>       |

Nota: SIAFI, 30/06/2026



# SECRETARÍA DE FINANZAS




## B. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

La mayor parte de los proyectos que ejecuta el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) provienen de financiamiento externo del Banco Mundial (BM) y el Kreditanstalt für Wiederaufbau de Alemania KfW, sumando las donaciones externas; en su conjunto alcanzan el 91%; mientras que el 9% se financia con fondos nacionales.

Del total del presupuesto vigente (L 855.0 millones), el 69% corresponde a fondos provenientes de crédito externo con un monto de L 590.8 millones y fondos nacionales que corresponden a contrapartes para gastos operativos de proyectos con un monto vigente de L 79.32 millones equivalente a 9%. Los fondos de donaciones (L 184.86 millones) equivalen al 22% tal como se muestra en el **gráfico No 1**.

Comportamiento Inversión Pública Total  
Al 30 de junio (2022-2026)  
0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social  
Cifras en millones de Lempiras

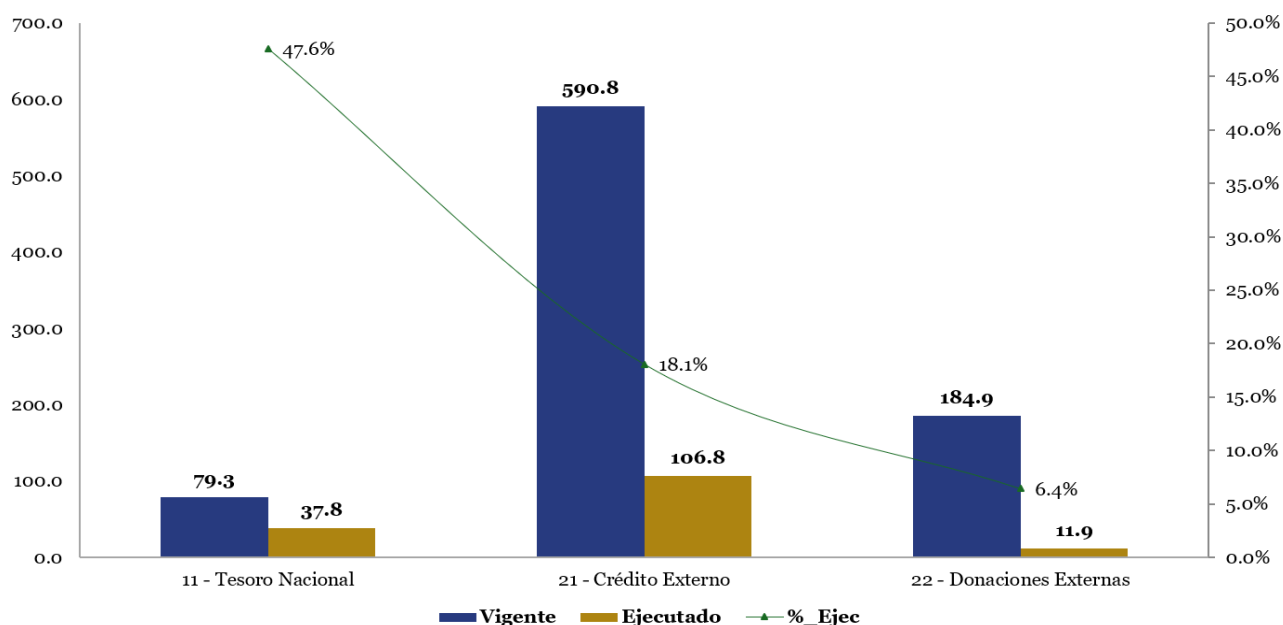

Fuente: SIAFI



# SECRETARÍA DE FINANZAS



## C. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA EJECUCIÓN AL II TRIMESTRE (2022-2026)

A continuación, se presenta el análisis del comportamiento histórico de la inversión pública ejecutada al segundo trimestre durante el período 2022-2026, con base en el presupuesto vigente y los montos efectivamente ejecutados.

En el año 2022, el presupuesto vigente ascendió a L 1,386.1 millones, de los cuales se ejecutaron L 89.9 millones, equivalente a un 6.5% de ejecución al segundo trimestre, reflejando un bajo nivel de avance financiero al inicio del ejercicio fiscal.

Para 2023, el presupuesto vigente se incrementó a L 1,727.3 millones, representando un aumento de 24.6% respecto al año anterior. Asimismo, la ejecución alcanzó L 371.3 millones, equivalente al 21.5%, lo que evidenció una mejora significativa tanto en el volumen de recursos ejecutados como en el ritmo de ejecución institucional.

En 2024, el presupuesto vigente disminuyó a L 1,649.6 millones, registrando una reducción aproximada de 4.5% en comparación con 2023. No obstante, la ejecución ascendió a L 385.2 millones, alcanzando un 23.4%, lo que representó una ligera mejora en la eficiencia de ejecución pese a la reducción del presupuesto disponible.

Durante 2025, el presupuesto vigente aumentó nuevamente hasta L 1,755.7 millones, equivalente a un incremento de 6.4% respecto a 2024. La ejecución alcanzó L 566.3 millones, logrando un 32.3%, el porcentaje de ejecución más alto del período analizado al segundo trimestre, reflejando un fortalecimiento en la capacidad de gestión y ejecución de la cartera de proyectos.

Para el ejercicio fiscal 2026, el presupuesto vigente se redujo considerablemente a L 855.0 millones, lo que representa una disminución aproximada de 51.3% respecto a 2025. Al cierre del segundo trimestre se registró una ejecución de L 156.4 millones, equivalente al 18.3% del presupuesto vigente. Esta disminución obedece principalmente al proceso de reorganización institucional derivado de la transición de programas y proyectos hacia la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), así como a la reducción de la cartera de inversión administrada, factores que incidieron en el ritmo de ejecución durante el período.


En términos generales, durante el período 2022-2026 se observa una evolución favorable en los niveles de ejecución al segundo trimestre, pasando de 6.5% en 2022 a un máximo de 32.3% en 2025. Sin embargo, en 2026 se evidencia una reducción en el porcentaje de ejecución, influenciada por la disminución significativa del presupuesto vigente y los cambios institucionales en la administración de los proyectos. En conjunto, la inversión pública registró un presupuesto vigente acumulado de L 7,373.7 millones, con una ejecución de L 1,569.1 millones, equivalente a un 21.3% de ejecución promedio al segundo trimestre del período analizado. **Ver Gráfico 2.**



# SECRETARÍA DE FINANZAS



**Gráfico 2**  
**Comportamiento Inversión Pública Total**  
**Al 30 de junio (2022-2026)**  
**0022 - Fondo Hondureño de**

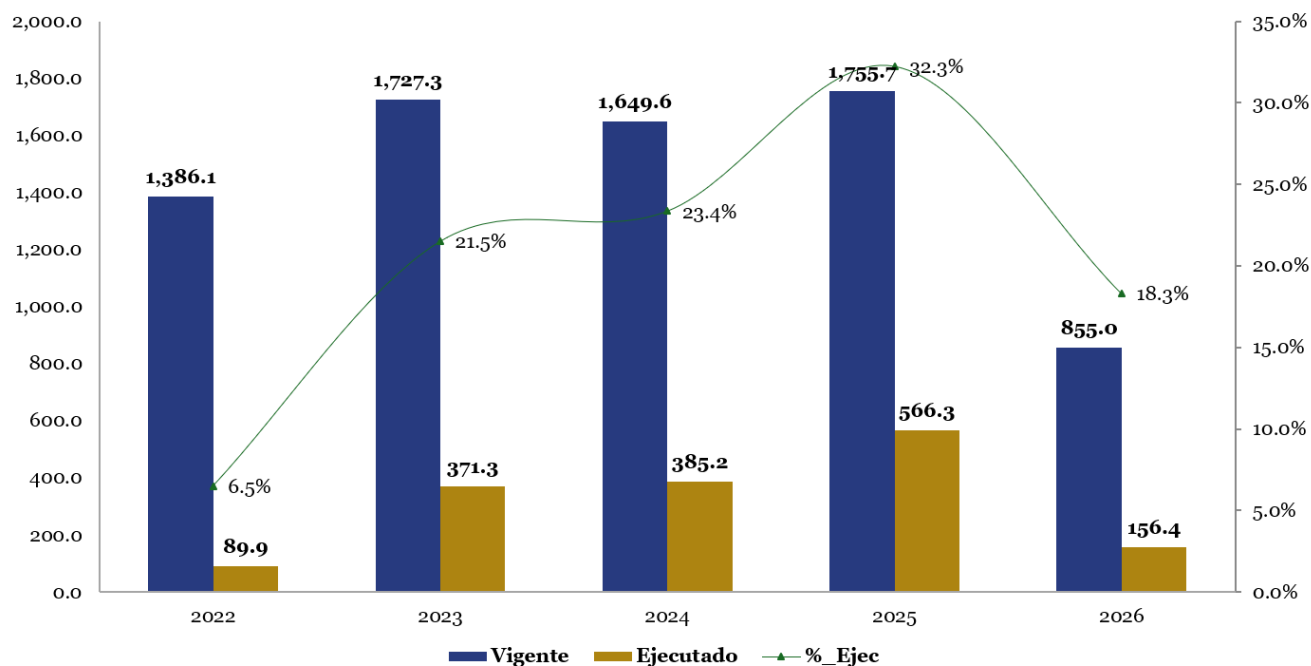

**Fuente:** SIAFI

## D. PRINCIPALES PROYECTOS

**La mayor parte de la inversión acumulada al II trimestre de 2026 se concentra en los siguientes proyectos:**

1. Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar (PROMINE/KFW, FASE IV y FASE V)
2. Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras (MIFE)
3. Proyecto Convivencia y Espacios Seguros para los Jóvenes en Honduras (CONVIVIR)
4. Proyecto Recuperación de Emergencia a causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras (PRE).



# SECRETARÍA DE FINANZAS



## D.1.1. Principales Metas Físicas al II Trimestre 2026

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros de los principales proyectos de acuerdo con su presupuesto vigente:

### 1. Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar (PROMINE/KFW, FASE IV y V) (KFW)

El PROMINE tiene por objetivo general fortalecer la rectoría Sectorial en Infraestructura Educativa de la Secretaría de Educación y la gestión local participativa, así como mejorar el acceso de los alumnos de las comunidades pobres al Centro Educativo de calidad que operan de manera sostenible. De esa manera se pretende contribuir al aumento de la eficiencia y de la calidad del sistema educativo (prebásico y básico).

#### Principales Metas Físicas al II trimestre 2026

| Metas Física            | Unidad de Medida | Anual        |           |         | II Trimestre de 2026 |           |         |
|-------------------------|------------------|--------------|-----------|---------|----------------------|-----------|---------|
|                         |                  | Programación | Ejecución | % EJEC. | Programación         | Ejecución | % EJEC. |
| Infraestructura Escolar | Centro Educativo | 8            | 0         | 0%      | 0                    | 0         | 0%      |

Fuente: Unidad Ejecutora del proyecto

No se reporta proyectos finalizados en este periodo, en vista que no se han realizado los pagos para la continuación de las obras.

#### Proyectos en Ejecución 2026/ PROMINE

| No | Nombre del Proyecto                                          | Depto             | Monto         | Avance Físico | Avance Financiero | Estatus    | Ejecutor                                                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Ampliación Ceb Sat America Y Cepb Rosa Canelo                | GRACIAS A DIOS    | 27,902,374.13 | 39.10%        | 33.76%            | Suspendido | Servicios De Diseño Y Construcción S. De R.L. (Serdicon)                                  |
| 2  | Ampliación Instituto Gubernamental Técnico Francisco Morazán | FRANCISCO MORAZÁN | 23,110,444.63 | 77.23%        | 79.13%            | Ejecución  | A.M. Sabanagrande                                                                         |
| 3  | Reposición Ceb Cerro Grande Zona 2                           | FRANCISCO MORAZÁN | 26,431,249.40 | 70.00%        | 55.44%            | Suspendido | Servicios De Ingeniería Para Telecomunicaciones, Electricidad Y Construcción Sintec, S.A. |



# SECRETARÍA DE FINANZAS



| No | Nombre del Proyecto                                       | Depto          | Monto         | Avance Físico | Avance Financiero | Estatus                 | Ejecutor                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| 4  | Reposición Escuela Y Jardín De Niños Jesus Mejia Paz      | GRACIAS A DIOS | 12,832,143.80 | 54.29%        | 29.00%            | Ejecución               | Construcciones Diversas S De R.L De C.V                  |
| 5  | Reposición Ceb Republica De Costa Rica Y Jn Stanley Goff  | GRACIAS A DIOS | 17,374,544.72 | 22.90%        | 25.44%            | Suspendido              | Servicios De Diseño Y Construcción S. De R.L. (Serdicon) |
| 6  | Reposición Cebp José Dolores Urquía                       | COMAYAGUA      | 2,683,379.76  | 0.00%         | 0.00%             | Proceso de contratación | A.M. Lamani                                              |
| 7  | Reposición Cebp Adalid Arauz,                             | COMAYAGUA      | 3,377,977.65  | 0.00%         | 0.00%             | Proceso de contratación | A.M. Ajuterique                                          |
| 8  | Reposición Ceb Enriqueta Orellana Y Ccpreb Mundo Infantil | LEMPIRA        | 7,449,351.54  | 0.00%         | 0.00%             | Proceso de contratación | A.M. Las Flores                                          |
| 9  | Ceb Independencia                                         | SANTA BARBARA  | 9,630,000.00  | 0.00%         | 0.00%             | Formulación             | A.M. Macuelizo/ Cep                                      |

Fuente: Unidad Ejecutora del proyecto

## D.1.2. Evaluación Financiera al II Trimestre 2026

### Evaluación Financiera II trimestre 2026

| Proyecto                                                               | Convenio                    | Costo Total                |                              | Fecha de Inicio - Fin |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|
|                                                                        |                             |                            |                              |                       |
| Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar (PROMINE/KFW, FASE V) | 2016 68 763                 | 10,750,000.00 €            | L295,947,500.00              | 02/04/2018-31/7/2026  |
|                                                                        | <b>Presupuesto Aprobado</b> | <b>Presupuesto Vigente</b> | <b>Ejecutado (Devengado)</b> | <b>% Ejecución</b>    |
| II Trimestre 2026                                                      | 55,095,857.00               | 55,095,857.00              | 3,297,648.08                 | 6%                    |
| Acumulado 2026                                                         | 55,095,857.00               | 55,095,857.00              | 3,297,648.08                 | 6%                    |
| Acumulado Vida del Proyecto *                                          | L295,947,500.00             | L295,947,500.00            | 181,136,357.49               | 61%                   |

\* / Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto  
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto  
Tipo de Cambio al 30/06/2026, L26.7183 por \$1.00



# SECRETARÍA DE FINANZAS



A la fecha se reporta una baja ejecución presupuestaria, teniendo pagos pendientes por un monto de L. 9,556,390.26. Es importante indicar que para concretar estos pagos se requiere en algunos casos la aprobación de los contratos en el Congreso Nacional, elaboración y firmas de adendas.

Hay que indicar que el proyecto está en proceso de ampliación de plazo para la contratación, ejecución y finalización de las obras de los centros escolares.

## 2. Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras (MIFE) (BCIE).

Consiste en la implementación de la metodología de formación permanente de docentes y estudiantes, la mejora de la infraestructura escolar de centros de educación pública en todo el territorio nacional con énfasis en las zonas de mayor pobreza urbana y rural. El mejoramiento de la infraestructura incluye la ampliación y/o reparación de infraestructura educativa, dotación de mobiliario y equipamiento técnico educativo especializado; y el fortalecimiento de habilidades de los docentes de educación sobre metodologías de enseñanza basadas en competencias y las capacidades de los estudiantes y docentes de bachillerato en temas relacionados al emprendedurismo.

### Principales Metas Físicas al II trimestre 2026

| Metas Física            | Unidad de Medida | Anual        |           |         | II Trimestre de 2026 |           |         |
|-------------------------|------------------|--------------|-----------|---------|----------------------|-----------|---------|
|                         |                  | Programación | Ejecución | % EJEC. | Programación         | Ejecución | % EJEC. |
| Infraestructura Escolar | Centro Educativo | 0            | 0         | 0%      | 0                    | 0         | 0%      |

Fuente: Unidad Ejecutora del proyecto

El proyecto se encuentra en etapa de cierre, por lo que está en proceso de gestión de desembolso para realizar pagos contractuales y la culminación de obras correspondientes a 29 centros educativos.

### Evaluación Financiera II trimestre 2026

| Proyecto                                                                                         | Convenio                    | Costo Total                |                              | Fecha de             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|
|                                                                                                  |                             |                            |                              | Inicio - Fin         |
| Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras (MIFE) | BCIE - 2239                 | US\$80,000,000             | L 2,137,304,000              | 02/04/2021-31/3/2026 |
|                                                                                                  | <b>Presupuesto Aprobado</b> | <b>Presupuesto Vigente</b> | <b>Ejecutado (Devengado)</b> | <b>% Ejecución</b>   |
| II Trimestre 2026                                                                                | L 98,494,585.00             | L 98,494,585.00            | 10,869,950.55                | 10%                  |
| Acumulado 2026                                                                                   | L 98,494,585.00             | L 98,494,585.00            | 10,869,950.55                | 10%                  |
| Acumulado Vida del Proyecto *                                                                    | L 2,137,304,000             | L 2,137,304,000            | L 714,802,058.73             | 33%                  |

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto  
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto  
Tipo de Cambio al 30/06/2026, L26.7183 por \$1.00



# SECRETARÍA DE FINANZAS



Es importante indicar que para concretar pagos se requiere la aprobación de los contratos en el Congreso Nacional, elaboración y firmas de adendas.

**Nota técnica:** Se informa que al Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras (MIFE) se le desestimaron fondos por un monto de \$ **49,833,582.98**. Asimismo, la fecha de cierre contractual del proyecto se encuentra vencida (31/03/2026), por lo que se requiere la revisión del estado administrativo y financiero, así como la definición de las acciones correspondientes para su regularización y cierre.

### 3. Proyecto Convivencia y Espacios Seguros para los Jóvenes en Honduras (CONVIVIR) (KFW)

El programa abarca la construcción, el mejoramiento y el equipamiento de infraestructura social para jóvenes y espacios públicos, financiamiento y/o cofinanciamiento del trabajo con jóvenes y la capacitación de jóvenes, la capacitación de personal de las instituciones involucradas, las municipalidades seleccionadas, las comunidades de barrio y servicios de consultoría.

Los principales avances físicos al II Trimestre del 2026 son los siguientes:

#### Principales Metas Físicas al II trimestre 2026

| Metas Física                  | Unidad de Medida | Anual        |           |         | II Trimestre de 2026 |           |         |
|-------------------------------|------------------|--------------|-----------|---------|----------------------|-----------|---------|
|                               |                  | Programación | Ejecución | % EJEC. | Programación         | Ejecución | % EJEC. |
| Espacios Públicos recuperados | Obra             | 9            | 0         | 0%      | 0                    | 0         | 0%      |
| Jóvenes Capacitados           | Capacitación     | 14           | 0         | 0%      | 0                    | 0         | 0%      |

Fuente: Unidad Ejecutora del proyecto

**A continuación, se presenta una tabla de la situación actual de los proyectos priorizados para ejecutar 2026.**

| Departamento | Municipio   | Colonia             | Nombre del Proyecto               | Método de adquisición | Estatus                    |
|--------------|-------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| La Paz       | La Paz      | Bo. San Juan        | Plaza de Convivencia La Paz       | Modalidad PEC         | Revisión Control y Calidad |
| El Paraíso   | Danlí       | Bo. Nueva Esperanza | Parque Recreativo Nueva Esperanza | Modalidad PEC         | Diseño Conceptual          |
| La Paz       | La Paz      | Bo. San José        | Casa CONVIVIR La Paz              | Modalidad PEC         | Diseño Anteproyecto        |
| El Paraíso   | Danlí       | Bo. La Concepción   | Plaza Concepción Los Sueños       | Modalidad PEC         | Pendiente                  |
| La Paz       | La Paz      | Bo. La Merced       | La Perolera                       | Modalidad PEC         | Diseño Anteproyecto        |
| La Paz       | La Paz      | Bo. San Antonio     | Centro de Formación La Raíz       | Modalidad PEC         | Pendiente                  |
| Yoro         | El Progreso | Col. San Jorge      | Plaza San Jorge                   | Modalidad PEC         | Pendiente                  |



# SECRETARÍA DE FINANZAS



| Departamento | Municipio   | Colonia                | Nombre del Proyecto                  | Método de adquisición | Estatus   |
|--------------|-------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------|
| Yoro         | El Progreso | Casa Joven El Progreso | Casa Joven El Progreso               | Modalidad PEC         | Pendiente |
| Yoro         | Yoro        | Col. Primero de Mayo   | Plaza de Convivencia Lluvia de Peces | Modalidad PEC         | Pendiente |

Fuente: Unidad Ejecutora del proyecto

Al cierre del segundo trimestre de 2026, el Proyecto de Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes en Honduras (CONVIVIR) Fase III registró una ejecución financiera acumulada de L 10.0 millones, equivalente al 7% de su presupuesto vigente de L 142.7 millones. En el ámbito físico, las acciones ejecutadas se concentraron principalmente en la planificación, formulación y preparación de las intervenciones de la Fase III, destacando la revisión integral de la cartera de proyectos de infraestructura, la formulación del proyecto "Plaza La Convivencia" en el municipio de La Paz, la definición de criterios para la distribución de recursos entre los municipios beneficiarios y el fortalecimiento de la coordinación con la Asistencia Técnica, los gobiernos municipales y las dependencias institucionales. Asimismo, durante el trimestre se formalizó el cambio en la coordinación del proyecto, garantizando la continuidad técnica y administrativa de las actividades programadas y sentando las bases para el inicio de las intervenciones de infraestructura y de los componentes sociales orientados al fortalecimiento de capacidades de la juventud en los municipios priorizados.

A continuación, se reporta la ejecución financiera histórica del Proyecto Convivencia y Espacios Seguros para los Jóvenes en Honduras (CONVIVIR) al II trimestre de 2026:

| Proyecto                                                                              | Convenio                    | Costo Total                |                              | Fecha de Inicio - Fin |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|
|                                                                                       |                             |                            |                              |                       |
| Proyecto Convivencia y Espacios Seguros para los Jóvenes en Honduras (CONVIVIR) (KFW) | Fase III 2018 67563         | 11,000,000.00              | L 336,743,000                | 02/04/2021-6/4/2028   |
|                                                                                       | <b>Presupuesto Aprobado</b> | <b>Presupuesto Vigente</b> | <b>Ejecutado (Devengado)</b> | <b>% Ejecución</b>    |
| II Trimestre 2026                                                                     | L 142,666,062.00            | L 142,666,062.00           | 10,002,217.78                | 7%                    |
| Acumulado 2026                                                                        | L 142,666,062.00            | L 142,666,062.00           | 10,002,217.78                | 7%                    |
| Acumulado Vida del Proyecto *                                                         | L 336,743,000               | L 336,743,000              | L 40,929,116.37              | 12.1%                 |

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto  
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto  
Tipo de Cambio al 30/06/2026, L26.7183 por \$1.00

Durante el II trimestre del 2026, no se han realizado contratos de bienes, servicios u obras.



# SECRETARÍA DE FINANZAS



## 4. Proyecto Recuperación de Emergencia a causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras (PRE) (Banco Mundial).

El Proyecto se enfoca en la rehabilitación y reconstrucción de la infraestructura pública en salud, educación, agua y saneamiento, vial, comunitaria y vivienda en las zonas geográficas del país afectadas por los ciclones tropicales Eta e Iota.

El PRE tiene por objetivo atender las necesidades identificadas como prioritarias para reactivar la economía y apoyar las más urgentes necesidades de la población afectada por los fenómenos naturales ETA e IOTA, como respuesta de emergencia y recuperación de Honduras, y, en esta perspectiva, fortalecer la capacidad institucional del Estado para gestionar una ejecución eficaz, eficiente y transparente.

Los principales avances físicos al II trimestre de 2026 son los siguientes:

### Principales Metas Físicas al II trimestre 2026

| Metas Física                                     | Unidad de Medida | Anual        |           |         | II Trimestre de 2026 |           |         |
|--------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------|---------|----------------------|-----------|---------|
|                                                  |                  | Programación | Ejecución | % EJEC. | Programación         | Ejecución | % EJEC. |
| Centros educativos rehabilitados                 | Centro Educativo | 19           | 0         | 0%      | 0                    | 0         | 0%      |
| Sistemas de agua rehabilitados                   | Sistema de Agua  | 7            | 1         | 14.3%   | 1                    | 1         | 100%    |
| Infraestructura vial rehabilitada y reconstruida | Kilometro        | 2            | 0         | 0%      | 0                    | 0         | 0%      |
| Centros de salud pública rehabilitados           | Unidad de Salud  | 1            | 0         | 0%      | 0                    | 0         | 0%      |

**Fuente: FHIS**

Durante el segundo trimestre de 2026, no se han registrado nuevas adjudicaciones de contratos de Obras, Bienes, Servicios de Consultorías (firmas e Individuales) o Servicios de No Consultoría. Los procesos activos en cada categoría de contratación y su estado actual a junio de 2026 se presentan a continuación:



# SECRETARÍA DE FINANZAS



| No.                                     | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Estado actual al<br>31 de junio de 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBRAS</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1                                       | <b>HN-SEDECOAS-407817-CW-RFB</b><br>Lote 2: Reposición CEB Ramón Montoya en Colón Código 110030, Enmienda No. 1 Contrato No. SDO-O-FHIS-09-2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Con fecha 30 de junio de 2026 se remite el expediente con la Enmienda 1 para la firma del Ministro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2                                       | <b>HN-SEDECOAS-371603-CW-RFB</b><br>Enmienda No. 1 al Contrato No. SDO-O-FHIS-07-2024 Lote No. 2 Reposición Sistema de Agua Potable en Aldea Casco Urbano, Municipio de Apacilagua en el Departamento de Choluteca, Código 109073                                                                                                                                                                                                                                                                  | A la espera de aprobación del Comité de Operaciones de la OC# No. 2 de Tiempo y No. 3 de Monto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>CONSULTORÍAS: FIRMAS CONSULTORAS</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1                                       | <b>HN-SEDECOAS-477034-CS-CQS</b><br>Supervisión de Reposición de Puentes en: San Lorenzo Techín Código 108785 y Reposición de Puente en Santa Clara Código 108700 en el Departamento de Copán, Puente Sobre el Río Aguagua San Vicente Centenario Código 110805 y Reposición de Puente sobre Río Palaja en el Municipio El Nispero, Código 111225 en el Departamento de Santa Barbara, y Puente Río Siale en Las Casitas en el Municipio de Orica, Código 111226 Departamento de Francisco Morazán | Proceso publicado en el portal de Honducompras y en Diario La Tribuna los días 19 y 22 de junio de 2026, sin embargo, la Dirección Legal de la SEDECOAS-FHIS en reunión de fecha 25 de junio ha comunicado a la Coordinación de la UEP-PRE que lo aprobado en el Acta No. 1723 por el Comité de Operaciones debe ser ratificado por las Autoridades actuales previo a cualquier acción que la UEP realice. Por lo anterior, este proceso será cancelado una vez que las Autoridades firmen la Notificación de la Cancelación de este Proceso. |
| 2                                       | <b>HN-SEDECOAS-513456-CS-CQS</b><br>Supervisión para la Restauración CEB República de Colombia Código 111277; Reposición CEB Renacimiento Código 111278 y Restauración CEB Luis Landa Código 111279 en el Municipio de Siguatepeque en el Departamento de Comayagua                                                                                                                                                                                                                                | Proceso reactivado y se procedió a remitir la Carta de Solicitud de Propuesta Servicios de Consultoría a la empresa Asociación de Profesionales S.A. de C.V. (ASP Consultores). La fecha Límite para la recepción de Propuesta Técnica y Financiera: 08 de julio del 2026 a las 2:00 p.m, de conformidad a lo indicado en la Enmienda No. 1 al Documento de Solicitud de Propuesta (SP).                                                                                                                                                      |
| 3                                       | <b>CPN-SEDECOAS-FHIS-28-2021</b><br>Supervisión Técnica de Obras de Rehabilitación y Reconstrucción de Escuelas, Paquetes No.1,4,6 y 7, Departamentos de Copán, Ocotepeque, Santa Bárbara, Cortés, Yoro e Islas de la Bahía de la República de Honduras, Enmienda No. 1 Contrato No. CPN-F-FHIS-02-2022                                                                                                                                                                                            | Con fecha 30 de junio de 2026, se remite el expediente con la Enmienda 1 para la firma del Ministro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4                                       | <b>CPN-FHIS-16-2022</b><br>Supervisión de Escuelas Paquete No.2 Ubicadas en los Departamentos de Comayagua, El Paraíso, Francisco Morazán, Intibucá, La Paz y Lempira. Códigos: 108505, 108504, 108275, 108524, 108620, 108509, 108451, 108579, 108443, 108491, 108602 y 108393, Enmienda No. 1 Contrato No. CPN-F-FHIS-03-2022                                                                                                                                                                    | Con fecha 30 de junio de 2026, se remite el expediente con la Enmienda 1 para la firma del Ministro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



# SECRETARÍA DE FINANZAS



| No. | Descripción                                                                                                                                                                                                            | Estado actual al<br>31 de junio de 2026                                                                                                                                                                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5   | <b>HN-SEDECOAS-342138-CS-CQS</b><br>Supervisión de Rehabilitación de Sistema de Agua Potable en los Departamentos de Yoro y Comayagua, Códigos: 108702, 108703 Y 108705, Enmienda No. 2 Contrato No. SC-F-FHIS-01-2023 | A la espera de recibir documentación complementaria por parte Inspector de Proyectos de la UEP-PRE para la elaboración de la Enmienda.                                                                             |
| 6   | <b>HN-SEDECOAS-342611-CS-QCBS</b><br>Supervisión Rehabilitación de Infraestructura Vial en Caminos Rurales, Enmienda 1 Contrato No. SC-F-FHIS-03-2025                                                                  | Pendiente de recibir de Especialista en Carreteras de la UEP-PRE la información complementaria para elaborar la enmienda, así mismo a la espera de obtener los datos generales del Contratante/nuevas autoridades. |

A continuación, véase la ejecución financiera histórica del Proyecto Recuperación de Emergencia a causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras (PRE) al II trimestre de 2026:

| Proyecto                                                                                        | Convenio                    | Costo Total                |                              | Fecha de              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|
|                                                                                                 |                             |                            |                              | Inicio - Fin          |
| Proyecto Recuperación de Emergencia a causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras (PRE) | BCIE - 2261                 | US\$124,211,000            | L 3,318,706,761.30           | 25/05/2021-30/06/2028 |
|                                                                                                 | <b>Presupuesto Aprobado</b> | <b>Presupuesto Vigente</b> | <b>Ejecutado (Devengado)</b> | <b>% Ejecución</b>    |
| II Trimestre 2026                                                                               | L 481,522,205.00            | L 481,522,205.00           | L 91,147,646                 | 18.9%                 |
| Acumulado 2026                                                                                  | L 481,522,205.00            | L 481,522,205.00           | L 93,763,686.23              | 18.9%                 |
| Acumulado Vida del Proyecto *                                                                   | 3,318,706,761.30            | 3,318,706,761.30           | 1,422,747,827.76             | 58%                   |

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 33/06/2026 (BCH): L26.7183 por \$1.00



# SECRETARÍA DE FINANZAS



Asimismo, el resto de los proyectos ejecutados por el FHIS, no reportan avances:

1. Proyecto “Agua de Gracias” es financiado con recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), está en proceso de cierre, no se han registrado avances físicos ni financieros significativos en su desarrollo el convenio fue desobligado en su totalidad.
2. Proyecto Construcción del Primer Hospital Garífuna en el Municipio de Iriona, Departamento de Colón.
3. Ampliación del Polideportivo Ramón Díaz López

Los dos últimos son financiados con recursos del tesoro nacional no reportan ejecución y se encuentran en proceso de cierre 2026.

## *D.1.3. Principales Adquisiciones al II Trimestre 2026*

No se registran adquisiciones para este trimestre.

## **E. GESTIÓN DE LA INVERSIÓN**

- Mediante Decreto Ejecutivo PCM-004-2026 de fecha 25 de febrero 2026 artículo 11 se instruye adscribir como dependencia interna de la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT), el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS).
- En atención a lo indicado en el PCM-004-2026, la Secretaría de Finanzas a través de la Dirección General de Inversiones Públicas emite Dictamen de Enmienda favorable para realizar cambio de ejecutor de todos los proyectos ejecutados por FHIS para ser ejecutados en SIT.
- Durante el II trimestre del año 2026, se realizó la solicitud de cuota trimestral de fondos externos a la SEFIN para garantizar la disponibilidad de recursos financieros de los proyectos de inversión pública.

## **F. PROBLEMÁTICA Y ACCIONES DURANTE EL II TRIMESTRE 2026**

- La transición institucional hacia la SIT continúa siendo el principal factor que afecta la velocidad de ejecución de varios programas.
- Los principales riesgos son administrativos más que técnicos, destacando retrasos en contrataciones, aprobación de contratos y pagos.
- PRE, PROMINE y CONVIVIR concentran la mayor necesidad de seguimiento ejecutivo por su impacto financiero y compromisos con organismos internacionales.
- Ejecutar el cronograma de transición a la SIT, el cual se ha trabajado con algunos retrasos y se contempla finalizar la transición a la SIT en el mes de septiembre según PCM-013-2026.
- Al 30 de junio de 2026 los contratos enviados a ratificación por el Congreso Nacional aún se encuentran pendientes de aprobación.



# SECRETARÍA DE FINANZAS



## G. CONCLUSIONES

El Fondo Hondureño de Inversión Social se encuentra en etapa de transición a la Secretaría de Infraestructura y Transporte, esto ha generado fragilidad en los procesos de los proyectos (administrativos, avances físicos y ejecución), por lo que se espera que para el siguiente trimestre se refleje un mejor panorama con respecto a los avances de cada uno de los proyectos.

## H. RECOMENDACIONES

Agilizar los procesos internos a fin de cumplir con los lineamientos compartidos por la SEFIN con respecto al cronograma de transición.

Realizar las gestiones necesarias para la solicitud de usuarios y perfiles, a fin de actualizar la información de los proyectos y la formulación 2027.



# SECRETARÍA DE FINANZAS



## ANEXO 1

Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas  
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE, 2026  
Cifras en Lempiras

| No. Proy. | Institución / Programa o Proyecto                                                                            | Convenio        | Presupuesto Aprobado    |                       |               | Presupuesto Vigente     |                       |               | Ejecutado II Trimestre  |                       |               |                         | Ejecutado Anual (Devengado) |                       |               |                         | Compromiso Aprobado     |                       |               |                           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------|
|           |                                                                                                              |                 | Total Fondos Nacionales | Total Fondos Externos | Total General | Total Fondos Nacionales | Total Fondos Externos | Total General | Total Fondos Nacionales | Total Fondos Externos | Total General | % Ejecución (Dev./Vig.) | Total Fondos Nacionales     | Total Fondos Externos | Total General | % Ejecución (Dev./Vig.) | Total Fondos Nacionales | Total Fondos Externos | Total General | % Compromiso (Comp./Vig.) |
| 81        | I. Inversión Productiva                                                                                      |                 | 49,407,087              | 775,706,770           | 825,113,857   | 42,901,185              | 775,706,770           | 818,607,955   | 1,433,997               | 116,326,432           | 117,760,428   | 13.1%                   | 1,433,997                   | 118,653,985           | 120,087,981   | 24.8%                   | 1,639,330               | 121,464,738           | 123,104,068   | 15.0%                     |
| 7         | 0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social                                                                   |                 | 49,407,087              | 775,706,770           | 825,113,857   | 42,901,185              | 775,706,770           | 818,607,955   | 1,433,997               | 116,326,432           | 117,760,428   | 14.4%                   | 1,433,997                   | 118,653,985           | 120,087,981   | 14.7%                   | 1,639,330               | 121,464,738           | 123,104,068   | 15.0%                     |
| 1         | Ampliación del Polideportivo Ramón Díaz López, Etapa II, ubicado en Catacamas, Departamento de Olancho       |                 | 6,505,902               |                       | 6,505,902     | -                       |                       | -             | -                       | -                     | -             | 0.0%                    | -                           |                       | -             | 0.0%                    | -                       |                       | -             | 0.0%                      |
|           | Total Ampliación del Polideportivo Ramón Díaz López, Etapa II, ubicado en Catacamas, Departamento de Olancho |                 | 6,505,902               |                       | 6,505,902     | -                       |                       | -             | -                       | -                     | -             | 0.0%                    | -                           |                       | -             | 0.0%                    | -                       |                       | -             | 0.0%                      |
| 2         | Construcción del Primer Hospital Garífuna en el Municipio de Triona, Departamento de Colón.                  | FN-25984-1      | 30,000,000              |                       | 30,000,000    | 30,000,000              |                       | 30,000,000    | -                       |                       | -             | 0.0%                    | -                           |                       | -             | 0.0%                    | -                       |                       | -             | 0.0%                      |
|           | Total Construcción del Primer Hospital Garífuna en el Municipio de Triona, Departamento de Colón             |                 | 30,000,000              |                       | 30,000,000    | 30,000,000              |                       | 30,000,000    | -                       |                       | -             | 0.0%                    | -                           |                       | -             | 0.0%                    | -                       |                       | -             | 0.0%                      |
| 3         | CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JOVENES EN HONDURAS FASE III                                             | KfW 2018.6756.3 | 9,846,678               | 132,819,384           | 142,666,062   | 9,846,678               | 132,819,384           | 142,666,062   | 1,154,667               | 8,847,551             | 10,002,218    | 7.0%                    | 1,154,667                   | 8,847,551             | 10,002,218    | 7.0%                    | 1,360,000               | 8,866,218             | 10,226,218    | 7.2%                      |
|           | Total CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JOVENES EN HONDURAS FASE III                                       |                 | 9,846,678               | 132,819,384           | 142,666,062   | 9,846,678               | 132,819,384           | 142,666,062   | 1,154,667               | 8,847,551             | 10,002,218    | 7.0%                    | 1,154,667                   | 8,847,551             | 10,002,218    | 7.0%                    | 1,360,000               | 8,866,218             | 10,226,218    | 7.2%                      |
| 4         | PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/ KfW, FASE II)                                     | BMZ 2016.68763  | 3,054,507               | 52,041,350            | 55,095,857    | 3,054,507               | 52,041,350            | 55,095,857    | 279,330                 | 3,018,318             | 3,297,648     | 6.0%                    | 279,330                     | 3,018,318             | 3,297,648     | 6.0%                    | 279,330                 | 3,169,652             | 3,448,981     | 6.3%                      |
|           | Total PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/ KfW, FASE II)                               |                 | 3,054,507               | 52,041,350            | 55,095,857    | 3,054,507               | 52,041,350            | 55,095,857    | 279,330                 | 3,018,318             | 3,297,648     | 6.0%                    | 279,330                     | 3,018,318             | 3,297,648     | 6.0%                    | 279,330                 | 3,169,652             | 3,448,981     | 6.3%                      |
| 5         | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y FORMACION EDUCATIVA EN HONDURAS                    | BCIE - 2239     | 98,494,585              | 98,494,585            | 98,494,585    | 98,494,585              | 98,494,585            | 98,494,585    | 10,869,951              | 10,869,951            | 11.0%         | 10,869,951              | 10,869,951                  | 10,869,951            | 11.0%         | 10,869,951              | 10,869,951              | 10,869,951            | 11.0%         |                           |
|           | Total PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y FORMACION EDUCATIVA EN HONDURAS              |                 | 98,494,585              | 98,494,585            | 98,494,585    | 98,494,585              | 98,494,585            | 98,494,585    | 10,869,951              | 10,869,951            | 11.0%         | 10,869,951              | 10,869,951                  | 10,869,951            | 11.0%         | 10,869,951              | 10,869,951              | 10,869,951            | 11.0%         |                           |
| 6         | PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE GRACIAS                 | BCIE-2261       | 10,829,246              | 10,829,246            | 10,829,246    | 10,829,246              | 10,829,246            | 10,829,246    | 2,154,479               | 2,154,479             | 19.9%         | 2,154,479               | 2,154,479                   | 2,154,479             | 19.9%         | 2,154,479               | 2,171,016               | 2,171,016             | 20.0%         |                           |
|           | Total PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE GRACIAS           |                 | 10,829,246              | 10,829,246            | 10,829,246    | 10,829,246              | 10,829,246            | 10,829,246    | 2,154,479               | 2,154,479             | 19.9%         | 2,154,479               | 2,154,479                   | 2,154,479             | 19.9%         | 2,154,479               | 2,171,016               | 2,171,016             | 20.0%         |                           |
| 7         | Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta y Iota en Honduras.                   | 6822-HN         | 481,522,205             | 481,522,205           | 481,522,205   | 481,522,205             | 481,522,205           | 481,522,205   | 91,436,133              | 91,436,133            | 19.0%         | 91,436,133              | 93,763,686                  | 93,763,686            | 19.5%         | 93,763,686              | 96,387,902              | 96,387,902            | 20.0%         |                           |
|           | Total Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta y Iota en Honduras.             |                 | 481,522,205             | 481,522,205           | 481,522,205   | 481,522,205             | 481,522,205           | 481,522,205   | 91,436,133              | 91,436,133            | 19.0%         | 91,436,133              | 93,763,686                  | 93,763,686            | 19.5%         | 93,763,686              | 96,387,902              | 96,387,902            | 20.0%         |                           |
|           | 2. Formación Bruta de Capital Fijo                                                                           |                 | 36,417,011              | -                     | 36,417,011    | 36,417,011              | -                     | 36,417,011    | 19,277,998              | -                     | 19,277,998    | 27.7%                   | 36,335,036                  | -                     | 36,335,036    | 37.6%                   | 36,335,036              | -                     | 36,335,036    | 99.8%                     |
|           | 0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social                                                                   |                 | 36,417,011              | -                     | 36,417,011    | 36,417,011              | -                     | 36,417,011    | 19,277,998              | -                     | 19,277,998    | 52.9%                   | 36,335,036                  | -                     | 36,335,036    | 99.8%                   | 36,335,036              | -                     | 36,335,036    | 99.8%                     |
|           | ACTIVIDADES CENTRALES                                                                                        |                 | -                       | -                     | -             | -                       | -                     | -             | -                       | -                     | -             | 0.0%                    | -                           | -                     | -             | 0.0%                    | -                       | -                     | -             | 0.0%                      |
|           | Total ACTIVIDADES CENTRALES                                                                                  |                 | -                       | -                     | -             | -                       | -                     | -             | -                       | -                     | -             | 0.0%                    | -                           | -                     | -             | 0.0%                    | -                       | -                     | -             | 0.0%                      |
|           | INFRAESTRUCTURA NACIONAL (FONDOS NACIONALES)                                                                 |                 | 36,417,011              | -                     | 36,417,011    | 36,417,011              | -                     | 36,417,011    | 19,277,998              | -                     | 19,277,998    | 52.9%                   | 36,335,036                  | -                     | 36,335,036    | 99.8%                   | 36,335,036              | -                     | 36,335,036    | 99.8%                     |
|           | Total INFRAESTRUCTURA NACIONAL (FONDOS NACIONALES)                                                           |                 | 36,417,011              | -                     | 36,417,011    | 36,417,011              | -                     | 36,417,011    | 19,277,998              | -                     | 19,277,998    | 52.9%                   | 36,335,036                  | -                     | 36,335,036    | 99.8%                   | 36,335,036              | -                     | 36,335,036    | 99.8%                     |
|           | Total general                                                                                                |                 | 85,824,098              | 775,706,770           | 861,530,868   | 79,318,196              | 775,706,770           | 855,024,966   | 20,711,994              | 116,326,432           | 137,038,426   | 23.1%                   | 37,769,033                  | 118,653,985           | 156,423,018   | 33.6%                   | 37,974,366              | 121,464,738           | 159,439,105   | 34.6%                     |

Nota: SIAFI, 30/06/2026



# SECRETARÍA DE FINANZAS



## ANEXO No.2

### SECRETARÍA DE FINANZAS

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública

#### PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL II TRIMESTRE, 2026

| Institución/Proyecto                                                                                            | Metas Física                                     | Unidad de Medida | Anual        |           |             | II Trimestre 2026 |           |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------|-------------|-------------------|-----------|-------------|
|                                                                                                                 |                                                  |                  | Programación | Ejecución | % Ejecución | Programación      | Ejecución | % Ejecución |
| 0022- Fondo Hondureño de Inversión Social                                                                       |                                                  |                  |              |           |             |                   |           |             |
| Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar (PROMINE/KFW, FASE IV y V) (KFW)                               | Infraestructura Escolar                          | Centro Educativo | 8            | 0         | 0%          | 0                 | 0         | 0%          |
| Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras (MIFE) (BCIE).        | Infraestructura Escolar                          | Centro Educativo | 0            | 0         | 0%          | 0                 | 0         | 0%          |
| Proyecto Convivencia y Espacios Seguros para los Jóvenes en Honduras (CONVIVIR) (KFW)                           | Espacios Públicos recuperados                    | Obra             | 9            | 0         | 0%          | 0                 | 0         | 0%          |
|                                                                                                                 | Jóvenes Capacitados                              | Capacitación     | 14           | 0         | 0%          | 0                 | 0         | 0%          |
| Proyecto Recuperación de Emergencia a causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras (PRE) (Banco Mundial) | Centros educativos rehabilitados                 | Centro Educativo | 19           | 0         | 0%          | 0                 | 0         | 0%          |
|                                                                                                                 | Sistemas de agua rehabilitados                   | Sistema de Agua  | 7            | 1         | 14.30%      | 1                 | 1         | 100%        |
|                                                                                                                 | Infraestructura vial rehabilitada y reconstruida | Kilometro        | 2            | 0         | 0%          | 0                 | 0         | 0%          |
|                                                                                                                 | Centros de salud pública rehabilitados           | Unidad de Salud  | 1            | 0         | 0%          | 0                 | 0         | 0%          |



# SECRETARÍA DE FINANZAS

