Secretaría de Finanzas
Gobierno de la República

SNIPH
Sistema Nacional de Inversión Pública de Honduras



Ampliación Subestación Eléctrica Choloma en 138 kV en Choloma, Cortés
Empresa Nacional de Energía Eléctrica

INFORME DE EJECUCIÓN

INVERSIÓN PÚBLICA JUNIO

2025

DGIP
Dirección General de Inversión Pública

www.sefin.gob.hn

Barrio El Jazmin, Ave. Miguel Cervantes

Contenido

Resumen Ejecutivo 1

Inversión Pública 3

Inversión Pública Aprobada 3
Inversión Pública aprobada como porcentaje del PIB, 2021-2025 4
Inversión Pública Ejecutada 5
Ejecución de la Inversión Pública Institucional 5
Ejecución de Inversión Pública por Sector 12
Ejecución de Inversión Pública por Fuente de Financiamiento 13
Ejecución Metas Físicas de la Inversión Pública 14
Análisis Proyectos Propuestos (Pre-Inversión) 16
Avances del SNIPH y Mapa de Inversiones 19

..... 20
Avances en el Portal Honduras Inversiones 20

|

Resumen Ejecutivo

La Secretaría de Finanzas (SEFIN), a través de la Dirección General de Inversiones Públicas (DGIP), desempeña un papel crucial en el desarrollo económico sostenible de Honduras, como órgano rector y técnico del Sistema Nacional de Inversión Pública de Honduras (SNIPH). Entre las funciones enmarcadas en ley, la DGIP es responsable de la formulación y actualización del Plan Plurianual de Inversión Pública, la priorización de la viabilidad de proyectos, la programación física y financiera de las inversiones, el seguimiento físico y financiero y el cierre de proyectos.

El Plan de Inversión Pública, es uno de los instrumentos de planificación más importante del Gobierno, ya que permite llevar a la práctica las políticas, planes, estrategias, programas y proyectos orientados a mejorar la calidad de vida de la población hondureña, haciendo uso óptimo de los recursos del Estado de forma que éstos brinden beneficios a los ciudadanos de manera oportuna, eficaz y sostenible. En ese sentido, los recursos invertidos producen mayor bienestar social a la comunidad, en coherencia con las prioridades establecidas en el Plan Gobierno Bicentenario para la Refundación Nacional.

La actualización anual del Plan de Inversión Pública permite adaptarse a las cambiantes condiciones económicas y sociales, así como a las nuevas prioridades del Gobierno de Honduras. Con la implementación de rigurosos procesos de evaluación y seguimiento, la DGIP busca maximizar el impacto positivo de cada proyecto, fomentando así un crecimiento inclusivo y equitativo.

Este enfoque estratégico y dinámico hacia la inversión pública es esencial para impulsar la innovación, mejorar la infraestructura y fortalecer la capacidad técnica institucional del país para enfrentar los desafíos futuros.

Para el año 2025 la Inversión Pública aprobada por el Congreso Nacional asciende a **L97,650.1** millones (Inversión productiva **28,816.7** millones, Inversión social **L58,830.3** millones y Formación Bruta de Capital L10,003.1 millones), representando **9.5%** del Producto Interno Bruto (PIB) y **22.7%** del Presupuesto General de la República, destinados para la ejecución de **72 proyectos** de arrastre y **12 nuevos**, totalizando **84** proyectos registrados en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIPH), además de Programas Sociales y Bienes de Formación Bruta de Capital.

El Plan de Inversión Pública al 30 de junio de 2025 alcanzó un presupuesto vigente de **L82,148.4 millones**; cuenta con un monto de L17,937.1 millones asignados a inversión productiva, L44,545.2 millones a inversión social y L19,957 millones a Formación Bruta de Capital. La ejecución presupuestaria alcanzó un **19%** del presupuesto vigente total, en la implementación de proyectos clave para el desarrollo del país para el año 2025.

Esta inversión se distribuye en diversos sectores esenciales como Carreteras, Salud, Educación Energía, Seguridad Alimentaria, Protección Social, Seguridad, entre otros, reflejando el compromiso del Gobierno con el progreso económico y social de Honduras.

En este informe, se analiza detalladamente la distribución y ejecución de la inversión pública al mes de junio de 2025, por tipo de inversión, sectorial y fuente de financiamiento, destacando los logros alcanzados y los desafíos que aún persisten en la gestión de la inversión pública en el país.

El presente informe tiene como objetivo proporcionar una visión general de la situación de la inversión pública que ejecuta el Gobierno, al mes de junio de 2025, examinando tanto la distribución de los recursos como los avances en la ejecución de proyectos prioritarios

Inversión Pública

Inversión Pública Aprobada

La Inversión Pública Total aprobada por el Congreso Nacional para el año 2025 se ha priorizado en un monto de **L97,650.1** millones que representa el **9.5%** respecto al Producto Interno Bruto (PIB) y **22.7%** del Presupuesto General de la República; del monto total aprobado L28,816.7 millones incluyen la **Inversión Productiva**, ejecutados por las instituciones del Sector Público, como la Secretaría de Salud, Educación, Seguridad, Agricultura y Ganadería, Infraestructura y Transporte, entre otras.

Además, se incluye, L58,830.3 millones, destinados para **Inversión Social** en intervenciones de capital humano para mejorar la calidad de vida y el bienestar social de la población y el restante L10,003.1 millones, corresponden a la **Formación Bruta de Capital Fijo**, como parte de la Inversión Pública Total, en apoyo a las adquisiciones de bienes capitalizables (equipos, maquinaria) para las instituciones del sector público.

Tabla 1. Inversión Pública por Tipo – Aprobado 2025
(En millones de lempiras)

Tipo de Inversión	Presupuesto Aprobado	% Participación
Inversión Productiva	28,816.7	29.5%
Inversión Social	58,830.3	60.2%
Formación Bruta de Capital	10,003.1	10.2%
Totales	**97,650.1**	**100.0%**

Nota. Datos obtenidos del Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI) presupuesto aprobado por el Congreso Nacional año 2025


Inversión Pública aprobada como porcentaje del PIB, 2021-2025

Al analizar la inversión pública aprobada respecto al Producto Interno Bruto (PIB) promedio del periodo 2021 - 2025, se puede observar que, en los años 2021 y 2022, la inversión pública representó un porcentaje relativamente bajo de aproximadamente el 2% del PIB, sin embargo, en los años 2023, 2024 y 2025, la inversión pública aumentó significativamente su participación respecto al PIB, representando alrededor del 11.1%, 10.4% y 9.5% respectivamente. Esto refleja el compromiso del Gobierno del Socialismo Democrático liderado por la Presidenta Xiomara Castro de promover la inversión social en beneficio de la población hondureña.



PIB estimado 2025
L1,029.4 millones

Gráfica 1. Inversión Pública Aprobada como Porcentaje del PIB, 2021-2025

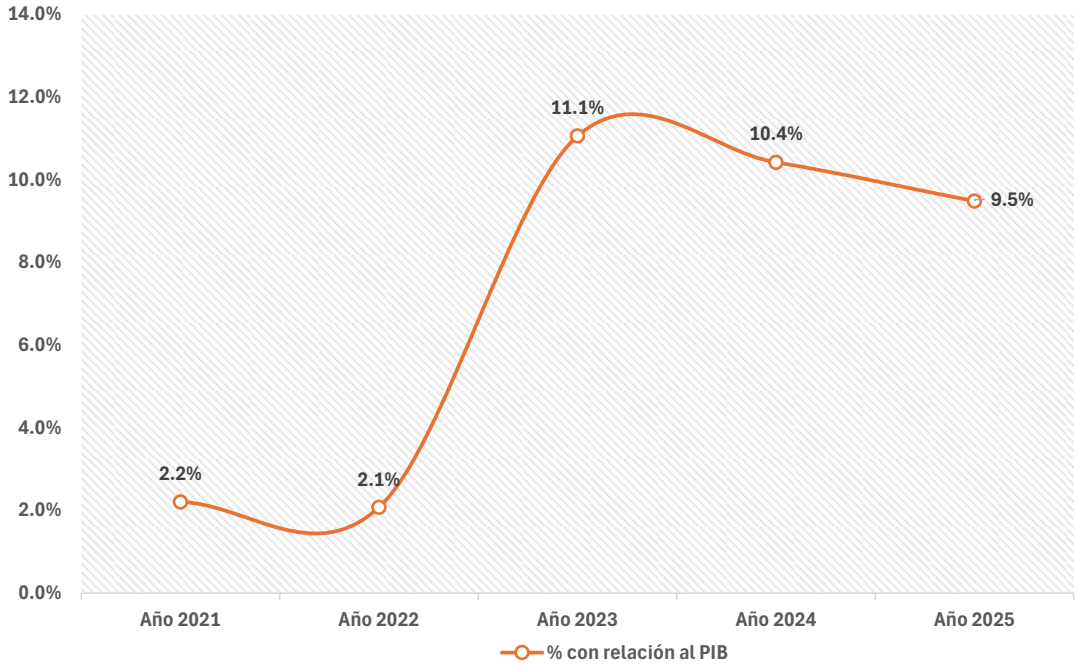


Nota. Datos obtenidos del Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI) y del Banco Central de Honduras (BCH)

Inversión Pública Ejecutada

Ejecución de la Inversión Pública Institucional

En la ejecución al mes de junio de 2025, se observa una amplia distribución de la inversión pública en diversas instituciones, como infraestructura y transporte, energía, red solidaria, salud, desarrollo comunitario, agua y saneamiento, agricultura y ganadería, deportes, educación física y recreación, inversión social, entre otras. El presupuesto vigente reporta un monto de L82,444.6 millones; mientras que la ejecución presupuestaria reporta un monto de L27,561.5 millones representando un porcentaje de ejecución del 33.4% (véase detalle en anexo).

Tabla 2. Inversión Pública por Tipo – Vigente Junio 2025
(En millones de lempiras)

	Tipo de Inversión	Presupuesto Vigente	% Participación
	Inversión Productiva	19,051.0	23.1%
	Inversión Social	19,818.6	24.0%
	Formación Bruta de Capital	43,575.0	52.9%
	Totales	82,444.6	100.0%

Nota. Datos obtenidos del Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI)

En cuanto a la ejecución por tipo de inversión, se presenta en el siguiente cuadro con el porcentaje de ejecución presupuestaria por tipo de inversión e institución:

Tabla 3. Ejecución Presupuestaria por Tipo de Inversión e Institución al mes de junio,2025

Cifras en Millones de Lempiras

Tipo de Inversión / Institución	Suma de Presupuesto Vigente	Suma de Devengado Aprobado	% de Ejec.
Inversión Productiva	19,818.59	5,232.34	26.4%
0411 - Secretaría de Infraestructura y Transporte	7,364.60	2,579.68	35.0%
0060 - Secretaría de Salud	2,072.31	347.34	16.8%
0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería	1,735.10	261.75	15.1%
0415 - Programa de la Red Solidaria	1,508.57	226.21	15.0%
0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social	1,506.41	380.77	25.3%
0801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica	776.83	210.79	27.1%
0414 - Dirección de Gestión por Resultados	471.89	96.09	20.4%
0413 - Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación	464.06	232.20	50.0%
0050 - Secretaría de Educación	405.13	171.22	42.3%
0180 - Registro Nacional de las Personas	392.26	4.23	1.1%
0400 - Administración Aduanera de Honduras	382.12	14.78	3.9%
0513 - Instituto Nacional de Estadísticas	372.47	34.89	9.4%
0416 - Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento	339.84	200.74	59.1%
0028 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal	327.13	132.03	40.4%
0070 - Secretaría de Seguridad	327.04	77.51	23.7%
0101 - Comisión Nacional de Telecomunicaciones	236.22	16.90	7.2%
0150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente	158.02	-	0.0%
0044 - Instituto Nacional Penitenciario	142.16	24.40	17.2%
1801 - Alcaldía Municipal del Distrito Central	137.93	52.35	38.0%
0410 - Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras	136.90	8.70	6.4%
0515 - Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación	125.24	35.40	28.3%
0803 - Empresa Nacional Portuaria	106.82	-	0.0%
0243 - Dirección Nacional de Parques y Recreación	89.94	43.52	48.4%
0507 - Inst. Hondureño para Prev. y Trat. del Alcohol Drog y Farm.	62.93	34.65	55.1%
0100 - Secretaría de Finanzas	50.19	0.03	0.1%
0130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social	35.91	-	0.0%
0511 - Universidad de Ciencias Forestales	35.25	9.11	25.8%
0406 - Secretaría de Asuntos de la Mujer	26.00	26.00	100.0%
0505 - Instituto Hondureño de Antropología e Historia	18.09	3.09	17.1%
0244 - Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer	7.69	4.44	57.7%
0418 - Administración Nacional de Servicio Civil	3.53	3.53	100.0%
0033 - Programa de Vivienda y Asentamientos Humanos	-	-	-

Tabla 3. Ejecución Presupuestaria por Tipo de Inversión e Institución al mes de junio,2025

Cifras en Millones de Lempiras

Tipo de Inversión / Institución	Suma de Presupuesto Vigente	Suma de Devengado Aprobado	% de Ejec.
Formación Bruta de Capital	19,051.00	3,596.98	18.9%
0411 - Secretaría de Infraestructura y Transporte	6,674.50	2,330.68	34.9%
0801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica	1,799.39	58.60	3.3%
0701 - Universidad Nacional Autónoma de Honduras	1,296.78	3.88	0.3%
0044 - Instituto Nacional Penitenciario	1,155.67	128.91	11.2%
0060 - Secretaría de Salud	1,016.54	307.14	30.2%
0601 - Instituto Hondureño de Seguridad Social	1,004.45	0.31	0.0%
0090 - Secretaría de Defensa Nacional	881.04	112.05	12.7%
0413 - Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación	589.86	13.33	2.3%
0902 - Banco Central de Honduras	525.26	5.16	1.0%
0070 - Secretaría de Seguridad	387.72	37.04	9.6%
0503 - Instituto Nacional de Formación Profesional	319.35	0.09	0.0%
0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería	261.15	-	0.0%
0050 - Secretaría de Educación	257.04	10.05	3.9%
0804 - Empresa Hondureña de Telecomunicaciones	237.27	0.79	0.3%
0500 - Instituto Nacional Agrario	206.13	165.45	80.3%
0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social	169.31	47.60	28.1%
0037 - Servicio de Administración de Rentas	163.04	18.26	11.2%
0604 - Instituto de Previsión Militar	150.50	17.46	11.6%
0045 - Instituto Nacional de Migración	121.40	6.77	5.6%
0024 - Instituto de la Propiedad	119.81	30.02	25.1%
0004 - Consejo Nacional Electoral	111.65	76.85	68.8%
0703 - Universidad Nacional de Agricultura	108.35	4.33	4.0%
0603 - Instituto Nacional de Previsión del Magisterio	95.99	3.08	3.2%
0030 - Secretaría de la Presidencia	95.42	1.70	1.8%
0102 - Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía	86.68	27.39	31.6%
0400 - Administración Aduanera de Honduras	83.02	0.29	0.4%
0042 - Cuerpo de Bomberos de Honduras	81.69	-	0.0%
0180 - Registro Nacional de las Personas	81.60	27.44	33.6%
0903 - Banco Nacional de Desarrollo Agrícola	69.00	6.15	8.9%
0150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente	68.60	0.20	0.3%
0130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social	67.22	0.00	0.0%
0043 - Empresa Nacional de Artes Gráficas	63.96	16.66	26.0%
0100 - Secretaría de Finanzas	53.14	4.23	8.0%
0062 - Agencia de Regulación Sanitaria	52.43	8.66	16.5%

Tabla 3. Ejecución Presupuestaria por Tipo de Inversión e Institución al mes de junio,2025

Cifras en Millones de Lempiras

Tipo de Inversión / Institución	Suma de Presupuesto Vigente	Suma de Devengado Aprobado	% de Ejec.
0144 - Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible	50.00	50.00	100.0%
0501 - Instituto Hondureño de Turismo	47.15	3.62	7.7%
0803 - Empresa Nacional Portuaria	44.84	3.92	8.7%
0511 - Universidad de Ciencias Forestales	42.98	9.74	22.7%
0505 - Instituto Hondureño de Antropología e Historia	38.67	9.23	23.9%
0901 - Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda	37.54	0.90	2.4%
0602 - Inst. Nal. de Jubi.y Pen. de los Emp. y Fun. del Poder Ejec.	37.00	3.04	8.2%
0035 - Instituto Hondureño de Geología y Minas	24.61	0.01	0.0%
0040 - Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización	23.53	0.07	0.3%
0950 - Comisión Nacional de Bancos y Seguros	23.06	0.00	
0080 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional	21.04	1.70	8.1%
0416 - Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento	17.51	13.53	77.3%
0805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados	17.46	0.62	3.6%
0123 - Instituto Hondureño de Transporte Terrestre	14.90	0.99	6.6%
0121 - Dirección General de la Marina Mercante	14.50	1.39	9.6%
0153 - Comisión Reguladora de Energía Electrica	12.03	1.59	13.2%
0005 - Tribunal de Justicia Electoral	10.52	10.52	100.0%
0807 - Suplidora Nacional de Productos Básicos	10.16	0.17	1.7%
0806 - Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola	9.74	0.21	2.2%
0605 - Ins. de Prev.Soc. de los Emp.de la Univ.Nal.Aut. de Honduras	8.80	0.20	2.3%
0039 - Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios	8.63	1.08	12.5%
0506 - Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas	7.86	0.48	6.1%
0200 - Procuraduría General de la República	5.40	3.93	72.7%
0508 - Patronato Nacional de la Infancia	4.75	0.14	3.0%
0702 - Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán	4.66	0.39	8.3%
0091 - Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil	4.30	0.29	6.7%
0510 - Confederación Deportiva Autónoma de Honduras (CONDEPAH)	4.20	0.30	7.2%
0407 - Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos	3.81	0.55	14.5%
0420 - Comisión Nacional del Ferrocarril Interoceánico	3.74	-	0.0%
0028 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal	3.42	0.31	8.9%

Tabla 3. Ejecución Presupuestaria por Tipo de Inversión e Institución al mes de junio,2025

Cifras en Millones de Lempiras

Tipo de Inversión / Institución	Suma de Presupuesto Vigente	Suma de Devengado Aprobado	% de Ejec.
0507 - Inst. Hondureño para Prev. y Trat. del Alcohol.,Drog.y Farm.	3.37	0.16	4.6%
0046 - Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores	2.87	0.02	0.8%
0417 - Programa de Acción Solidaria	2.62	0.13	5.1%
0290 - Secretaría de Desarrollo Economico	2.61	0.35	13.5%
0406 - Secretaría de Asuntos de la Mujer	2.49	0.04	1.4%
0415 - Programa de la Red Solidaria	2.17	0.27	12.6%
0410 - Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras	1.90	0.53	28.1%
0026 - Instituto Nacional de la Juventud	1.75	0.02	1.4%
0244 - Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer	1.71	0.62	36.5%
0808 - Ferrocarril Nacional de Honduras	1.51	0.18	11.7%
0032 - Instituto de Acceso a la Información Pública	1.50	0.61	40.4%
0809 - Empresa de Correos de Honduras	1.30	1.10	84.5%
0513 - Instituto Nacional de Estadísticas	1.30	0.20	15.3%
0301 - Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas	1.30	0.98	75.9%
0061 - Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento	1.12	0.26	23.2%
0404 - Dirección General de Cinematografía	1.11	0.31	28.2%
0051 - Centro Nacional de Educación para el Trabajo	1.04	0.06	6.1%
0408 - Secretaría de Planificación Estratégica	1.00	0.28	27.6%
0412 - Secretaría de Desarrollo Social	1.00	0.01	0.7%
0409 - Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción	0.71	0.03	4.7%
0300 - Secretaria de Derechos Humanos	0.68	0.24	35.7%
0033 - Programa de Vivienda y Asentamientos Humanos	0.67	0.29	43.9%
0514 - Comisión Para La Defensa Y La Promoción de la Competencia	0.53	0.02	3.4%
0243 - Dirección Nacional de Parques y Recreación	0.51	0.25	49.1%
0418 - Administración Nacional de Servicio Civil	0.47	0.07	14.0%
0419 - Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia	0.39	0.06	16.8%
0515 - Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación	0.36	0.11	29.6%
0145 - Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria	0.25	-	0.0%
0101 - Comisión Nacional de Telecomunicaciones	0.25	0.12	49.7%
0504 - Instituto de Crédito Educativo	0.24	-	0.0%
0414 - Dirección de Gestión por Resultados	0.19	-	0.0%

Tabla 3. Ejecución Presupuestaria por Tipo de Inversión e Institución al mes de junio,2025

Cifras en Millones de Lempiras

Tipo de Inversión / Institución	Suma de Presupuesto Vigente	Suma de Devengado Aprobado	% de Ejec.
0025 - Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc	0.14	0.13	93.7%
0041 - Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales	0.12	-	0.0%
0072 - Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales	0.07	0.04	53.7%
0170 - Secretaría de Turismo	0.05	-	0.0%
0104 - Dirección Nacional de Bienes del Estado	-	-	0.0%
0310 - Secretaría de Energía	-	-	-
Inversión Social	**43,574.96**	**18,732.17**	**43.0%**
0603 - Instituto Nacional de Previsión del Magisterio	10,321.93	4,458.09	43.2%
0602 - Inst. Nal. de Jubi.y Pen. de los Emp. y Fun. del Poder Ejec.	7,693.00	3,274.07	42.6%
0310 - Secretaría de Energía	6,815.88	2,571.19	37.7%
0060 - Secretaría de Salud	5,616.25	1,768.62	31.5%
0070 - Secretaría de Seguridad	2,635.87	1,126.27	42.7%
0604 - Instituto de Previsión Militar	2,498.86	1,148.24	46.0%
0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería	2,450.00	1,450.00	59.2%
0417 - Programa de Acción Solidaria	1,406.92	824.22	58.6%
0412 - Secretaría de Desarrollo Social	600.08	401.34	66.9%
0050 - Secretaría de Educación	576.11	112.10	19.5%
0090 - Secretaría de Defensa Nacional	575.45	300.58	52.2%
0044 - Instituto Nacional Penitenciario	526.46	300.54	57.1%
0415 - Programa de la Red Solidaria	522.66	396.72	75.9%
0701 - Universidad Nacional Autónoma de Honduras	247.44	93.41	37.8%
0806 - Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola	236.99	54.83	23.1%
0080 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional	225.51	71.76	31.8%
0030 - Secretaría de la Presidencia	214.60	214.60	100.0%
0028 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal	100.20	73.70	73.5%
0039 - Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios	86.30	40.20	46.6%
0040 - Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización	66.34	-	0.0%
0406 - Secretaría de Asuntos de la Mujer	44.57	15.26	34.2%
0410 - Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras	36.14	13.96	38.6%
0803 - Empresa Nacional Portuaria	28.00	13.30	47.5%
0300 - Secretaria de Derechos Humanos	20.00	3.24	16.2%
0010 - Poder Judicial	8.53	-	0.0%

Tabla 3. Ejecución Presupuestaria por Tipo de Inversión e Institución al mes de junio,2025

Cifras en Millones de Lempiras

Tipo de Inversión / Institución	Suma de Presupuesto Vigente	Suma de Devengado Aprobado	% de Ejec.
0601 - Instituto Hondureño de Seguridad Social	8.07	-	0.0%
0500 - Instituto Nacional Agrario	7.18	3.76	52.3%
0130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social	2.48	1.12	45.3%
0703 - Universidad Nacional de Agricultura	1.95	0.10	5.3%
0507 - Inst. Hondureño para Prev. y Trat. del Alcohol.,Drog.y Farm.	0.84	0.80	96.0%
0003 - Comisionado Nacional de Derechos Humanos	0.15	0.05	30.0%
0506 - Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas	0.12	0.12	97.9%
0141 - Direccion de Ciencia y Tecnología Agropecuaria	0.10	-	0.0%
0501 - Instituto Hondureño de Turismo	0.01	-	0.0%
Total general	**82,444.55**	**27,561.49**	**33.4%**

Nota. Datos obtenidos del Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI), presupuesto vigente vs. ejecutado, al 30 de junio de 2025.

Por otro lado, las instituciones con mayor cantidad de proyectos productivos en ejecución que encabezan la lista al mes de junio de 2025 son las siguientes:

	INSTITUCIÓN EJECUTORA	CANTIDAD DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN
	**0411 - Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT)**	**19**	**23.2%**
	**0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)**	**8**	**9.8%**
	**0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)**	**8**	**9.8%**
	**0415 - Programa de la Red Solidaria (PRS)**	**8**	**9.8%**
	**0060 - Secretaría de Salud (SESAL)**	**7**	**8.5%**
	**0801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)**	**3**	**3.7%**
	**Resto de Instituciones**	**29**	**35.4%**
	Total	**82**	**100.0%**


Nota. Datos obtenidos del Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI)

Ejecución de Inversión Pública por Sector

De acuerdo con el Sistema de Administración Financiera Integrado (SIAFI), al finalizar el mes de junio de 2025, los sectores de Protección Social, Salud, Carreteras, Energía, Seguridad y Defensa, Educación, Desarrollo Productivo, y Transporte y Obras Públicas sobresalieron por tener el mayor monto vigente, evidenciando así las prioridades de inversión productiva como social del Gobierno de la República.

Sin embargo, los sectores que reportan mayor porcentaje de ejecución respecto a su presupuesto vigente son: Desarrollo Productivo (48.1%) Protección Social (43.4%), Carreteras (38.1%), Seguridad y Defensa (33.9%) y Energía (30.6%), mientras que el resto de los sectores reflejaron una ejecución 9.9% tal como se observa en la siguiente gráfica:

Gráfica 2. Inversión Pública, Principales Sectores, Presupuesto Vigente vs. Ejecutado, al mes de junio 2025
(En millones de lempiras)

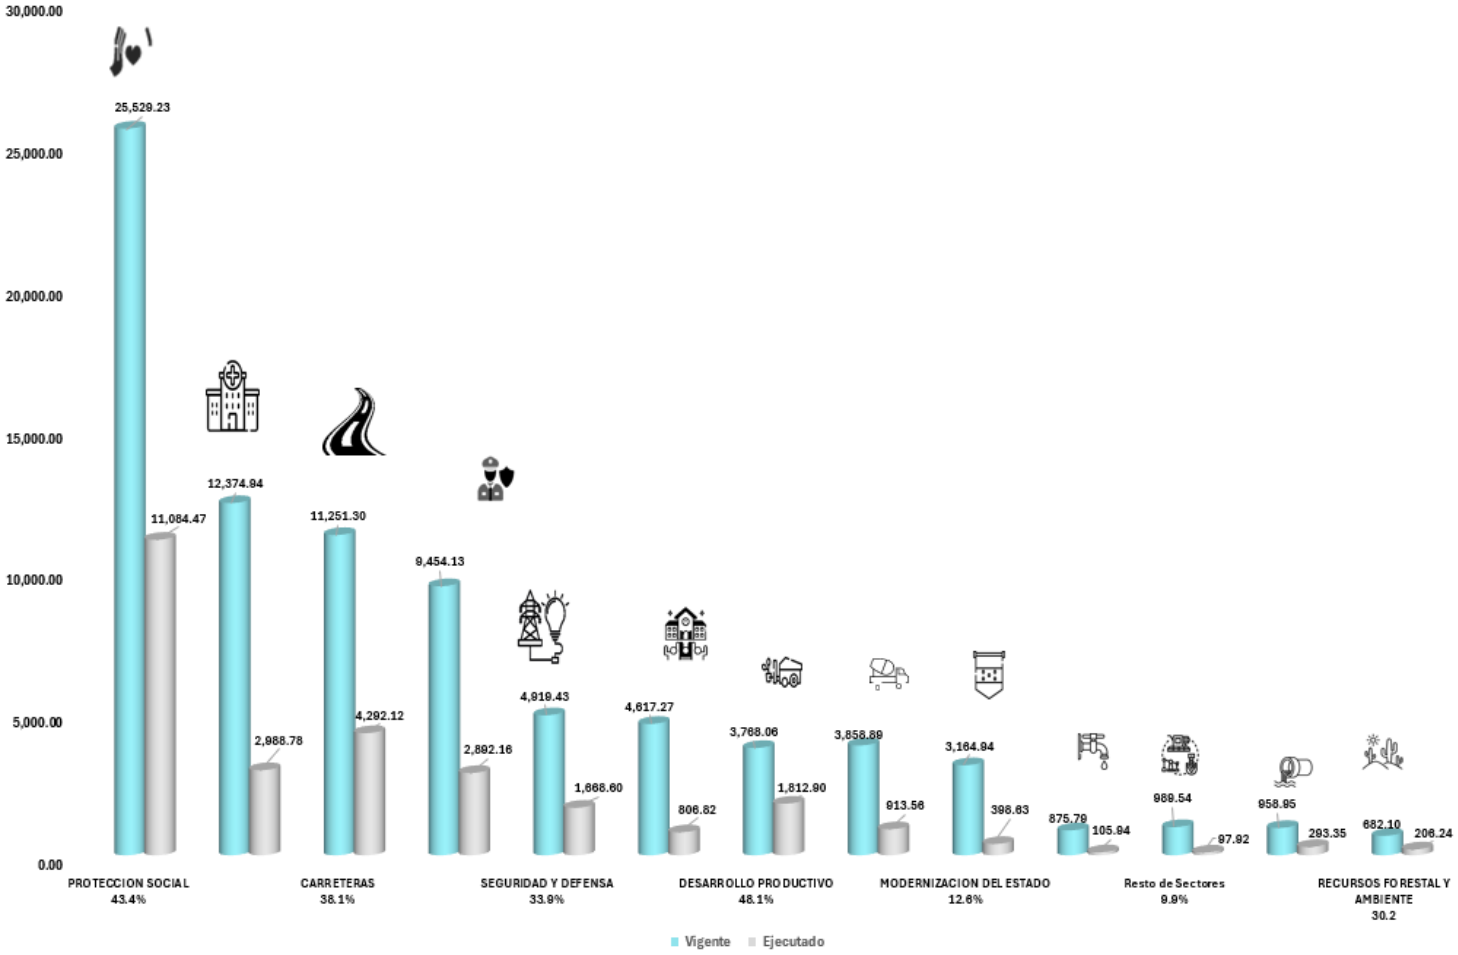

Nota. Datos obtenidos del Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI), presupuesto vigente vs. ejecutado, al 30 de junio de 2025.El Resto de los sectores está comprendido por: Comunicaciones, Descentralización, Competitividad y MIPYMES, Vivienda y Actividad Turística.

Ejecución de Inversión Pública por Fuente de Financiamiento


Al mes de junio de 2025 la ejecución revela una distribución significativa de los recursos; siendo la principal fuente de financiamiento, los fondos nacionales que contaron con un presupuesto vigente de L64,558 millones y una ejecución de 25,206.0 millones, representando un porcentaje del 39%. Por su parte, la fuente de Crédito Externo contó con un presupuesto vigente de L 16,850.7 millones, sin embargo, registró una ejecución de L2,069.5 millones equivalente al 12.3%. Finalmente, las Donaciones Externas, al mes de junio registró un presupuesto vigente de L 1,035.2 millones de los cuales se ejecutaron L 288.0 millones lo que representa solamente el 27.6%, tal como se observa en la gráfica 4.

Es importante destacar que los recursos nacionales, provienen principalmente de los impuestos y tributos pagados por los ciudadanos y las empresas dentro del país.

Por otro lado, los fondos externos se obtienen principalmente a través de mecanismos de préstamos y donaciones de organismos multilaterales, siendo los principales el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Banco Mundial (BM) y organismos bilaterales como: Japan International Cooperation Agency (JICA), Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Gráfica 3. Inversión Pública por Fuente de Financiamiento, Presupuesto Vigente vs. Devengado, al mes de junio de 2025

(En millones de lempiras)

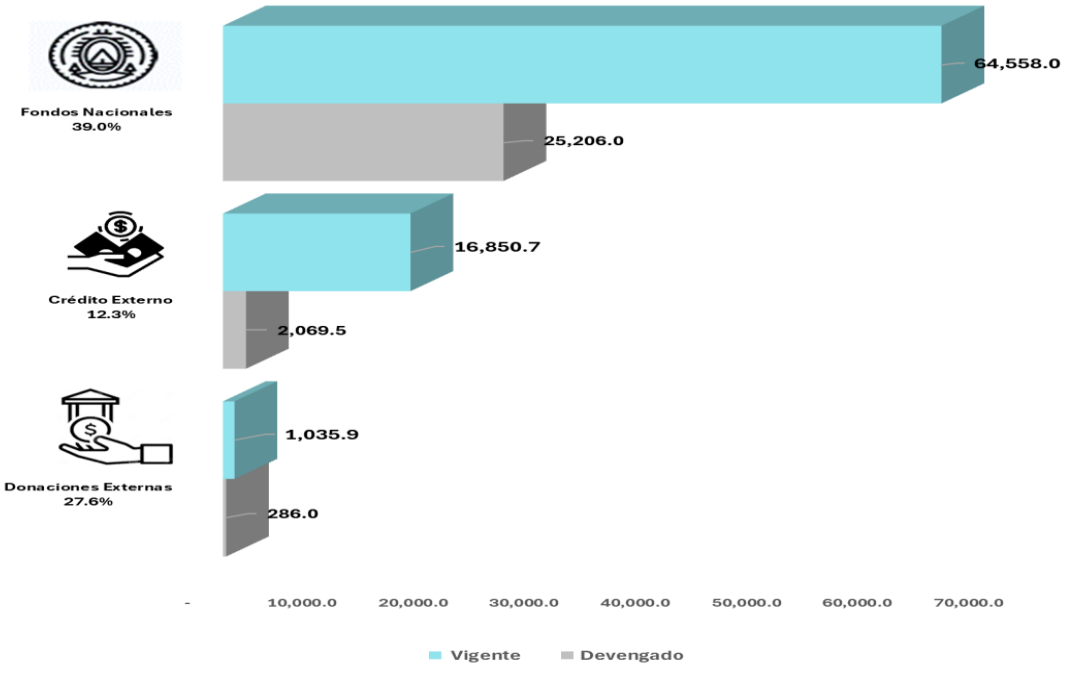

Ejecución Metas Físicas de la Inversión Pública

Sector de Inversión		Indicadores Físicos a Junio 2025				
		Unidad de Medida	Cantidad Programada	Cantidad Ejecutada a Junio 2025	% Ejecución Físico	Observaciones
	Protección Social	Hogares	190,087	0	0%	Al mes de junio no hay entregas de TMC , la programacion de entregas de TMC la unidad ejecutora las ha reprogramado para el mes de julio y subsiguientes.
	Energía	Subestaciones Eléctricas (Ampliadas y Construidas)	19	7	36.8%	Subestaciones finalizadas e inauguradas (99-98 %) Miraflores, Laínez, Bellavista: ampliación 138/13.8 kV, 50 MVA — Finalizadas e inauguradas con avance del 99 %. El Centro: ampliación 138/13.8 kV, 50 MVA — Finalizada e inaugurada, 98 % de avance. ☑ Obras con avance alto pero aún sin inauguración Toncontín: ampliación 138/13.8 kV, 50 MVA — 99 % de avance. Siguatepeque: ampliación 138/13.8 kV, 50 MVA — 99 %, ya en operación comercial. Choloma: ampliación 138 kV — 98 % de avance. Subestaciones en construcción (etapas avanzadas) Calpules: 82 % y La Victoria: 77 % — ambas 138/13.8 kV, 2 x 50 MVA. San Pedro Sula Sur: ampliación 230/138 kV — 77 % de avance. Santa Marta: ampliación 138/69 kV — 75 %. El Progreso: ampliación 138/69 kV — 82 %. Proyectos en fase inicial El Sitio: nueva construcción 230/13.8 kV, 50 MVA — solo 4 % de avance. Avance de subestaciones con compensación reactiva (MVARs) Bermejo (La Victoria): 50 % (138 kV, 30 MVARs) La Puerta: 87 %, circunvalación: 76 %, Comayagua: 84 %,
		Líneas de transmisión (kms)	76.79	47.79	62.2%	- La Construcción de la Línea de Transmisión Doble Terna 230 kV entre las SE San Pedro Sula Sur San Buenaventura (LT SBV-SPSS, 47,79 kms), reporta un avance general de las obras de 100.0% - La Construcción de Línea de Transmisión Terna Sencilla en 138 kV entre las Subestaciones Eléctricas Miraflores-Laínez (4 kms) reporta un avance general de las obras de 90.0% - La Construcción de Línea de Transmisión Terna Sencilla en 138 kV entre las Subestaciones Eléctricas Bellavista-El Centro (2 kms), reporta un avance geenral de las obras de 76.0% - La Construcción de Línea de Transmisión de Doble Terna en 138 kV entre las SE San Pedro Sula Sur - El Progreso (23 kms), reporta un avance general de las obras de 38.0%
	Carreteras	Kilómetro	210.05	44	21%	La SIT avanzo en la construcción, pavimentación y rehabilitación de 105,9 km de carretera con concreto hidráulico en varios proyectos a nivel nacional. Entre los tramos que mas ejecución contarón estan: 1. Tramo: Cucuyagua - Ocotepeque - El Poy - Ocotepeque - Agua Caliente 2. Tramo: Tegucigalpa - Empalme Concreto Hidráulico Neteapa 3. Anillo Agrícola, Tramos Las Delicias - El Bijagual y San Francisco de Becerra - Catacamas. 4. Tramo: San Juan de Flores - Talanga El 30 de junio de otorgó la orden de inicio del tramo Danlí - Trojes de 78 km (dividido en tres sub tramos, cada uno con su propio contratista).
	Salud	Hospital	8	0	0.0%	Hospitales en etapa inicial Hospital Regional del Sur (Choluteca): avance físico global del 12.09 %; Hospital San Isidro (Tocoa): avance físico global del 6.61 %. Hospitales en ejecución con avance parcial Hospital General de Roatán: Obras civiles: 17.22 %, supervisión técnica: 39 %, Hospital General de Santa Bárbara: avance físico general: 35.46 %, módulos 1, 2 y 4: 100 %, módulo 5: 43 %, Módulo 6: 22.9 %, micropilotes: 68.5 %, Hospital Básico de Ocotepeque: avance global: 51.1 %, módulos 1, 2 y 4: 100 %, módulo 5: 43 %, Módulo 6: 22.9 %, micropilotes: 68.5 %. Hospital Básico de Salamá: avance general: 52.3 %, Etapa I (terracería) y II (cimentación/estructura): 100 %, Etapa III (refuerzos): 57.2 % (instalación de columnas, vigas, perfiles Z, cubierta, etc.) Hospitales en fase de diseño ejecutivo Hospital de Trauma (Tegucigalpa): fase 4 – diseño de proyecto ejecutivo (25 productos): 75 %, Hospital de Trauma (San Pedro Sula):


Sector de Inversión		Indicadores Físicos a Junio 2025				
		Unidad de Medida	Cantidad Programada	Cantidad Ejecutada a Junio 2025	% Ejecución Físico	Observaciones
	Seguridad	Jefatura Policía	1	0,98	98%	EEl proyecto Convivencia Ciudadana presenta un 98% de avance físico en la obra Unidad Departamental de Prevención de Intibucá logrando completar en un 100% los dormitorios femeninos, dormitorios oficiales, dormitorios masculinos Norte-Sur, Edificio Administrativo, salón de capacitaciones, bodega de armas, garita sureste y la Sala Técnica; mientras que presenta avances del 99% en la Cafetería y los servicios varios; restán a un 98% de avance el módulo de detención y la lavandería. El Proyecto Modernización y Profesionalización de la Policía Nacional de Honduras ha lanzado el proceso de Concurso Público para el Diseño de la Academia de la Policía Nacional (ANAPO) y se encuentra en la etapa de recepción de las expresiones de interés.
	Educación	Centro Educati	588	0	0%	44 Sub Proyectos Escolares en ejecución **Promine** 28 Sub Proyectos Escolares en Ejecución **ETA IOTA** 60 Sub Proyectos Escolares en Ejecución **MIFE** 42 Aulas integrales de pre- Basica **Secretaría de Educacion** (en Septimbre se espera la entrega de las 42 Aulas Integrales) 414 Interverciones de Centros Escolares Primaria y Media **Secretaría de Gobernacion.**

Análisis Proyectos Propuestos (Pre-Inversión)

La Pre-Inversión es la fase en que se formula y evalúa un proyecto. El objetivo de esta fase es apoyar la toma de decisiones sobre la asignación de recursos al proyecto.

La Dirección General de Inversiones Públicas brinda asistencia técnica y capacitaciones a las instituciones ejecutoras de proyectos de inversión pública para dar cumplimiento a los artículos 176, 179, 186, 189, 190, 191 y 192 de las Disposiciones Generales de Presupuesto (DGP) para el ejercicio fiscal 2025; puesto que las Instituciones del Sector Público tienen la obligatoriedad de presentar a la Secretaría de Finanzas las solicitudes de las nuevas iniciativas de programas y proyectos, conforme a los lineamientos establecidos en la Guía Metodológica General (GMG), para su posterior registro en el Sistema Nacional de Inversión Pública de Honduras (SNIPH).

Gráfica 5. Solicitudes Recibidas en Pre-Inversión al mes de junio, 2025

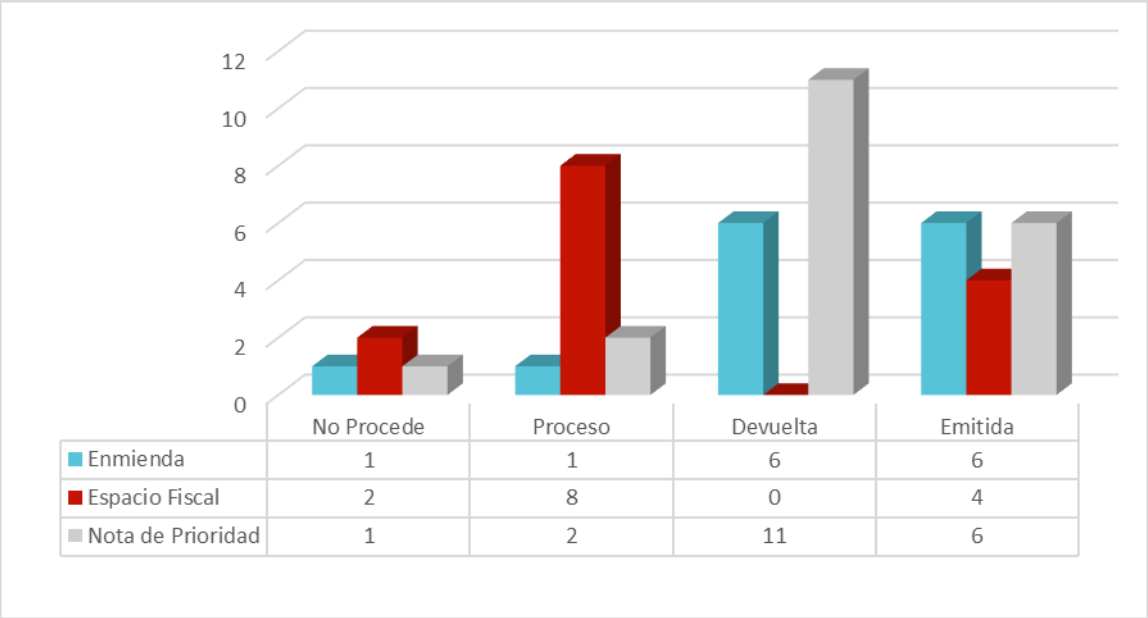

	No Procede	Proceso	Devuelta	Emitida
Enmienda	1	1	6	6
Espacio Fiscal	2	8	0	4
Nota de Prioridad	1	2	11	6

Nota: Acumuladas al mes de junio de 2025, se emitieron 6 Notas de Prioridad y 6 Enmiendas.

NOTA DE PRIORIDAD

- Es un documento legal, mediante el cual la SEFIN a través de la DGIP dictamina si un programa o proyecto de inversión es viable económica, social, ambiental, legal y técnicamente, además sobre su concordancia con los objetivos e indicadores de los planes estratégicos de Gobierno, sectoriales e institucionales.
- Al mes de junio 2025 se emitieron 6 Notas de Prioridad.

ENMIENDA A LA NOTA DE PRIORIDAD

- Es un documento legal, mediante el cual la SEFIN a través de la DGIP dictamina si la modificación del programa o proyecto de inversión pública es suficientemente justificado y congruente con el objetivo del proyecto y se realiza en los siguientes casos:

✓Inconsistencias en el nombre del proyecto (siempre y cuando éste no afecte el objetivo y alcance del mismo),
✓Cambio de Institución Ejecutora,
✓Cambio de cobertura, localización geográfica,
✓Incremento o disminución del costo del proyecto y Fuente de Financiamiento.

- Al mes de junio de 2025 se emitieron 6 Enmiendas.

ESPACIO FISCAL

- El espacio fiscal puede definirse como el margen de maniobra que existe dentro del presupuesto público, para proporcionar recursos para un fin deseado sin comprometer la sostenibilidad financiera del Estado.

Tabla 6. Notas de Prioridad emitidas por Sector al mes de junio, 2025

(En Millones de Lempiras)

No.	Institución	No. de Nota de Prioridad	Nombre del Proyecto por Institución	Fuente de Financiamiento	Monto aprobado del proyecto	Duración Estimada en Meses
Sector Educación						
1	Universidad Nacional de Agricultura (UNAG)	25920-1-01-25	Construcción y Equipamiento de Edificio Residencial para Estudiantes Mujeres "Xiomara Castro" en la Universidad Nacional de Agricultura, ubicado en la ciudad de Catacamas, Departamento de Olancho	Fondos Nacionales	159.2	12
			Subtotal		**159.2**	
Sector Energía						
2	Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	25939-1-02-25	Construcción de un Sistema de Almacenamiento de Energía con Batería Conectado a la Red (BESS) con una Capacidad de 75MW/300MWh y sus Trabajos Asociados, en la Subestación Amarateca en el Distrito Central	Fondos Nacionales	1,326.4	8
			Subtotal		**1,326.4**	
Sector Agua y Saneamiento						
3	Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC)	25957-1-04-25	Construcción de la Represa Jiniguare	Fondos Externos y Nacionales	6,490.0	32
			Subtotal		**6,490.0**	
Sector Transporte y Obras Públicas						
4	Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)	25984-1-05-25	Construcción del Primer Hospital Garífuna, Municipio de Iriona, Departamento de Colón	Fondos Nacionales	50.0	12
			Subtotal		**50.0**	
Sector Protección Social						
5	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento-Fondo Hondureño de Inversión Social (SEDECOAS/FHIS)	26000-1-06-2025	Ampliación del Polideportivo Ramón Diaz López, Etapa II, ubicado en Catacamas, Departamento de Olancho	Fondos Nacionales	35.4	9
			Subtotal		**35.4**	
Sector Carreteras						
6	Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT)	25993-1-06-2025	Construcción y Pavimentación con Carpeta Asfáltica del Tramo Carretero La ENA-San José de Río Tinto-Dulce Nombre de Culmí, Subtramo La ENA-El Pataste, Ruta No.83	Fondos Nacionales	728.3	17
			Subtotal		**728.3**	
			Total General		**8,789.3**	

Tipo de cambio US$1.0 igual a L.25.5069 fecha 31 de diciembre de 2024 según BCH.

*El monto del proyecto de la AMDC no incluye los costos de financiamiento y estructuración que no forma parte del proyecto por un valor de US$34,003,492.05.

Tabla 7. Enmiendas emitidas al mes de junio, 2025

(En Millones de Lempiras)

No.	Institución	No. de Enmienda	No. de Nota de Prioridad	Nombre del Proyecto por Institución	Fuente de Financiamiento	Monto Nota de Prioridad Original + Enmiendas Anteriores	Aumento	Disminución	Presupuesto Vigente (Enmiendas Anteriores + Enmienda Actual)
Sector Transporte y Obras Públicas									
1	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS)	Enmienda 1	24226-1	Proyecto de Recuperación de Emergencia a Causa de los Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras	Fondos Externos	3,826.0	0.0	657.8	3,168.2
2	Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR)	Enmienda 1	25813-1-8-2024	Construcción y Mejoramiento de Instalaciones Deportivas y Recreativas para Uso de la Población en General a nivel nacional	Fondos Nacionales	690.0	684.8	0.0	1,374.7
				Subtotal		**4,516.0**	**684.8**	**657.8**	**4,542.9**
Sector Comunicaciones									
3	Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL)	Enmienda 2	24725-1-07-22	Ampliación en las Redes de Conectividad y en Accesos a Clientes Corporativos y Residenciales (HONDUTEL)	Fondos Nacionales	36.4	0.0	0.0	36.4
				Subtotal		**36.4**	**0.0**	**0.0**	**36.4**
Sector Educación									
4	Secretaría de Educación (SEDUC)	Enmienda 1	23860-1	Mejoramiento de la Calidad en la Educación Prebásica en Honduras	Fondos Externos	1,007.5	0.0	0.0	1,007.5
				Subtotal		**1,007.5**	**0.0**	**0.0**	**1,007.5**
Sector Desarrollo Productivo									
5	Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)	Enmienda 2	23628-1	Integrando la Innovación para la Competitividad Rural en Honduras (ComRural II)	Fondos Externos	1,913.0	0.0	637.7	1,275.3
				Subtotal		**1,913.0**	**0.0**	**637.7**	**1,275.3**
Sector Salud									
6	Secretaría de Salud (SESAL)	Enmienda 1	25449-1-11-23	Programa de Construcción y Equipamiento de Tres Hospitales (Tegucigalpa, San Pedro Sula y Roatán) para el Fortalecimiento de la Red Hospitalaria en Honduras	Fondos Externos y Nacionales	5,870.7	1,363.0	0.0	7,233.7
				Subtotal		**5,870.7**	**1,363.0**	**0.0**	**7,233.7**
				Total General		**13,343.6**	**2,047.8**	**1,295.5**	**14,095.8**

Tipo de cambio US$1.0 igual a L.25.5069 fecha 31 de diciembre de 2024 según BCH.

Avances del SNIPH y Mapa de Inversiones

El SNIPH es un conjunto de normas legales, procedimientos e instrumentos técnicos comunes para todas las entidades del Sector Público.

Es un instrumento de gestión en el que se considera todo el ciclo de vida de los proyectos y comprende los subsistemas de Pre-inversión e Inversión y Operación.

Se han recibido un total de 8 solicitudes para asistencia técnica en el registro y actualización de información en la herramienta informática, y todas han sido atendidas, alcanzando un 100% de atención. Asimismo, se ha recibido 1 solicitud relacionada con la creación y/o modificación de usuarios, la cual también fue resuelta en su totalidad, logrando un 100% de atención. Por último, se registraron 2 casos de incidentes en los módulos del SNIPH, y fueron completamente atendidos, alcanzando nuevamente un 100% en la resolución de los mismos, con base en las solicitudes recibidas.

Tabla 8. Asistencias Técnicas SNIPH, junio 2025



Otras actividades realizadas:

1. Seguimiento al Programa de Conversión Deuda Honduras España / Objeto: Consultas técnicas de procesos para la gestión financiera del sector Educativo.
2. Participación en reunión con el BID Honduras Inversiones / MapaInversiones: Sesión explicativa módulo de carga de fotografías
3. Participación en reunión presencial con la Misión de Asistencia Técnica para apoyar al Gobierno de Honduras en la preparación de los Informes

de Asociación e Impacto correspondientes al Bono Temático, Verde, Social y Sostenible.

4. Participación reunión para la Presentación del borrador de la Respuesta al TSC sobre las recomendaciones 1 y 2 del Informe de Auditoría No.001-2023-DERNAC-ACC-SEFIN-D
5. Participación en el Taller de consulta regional de Estrategias Nacionales de Gestión de Riesgo de Desastres-BM-UNDRR/COSEFIN-SE-095-2025 Invitación Taller GFRD-BM-UNDRR-Honduras. Virtual
6. Reunión con la Dirección de Transparencia sobre la presentación de las observaciones aplicadas al Informe de Ejecución del Presupuesto de Cambio Climático 2024
7. Reunión con el BID sobre la actualización de la Metodología de marcación del gasto climático - Inversión pública.

En relación con el Portal Honduras Inversiones, se encuentran en ejecución 60 proyectos.

Nota: el número de proyectos puede variar según las ampliaciones de plazo de los proyectos que se realicen en ejecución.

FUENTE: https://hondurasinversiones.gob.hn/



Avances en el Portal Honduras Inversiones

- Se llevó a cabo la instalación del módulo en el ambiente de pruebas de SEFIN en la fecha programada el 13 de junio.
- Se habilitó en ambiente de producción la carga de fotografías.
- Se llevó a cabo la sesión explicativa del módulo de carga de fotografías por parte del BID el 16 de junio al equipo de Seguimiento de la DGIP.
