Codigo BIP	25617	Fortalecimiento Integral Del Instituto Hondureño De Antropología E Historia, Para La Restauración, Rehabilitación, Acceso Inclusivo E Investigación En Sitios Arqueológicos, Museos, Archivos Históricos E Inmuebles De Patrimonio En 9 Departamentos Del Pais.

Información General del Proyecto

1. Identificación del Proyecto					
Nombre del Programa/Proyecto:	Fortalecimiento Integral Del Instituto Hondureño De Antropología E Historia, Para La Restauración, Rehabilitación, Acceso Inclusivo E Investigación En Sitios Arqueológicos, Museos, Archivos Históricos E Inmuebles De Patrimonio En 9 Departamentos Del Pais.				
Entidad Ejecutora:	0505 - Instituto Hondureño De Antropología E Historia				
Sector:	Desarrollo E Inclusión Social				
Organismo Financiador	001 - Tesorería General De La República - Efectivo				
Convenio	FN-25617-1				
Contraparte Nacional(L)	31,707,186.00				
Monto Financiamiento USD:	0.00				
Plazo de Ejecución:	22 meses	Fecha de Inicio	1/4/2024	Fecha de Fin	27/2/2026
Estado del Proyecto:	Ejecución				
Tipo de inversión	1 - Inversion Real				
Costo del proyecto (L)	31,707,186.00				

2. Objetivo Estratégico

Fortalecer la capacidad operativa y administrativa del IHAH, a través de la conservación, restauración de inmuebles y museos; así como también, la investigación tanto arqueológica, histórica, etnohistórica y documental del patrimonio, a fin de fortalecer la identidad cultural y la memoria histórica de la población hondureña, especialmente en las áreas de intervención del proyecto.


3. Cobertura	
Departamentos	Atlantida, Colón, Comayagua, Cortes, Choluteca, El Paraiso, Francisco Morazán, Intibucá, La Paz
Municipios	La Ceiba, Trujillo, Tocoa, Comayagua, San Pedro Sula, Omoa, Pimienta, La Lima, Choluteca, El Corpus, Yuscarán, Distrito Central, Cedros, San Antonio De Oriente, Intibucá, La Paz

Beneficiarios:	2,835,288
Generacion de empleo	398 Empleos Directos 1,194 Empleos Indirectos

Beneficiarios del Proyecto




Cobertura

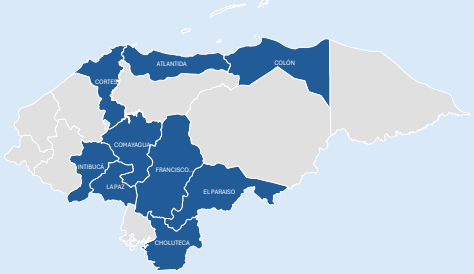

3.Componentes del Proyecto

Nombre del Componentes	Costo Componente (L)			
	Credito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total
2669 - Elaboración de Estudio Estructural y Presupuesto del Terreno e Inmueble a intervenir.	-	-	370,000.00	370,000.00
2670 - Restauración y Rehabilitación de Museo, Sitios e Inmuebles de patrimonio	-	-	22,937,976.00	22,937,976.00
2671 - Investigaciones Arqueológicas, Históricas y Etnohistóricas en Varios Sitios del País.	-	-	5,593,030.00	5,593,030.00
2672 - Sistema de Gestión Documental en el Archivo Etnohistórico del IHAH	-	-	1,724,580.00	1,724,580.00
2673 - Gestión y Administración del proyecto	-	-	1,081,600.00	1,081,600.00
TOTAL	0.00	0.00	31,707,186.00	31,707,186.00

Area visual costo total de componentes




Información Financiera/Presupuestaria del Proyecto

3. Ejecución Financiera (US$ Millones)	
Organismo Financiador: UEPEX	001 - Tesorería General De La República - Efectivo
Monto Contratado:	-
Desembolsado Acumulado	-
Disponible:	-
% Desembolso:	0.0%

5.Presupuesto según SIAFI 2026 (L)

Presupuesto	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total
Presupuesto Aprobado:	-	-	167,043.00	167,043.00
Presupuesto Vigente:	-	-	167,043.00	167,043.00
Ejecutado al 30/06/2026	-	-	-	-
% Ejecución 2026	0.0%	0%	0%	0.0%


Area visual presupuesto SIAFI 2026



6.Presupuesto Histórico Según SIAFI (L)

Gestión	Presupuesto Vigente Histórico				Ejecución Histórica				
	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total	% de Ejecución
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	
2024	-	-	13,612,547.00	13,612,547.00	-	-	13,579,679.37	13,579,679.37	99.76%
2025	-	-	18,094,639.00	18,094,639.00	-	-	17,960,464.33	17,960,464.33	99.26%
2026	-	-	167,043.00	167,043.00	-	-	-	-	0.00%
TOTAL	-	-	31,874,229.00	31,874,229.00	-	-	31,540,143.70	31,540,143.70	99%

Area visual presupuesto vigente historico



Información Física del Proyecto

7.INDICADORES CLAVE

Total Entregables	COMPLETADO ●	En Riesgo ●	Con Retraso ●	Sin Iniciar ○	% Ejec. Global	Prog. vs Ejec.
5	5	0	0	0	100%	100%

Seguimiento Físico De Metasfortalecimiento Integral Del Instituto Hondureño De Antropología E Historia, Para La Restauración, Rehabilitación, Acceso Inclusivo E Investigación En Sitios Arqueológicos, Museos, Archivos Históricos E Inmuebles De Patrimonio En 9 Departamentos Del País.

8.ENTREGABLE		META GLOBAL			PROGRAMACIÓN 2026					EJECUTADO 2026 (editar)					RESULTADO		SEMÁFORO	PROG 2026-27
Entregable	Unidad de Medida	Meta Global	Acumulado Dic-2025	% Avance Ac. 2025	T1 Prog	T2 Prog	T3 Prog	T4 Prog	Total Prog 2026	T1 Real	T2 Real	T3 Real	T4 Real	Total Ejec 2026	% Ejecución 2026	Desviación	Semáforo	Prog 2026-27
Celdas en AMARILLO = ingrese avance real | Celdas en AZUL = programación (editable anualmente) | Celdas en BLANCO = calculadas automáticamente																		
Restaurados y rehabilitados patrimonio del país	Inmuebles	5	5	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	-	● COMPLETADO	0
TOTAL / PROMEDIO		5.00	5.00	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	-		0.00

Situacion Actual

El proyecto contempló la restauración y rehabilitación de cinco (5) inmuebles de patrimonio (Museo Villa Roy, Casa Valle, Casa Fortín, Antigua Comandancia Santa Barbara y Fortaleza San Fernando) la investigación y consolidación de tres (3) sitios arqueológicos (Cerro Palenque, Comunidad Garífuna de Guadalupe, Centro Histórico Copan Ruinas) y los registros de nuevos asentamientos arqueológicos en dos (2) cuencas del país, incluye además siete (7) investigaciones históricas y etnohistóricas, así como la creación de un Sistema de Gestión Documental y el desarrollo de un plan Estratégico Institucional, este proyecto será implementado y ejecutado en nueve (9) departamentos del país, abarcando dieciséis (16) municipios.
El alcance del proyecto consistía en la entrega de un estudio estructural y de presupuesto del inmueble Villa Roy; de cinco (5) inmuebles restaurados y rehabilitados; de doce (12) investigaciones arqueológicas, históricas y etnohistóricas y un Sistema de Información documental, con lo que se pretende que la población hondureña y los extranjeros que visitan estos monumentos restaurados y utilizados en ocasiones como museos o casas de época para el deleite de quienes los visitan, así mismo se beneficien del conocimiento de la existencia de nuevos asentamientos arqueológicos de los resultados de las investigaciones históricas y etnohistóricas a disposición del público y de un Sistema Información Documental implementado y constantemente actualizado.
El proyecto finalizó su ejecución física, el 27 de febrero de 2026 y logró completar las siguientes actividades:
•Estudio Estructural y presupuesto, estabilización del terrero y restauración del inmueble del Museo Villa Roy, ubicado en Tegucigalpa.
•Restauración de la cubierta del inmueble de la Casa Valle, Choluteca, Choluteca.
•Restauración y rehabilitación de la Casa Fortín, ubicada en Yuscarán, El Paraíso.
•Restauración de la Antigua comandancia de la Fortaleza de Santa Bárbara, Trujillo.
•Restauración y conservación del techo del museo de Comayagua, ubicado en Comayagua.
•Acceso inclusivo en la Fortaleza de San Fernando de Omoa.
•Instalación de dos (2) accesos inclusivos para la movilidad de sillas de ruedas y camillas en la Fortaleza de Santa Bárbara, ubicada en Trujillo.
•Desarrollo de cinco (5) investigaciones, Centro histórico de Siguatepeque, Investigación Antropológica en comunidad Garifuna de Guadalupe, Colon, Municipio de Copan Ruinas, Municipio de Omoa Cortes, Investigación Etnohistorica de San Andrés, La Unión, Copan.
•Gira de Presentación de investigación Etnohistorica de la Tribu Tolupán de Agalteca, Olanchito, Yoro.
•Se realizaron investigaciones en sitios Arqueológicos claves en el país.
•Investigación arqueológica en el sitio Cerro Palenque.
•Sistema de Gestión Documental en el Archivo Etnohistórico del IHAH.

Principales Riesgos Identificados

El proyecto finalizó su ejecución física y presupuestaria.

Acciones Recomendadas

El proyecto remitio el informe de cierre, por parte de la unidad ejecutora no se cuenta con actividades pendientes.

Mensaje Clave para Alta Dirección

El éxito del proyecto se debe al acompañamiento por parte de las autoridades del Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH) y el compromiso de la unidad ejecutora responsable del proyecto.
