Codigo BIP	25715	Construcción, Ampliación Y Remodelación De Obras De Infraestructura En El Campus Central De La Universidad Nacional De Ciencias Forestales

Información General del Proyecto

1. Identificación del Proyecto					
Nombre del Programa/Proyecto:	Construcción, Ampliación Y Remodelación De Obras De Infraestructura En El Campus Central De La Universidad Nacional De Ciencias Forestales				
Entidad Ejecutora:	0511 - Universidad De Ciencias Forestales				
Sector:	Desarrollo E Inclusión Social				
Organismo Financiador	001 - Tesorería General De La República - Efectivo				
Convenio	FN-25715				
Contraparte Nacional(L)	35,251,996.00				
Monto Financiamiento USD:	0.00				
Plazo de Ejecución:	25 meses	Fecha de Inicio	13/9/2024	Fecha de Fin	31/10/2026
Estado del Proyecto:	Ejecución				
Tipo de inversión	1 - Inversion Real				
Costo del proyecto (L)	**35,251,996.00**				

2. Objetivo Estratégico
Mejorar la atención en los servicios estudiantiles académicos y una mejora al acceso a la atención médica a los estudiantes, docentes y personal administrativo que laboran en el campus central de la UNACIFOR.

3. Cobertura	
Departamentos	Comayagua
Municipios	Siguatepeque

Beneficiarios:	707
Generacion de empleo	213 Empleos Directos 426 Empleos Indirectos

Beneficiarios del Proyecto

305.00 Mujeres

402.00 Hombres

707.00 Total

Cobertura



3.Componentes del Proyecto				
Nombre del Componentes	Costo Componente (L)			
	Credito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total
2739 - Remodelación de insfraestructura en el campus central de la UNACIFOR	-	-	34,771,996.00	34,771,996.00
2740 - Supervisión	-	-	480,000.00	480,000.00
TOTAL	0.00	0.00	35,251,996.00	35,251,996.00

Area visual costo total de componentes




Información Financiera/Presupuestaria del Proyecto

5. Ejecución Financiera (US$ Millones)	
Organismo Financiador: UEPEX	001 - Tesorería General De La República - Efectivo
Monto Contratado:	-
Desembolsado Acumulado	-
Disponible:	-
% Desembolso:	0.0%


5.Presupuesto según SIAFI 2026 (L)				
Presupuesto	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total
Presupuesto Aprobado:	-	-	12,200,000.00	**12,200,000.00**
Presupuesto Vigente:	-	-	12,200,000.00	**12,200,000.00**
Ejecutado al 30/06/2026	-	-	205,582.48	**205,582.48**
% Ejecución 2026	**0.0%**	**0%**	**0%**	**1.7%**

Area visual presupuesto SIAFI 2026



6.Presupuesto Histórico Según SIAFI (L)									
Gestión	Presupuesto Vigente Histórico				Ejecución Histórica				
	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total	% de Ejecución
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	
2024	-	-	35,251,996.00	35,251,996.00	-	-	-	-	0.00%
2025	-	-	35,251,996.00	35,251,996.00	-	-	33,353,014.32	33,353,014.32	94.61%
2026	-	-	12,200,000.00	12,200,000.00	-	-	205,582.48	205,582.48	1.69%
TOTAL	-	-	**82,703,992.00**	**82,703,992.00**	-	-	**33,558,596.80**	**33,558,596.80**	**41%**

Area visual presupuesto vigente historico

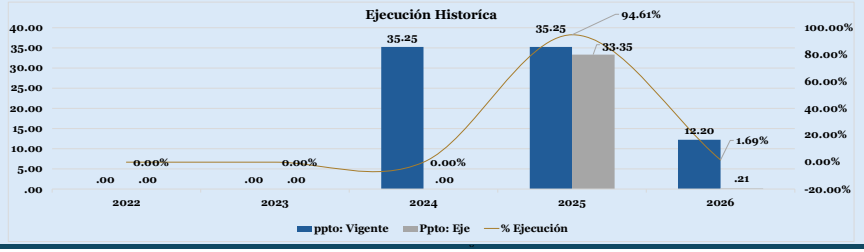

Información Física del Proyecto

7.INDICADORES CLAVE

Total Entregables	COMPLETADO ●	En Riesgo ●	Con Retraso ●	Sin Iniciar ○	% Ejec. Global	Prog. vs Ejec.
6	5	0	0	1	83.00%	83%

Seguimiento Físico De Metasconstrucción, Ampliación Y Remodelación De Obras De Infraestructura En El Campus Central De La Universidad Nacional De Ciencias Forestales

8.ENTREGABLE		META GLOBAL			PROGRAMACIÓN 2026					EJECUTADO 2026 (editar)					RESULTADO		SEMÁFORO	PROG 2027
Entregable	Unidad de Medida	Meta Global	Acumulado Dic-2025	% Avance Ac. 2025	T1 Prog	T2 Prog	T3 Prog	T4 Prog	Total Prog 2026	T1 Real	T2 Real	T3 Real	T4 Real	Total Ejec 2026	% Ejecución 2026	Desviación	Semáforo	Prog 2027
Celdas en AMARILLO = ingrese avance real | Celdas en AZUL = programación (editable anualmente) | Celdas en BLANCO = calculadas automáticamente																		
Ampliación y remodelación de la Clínica Estudiantil de la UNACIFOR	Obra	1	0	9.9%	42.50%	47.63%			90.13%	42.50%	47.63%	0.00%	0.00%	90.13%	100%	-	● COMPLETADO	0
Ampliación y remodelación del Edificio Ingeniero Forestal Oscar Washington Ferreira Rojas (DIFA)	Obra	1	0	45.0%	35%	20%			55.00%	35.00%	20.00%	0.00%	0.00%	55.00%	100%	-	● COMPLETADO	0
Remodelación de la Cabaña No. 21	Obra	1	0	0.0%	100%	0%			100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100%	-	● COMPLETADO	0
Restauración del Laboratorio de Computación	Obra	1	0	0.0%	47.13%	52.87%			100.00%	47.13%	52.87%	0.00%	0.00%	100.00%	100%	-	● COMPLETADO	0
Remodelación del Edificio de Enseñanza e Investigación	Obra	1	0	0.0%	100%	0%			100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100%	-	● COMPLETADO	0
Construcción del pórtico de acceso por la CA-5	Obra	1	0	0.0%	0%	0%			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0%	-	○ Sin Iniciar	0
TOTAL / PROMEDIO		6.00	0.00	9.1%	54%	20%	0.00	0.00	74.19%	54%	20%	0%	0%	74%	100%	-		0.00

Situacion Actual

La inversión productiva al segundo trimestre del 2026 se concentra en el proyecto Construcción, Ampliación y Remodelación de Obras de Infraestructura en el Campus Central de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales.
El objetivo general del proyecto es mejorar la infraestructura física del campus central de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales (UNACIFOR), con el propósito de fortalecer la prestación de los servicios académicos, estudiantiles y administrativos, mediante la remodelación, ampliación y construcción de obras que contribuyan a brindar espacios seguros, modernos y funcionales para la comunidad universitaria.
Entre los beneficios, se incluyen:
1.Mejora de la infraestructura académica: Remodelación de tres edificios institucionales y ampliación de un laboratorio de cómputo para ofrecer espacios adecuados para la enseñanza, la investigación y el aprendizaje.
2.Fortalecimiento de los servicios estudiantiles: Construcción de una clínica estudiantil que permitirá mejorar el acceso a servicios de atención médica para estudiantes, docentes y personal administrativo.
3.Optimización del acceso y funcionamiento del campus: Construcción de un pórtico principal de acceso sobre la carretera CA-5, facilitando el ingreso y la salida de la comunidad universitaria, así como mejorando la seguridad y el orden en las instalaciones.
Como resultado, el proyecto contempla la remodelación de la Cabaña 21, el Edificio de Enseñanza e Investigación y el Edificio Ingeniero Forestal Oscar Washington Ferreira Rojas (DIFA), incluyendo mejoras en la estructura de techos, sistemas eléctricos e hidrosanitarios y acabados; además de la ampliación de un laboratorio de cómputo y la construcción de una clínica estudiantil y un nuevo acceso principal al campus.

El proyecto finalizó su ejecución física. Se requiere que la Unidad Ejecutora remita el informe final del proyecto para su respectivo cierre.

Principales Riesgos Identificados

El proyecto finalizó su ejecución física y presupuestaria, sin embargo, debe realizar el cierre financiero y administrativo previo al 31 de octubre de 2026.

Acciones Recomendadas

La unidad ejecutora, deberá remitir el informe de cierre del proyecto para las acciones correspondientes en el SNIPH.

Mensaje Clave para Alta Dirección

El éxito del proyecto se debe al acompañamiento por parte de las autoridades de la Universidad de Ciencias Forestales (UNACIFOR) y el compromiso de la unidad ejecutora responsable del proyecto.
