
SECRETARÍA DE FINANZAS

Ficha Ejecutiva de Seguimiento de Proyecto 2026

Código BIP	25528	Programa De Diseño, Construcción Y Equipamiento Del Nuevo Hospital En Las Ciudades De Choluteca Y Tocoa Como Apoyo A La Red Hospitalaria De La República De Honduras

1. Identificación del Proyecto

Nombre del Programa/Proyecto:	Programa De Diseño, Construcción Y Equipamiento Del Nuevo Hospital En Las Ciudades De Choluteca Y Tocoa Como Apoyo A La Red Hospitalaria De La República De Honduras				
Entidad Ejecutora:	0060 - Secretaría De Salud				
Sector:	Promocion Y Proteccion Humana				
Organismo Financiador	172 - Banco Centroamericano De Integración Económica				
Convenio	BCIE-2329				
Monto Total de Financiamiento USD:	135,000,000.00				
Monto Financiamiento L:	3,606,970,500.00				
Plazo de Ejecución:	48 meses	**Fecha de Inicio**	30/7/2024	**Fecha de Fin**	1/8/2028
Estado del Proyecto:	Ejecución				
Tipo de inversión	1 - Inversion Real				
Tipo de Cambio II Trimestre 2026	26.7183				

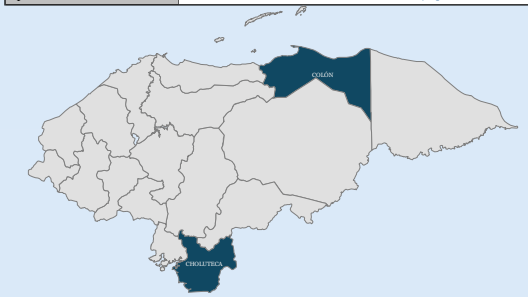

2. Objetivo Estratégico

Incrementar la cobertura en Atención de los Servicios de Salud a nivel Hospitalario, a través del diseño, construcción, equipamiento y puesta en marcha de dos centros hospitalarios en las ciudades de Choluteca, departamento de Choluteca y Tocoa, departamento de Colón, al Sur y Nor-oriente del país, respectivamente, en coherencia con las prioridades de la Secretaría de Salud de Honduras (SESAL).

3. Cobertura

Departamentos	Colón, Choluteca
Municipios	Tocoa, Choluteca

Beneficiarios:	268,851
Generación de empleo (Estimado)	1,474 directos 4,422 indirectos

Beneficiarios del Proyecto

136,530.00 Mujeres

132,321.00 Hombres

268,851.00 Total

3.Componentes del Proyecto

Nombre del Componentes	Costo Componente (L)			
	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total
2624 - Diseño, Construcción y Equipamiento de Nuevo Hospital General de Choluteca	2,101,209,137.2	-	-	2,101,209,137.2
2625 - Diseño, Construcción y Equipamiento de Nuevo Hospital Básico de Tocoa	1,435,793,349.1	-	-	1,435,793,349.1
2626 - Fortalecimiento Institucional	12,033,120.8	8,015,490.0	-	20,048,610.8
2627 - Gastos de Administración y Auditoria del Programa	49,919,403.0	-	-	49,919,403.0
TOTAL	**3,598,955,010.0**	**8,015,490.0**	**-**	**3,606,970,500.0**

Costo Total de Proyecto (Cifras en Millones de Lempiras)



Información Financiera/Presupuestaria del Proyecto


5. Ejecución Financiera (US$ Millones)

Organismo Financiador: UEPEX	172 - Banco Centroamericano De Integración Económica
Monto Contratado:	135.0
Desembolsado Acumulado	54.8
Disponible:	80.2
% Desembolso:	41%

6.Presupuesto según SIAFI 2026 (L)

Presupuesto	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total
Presupuesto Aprobado:	595,435,840.0	7,851,000.0	-	**603,286,840.0**
Presupuesto Vigente:	595,435,840.0	7,851,000.0	-	**603,286,840.0**
Ejecutado al 30/06/2026	139,557,817.9	-	-	**139,557,817.9**
% Ejecución al 30/06/2026	**23.4%**	**0%**	**0.0%**	**23.1%**


Presupuesto SIAFI 2026 (Millones de Lempiras)



7.Presupuesto Histórico Según SIAFI (L)

Gestión	Presupuesto Vigente Histórico				Ejecución Histórica				
	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total	% de Ejecución
2024	522,921,135.0	-	-	522,921,135.0	363,205,139.0	-	-	363,205,139.0	69%
2025	1,196,400,341.0	-	-	1,196,400,341.0	748,719,556.1	-	-	748,719,556.1	63%
2026	595,435,840.0	7,851,000.0	-	603,286,840.0	139,557,817.9	-	-	139,557,817.9	23%
TOTAL	**2,314,757,316.0**	**7,851,000.0**	**-**	**2,322,608,316.0**	**1,251,482,513.0**	**-**	**-**	**1,251,482,513.0**	**54%**

Presupuesto Vigente -Ejecutado Histórico



SECRETARÍA DE FINANZAS

Ficha Ejecutiva de Seguimiento de Proyecto 2026

Código BIP	25528	Programa De Diseño, Construcción Y Equipamiento Del Nuevo Hospital En Las Ciudades De Choluteca Y Tocoa Como Apoyo A La Red Hospitalaria De La República De Honduras

Información Física del Proyecto

8. INDICADORES CLAVE

Total Entregables	COMPLETADO	En Riesgo	Con Retraso	Sin Iniciar	% Ejec. Global	% Ejecución 2026
7	0	0	2	0	938%	24%

Seguimiento Físico De Metasprograma De Diseño, Construcción Y Equipamiento Del Nuevo Hospital En Las Ciudades De Choluteca Y Tocoa Como Apoyo A La Red Hospitalaria De La República De Honduras

8.1 Entregables		Meta Global			Programación 2026					Ejecutado 2026					Resultados		Indicador	PROG 2026-27
Entregable	Unidad de Medida	Meta Global	Acumulado Dic-2025	% Avance Ac. 2025	T1 Prog	T2 Prog	T3 Prog	T4 Prog	Total Prog 2026	T1 Real	T2 Real	T3 Real	T4 Real	Total Ejec 2026	% Ejecución 2026	Desviación	Indicadores	Prog 2026-27
Celdas en AMARILLO = ingrese avance real | Celdas en AZUL = programación (editable anualmente) | Celdas en BLANCO = calculadas automáticamente																		
Componente Infraestructura y equipamiento hospitalaria																		
Implementar Apoyo de Agencia al PARH	Gestión Inicial del Programa	1	1	100%	0	0	0	0	0	0	0			0	0%	0	NO PROGRAMADO	0
Mantener vigente la contratación de la Supervisión de las obras del Hospital General, en el Departamento de Choluteca y del Hospital Básico, en el Departamento de Colón	Supervisión	26	11	42%	4	3	3	3	13	0	9			9	69%	-4	CON RETRASO	2
Desarrollar Auditoría Externa del Programa	Auditoría	15	2	13%	4	1	1	1	7	0	0			0	0%	-7	CON RETRASO	6
Componente Imprevistos y Escalamiento																		
Ejecutar el apoyo del Miembro DAAB	DAAB	44	18	41%	6	6	5	0	17	0	0			0	0%	-17	NO PROGRAMADO	9
Componente Comisión																		
Pagar Comisión de Administración del BCIE	BCIE	1	1	100%	0	0	0	0	0	0	0			0	0%	0	NO PROGRAMADO	0
TOTAL / PROMEDIO		87.00	33.00	49%	14.00	10.00	9.00	4.00	37.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	24%	(28.00)		

Situación Actual

Para el segundo trimestre 2026, la Unidad Administradora del Programa de Apoyo a la Red Hospitalaria de Honduras (PARH) reporta el siguiente avance:
•Hospital Regional del Sur en Choluteca:
Etapa (1) Preinversión: avance físico 97.45%, avance financiero 47.0% (US$1,128,614.07); fecha de fin prevista 29 junio de 2025.
Etapa (2) Construcción: avance físico 55.80%, avance financiero 55.04% (US$17,151,269.05); fecha de fin prevista 12 agosto de 2026.
Etapa (3) Equipamiento: avance físico 13.79%, avance financiero 9.45% (US$2,162,245.49); fecha de fin prevista 12 agosto 2026.
•Hospital San Isidro en Tocoa:
Etapa (1) Preinversión: avance físico 100%, avance financiero 95% (US$3,504,173.42); fecha de fin prevista 26 agosto de 2025.
Etapa (2) Construcción: avance físico 22.77%, avance financiero 36.63% (US$15,180,392.20); fecha de fin prevista 21 julio de 2026.
Etapa (3) Equipamiento: avance físico 0%, avance financiero 20% (US$2,743,285.34); fecha de fin prevista 21 julio de 2026.

Principales Riesgos Identificados

Finalización de contratos del personal de la Unidad Ejecutora al 30/06/2026.

Acciones Recomendadas

La SESAL debe velar por el cumplimiento del cronograma de diseño, construcción, equipamiento y puesta en marcha de hospitales; considerando que son contratos que consideran la ejecución de sus etapas en paralelo.

Mensaje Clave para Alta Dirección

SEFIN apoyará las gestiones pertinentes, apoyando el monitoreo y avance del Programa.
Promover a nivel de Autoridades poder realizar una evaluación de las diferentes Unidades Ejecutoras, considerando aspectos reincidentes como ser baja ejecución, cantidad de ampliaciones de plazo requeridas, planificación y modificaciones, gestión de los procesos tanto de Gobierno como de los organismos financieros; con el propósito de contar con el personal idóneo en la gestión efectiva de proyectos actuales y futuros.

SECRETARÍA DE FINANZAS

Ficha Ejecutiva de Seguimiento de Proyecto 2026

Código BIP	24538	Respuesta Inmediata De Salud Pública Para Contener Y Controlar El Coronavirus (Covid-19) Y Mitigar Su Efecto En La Prestación De Servicios En Honduras (Risp-Ho-2)

1. Identificación del Proyecto

Nombre del Programa/Proyecto:	Respuesta Inmediata De Salud Pública Para Contener Y Controlar El Coronavirus (Covid-19) Y Mitigar Su Efecto En La Prestación De Servicios En Honduras (Risp-Ho-2)				
Entidad Ejecutora:	0060 - Secretaría De Salud				
Sector:	Desarrollo E Inclusión Social				
Organismo Financiador	173 - Banco Interamericano De Desarrollo				
Convenio	BID 4713/BL-HO				
Monto Total de Financiamiento USD:	53,820,000.00				
Monto Financiamiento L:	1,437,978,906.00				
Plazo de Ejecución:	61 meses	**Fecha de Inicio**	1/10/2021	**Fecha de Fin**	31/3/2027
Estado del Proyecto:	Ejecución				
Tipo de inversión	2 - Inversion En Desarrollo Humano				
Tipo de Cambio II Trimestre 2026	26.7183				



2. Objetivo Estratégico


Contribuir a reducir la morbilidad y la mortalidad por COVID-19 y mitigar los demás efectos indirectos de la pandemia sobre la salud.

3. Cobertura

Departamentos	Atlántida, Colón, Comayagua, Copán, Cortés, Choluteca, El Paraíso, Francisco Morazán, Gracias a Dios, Intibucá, Islas de la Bahía, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Santa Bárbara, Valle, Yoro
Municipios	La Ceiba, Balfate, Comayagua, Santa Rosa de Copán, San Pedro Sula, Choluteca, El Paraíso, Distrito Central, Puerto Lempira, La Esperanza, Roatán, La Paz, Gracias, Ocotepeque, Juticalpa, Santa Bárbara, Nacaome, Yoro

Beneficiarios:	9,464,406
Generación de empleo (Estimado)	1,894 directos 5,682 indirectos

Beneficiarios del Proyecto

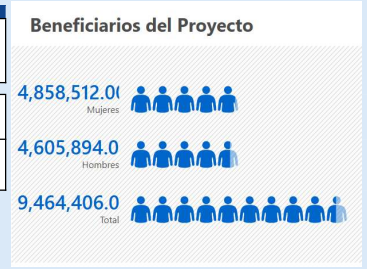

3.Componentes del Proyecto

Nombre del Componentes	Costo Componente (L)			
	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total
2233 - Conducción de la respuesta a nivel de país	4,510,049.0	-	-	4,510,049.0
2235 - Detección y seguimiento de casos	67,343,475.2	-	-	67,343,475.2
2236 - Interrupción de la cadena de transmisión	398,102,670.0	-	-	398,102,670.0
2237 - Mejoramiento a la capacidad de provisión de servicios	913,504,020.7	-	-	913,504,020.7
2238 - Administración del Programa	54,518,691.2	-	-	54,518,691.2
TOTAL	**1,437,978,906.0**	**-**	**-**	**1,437,978,906.0**

Costo Total de Proyecto (Cifras en Millones de Lempiras)



Información Financiera/Presupuestaria del Proyecto


5. Ejecución Financiera (US$ Millones)

Organismo Financiador: UEPEX	173 - Banco Interamericano De Desarrollo
Monto Contratado:	53.8
Desembolsado Acumulado	49.8
Disponible:	4.0
% Desembolso:	93%

6.Presupuesto según SIAFI 2026 (L)

Presupuesto	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total
Presupuesto Aprobado:	85,720,918.0	-	-	**85,720,918.0**
Presupuesto Vigente:	216,045,554.0	-	-	**216,045,554.0**
Ejecutado al 30/06/2026	11,836,616.3	-	-	**11,836,616.3**
% Ejecución al 30/06/2026	**5%**	**0%**	**0%**	**5%**

Presupuesto SIAFI 2026 (Millones de Lempiras)



7.Presupuesto Histórico Según SIAFI (L)

Gestión	Presupuesto Vigente Histórico				Ejecución Histórica				
	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total	% de Ejecución
2021	464,282,620.0	-	-	464,282,620.0	429,503,414.5	-	-	429,503,414.5	93%
2022	462,428,545.0	-	-	462,428,545.0	263,846,539.3	-	-	263,846,539.3	57%
2023	275,994,569.0	-	-	275,994,569.0	121,885,133.3	-	-	121,885,133.3	44%
2024	348,618,420.0	-	-	348,618,420.0	209,325,546.5	-	-	209,325,546.5	60%
2025	248,561,957.0	-	-	248,561,957.0	146,847,170.7	-	-	146,847,170.7	59%
2026	216,045,554.0	-	-	216,045,554.0	11,836,616.3	-	-	11,836,616.3	5%
TOTAL	**2,015,931,665.0**	**-**	**-**	**2,015,931,665.0**	**1,183,244,420.7**	**-**	**-**	**1,183,244,420.7**	**59%**

Presupuesto Vigente -Ejecutado Histórico



SECRETARÍA DE FINANZAS

Ficha Ejecutiva de Seguimiento de Proyecto 2026

Código BIP	24538	Respuesta Inmediata De Salud Pública Para Contener Y Controlar El Coronavirus (Covid-19) Y Mitigar Su Efecto En La Prestación De Servicios En Honduras (Risp-Ho-2)

Información Física del Proyecto

8. INDICADORES CLAVE

Total Entregables	COMPLETADO	En Riesgo	Con Retraso	Sin Iniciar	% Ejec. Global	% Ejecución 2026
5	0	0	3	0	52%	19%

Seguimiento Físico De Metasrespuesta Inmediata De Salud Pública Para Contener Y Controlar El Coronavirus (Covid-19) Y Mitigar Su Efecto En La Prestación De Servicios En Honduras (Risp-Ho-2)

8.1 Entregables		Meta Global			Programación 2026					Ejecutado 2026					Resultados		Indicador	PROG 2026-27
Entregable	Unidad de Medida	Meta Global	Acumulado Dic-2025	% Avance Ac. 2025	T1 Prog	T2 Prog	T3 Prog	T4 Prog	Total Prog 2026	T1 Real	T2 Real	T3 Real	T4 Real	Total Ejec 2026	% Ejecución 2026	Desviación	Indicadores	Prog 2026-27
Celdas en AMARILLO = ingrese avance real | Celdas en AZUL = programación (editable anualmente) | Celdas en BLANCO = calculadas automáticamente																		
Componente 3: Interrupción de la Cadena de Transmisión																		
Adquisición, suministro e instalación de generadores eléctricos para los Hospitales Juan Manuel Gálvez y Aníbal Murillo	Equipo	2	0	0%	0	0	0	0.2	0.2	0	0			0	0%	-0.2	CON RETRASO	
Componente 4: Mejoramiento a la capacidad de provisión de servicios de salud																		
Sub estación eléctrica del Hospital Escuela Instalada y Funcionando	Equipo	1	0.46	46%	0.19	0.25	0.1	0	0.54	0.2	0.3			0.5	93%	-0.04	NO PROGRAMADO	
Hospitales fortalecidos con Equipo Medico y no-médico para la continuidad de servicios esenciales (salas neonatales)	Lotes	10	0	0%	0	0	0.8	0.2	1	0	0			0	0%	-1	CON RETRASO	
Fortalecimiento a la red de hospitales a través de equipamiento médico y no médico	Lotes	14	0	0%	0	0	0.35	0.5	0.85	0	0			0	0%	-0.85	CON RETRASO	
TOTAL / PROMEDIO		**27.00**	**0.46**	**2%**	**0.19**	**0.25**	**1.25**	**0.90**	**2.59**	**0.20**	**0.30**	**0.00**	**0.00**	**0.50**	**19%**	**(2.09)**		

Situación Actual

Al segundo trimestre del 2026, la Unidad Ejecutora de Proyectos BID (GESALUD) reporta un avance global **fisico del 88%** y **financiero del 87.3%**, con relación a las actividades realizadas en el marco del reporte de monitoreo del proyecto (PMR):
o En cuanto al Proceso de Adecuación del Centro de Datos de la SESAL, se tomó la decisión de no realizar esta actividad, reasignando el financiamiento para el Fortalecimiento de la Red Hospitalaria que consiste en la adquisición y reparación de equipo médico y no medico priorizado por la SESAL para beneficiar 4 hospitales del país (Hospital Escuela, Hospital Mario Catarino Rivas, Hospital del Tórax) en pro de contribuir a la mora quirúrgica.
o En la Adquisición de Generadores Eléctricos para 5 hospitales se presentó el Informe del Proceso en no objeción en el BID.
o En relación del Reemplazo de la Sub-Estación Eléctrica del Bloque Médico Quirúrgico del Hospital Escuela, se realizó el pago de estimaciones de obra #7, #8 y #9 correspondientes a la subestación eléctrica del Hospital Escuela.
o Asimismo, en las Gestiones administrativas, se realizó el pago de honorarios a consultores para la UTGP, UTINH, UGI; gestión y pago de viáticos a diferentes Regiones con el propósito de realizar entrega de equipo no médico salas neonatales hospitales priorizados, supervisión obras roatán y avances Hospital Traumas de San Pedro Sula; así mismo, la inspección de bodegas donde se almacena el equipo médico del Hospital de Roatán en San Pedro Sula.

Principales Riesgos Identificados

Asegurar la finalización de las siguientes actividades:
1. Subproyecto de "Reemplazo y puesta en marcha de la Subestación Eléctrica del Hospital Escuela"
2. Adquisición del equipo no medico de las salas neonatales para cuatro hospitales: Hospital Escuela, Hospital Santa Teresa, Hospital San Francisco, Hospital Roberto Suazo Córdova,
3. Fortalecimiento de la red hospitalaria a través de la adquisición del Equipo Electromecánico, Instrumental Quirúrgico, Adquisición de insumo médico y Adquisición de la Reparación y mantenimiento de equipo y la continuidad del proceso de adquisición de las plantas generadoras eléctricas de los hospitales: Hospital Juan Manuel Gálvez y Hospital Aníbal Murillo; adquisición y reparación de equipo médico y no médico para tres hospitales: Hospital Escuela, Hospital San Felipe y Hospital Mario Catarino Rivas, a través de la adquisición de mobiliario médico y adquisición de equipo médico.

Acciones Recomendadas

Asegurar el cumplimiento del cronograma de cierre del Proyecto.

Mensaje Clave para Alta Dirección

Proyecto ha cumplido el objetivo por el cual fue creado, para apoyar acciones durante la Pandemia COVID-19; los recursos disponibles de acuerdo a priorización de las diferentes Autoridades de la SESAL han ocasionado mantener la vigencia del Proyecto sin concretar las adquisiciones, procesos desfasados y/o desiertos, entre otros por lo que se sugiere la des obligación de saldos no desembolsados (estimados en US$4.0 millones) y cierre del Proyecto.

Promover a nivel de Autoridades poder realizar una evaluación de las diferentes Unidades Ejecutoras, considerando aspectos reincidentes como ser baja ejecución, cantidad de ampliaciones de plazo requeridas, planificación y modificaciones, gestión de los procesos tanto de Gobierno como de los organismos financieros; con el propósito de contar con el personal idóneo en la gestión efectiva de proyectos actuales y futuros.

SECRETARÍA DE FINANZAS

Ficha Ejecutiva de Seguimiento de Proyecto 2026

Código BIP	23897	Apoyo Al Sistema Integral De Protección Social 5008/Bl-Ho

1. Identificación del Proyecto

Nombre del Programa/Proyecto:	Apoyo Al Sistema Integral De Protección Social 5008/Bl-Ho				
Entidad Ejecutora:	0060 - Secretaría De Salud				
Sector:	Desarrollo E Inclusión Social				
Organismo Financiador	173 - Banco Interamericano De Desarrollo				
Convenio	5008/BL-HO				
Monto Total de Financiamiento USD:	5,000,000.00				
Monto Financiamiento L:	133,591,500.00				
Plazo de Ejecución:	75 meses	**Fecha de Inicio**	8/9/2020	**Fecha de Fin**	31/12/2026
Estado del Proyecto:	Ejecución				
Tipo de inversión	2 - Inversion En Desarrollo Humano				
Tipo de Cambio II Trimestre 2026	26.7183				



2. Objetivo Estratégico

Mejorar las condiciones de vida de los hogares en situación de pobreza extrema, así como promover su generación de capital humano. Los objetivos específicos son: (i) aumentar el ingreso mínimo de los hogares participantes; (ii) aumentar el uso y la oferta de servicios educativos, priorizando el tercer ciclo; (iii) mejorar el uso y la oferta de servicios de salud y nutrición, en especial para las mujeres, jóvenes y niños; y (iv) mejorar la pertinencia, focalización y articulación de las acciones de protección e inclusión social para los hogares en extrema pobreza.

3. Cobertura

Departamentos	Olancho, La Paz, Ocotepeque, Copán
Municipios	Manguile, Cabañas, San Pedro de Tutule, San Agustín

Beneficiarios:	544,098
Generación de empleo (Estimado)	No Disponible

Beneficiarios del Proyecto

278,228.00 Mujeres

265,870.00 Hombres

544,098.00 Total

3.Componentes del Proyecto

Nombre del Componentes	Costo Componente (L)			
	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total
1807 - FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD, PRIORIZANDO LOS SERVICIOS MATERNOS INFANTILES	133,591,500.0	-	-	133,591,500.0
TOTAL	**133,591,500.0**	**-**	**-**	**133,591,500.0**

Costo Total de Proyecto (Cifras en Millones de Lempiras)



Información Financiera/Presupuestaria del Proyecto


5. Ejecución Financiera (US$ Millones)

Organismo Financiador: UEPEX	173 - Banco Interamericano De Desarrollo
Monto Contratado:	5.0
Desembolsado Acumulado	3.2
Disponible:	1.8
% Desembolso:	64%

6.Presupuesto según SIAFI 2026 (L)

Presupuesto	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total
Presupuesto Aprobado:	-	-	-	-
Presupuesto Vigente:	23,044,610.0	-	-	**23,044,610.0**
Ejecutado al 30/06/2026	8,911,079.6	-	-	**8,911,079.6**
% Ejecución al 30/06/2026	**39%**	**0%**	**0%**	**39%**

Presupuesto SIAFI 2026 (Millones de Lempiras)



7.Presupuesto Histórico Según SIAFI (L)

Gestión	Presupuesto Vigente Histórico				Ejecución Histórica				
	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total	% de Ejecución
2021	12,278,362.0	-	-	12,278,362.0	4,219,357.6	-	-	4,219,357.6	34%
2022	36,909,200.0	-	-	36,909,200.0	6,954,872.0	-	-	6,954,872.0	19%
2023	34,012,479.0	-	-	34,012,479.0	11,583,566.6	-	-	11,583,566.6	34%
2024	29,601,540.0	-	-	29,601,540.0	22,950,847.9	-	-	22,950,847.9	78%
2025	40,457,049.0	-	-	40,457,049.0	32,702,756.4	-	-	32,702,756.4	81%
2026	23,044,610.0	-	-	23,044,610.0	8,911,079.6	-	-	8,911,079.6	39%
TOTAL	**176,303,240.0**	**-**	**-**	**176,303,240.0**	**87,322,480.2**	**-**	**-**	**87,322,480.2**	**50%**

Presupuesto Vigente -Ejecutado Histórico



SECRETARÍA DE FINANZAS

Ficha Ejecutiva de Seguimiento de Proyecto 2026

Código BIP	23897	Apoyo Al Sistema Integral De Protección Social 5008/Bl-Ho

Información Física del Proyecto

8. INDICADORES CLAVE

Total Entregables	COMPLETADO	En Riesgo	Con Retraso	Sin Iniciar	% Ejec. Global	% Ejecución 2026
4	0	0	3	0	33%	11%

Seguimiento Físico De Metasapoyo Al Sistema Integral De Protección Social 5008/Bl-Ho

8.1 Entregables		Meta Global			Programación 2026					Ejecutado 2026					Resultados		Indicador	PROG 2026-27
Entregable	Unidad de Medida	Meta Global	Acumulado Dic-2025	% Avance Ac. 2025	T1 Prog	T2 Prog	T3 Prog	T4 Prog	Total Prog 2026	T1 Real	T2 Real	T3 Real	T4 Real	Total Ejec 2026	% Ejecución 2026	Desviación	Indicadores	Prog 2026-27
Celdas en AMARILLO = ingrese avance real | Celdas en AZUL = programación (editable anualmente) | Celdas en BLANCO = calculadas automáticamente																		
Componente 3: Fortalecimiento de la oferta de servicios de salud, priorizando los servicios maternos infantiles Construcción y equipamiento de hospitales																		
138,523 Personas cubiertas por gestores descentralizados en primer nivel de atención en municipios más pobres.	Informes	27	0	0%	0	0.33	0.34	0.33	1	0	0.33			0.33	33%	-0.67	CON RETRASO	
Intervenciones entregadas a población cubierta en los 5 municipios asegurando un enfoque intercultural y género, con información sobre los sistemas tradicionales, prácticas y conocimientos de los pueblos indígenas.	Informes	3	0	46%	0	0	0	1	1	0	0			0	0%	-1	CON RETRASO	
ESFAM de los 52 municipios priorizados fortalecidos.	Informes	5	0	0%	0	0	0	1	1	0	0			0	0%	-1	CON RETRASO	
TOTAL / PROMEDIO		**49.00**	**0.00**	**2%**	**0.00**	**0.33**	**0.34**	**2.33**	**3.00**	**0.00**	**0.33**	**0.00**	**0.00**	**0.33**	**11%**	**(2.67)**		

Situación Actual

Al segundo trimestre del 2026, la Unidad Ejecutora de Proyectos BID (GESALUD) reporta un avance global **físico del 73%** y **financiero del 64%**, en la vida del Proyecto.
Para las actividades 1.1 a la 1.4 relacionadas a los Convenios de Gestión (cobertura de población, intervenciones en 5 municipios priorizados, Plan de Apoyo a experiencias y Equipos de Salud Familiar - ESFAM respectivamente), se comprometieron recursos en el sistema UEPEX relacionados con la Adenda 3 de los Convenios con los gestores priorizados. Este monto corresponde al presupuesto asignado para el período 2026, así como al alquiler de oficinas de los trimestres II y III de este año.
Pago a Consultores de la Unidad de Gestión Descentralizada (UGD) los meses de Enero a Junio 2026 (36 informes).

Principales Riesgos Identificados

Dar cumplimiento al cierre del Programa conforme al mandato del PCM-004-2026 y PCM-13-2026 a diciembre 2026.

Acciones Recomendadas

Asegurar el cumplimiento del cronograma de cierre del Proyecto.

Mensaje Clave para Alta Dirección

Promover a nivel de Autoridades poder realizar una evaluación de las diferentes Unidades Ejecutoras, considerando aspectos reincidentes como ser baja ejecución, cantidad de ampliaciones de plazo requeridas, planificación y modificaciones, gestión de los procesos tanto de Gobierno como de los organismos financieros; con el propósito de contar con el personal idóneo en la gestión efectiva de proyectos actuales y futuros.

SECRETARÍA DE FINANZAS

Ficha Ejecutiva de Seguimiento de Proyecto 2026

Código BIP	25449	Programa De Construcción Y Equipamiento De Tres Hospitales (Tegucigalpa, San Pedro Sula Y Roatán) Para El Fortalecimiento De La Red Hospitalaria En Honduras

1. Identificación del Proyecto

Nombre del Programa/Proyecto:	Programa De Construcción Y Equipamiento De Tres Hospitales (Tegucigalpa, San Pedro Sula Y Roatán) Para El Fortalecimiento De La Red Hospitalaria En Honduras				
Entidad Ejecutora:	0060 - Secretaría De Salud				
Sector:	Promocion Y Proteccion Humana				
Organismo Financiador	147 - Japan International Cooperation Agency, 173 - Banco Interamericano De Desarrollo				
Convenio	BID 5790/BL-HO				
Monto Total de Financiamiento USD:	230,163,200.00				
Monto Financiamiento L:	6,149,569,426.56				
Plazo de Ejecución:	72 meses	**Fecha de Inicio**	15/4/2024	**Fecha de Fin**	15/5/2030
Estado del Proyecto:	Ejecución				
Tipo de inversión	1 - Inversion Real				
Tipo de Cambio II Trimestre 2026	26.7183				



2. Objetivo Estratégico

Mejorar la efectividad y el acceso a los servicios especializados hospitalarios materno-infantiles, de atención a Lesiones de Causa Externa (LCE) y a complicaciones de Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ENT).

3. Cobertura

Departamentos	Cortés, Francisco Morazán, Islas de la Bahía
Municipios	San Pedro Sula, Distrito Central, Roatán

Beneficiarios:	3,716,093
Generación de empleo (Estimado)	3,521 directos 10,563 indirectos

Beneficiarios del Proyecto

1,941,565 Mujeres


1,774,528 Hombres

3,716,093 Total

3.Componentes del Proyecto

Nombre del Componentes	Costo Componente (L)			
	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total
2600 - Construcción y Equipamiento del Hospital General de Roatán, en Roatán Islas de la Bahía	600,563,260.1	-	-	600,563,260.1
2601 - Desarrollo de Competencias Clínicas y de Gestión Hospitalaria	172,065,852.0	-	-	172,065,852.0
2602 - Fortalecimiento de la integración y gestión de redes de servicios priorizadas	178,745,427.0	-	-	178,745,427.0
2603 - Administración del Programa/Costos de Gestión	193,538,387.9	-	-	193,538,387.9
2604 - Construcción y Equipamiento de Hospital de Especialidades (Trauma) en la Ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazán	2,789,074,389.1	-	-	2,789,074,389.1
2605 - Construcción y Equipamiento de Hospital de Especialidades (Trauma) en la Ciudad de San Pedro Sula, Cortés	2,215,582,110.6	-	-	2,215,582,110.6
TOTAL	**6,149,569,426.6**	**-**	**-**	**6,149,569,426.6**

Costo Total de Proyecto (Cifras en Millones de Lempiras)



Información Financiera/Presupuestaria del Proyecto


5. Ejecución Financiera (US$ Millones)

Organismo Financiador: UEPEX	147 - Japan International Cooperation Agency, 173 - Banco Interamericano De Desarrollo
Monto Contratado:	230.2
Desembolsado Acumulado	37.8
Disponible:	192.3
% Desembolso:	16%

6.Presupuesto según SIAFI 2026 (L)

Presupuesto	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total
Presupuesto Aprobado	575,566,138.0	-	-	**575,566,138.0**
Presupuesto Vigente	421,636,892.0	-	-	**421,636,892.0**
Ejecutado al 30/06/2026	85,537,983.4	-	-	**85,537,983.4**
% Ejecución al 30/06/2026	**20%**	**0%**	**0%**	**20%**

Presupuesto SIAFI 2026 (Millones de Lempiras)



7.Presupuesto Histórico Según SIAFI (L)

Gestión	Presupuesto Vigente Histórico				Ejecución Histórica				
	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total	% de Ejecución
2024	449,390,810.0	-	-	449,390,810.0	233,135,659.7	-	-	233,135,659.7	52%
2025	331,233,052.0	-	-	331,233,052.0	179,696,846.9	-	-	179,696,846.9	54%
2026	421,636,892.0	-	-	421,636,892.0	85,537,983.4	-	-	85,537,983.4	20%
TOTAL	**1,202,260,754.0**	**-**	**-**	**1,202,260,754.0**	**498,370,490.0**	**-**	**-**	**498,370,490.0**	**41%**

Presupuesto Vigente -Ejecutado Histórico



SECRETARÍA DE FINANZAS

Ficha Ejecutiva de Seguimiento de Proyecto 2026

Código BIP	25449	Programa De Construcción Y Equipamiento De Tres Hospitales (Tegucigalpa, San Pedro Sula Y Roatán) Para El Fortalecimiento De La Red Hospitalaria En Honduras

Información Física del Proyecto

8. INDICADORES CLAVE

Total Entregables	COMPLETADO	En Riesgo	Con Retraso	Sin Iniciar	% Ejec. Global	% Ejecución 2026
25	0	0	5	0	1054%	3%

Seguimiento Físico De Metasprograma De Construcción Y Equipamiento De Tres Hospitales (Tegucigalpa, San Pedro Sula Y Roatán) Para El Fortalecimiento De La Red Hospitalaria En Honduras

8.1 Entregables		Meta Global			Programación 2026					Ejecutado 2026					Resultados		Indicador	PROG 2026-27
Entregable	Unidad de Medida	Meta Global	Acumulado Dic-2025	% Avance Ac. 2025	T1 Prog	T2 Prog	T3 Prog	T4 Prog	Total Prog 2026	T1 Real	T2 Real	T3 Real	T4 Real	Total Ejec 2026	% Ejecución 2026	Desviación	Indicadores	Prog 2026-27
Celdas en AMARILLO = ingrese avance real | Celdas en AZUL = programación (editable anualmente) | Celdas en BLANCO = calculadas automáticamente																		
Componente 1: Construcción y equipamiento de hospitales																		
Construcción hospital de Roatán	Obra	1	0	28%	0	0	0	0	1	0	0			0	6%	-0.58	CON RETRASO	0
Equipamiento hospital de Roatán	Unidad	2,930	0	0%	0	0	2	1	3	0	0			0	0%	-2.94	CON RETRASO	0
Supervisión del hospital de Roatán	Informe	1	0	30%	3	3	3	3	12	3	7			10	83%	-2	CON RETRASO	2
Hospitales fortalecidos con Equipo Medico y no-médico para la continuidad de servicios esenciales (salas neonatales)	Lotes	10	0	0%	0	0	1	0	1	0	0			0	0%	-1	CON RETRASO	2
Fortalecimiento a la red de hospitales a través de equipamiento médico y no médico	Lotes	14	0	0%	0	0	0	1	1	0	0			0	0%	-0.85	CON RETRASO	2
Componente 2: Formación y desarrollo de competencias de los RRHH en Salud																		
Formación de médicos especialistas	Profesionales	46	0	0%	0	0	0	0	0	1	0			1	100%	0	NO PROGRAMADO	0
Capacitados Médicos especialistas con diplomados en temas priorizados	Profesionales	19	0	0%	0	0	0	0	0	0	0			0	0%	0	NO PROGRAMADO	19
Certificados Médicos Generales en programas priorizados	Profesionales	150	0	0%	0	0	0	0	0	0	0			0	0%	0	NO PROGRAMADO	150
Capacitados Médicos Generales en el manejo de pacientes hospitalizados y de urgencia con trauma	Profesionales	54	0	0%	0	0	0	0	0	0	0			0	0%	0	NO PROGRAMADO	54
Capacitados Médicos Generales con diplomados en temas priorizados	Profesionales	204	0	0%	0	0	0	0	0	0	0			0	0%	0	NO PROGRAMADO	204
Capacitados con Diplomado de directivos de los hospitales en habilidades gerenciales y Gestión de Calidad en Servicios de Salud	Profesionales	120	0	0%	0	0	0	0	0	0	0			0	0%	0	NO PROGRAMADO	120
Capacitados Enfermeros con diplomado en temas priorizados	Profesionales	60	0	0%	0	0	0	0	0	0	0			0	0%	0	NO PROGRAMADO	60
Formados Técnicos en Urgencias Medicas	Profesionales	50	0	0%	0	0	0	0	0	0	0			0	0%	0	NO PROGRAMADO	50
Implementado el Modelo Organizacional y de Gestión para la puesta en marcha de cada hospital beneficiado implementado (Roatán primera fase)	Documento	1	0	0%	0	0	0	0	0	0	0			0	0%	0	NO PROGRAMADO	1
Elaborado e Implementado Plan de manejo de residuos y desechos hospitalarios (comunes o no peligrosos, biológicos y peligrosos), en cada hospital de intervención (Roatán primera fase)	Documento	1	1	0%	0	0	0	0	0	0	0			0	0%	0	NO PROGRAMADO	1
Capacitados Personal de los hospitales beneficiados en el manejo de LCS por violencia sexual y de genero.	Profesionales	150	0	0%	0	0	0	0	0	0	0			0	0%	0	NO PROGRAMADO	150
Elaborados Protocolos y guias clinicas priorizadas	Documento	10	0	0%	0	0	0	0	0	0	0			0	0%	0	NO PROGRAMADO	10
Actualizado y socializado con actores territoriales Manual para la atención (incluyendo referencia y respuesta) de sobrevivientes de diversos tipos de violencia sexual y basada en género revisado para su actualización y socializado con actores territoriales	Documento	1	0	0%	0	0	0	0	0	0	0			0	0%	0	NO PROGRAMADO	1
Desarrollados Protocolo que incluye la identificación, atención y referencia de PCD	Documento	3	0	0%	0	0	0	0	0	0	0			0	0%	0	NO PROGRAMADO	3
Implementado Hospitales con sistema de gestión de la calidad	Documento	3	0	0%	0	0	0	0	0	0	0			0	0%	0	NO PROGRAMADO	3
Desarrollados Lineamientos de atención Intercultural y Protocolos específicos de atención intercultural enfocados en PIAH	Documento	3	0	0%	0	0	0	0	0	0	0			0	0%	0	NO PROGRAMADO	3
Capacitados Personal en atención de personas diversas (LGTBIQ+, Pueblos Indígenas y personas con discapacidad).	Profesionales	80	0	0%	0	0	0	0	0	0	0			0	0%	0	NO PROGRAMADO	80
Componente 3: Fortalecimiento de la Gestión de la Red de Servicios																		
Conformadas Redes de servicio del área de influencia de los hospitales básicos y generales beneficiados	Documento	2	0	0%	0	0	0	0	0	0	0			0	0%	0	NO PROGRAMADO	2
Equipados Establecimientos de primer nivel de atención materno-infantil en la zona de influencia del hospital de Roatán	Unidades	7	0	0%	0	0	0	0	0	0	0			0	0%	0	NO PROGRAMADO	7
Capacitados Personal de primer nivel de las áreas de influencia del hospital de Roatán en normas de cuidados obstétricos y neonatales.	Profesionales	50	0	0%	0	0	0	0	0	0	0			0	0%	0	NO PROGRAMADO	50
Capacitados Personal asistencial y de conducción (primer y segundo nivel) del área de influencia de los hospitales intervenidos para la implementación de Red de Servicios	Profesionales	50	0	0%	0	0	0	0	0	0	0			0	0%	0	NO PROGRAMADO	50
Equipados Servicios de emergencia de Hospitales	Hospitales	5	0	0%	0	0	0	0	0	0	0			0	0%	0	NO PROGRAMADO	5
Elaborado Modelo de atención y Protocolos de coordinación, comunicación y atención prehospitalaria	Documento	1	0	0%	0	0	0	0	0	0	0			0	0%	0	NO PROGRAMADO	1
TOTAL / PROMEDIO		4,362	2	2%	78.05	78.41	99.44	97.51	353.41	3.54	7.00	0.00	0.00	10.54	3%	(342.87)		

Situación Actual

Al segundo trimestre, la Unidad Ejecutora de Proyectos BID (GESALUD) reporta un avance global físico de 9% y financiero de 8.4%, con relación a las actividades realizadas en el marco del reporte de monitoreo del proyecto (PMR).
Así mismo al término de junio de los corrientes, por parte de la Unidad Técnica de Infraestructura para los Nuevos Hospitales (UTINH), reporta para la Construcción y Equipamiento del Hospital de Roatán, avance físico (obra) del 44.03% y supervisión en 100%, indicando las siguientes actividades en ejecución:
•Demolición de elementos de concreto o block para el reforzamiento del Edificio Existente.
•Habilitado y colocación de ductos de lámina galvanizada para instalación de HVAC nivel 1 y 2 en el Edificio Existente.
•Habilitado y colocación de ductos de lámina galvanizada para instalación de HVAC nivel 2 Actuación 2 y 3.
•Colocación de tubería y canastilla para Instalación de telecomunicaciones en niveles 2 de la Actuación 2 y 3.
•Pintura de estructura metálica Actuación 5.
•Colocación de soporte para tubería de cobre de diferentes diámetros de gases medicinales en el Edificio Existente.
•Colocación de tubería de cobre de diferentes diámetros para instalación agua fría/ caliente en el Edificio Existente y Actuación 2.
•Colocación de bandeja porta cable en Edificio Existente.
•Colocación de conductor eléctrico 12 awg en nivel 1 del Edificio Existente y primer nivel Actuación 2.
En cuanto a la Construcción y supervisión de la obra del hospital de especialidades (trauma San Pedro Sula), el documento de pliegos fue enviado al BID para no objeción; así mismo durante el segundo trimestre se realizó visita de campo para verificación de terreno por parte de las empresas oferentes.
En relación con el Convenio de Becas entre SESAL y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), se incorporaron ajustes de las observaciones realizadas por el BID, se está a la espera de que SESAL envié esta versión final con sus anexos aprobados para la gestión de su no objeción.
Se inició la elaboración de la Hoja de Ruta para la Reconfiguración de la Red Integrada de Servicios de Salud (RISS) de Islas de la Bahía y la puesta en marcha de apertura del Hospital de Roatán, lo que conllevo a hacer ajustes en PEP para incorporar actividades e identificación de financiamiento para su ejecución.

Principales Riesgos Identificados

Reformulación del Programa, considerando la decisión de pausar la construcción del Hospital de Trauma en Tegucigalpa, en vista de no contar con financiamiento adicional que cubra los costos estimados producto de los Diseños recibidos al cierre de 2025.

Acciones Recomendadas

Acelerar la gestión de reformulación formalizando a SEFIN y BID.
La SESAL debe velar por el cumplimiento del cronograma de ejecución y puesta en marcha del Hospital de Roatán; considerando ser mas rigurosos con las empresas contratistas (obra y supervisión) para el cumplimiento de contratos, sin aprobar mas ordenes de cambio por ampliación en los plazos de ejecución.
Acelerar el proceso que permitirá dar incido a la formación nacional e internacional de especialización del personal médico para atención en los nuevos hospitales.

Mensaje Clave para Alta Dirección

SEFIN apoyará las gestiones pertinentes, apoyando el monitoreo y avance del Programa.
Promover a nivel de Autoridades poder realizar una evaluación de las diferentes Unidades Ejecutoras, considerando aspectos reincidentes como ser baja ejecución, cantidad de ampliaciones de plazo requeridas, planificación y modificaciones, gestión de los procesos tanto de Gobierno como de los organismos financieros; con el propósito de contar con el personal idóneo en la gestión efectiva de proyectos actuales y futuros.

SECRETARÍA DE FINANZAS

Ficha Ejecutiva de Seguimiento de Proyecto 2026

Código BIP	25216	Proyecto De Servicios Esenciales De Salud Y Preparación Ante Emergencias

1. Identificación del Proyecto

Nombre del Programa/Proyecto:	Proyecto De Servicios Esenciales De Salud Y Preparación Ante Emergencias				
Entidad Ejecutora:	0060 - Secretaría De Salud				
Sector:	Promocion Y Proteccion Humana				
Organismo Financiador	171 - Asociación Internacional De Fomento				
Convenio	IDA 7142-HN, TF0B8564-HN, TF0C1861				
Monto Total de Financiamiento USD:	82,000,000.00				
Monto Financiamiento L:	2,189,063,800.00				
Plazo de Ejecución:	60 meses	**Fecha de Inicio**	15/3/2024	**Fecha de Fin**	15/3/2029
Estado del Proyecto:	Ejecución				
Tipo de inversión	2 - Inversion En Desarrollo Humano				
Tipo de Cambio II Trimestre 2026	26.6959				

Nota: Mediante Oficio DGCP-FEMS-232/2026 del 24 de abril de 2026, SEFIN solicita cancelación parcial del Crédito por US$13.0 millones. La Asociación Internacional del Fomento (AIF/ Banco Mundial) notifica aceptación mediante Oficio de fecha 29 de abril de 2026.

2. Objetivo Estratégico

Fortalecer la respuesta del sistema de salud para prestar servicios esenciales de salud materna, infantil y de adolescentes y con mayor capacidad de preparación, respuesta y rectoría de la Salud Pública.

3. Cobertura

Departamentos	Atlántida, Colón, Comayagua, Copán, Cortés, Choluteca, El Paraíso, Francisco Morazán, Gracias a Dios, Intibucá, Islas de la Bahía, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Santa Bárbara, Valle, Yoro
Municipios	La Ceiba, Trujillo, Comayagua, Santa Rosa De Copán, San Pedro Sula, Choluteca, El Paraíso, Distrito Central, Brus Laguna, Intibucá, Roatán, La Paz, Gracias, Ocotepeque, Juticalpa, Santa Bárbara, Nacaome, Yoro

Beneficiarios:	5,918,115
Generación de empleo (Estimado)	5,774 directos 17,320 indirectos

Beneficiarios del Proyecto






3.Componentes del Proyecto

Nombre del Componentes	Costo Componente (L)			
	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total
2480 - 1(a) Actividades de inmunización para los niños parcialmente Vacunados y Niños Cero Dosis	146,827,450.0	66,739,750.0	-	213,567,200.0
2484 - Comp. 2. Capacidad de Preparación, Respuesta y Rectoría de la Salud Pública	373,742,600.0	106,783,600.0	-	480,526,200.0
2485 - Comp. 3. Gestión del Proyecto	80,087,700.0	26,695,900.0	-	106,783,600.0
2724 - 1(b) Mejora de la Calidad de los Servicios Materno y Neonatales	694,093,400.0	106,783,600.0	-	800,877,000.0
2725 - 1(c) Mejora de la Calidad de los Servicios de Salud Sexual y Reproductiva (Adolescentes)	307,002,850.0	93,435,650.0	-	400,438,500.0
2726 - 1(a) GAVI- Actividades de inmunización para los niños parcialmente Vacunados y Niños Cero Dosis	-	106,783,600.0	-	106,783,600.0
2727 - Comp. 2. GAVI-Capacidad de Preparación, Respuesta y Rectoría de la Salud Pública	-	53,391,800.0	-	53,391,800.0
2728 - Comp. 3. GAVI- Gestión del Proyecto	-	26,695,900.0	-	26,695,900.0
TOTAL	**1,601,754,000.0**	**587,309,800.0**	**-**	**2,189,063,800.0**

Costo Total de Proyecto (Cifras en Millones de Lempiras)



Información Financiera/Presupuestaria del Proyecto


5. Ejecución Financiera (US$ Millones)

Organismo Financiador: UEPEX	171 - Asociación Internacional De Fomento
Monto Contratado:	82.0
Desembolsado Acumulado	12.3
Disponible:	69.7
% Desembolso:	15%

6.Presupuesto según SIAFI 2026 (L)

Presupuesto	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total
Presupuesto Aprobado:	108,290,171.0	83,854,000.0	-	**192,144,171.0**
Presupuesto Vigente:	108,290,171.0	83,854,000.0	-	**192,144,171.0**
Ejecutado al 31/03/2026	670,498.0	56,552,848.7	-	**57,223,346.6**
% Ejecución al 31/03/2026	**1%**	**67%**	**0%**	**30%**


Presupuesto SIAFI 2026 (Millones de Lempiras)



7.Presupuesto Histórico Según SIAFI (L)

Gestión	Presupuesto Vigente Histórico				Ejecución Histórica				% de Ejecución
	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total	
2024	-	17,314,947.0	-	17,314,947.0	-	4,391,136.5	-	4,391,136.5	25%
2025	3,000.0	169,412,949.0	-	169,415,949.0	-	164,493,439.9	-	164,493,439.9	97%
2026	108,290,171.0	83,854,000.0	-	192,144,171.0	670,498.0	56,552,848.7	-	57,223,346.6	30%
TOTAL	**108,293,171.0**	**270,581,896.0**	**-**	**378,875,067.0**	**670,498.0**	**225,437,425.1**	**-**	**226,107,923.0**	**60%**

Presupuesto Vigente -Ejecutado Histórico



SECRETARÍA DE FINANZAS

Ficha Ejecutiva de Seguimiento de Proyecto 2026

Código BIP	25216	Proyecto De Servicios Esenciales De Salud Y Preparación Ante Emergencias

Información Física del Proyecto

8. INDICADORES CLAVE

Total Entregables	COMPLETADO	En Riesgo	Con Retraso	Sin Iniciar	% Ejec. Global	% Ejecución 2026
18	0	0	0	7	33%	0%

Seguimiento Físico De Metasproyecto De Servicios Esenciales De Salud Y Preparación Ante Emergencias

8.1 Entregables		Meta Global			Programación 2026					Ejecutado 2026					Resultados		Indicador	PROG 2026-27
Entregable	Unidad de Medida	Meta Global	Acumulado Dic-2025	% Avance Ac. 2025	T1 Prog	T2 Prog	T3 Prog	T4 Prog	Total Prog 2026	T1 Real	T2 Real	T3 Real	T4 Real	Total Ejec 2026	% Ejecución 2026	Desviación	Indicadores	Prog 2026-27
Celdas en AMARILLO = ingrese avance real | Celdas en AZUL = programación (editable anualmente) | Celdas en BLANCO = calculadas automáticamente																		
Mejorar la utilización de los servicios de salud reproductiva e infantil en las regiones prioritarias																		
Número de regiones sanitarias que tienen una cobertura de vacunación Penta3 superior o igual al 85%	Número	20	3	15%	0	0	0	0	0	0	0			0	0%	0	NO PROGRAMADO	0
Incremento en cobertura de partos institucionales que ocurren en instituciones que cumplen con estándares nacionales para cuidados maternos y neonatales, en regiones priorizadas por el proyecto	Porcentaje	25	0	0%	0	0	0	0	0	0	0			0	0%	0	NO PROGRAMADO	0
Fortalecer las capacidades del sistema de salud pública para la preparación ante emergencias																		
Notificaciones de casos sospechosos de dengue para los cuales los resultados de laboratorio están disponibles para la Unidad de Vigilancia de la Salud (UVS) dentro de los 10 días posteriores a la recolección de la muestra	Porcentaje	40	2	6%	0	0	0	0	0	0	0			0	0%	0	NO PROGRAMADO	0
Fortalecimiento de los servicios de salud para adolescentes, madres y niños																		
Personas que han recibido servicios esenciales de salud, nutrición y población (SNP) (CRI, Número)	Personas	1,230,000	414,505	34%	0	0	0	0	0	0	0			0	0%	0	NO PROGRAMADO	0
Personas que han recibido servicios esenciales de salud, nutrición y población (SNP) - Mujeres (requisito) (CRI, Número)	Mujeres	805,000	204,414	25%	0	0	0	0	0	0	0			0	0%	0	NO PROGRAMADO	0
Número de niños inmunizados (CRI, Número)	Niños	850,000	414,505	49%	0	0	0	0	0	0	0			0	0%	0	NO PROGRAMADO	0
Número de partos atendidos por personal sanitario calificado (CRI, Número)	Mujeres	380,000	0	0%	0	0	0	0	0	0	0			0	0%	0	NO PROGRAMADO	0
Mujeres embarazadas que acudieron a su primer control prenatal con 12 semanas o menos de gestación, en regiones priorizadas por el proyecto (Porcentaje)	Porcentaje	70	22	31%	0	0	0	0	0	0	0			0	0%	0	NO PROGRAMADO	0
Establecimientos que brindan servicios de SSR adaptados a los adolescentes que actualizan sus planes de acción en función de los comentarios de los usuarios sobre la calidad de los servicios brindados, en regiones priorizadas por el proyecto	Porcentaje	100	0	0%	0	0	0	0	0	0	0			0	0%	0	NO PROGRAMADO	0
Trabajadores en salud capacitados/certificados en la provisión de servicios amigables a los adolescentes, en regiones priorizadas por el Proyecto (IDA|7142-HN)	Personas	500	0	0%	0	0	0	0	0	0	0			0	0%	0	NO PROGRAMADO	0
Establecimientos que brindan servicios de labor y parto rehabilitados y/o equipados para cumplir con los estándares nacionales mínimos para atención materna y neonatal, en regiones priorizadas por el Proyecto	Porcentaje	60	0	0%	0	0	0	0	0	0	0			0	0%	0	NO PROGRAMADO	0
Número de niños menores de 1 año pendientes de su primera dosis de la vacuna pentavalente	Niños	16,219	45,044	278%	0	0	0	0	0	0	0			0	0%	0	NO PROGRAMADO	0
Capacidad de preparación y respuesta de la salud pública																		
Establecimientos de salud que reportan datos al sistema integrado de conformidad con los protocolos de la SESAL	Número	506	854	169%	0	0	0	0	0	0	0			0	0%	0	NO PROGRAMADO	0
Laboratorios regionales que siguen los Procedimientos Operativos Estándares (POEs) establecidos para las tres principales enfermedades prioritarias (COVID-19, dengue y zika), con base en auditorías técnicas (Porcentaje)	Porcentaje	100	0	0%	0	0	0	0	0	0	0			0	0%	0	NO PROGRAMADO	0
Unidades regionales de vigilancia equipadas y capacitadas para el análisis de datos epidemiológicos (Número)	Número	15	0	0%	0	0	0	0	0	0	0			0	0%	0	NO PROGRAMADO	0
TOTAL / PROMEDIO		3,282,655	1,079,349	40%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0		

SECRETARÍA DE FINANZAS

Ficha Ejecutiva de Seguimiento de Proyecto
2026

Código BIP	25216	Proyecto De Servicios Esenciales De Salud Y Preparación Ante Emergencias

Situación Actual

Para el segundo trimestre, la Unidad Administradora de Proyectos para la Protección de la Salud Honduras (UAP-PROSALH) reporta las siguientes acciones en base a la Matriz de Resultados:
•Fortalecer las capacidades del sistema de salud pública para la preparación ante emergencias:
8 laboratorios regionales confirman casos sospechosos de dengue, siguiendo los lineamientos de la SESAL y reportan los resultados en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS).
•Fortalecimiento de los servicios de salud para adolescentes, madres y niños:
918,958 personas han recibido servicios esenciales de salud, nutrición y población.
452,794 mujeres han recibido servicios esenciales de salud, nutrición y población.
917,778 niños fueron inmunizados (aplicación de vacunas).
1,180 partos atendidos por personal sanitario certificado.
31.28% de las mujeres embarazadas acudieron a primer control prenatal, con 12 semanas o menos de gestación.
80,581 niños menos de 1 año pendientes de su primera dosis de vacuna pentavalente.
•Capacidad de preparación y respuesta de la salud pública:
1,170 establecimientos de salud reportan datos al Sistema Integrado de conformidad con los protocolos de la SESAL.

Principales Riesgos Identificados

Baja ejecución del Proyecto.
Unidad Ejecutora debe identificar e implementar estrategias para eficientar la ejecución del Proyecto.

Acciones Recomendadas

Acelerar la ejecución del Proyecto, a fin de evitar gestiones de extensión de plazos para ejecución (a 3 años de ejecución el avance es lento).

Mensaje Clave para Alta Dirección

SEFIN apoyará las gestiones pertinentes, apoyando el monitoreo y avance del Programa.
Promover a nivel de Autoridades poder realizar una evaluación de las diferentes Unidades Ejecutoras, considerando aspectos reincidentes como ser baja ejecución, cantidad de ampliaciones de plazo requeridas, planificación y modificaciones, gestión de los procesos tanto de Gobierno como de los organismos financieros; con el propósito de contar con el personal idóneo en la gestión efectiva de proyectos actuales y futuros.

SECRETARÍA DE FINANZAS

Ficha Ejecutiva de Seguimiento de Proyecto 2026

Código BIP	25289	Construcción Y Equipamiento Del Edificio Administrativo Y Del Laboratorio Nacional De Vigilancia (Lnv) De La Salud En Tegucigalpa, Francisco Morazán

1. Identificación del Proyecto

Nombre del Programa/Proyecto:	Construcción Y Equipamiento Del Edificio Administrativo Y Del Laboratorio Nacional De Vigilancia (Lnv) De La Salud En Tegucigalpa, Francisco Morazán				
Entidad Ejecutora:	0060 - Secretaría De Salud				
Sector:	Desarrollo E Inclusión Social				
Organismo Financiador	001 - Tesorería General De La República - Efectivo, 147 - Japan International Cooperation Agency				
Convenio	Acuerdo Donación No 1660400				
Monto Total de Financiamiento USD:	9,406,516.10				
Monto Financiamiento L:	251,326,119.00				
Plazo de Ejecución:	30 meses	**Fecha de Inicio**	1/9/2023	**Fecha de Fin**	31/3/2027
Estado del Proyecto:	Ejecución				
Tipo de inversión	1 - Inversion Real				
Tipo de Cambio II Trimestre 2026	26.7183				



2. Objetivo Estratégico

ADECUADA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA UN FUNCIONAMIENTO OPTIMO DEL AREA TECNICO-ADMINISTRATIVA DEL LABORATORIO NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD EN TEGUCIGALPA EN FRANCISCO MORAZAN

3. Cobertura

Departamentos	Francisco Morazán
Municipios	Distrito Central

Beneficiarios:	3,497,636
Generación de empleo (Estimado)	59 directos 177 indirectos



3.Componentes del Proyecto

Nombre del Componentes	Costo Componente (L)			
	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total
2524 - CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y DEL LABORATORIO NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD.	-	202,374,309.0	26,362,840.0	228,737,149.0
2525 - EQUIPAMIENTO CLINICO DEL LABORATORIO NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD	-	-	4,547,250.0	4,547,250.0
2526 - FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO INSTITUCIONAL	-	-	18,041,720.0	18,041,720.0
TOTAL	**-**	**202,374,309.0**	**48,951,810.0**	**251,326,119.0**

Costo Total de Proyecto (Cifras en Millones de Lempiras)



Información Financiera/Presupuestaria del Proyecto

5. Ejecución Financiera (US$ Millones)

Organismo Financiador: UEPEX	001 - Tesorería General De La República - Efectivo, 147 - Japan International Cooperation Agency
Monto Contratado:	9.4
Desembolsado Acumulado	5.6
Disponible:	3.8
% Desembolso:	59%

6.Presupuesto según SIAFI 2026 (L)

Presupuesto	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total
Presupuesto Aprobado:	-	148,917.0	27,552,928.0	**27,701,845.0**
Presupuesto Vigente:	-	148,917.0	27,552,928.0	**27,701,845.0**
Ejecutado al 30/06/2026	-	-	-	**-**
% Ejecución al 30/06/2026		**0%**	**0%**	**0%**


Presupuesto SIAFI 2026 (Millones de Lempiras)



7.Presupuesto Histórico Según SIAFI (L)

Gestión	Presupuesto Vigente Histórico				Ejecución Histórica				
	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total	% de Ejecución
2024	-	112,249,329.0	5,187,117.0	117,436,446.0	-	108,962,232.1	5,187,116.5	114,149,348.6	97%
2025	-	106,317,132.0	9,154,179.0	115,471,311.0	-	25,253,296.1	9,154,177.0	34,407,473.1	30%
2026	-	148,917.0	27,552,928.0	27,701,845.0	-	-	-	-	0%
TOTAL	**-**	**218,715,378.0**	**41,894,224.0**	**260,609,602.0**	**-**	**134,215,528.2**	**14,341,293.4**	**148,556,821.6**	**57%**

Presupuesto Vigente -Ejecutado Histórico



SECRETARÍA DE FINANZAS

Ficha Ejecutiva de Seguimiento de Proyecto 2026

Código BIP	25289	Construcción Y Equipamiento Del Edificio Administrativo Y Del Laboratorio Nacional De Vigilancia (Lnv) De La Salud En Tegucigalpa, Francisco Morazán

Información Física del Proyecto

8. INDICADORES CLAVE

Total Entregables	COMPLETADO	En Riesgo	Con Retraso	Sin Iniciar	% Ejec. Global	% Ejecución 2026
13	0	0	2	11	82%	0%

Seguimiento Físico De Metasconstrucción Y Equipamiento Del Edificio Administrativo Y Del Laboratorio Nacional De Vigilancia (Lnv) De La Salud En Tegucigalpa, Francisco Morazán

8.1 Entregables		Meta Global			Programación 2026					Ejecutado 2026					Resultados		Indicador	PROG 2026-27
Entregable	Unidad de Medida	Meta Global	Acumulado Dic-2025	% Avance Ac. 2025	T1 Prog	T2 Prog	T3 Prog	T4 Prog	Total Prog 2026	T1 Real	T2 Real	T3 Real	T4 Real	Total Ejec 2026	% Ejecución 2026	Desviación	Indicadores	Prog 2026-27
Celdas en AMARILLO = ingrese avance real | Celdas en AZUL = programación (editable anualmente) | Celdas en BLANCO = calculadas automáticamente																		
2524 - CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y DEL LABORATORIO NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD																		
Realizar los Estudios y Diseños del Edificio Administrativo	DISEÑO	1	1	100%	0	0	0	0	0	0	0			0	0%	0	NO PROGRAMADO	0
Construir Edificio Administrativo (566 mt2) 1. (Diseño y Construcción del Muro Perimetral (85mts2) 2. (Construcción del Estacionamiento Vehicular (868 mts2), 3. (Diseño y Construcción de la Caseta del Nuevo Generador (42mts2) Supervisar obra de Construcción del Edificio	EDIFICIO	1	0	0%	0	0	0	1	1	0	0			0	0%	-1	CON RETRASO	0
Supervisar obra de Construcción del Edificio Administrativo	INFORME	1	0	0%	0	0	0	1	1	0	0			0	0%	-1	CON RETRASO	0
Construir Edificio del Laboratorio Nacional de la Vigilancia de la Salud	EDIFICIO	1	1	100%	0	0	0	0	0	0	0			0	0%	0	NO PROGRAMADO	0
2525 - EQUIPAMIENTO CLINICO DEL LABORATORIO NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD																		
Realizar el Equipamiento Clínico del Laboratorio Nacional de Vigilancia de la Salud	LOTE DE EQUIPO	1	1	100%	0	0	0	0	0	0	0			0	0%	0	NO PROGRAMADO	0
2526 - FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO INSTITUCIONAL																		
Adquirir Mobiliario Equipo y útiles varios de oficina	LOTE DE EQUIPO	3	2	67%	0	0	1	0	1	0	0			0	0%	-1	NO PROGRAMADO	0
Adquirir Equipo y Mobiliario de Computación	LOTE DE EQUIPO	2	2	100%	0	0	0	0	0	0	0			0	0%	0	NO PROGRAMADO	0
Adquirir vehiculos	VEHICULO	4	4	100%	0	0	0	0	0	0	0			0	0%	0	NO PROGRAMADO	0
Adquirir Hyster (Capacidad de carga: 5000LBS/2268KG.)	EQUIPO	1	1	100%	0	0	0	0	0	0	0			0	0%	0	NO PROGRAMADO	0
Instalar montacargas para equipo, (capacidad: 1500 Kg)	EQUIPO	1	1	100%	0	0	0	0	0	0	0			0	0%	0	NO PROGRAMADO	0
Instalar Elevador (capacidad: de 8 Pasajeros 630 K)	EQUIPO	1	0	0%	0	0	0	0	0	0	0			0	0%	0	NO PROGRAMADO	0
TOTAL / PROMEDIO		17.00	14.00	70%	0.00	0.00	1.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	(3.00)		

Situación Actual

Al segundo trimestre del 2026, UAFCE-SESAL indica que no es posible tener avances físicos durante el año, debido a que están en curso dos los procesos de adquisición con fondos nacionales.
EN cuanto a la Fuente 22 se realizaron algunos pagos por parte de JICA/JAPON, sin embargo, los mismos serán regularizados hasta el tercer trimestre de 2026.

Principales Riesgos Identificados

Tras varios intentos, no se logra concretar la contratación de la obra y supervisión para la construcción del Edificio Administrativo del Laboratorio Nacional de Vigilancia (LNV), el cual representa la contrapartida nacional del Acuerdo de Donación JICA.
Cabe señalar, que por su parte JICA en diciembre del 2025 entregó a SESAL construido el Edificio del LNV.
Bajo el Acuerdo de Donación, la **SESAL ha gestionado directamente 5 enmiendas para ampliar el período de desembolso ante JICA**; sin embargo, para el Proyecto se solicitó 1 ampliación de plazo de ejecución hasta el 31/03/2027.

Acciones Recomendadas

Tomando en consideración la baja capacidad de ejecución por parte de la SESAL, a fin de evitar continuar con las gestiones de ampliación se recomienda finalizar el Proyecto dentro la vigencia a marzo del 2027.
Considerar realizar la construcción del Edificio Administrativo bajo un esquema diferente de ejecución (acuerdo interinstitucional dentro del Sector Público o mediante la tercerización de las actividades permitidas bajo la Ley de Contratación del Estado).

Mensaje Clave para Alta Dirección

SEFIN apoyará las gestiones pertinentes, el monitoreo y avance del Proyecto hasta su cierre.
Promover a nivel de Autoridades poder realizar una evaluación de las diferentes Unidades Ejecutoras, considerando aspectos reincidentes como ser baja ejecución, cantidad de ampliaciones de plazo requeridas, planificación y modificaciones, gestión de los procesos tanto de Gobierno como de los organismos financieros; con el propósito de contar con el personal idóneo en la gestión efectiva de proyectos actuales y futuros.
